
RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA SE SANGÜESA

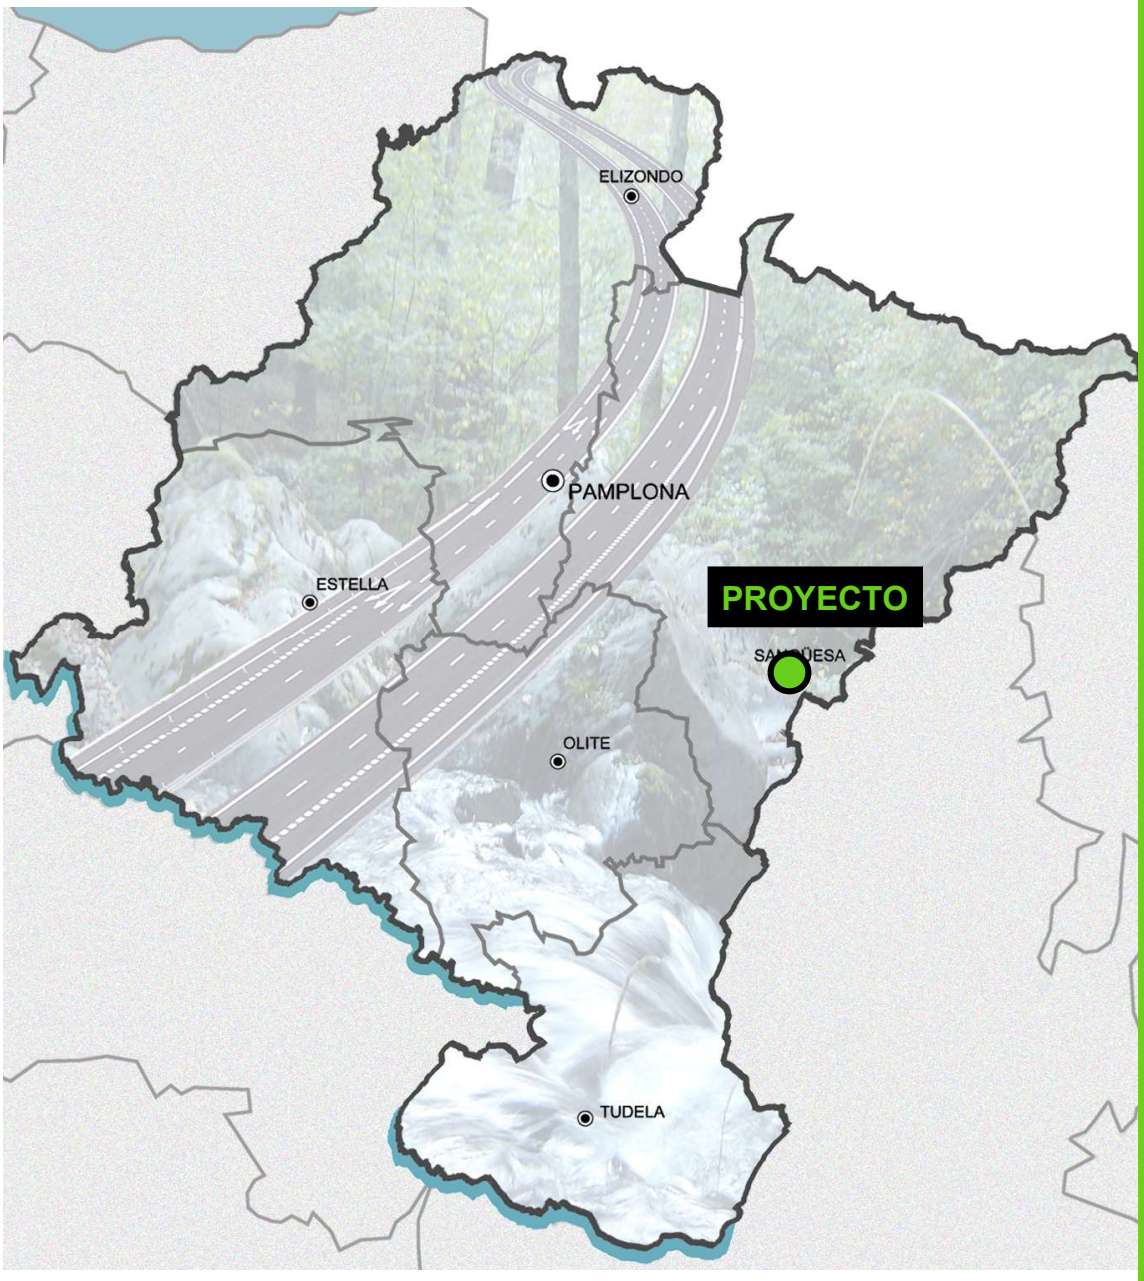

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

TOMO 1 de 1

MEMORIA Y ANEJOS
PLANOS
PLIEGO DE CONDICIONES
PRESUPUESTO

EUNATE
Compañía de Ingeniería, s.l.
Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ªplanta
31192 Tajonar (NAVARRA)
☎ (+34) 948 29 02 37
✉ eunate@eunateing.com

SANG(11P23)0

AGOSTO 2023

ÍNDICE GENERAL

RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SAGÜESA

PROYECTO

Documento nº1: MEMORIA y ANEJOS.

MEMORIA

ANEJOS

nº 1: Topografía (Bases de replanteo).
nº 2: Trazado.
nº 3: Cálculo hidráulico.
nº 4: Justificación de precios.
nº 5: Estudio de Seguridad y Salud.
nº 6: Estudio de Gestión de RCDs.

Documento nº2: PLANOS.

1.- SITUACIÓN E ÍNDICE..... 1 p
2.- EMPLAZAMIENTO..... 1 p
3.- TOPOGRAFIA..... 1 p
4.- SITUACIÓN EXISTENTE..... 1 p
5.- REDES PROYECTADAS..... 2 p
5.1.- PLANTA..... 1 p
5.2.- LONGITUDINALES..... 1 p
6.- SERVICIOS PROYECTADA..... 1 p
7.- PAVIMENTACIÓN PROYECTADA..... 4 p
7.1.- PLANTA Y SECCIONES..... 2 p
7.2.- LONGITUDINALES..... 1 p
7.3.- TRANSVERSLES..... 1 p
8.- DETALLES..... 3 p

Documento nº3: PLIEGO DE CONDICIONES.

Documento nº4: VALORACIÓN.

CUADRO DE PRECIOS nº1

CUADRO DE PRECIOS nº2

MEDICIONES

VALORACIÓN

MEMORIA

s

INDICE

1- ANTECEDENTES. 2
2- OBJETO DEL PROYECTO. 3
3- EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS. 4
4- SITUACIÓN ACTUAL. 6
4.1 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS 6
4.2 REDES 7
4.3 SERVICIOS. 8
4.4 PAVIMENTACIÓN 9
5- REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 10
6- DISEÑO PROYECTADO. 13
6.1 DATOS GENERALES DEL DISEÑO. 13
6.2 RENOVACIÓN DE REDES. 13
6.3 RENOVACIÓN/IMAPLANTACIÓN DE SERVICIOS. 15
6.4 RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN. 16
7- , CALCULO HIDRAULICO. 18
8- , ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO PEATONAL Y RODADO. 19
9- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 20
10- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs. 20
11- PLAZO Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 21
12- DOCUMENTOS DEL PROYECTO 22
13- PRESUPUESTO 23

PLANOS

PRESUPUESTO

1- ANTECEDENTES.

En el año 2000 se realiza la renovación de redes y pavimentación de la calle Alfonso el Batallador como parte de las obras de la "Renovación de Redes locales de Sangüesa 3º Fase", que agrupaba además de esta calle la c/Isidoro Gil de Jaz, la c/Amadores, la calle y Plaza de Santiago, así como parte de la c/Fermina de Ripalda y la c/Juan de Berrueta, y la Plaza de San Salvador y la Plaza Santo Domingo. En el caso de la c/Juan de Berrueta se realizó la renovación de redes (saneamiento separativo) y pavimentación (adoquín) de la mitad Sur (conexión con c/Alfonso el Batallador), mientras que en la mitad Norte (conexión c/Mayor) se mantuvo la infraestructura existente (unitario de saneamiento y pavimentación de asfalto).

A raíz de la peatonalización (acceso restringido) de la c/Mayor de Sangüesa y las modificaciones del tráfico rodado en el caso urbano de Sangüesa realizadas en las últimas décadas, se ha ido derivando hacia la c/Alfonso el Batallador, la Plaza de San Salvador, la Plaza Santo Domingo (principales zonas de aparcamiento del entorno) y la c/Juan de Berrueta, gran parte del tráfico rodado ligero así como pesado (autobuses, recogida de RSU, etc.) que antes se repartía entre diferentes calles del casco urbano.

Como consecuencia de este aumento del tráfico pesado, así como de tráfico ligero hacia/desde las plazas, la calzada de la c/Alfonso el Batallador (adoquín de 6cm prefabricado de hormigón), prevista para un tráfico más reducido, sufrió un importante deterioro y generado unas necesidades de mantenimiento y reparación muy elevadas para garantizar un tránsito adecuado de vehículos y peatones. En el año 2021, tras un estudio de alternativas, se realizó la renovación de la pavimentación de la calzada con aglomerado asfáltico estampado con formato de adoquín.

En el caso de la c/Juan de Berrueta, aunque más limitada al tráfico pesado por la estrechez de la calle y trazado parcial en curva, sufre también un importante deterioro como consecuencia de los desvíos al tráfico, sobre todo en época estival, en la que se realiza una reorganización de tráficos y la peatonalización de la c/Alfonso el Batallador, quedando la c/Juan de Berrueta como única acceso a Sangüesa desde el puente de hierro sobre el Aragón.

2- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la renovación de redes y pavimentación de los 125ml de la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta, calle del casco urbano histórico de unos 250ml y 5-6m de anchura. Las obras incluyen la renovación completa de redes, mantenimiento y/o soterramiento de servicios, y la renovación de la pavimentación con la tipología de calzada de aglomerado asfáltico estampado con tipología de adoquín y aceras de loseta prefabricada de hormigón, similar a la realizada por el ayuntamiento de Sangüesa en la c/Alfonso el Batallador en 2021 y prevista para vías del casco urbano histórico con intenso tráfico.

En la mitad Sur de la calle no se realiza actuación alguna, quedando la renovación de su calzada con aglomerado asfáltico estampado para una fase posterior de pavimentación (inversión en reserva dentro del PIL 2023-2025).

La calle es paralela a la c/Alfonso el Batallador y con conexión a ésta previa a la c/Enrique Labrit, que constituyen, tras la peatonalización de la c/Mayor, las principales arterias de entrada desde el Puente de Hierro sobre el río Aragón.

El contenido del presente Proyecto es:

- La justificación en la Memoria de la situación actual, de la solución adoptada en sus aspectos técnicos y económicos, así como los datos empleados para redactar el Proyecto.
- La aportación de los planos de conjunto y detalle suficientes para la ejecución de las obras.
- La realización del Estudio Básico de Seguridad y Salud adecuado al R.D. 1627/97 y de un Estudio de Gestión de RCDs adecuado al R.D. 105/2008.
- La inclusión del Pliego de Condiciones que servirá de base para la redacción del Contrato de ejecución de las obras, en el cual se describen los trabajos objeto del proyecto, las condiciones que deben reunir los materiales y las distintas unidades de obra, así como las formas de ejecución de las mismas y las condiciones económicas para su medición y abono.
- La confección de un Presupuesto, incluyendo: Mediciones, Cuadros de Precios y la Valoración Total de las obras proyectadas.

La finalidad principal de la obra a realizar consiste en:

MITAD NORTE DE C/JUAN DE BERRUETA

- Renovación del saneamiento unitario actual HAØ600mm por una red separativa de PVCØ315mm para las fecales (160ml) y PVCØ315mm para las pluviales (170ml).
- Renovación de la general de abastecimiento de FNØ200mm (125ml) así como de la conexión con FNØ100 hacia Plaza Santo Domingo.
- Soterramiento/reposición del conjunto de servicios de electricidad (3*PVCcØ160mm), telefonía (2*PVCcØ110mm+ tritubo) y alumbrado (2*PVCcØ110mm), así como la reposición del servicio de gas existente.
- Renovación de la pavimentación con sección de firme de 25cm de ZA-25 (165m^3) y pavimento de aglomerado asfáltico estampado con trama de adoquín y simulación de caz central y encintados laterales (650m^2), constituido por una base de 7cm de mezcla bituminosa caliente (MBC) tipo AC22 BIN 50/70 S CALIZA (S-20) y rodadura de 4cm de MBC tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA (D-8). Las aceras (300m^2) se ejecutarán con losa prefabricada de hormigón 40x20x4cm sobre solera de hormigón HM-20 de 15cm (75m^2).El formato es el mismo que el ejecutado en 2021 para la renovación de la calzada de la c/Alfonso el Batallador, así como el previsto en calzada para la mitad Sur de la propia c/Juan de Berrueta o para la c/Enrique Labrit.

MITAD NORTE DE C/JUAN DE BERRUETA

- No están previstas actuaciones en la mitad Sur de la calle en el presente proyecto (inversión en reserva en el PIL 2023-2025)

3- EMPLAZAMIENTO Y ACCESOS.

El municipio de Sangüesa se sitúa en la Merindad del mismo nombre, a 45km al Este de Pamplona, en la MI del río Aragón y a unos 10km al Suroeste del Pantano de Yesa. Limita la Este con Aragón. Su población ronda los 4.800-5.000 habitantes en las dos últimas décadas. Su c/Mayor conecta con la NA-132 al Oeste y con la NA-127 al Este, que conecta al Norte con la NA-2420/A-21, principales vías del entorno. La cota media de la población ronda la 400m.

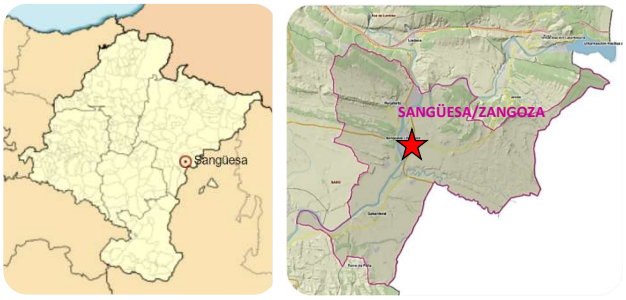


Fig 3.1 Ubicación de Sangüesa

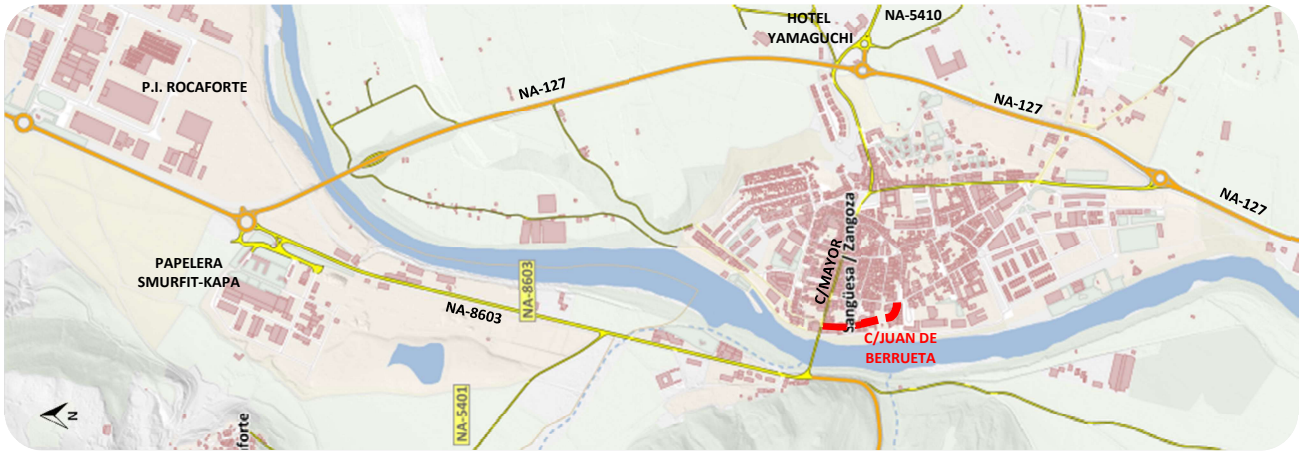


Fig 3.2 Emplazamiento general del casco urbano de Sangüesa y principales vías de acceso

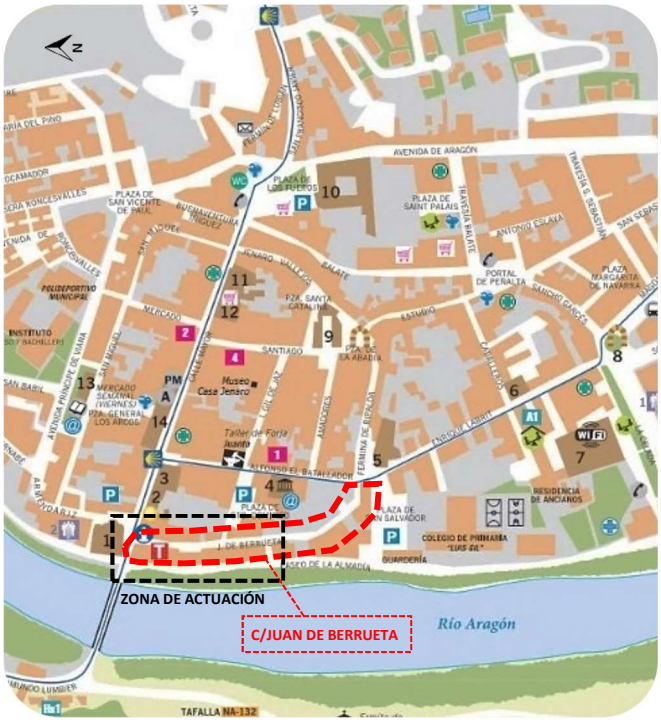


Fig 3.3 Callejero y zona de actuación en casco urbano de Sangüesa



Fig 3.4 Ortofoto y zona de actuación en casco urbano de Sangüesa

El clima en Sangüesa (Papadakis) es de tipo mediterráneo templado (húmedo), con una precipitación media de 650-700mm/año, repartida en unos 105 días de lluvia y 5 de nieve al año. La temperatura media es de 13ºC, medias máximas de 19ºC y medias mínimas de 7,6ºC. los veranos son calurosos, secos y mayormente despejados y los inviernos son muy fríos y parcialmente nublados (45 días de helada entre finales de Octubre y finales de Abril). Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de *1 C* a *29 C* y rara vez baja a menos de *-4ºC* o sube a más de *35ºC*.

Las festividades patronales de Sangüesa, en honor a San Sebastián, se celebran del 11 al 17 de septiembre. Las "Javieradas", primer domingo marzo (4-12 Marzo) y sábado siguiente, son otras fechas de gran afluencia de público en Sangüesa en su camino hacia Javier.

Los tres accesos viables al casco urbano son desde el Oeste por la rotonda de la NA-5410 y la c/San Francisco Javier (conex. con c/Mayor), desde el Sur por la rotonda de la NA-127 y la Avenida de Aragón o desde el Oeste por el puente de hierro sobre el Aragón (conex. con c/Mayor)

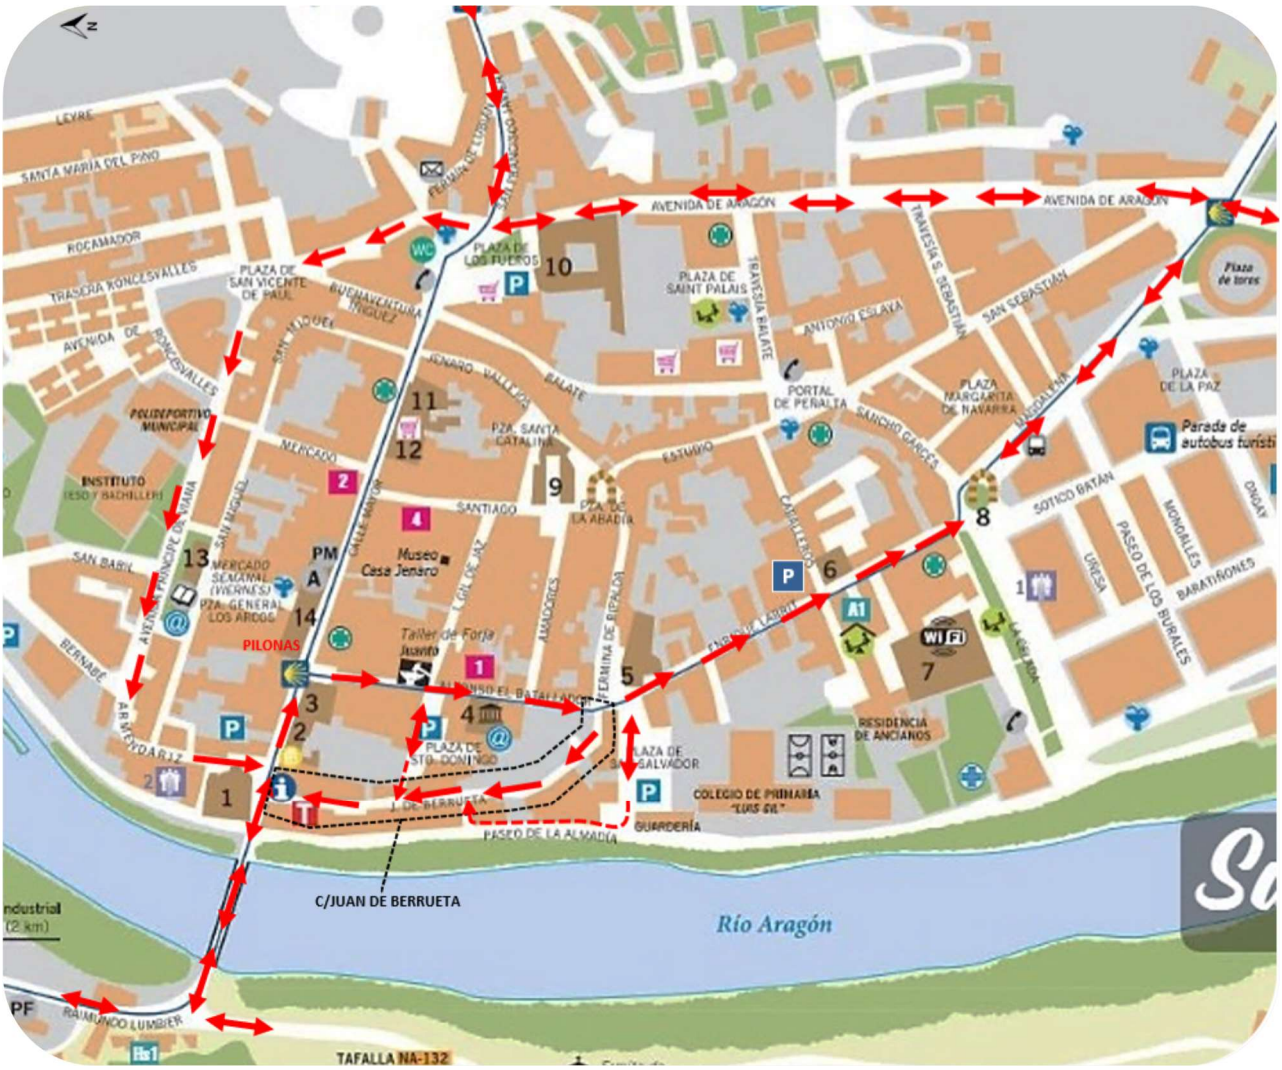


Fig 3.5: Sentidos de circulación y principal circuito regulador accesos rodados al casco urbano de Sangüesa

En la actualidad existe un circuito regulador del tráfico perimetral al centro histórico de Sangüesa desde el Este (c/San Francisco Javier) y desde el Sur (Avenida de Aragón y c/Magdalena, vías de doble sentido de circulación, que permiten la interconectividad con las calles de menor anchura y tráfico de sentido único. La salida hacia el Oeste de este circuito se articula circunvalando por el Norte, por la Avenida Príncipe de Viana, hasta el inicio de la calle Mayor, en su tramo de doble sentido, que nos permite dirigirnos hacia el puente de Hierro (limitada a 3,5 Tn por el municipio). El acceso y circuito desde el Oeste está limitado por el río Aragón y el acceso por el puente de hierro. Con el cierre y peatonalización de la c/Mayor a la altura de la c/Alfonso el Batallador, son esta calle, su prolongación por c/Enrique Labrit y el retorno por c/Juan de Berrueta, las calles que regulan el circuito de acceso Oeste, pero en este caso se trata de calles de sentido único y relativamente estrechas. La movilidad y accesibilidad desde el Oeste está mucho más limitada. La c/Alfonso el Batallador y la c/Berrueta son las dos únicas opciones de habilitar un acceso directo desde el Oeste y puente de hierro. Es la primera la que articula realmente esta opción, ya que es la de mayor anchura y la que mejor conexión tiene con las plazas de San Salvador y Santo Domingo, ya que la unión de estas con la c/Juan de Berrueta son bastante estrechas, sobre todo en el caso de la Plaza Santo Domingo (≈3,5m). La posibilidad de volver desde la Plaza San Salvador por la c/Juan de Berrueta ha hecho que esta vía mantenga habitualmente un sentido Sur-Norte, aunque en los casos de cierre de la c/Alfonso el Batallador o las regulaciones establecidas a partir de Junio de 2020 (cierre a partir de las 12:00 de c/Mayor y c/Alfonso el Batallador) se cambia el sentido de circulación de c/Juan de Berrueta a Norte-Sur, al objeto de dar salida a los tráficos procedentes del puente de hierro o la Avenida príncipe de Viana. Las obras en la c/Juan de Berrueta supondrán una importante afección al tráfico, que pueden absorberse en gran medida gracias al mantenimiento del tráfico por la c/Alfonso el Batallador.

4- SITUACIÓN ACTUAL.

Se expone la situación actual de las redes, servicios y pavimentación de la entidad, así como los problemas principales a destacar de las infraestructuras existentes.

4.1 PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS

MITAD NORTE: La principal problemática se produce en la mitad Norte (125ml) del total (250ml) de la c/Juan de Berrueta, entre la c/Mayor (c/Juan de Berrueta nº2) y la conexión con el Paseo de la Almadía (c/Juan de Berrueta nº18), tramo de calle que quedó fuera de las renovaciones de redes y pavimentación de los años 2000-2002 del casco histórico de Sangüesa. En este tramo la red de saneamiento todavía es unitaria, derivando los caudales (fecal + pluvial) al emisario HAØ400mm de NILSA que recorre la MI del río Aragón por el Paseo de la Almadía (pozo CPSM15, junto al CT). Se trata en conjunto de redes muy antiguas, con un unitario de HAØ500-600mm y una general de abastecimiento de FNØ300-200mm y numerosas acometidas de abastecimiento sin contador exterior y todavía con algunas BR de tipo “lanza”.

En relación a la pavimentación de este tramo Norte la situación es también muy deficiente, ya que mantiene la tipología antigua de pequeñas aceras elevadas laterales, de apenas 0,75-1,0m o incluso menores, pavimentadas en baldosa hidráulica, y calzada central de aglomerado asfáltico, que debido a su antigüedad presenta numerosas deficiencias en su rodadura, incluyendo algunos hundimientos de firme.

MITAD SUR: En relación a la mitad Sur entre la conexión al Paseo de la Almadía (c/Juan de Berrueta nº18) y la c/Alfonso el Batallador (c/Juan de Berrueta nº31), dispone de renovación de redes, servicios y pavimentación de los años 2000-2002, esta última realizándose con una sección transversal con caída al medio y caz central prefabricado de hormigón de 30cm en “V”, calzada central en adoquín prefabricado de hormigón de 6cm de espesor de color gris y aceras de losa prefabricada de hormigón de 40x20cm de color marrón y 4cm de espesor. La separación de la zona peatonal y la zona rodada se realizaba con un encintado de adoquín de color rojo.

La problemática de esta calles es la misma que están sufriendo calles como Alfonso el Batallador o Enrique Labrit, El proceso de peatonalización de diferentes calles del casco histórico de Sangüesa realizado en la última década y la reorganización de sentidos de circulación ha ido obligando a derivar el tráfico procedente de varias de estas calles y del Puente de Hierro hacia la c/Alfonso el Batallador y la c/Enrique Labrit como eje principal, incluyendo el tráfico de vehículos pesados, transporte colectivo, limpieza RSU, etc., así como a la c/Juan de Berrueta como eje alternativo, que debido a los periodos de peatonalización de c/Alfonso el Batallador (fines de semana, periodo estival, etc.) se ve sometida cada vez en mayor medida a un intenso tráfico.

La sección de firme de la mitad Sur es una sección destinada a tráfico ligero o pesado muy reducido, ya que aunque la solera de hormigón es adecuada para tráficos de hasta 25-50 veh. Pesados/día (categoría C1) el espesor del adoquín de 6cm limita su uso a 4-14 veh. Pesados/día (categoría C3 y C4), tráfico muy inferior al que tiene en la actualidad. También debe tenerse en cuenta que la pavimentación tiene ya una antigüedad de 20 años, periodo habitual de diseño para firmes de adoquín.

La calle presenta algunas deficiencias en las bandas de rodadura de la calzada, con adoquines sueltos y ligero asentamiento (pérdida de la cama de arena por movimientos). En el trazado curvo y final de la calle es donde el deterioro es más acusado, al producir el giro de los vehículos una afección más generalizada en el pavimento. La situación actual supone un deterioro progresivo de la pavimentación, que obliga a numerosos y periódicas reparaciones de baches, blandones, reposiciones de caz, etc., así como a numerosas molestias al tráfico rodado y peatonal, así como molestias a los vecinos. Las irregularidades producen un incremento de los ruidos por la circulación de tráfico rodado (ligero y pesado), ya de por sí molestas en pavimentos de adoquín y que no preveían una concentración de tráfico tan elevada en esta calle. Tan bien suponen una molestia al tráfico de bicicletas (por la tipología de las aceras deben circular por la calzada) y a la circulación peatonal, que se encuentran con un pavimento irregular, cejas, adoquines sueltos, etc.. La situación no es todavía la que presentaba Alfonso el Batallador (calzada renovada en 2021 en asfalto estampado con trama de adoquín) pero es comparable a la que presenta Enrique Labrit.


En conjunto la calle requiere de una renovación de redes en la mitad Norte de la calle para implantar una red separativa de saneamiento y ordenar la red de abastecimiento, así como renovación total (mitad Norte) o parcial (mitad sur, calzada) del conjunto del pavimento de la calle.

4.2 REDES

MITAD NORTE:


En la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta el saneamiento todavía sigue siendo unitario (HAØ500-600mm), que entra desde la c/Mayor (pozo U-5 giro 90º, H=2,53m), recoge los caudales (fecal + pluvial) propios de c/Juan de Berrueta entre la c/Mayor y la conexión con el Paseo de la Almadía (c/Juan de Berrueta nº18-nº20) y termina cruzando esta calle (pozo U-2, giro 90º, H=2m) hasta el emisario HAØ400mm de NILSA (pozo U-1 H=2,1/3,85m) que recorre la MI del río Aragón por el Paseo de la Almadía (pozo CPSM15, junto al CT).

La entrada del unitario desde la c/Mayor (pozo U-5) se hace con giro de 90º a profundidad elevada (H=2,53m), habiéndose observado un importante aporte de agua en la visita desde c/Mayor. Según los datos disponibles existe red separativa en la c/Príncipe de Viana y en la c/Mayor, por lo que al unitario de c/Juan de Berrueta sólo deberían acometer aguas fecales. Las pluviales de la c/Mayor se derivan directamente al río por una antigua mineta muy profunda (H=3,7m) con trazado bajo el puente. Se sitúa centrada en c/Mayor (bajo caz) y le acomete desde P. Viana un colector HAØ600mm a 1,85m Se ha observado aporte de agua desde este colector en periodo estival (posible filtración fuga).

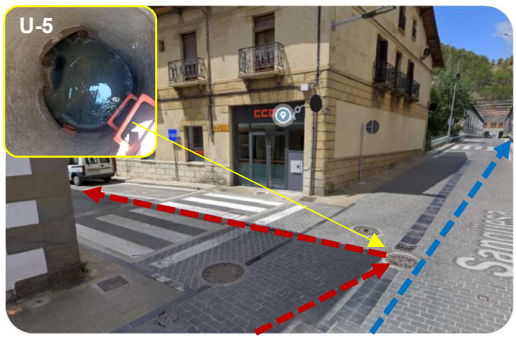

F0.1 Inicio Berrueta y pozo U-5 (90º)

En relación a la fecales, existe un colector PVCØ250/315mm en cada margen de la c/Mayor, unificándose ambos, así como las fecales procedentes de Avda. Príncipe de Viana, a la altura de esta conexión (H=2,05-2,25m). Entre la conexión con Avda. Príncipe de Viana y la conexión con c/Juan de Berrueta, las fecales discurren, por el antiguo colector unitario de (HAØ500-600mm que localizamos en c/J. de Berrueta

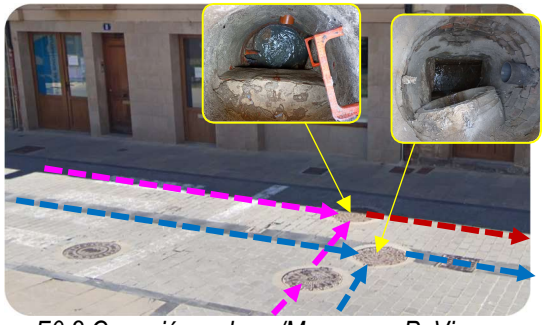
F0.2 Conexión redes c/Mayor con P. Viana

En la revisión realizada se ha observado que el grueso del caudal detectado en el unitario de c/Juan Berrueta procede del colector procedente de Avda. Principe Viana, muy superior al de ambos colectores de c/Mayor. La presencia de agua tanto en el colector fecal como pluvial de esta avenida hacen sospechar la existencia de una fuga agua arriba de la conexión con c/Mayor.

Asociados a c/Juan de Berrueta, se han localizado 3+2 registros de este unitario (U-1 de conexión emisario Nilsa, U-2, U-3, U-4 en c/Juan de Berrueta y U-5 en c/Mayor), cuya accesibilidad es muy deficiente (no disponen de pates, medias cañas, etc.). La mitad Norte de la c/Juan de Berrueta presenta una rasante quebrada, con punto bajo en la conexión con la Plaza Santo Domingo (U-3, H=1,27m). La red separativa de la mitad Sur de c/Juan de Berrueta tiene sus colectores de cabecera (Berrueta nº20) someros (fec. H=1,4m y pluv H=1,6m), por lo que no hay posibilidad, debido a esta rasante quebrada con punto bajo en conexión con Plaza Santo Domingo, de conectar una nueva red separativa de la mitad Norte de c/Juan de Berrueta, con la existente en la mitad Sur.

Las fecales y pluviales de esta plaza están derivadas a contrapendiente a la c/Alfonso el Batallador, por lo que existen conexiones con c/Juan de Berrueta. En el estrechamiento de la plaza hacia c/Juan de Berrueta el último sumidero está taponado (acometidas PE a ambos lados, uso desconocido), por lo que la escorrentía de la zona más baja de la Plaza, así como la propia conexión sí terminan alcanzando la c/Juan de Berrueta.

El número de acometidas de fecales, situadas en acera y en general en muy mal estado (sin medias cañas, con filtraciones y conexión bajantes, etc.) es muy reducida en comparación con las acometidas de abastecimiento localizadas, lo que hace pensar que existen varias acometidas directas de vivienda al unitario sin registros a pie de fachada.

En relación a la pluviales el número de sumideros es muy limitado (prácticamente limitado al sobreancho del nº6). Las bajantes sueles ser enterrada en acera con salida al bordillo, aunque existen también varias directas a calzada, así como bajantes interiores (se desconoce si derivadas a la acometida de fecales del edificio o con acometida directa al unitario de la calle).

La escorrentía en la mitad Norte de c/Juan de Berrueta es por tanto capturada por los sumideros del nº6 y conectada al unitario, o termina alcanzado el punto bajo de la conexión con la Plaza Santo Domingo, donde existe una rejilla-sumidero en la acera (MD). El registro U-3 se encuentra unos 5m agua arriba, sin acometidas, por lo que descartando una conexión no registrada, o lo más probable es que se trate de otra de las antiguas minetas al río Aragón bajo las viviendas (antiguo matadero). La escorrentía superficial recorre en cualquier caso tramos de entre 40-50ml hasta encontrar un punto de recogida.

Respecto al abastecimiento existe una general de FNØ300mm entre la c/Mayor (válvula compuerta) y la conexión con la Plaza Santo Domingo (válvula FNØ100mm hacia esta última). En este punto se deriva una conducción de FNØ100mm hacia esta plaza mientras que la prolongación de la c/Juan de Berrueta continua con FNØ200mm hasta c/Alfonso el Batallador, donde existe un importante nudo general. Existe numerosas acometidas de abastecimiento, con llave de corte en acera (bola metálica o de PE) en registro rectangular o tubo PVC300mm bajo tapa FN40x40cm. Sólo una pequeña parte dispone de caja contador en acera o armario fachada, lo que nos indica que el grueso de los contadores de esta calle se localiza en el interior de las viviendas. Dispone la red de una tipología ed BR muy variada, desde nuevas tipo racor Barcelona hasta antiguo modelos tipo “lanza” de la antigua Sancena (fuera de uso, ante el riesgo de rotura o atasco del muelle de cierre).

Se trata en su conjunto de una infraestructura de redes muy antigua, que no participó de las renovaciones de los años 2000-2002, y que presenta numerosos problemas debido a su antigüedad.

MITAD SUR:

La mitad Sur de la c/Juan de Berrueta dispone de red separativa (PVCØ250mm fecales, PVCØ315mm pluviales) con cabecera en c/Juan de Berrueta y vertido a c/Alfonso el Batallador, red de abastecimiento FNØ200mm, infraestructura renovada con las obras de los años 2000-2002 realizadas en el caso histórico de Sangüesa, que incluyo la mitad sur de la c/Juan de Berrueta.

4.3 SERVICIOS.

MITAD NORTE:

A pesar de la estrechez de sus aceras, la c/Juan de Berrueta dispone de una importante red de canalización soterrada de servicios (registros ladrillo con tapa FN Fensa 60x60cm), motivada por la presencia de un CT en el Paseo de la Almadía a la altura de c/Juan Berrueta nº18-nº20, que utiliza este punto y esta vía como infraestructura del reparto hacia el casco urbano.



Fig 4.1 Infraestructura de servicios s/PCCS de electricidad (rojo), telefonía (verde), gas (morado) y ONO (negro)

A pesar de esta canalización soterrada, que se desarrolla preferentemente por la acera de MD (Oeste) y de números cruces soterrados en los cruces de calles, esto no impide que exista una profusa red de aéreos entre fachada, tanto lineales como transversales, de BT (tramo final conexión con c/Mayor y tramos secundarios de acometidas), telefonía (un coaxial soterrado recorre la c/Mayor, con cámara de reparto en la conexión con c/Juan de Berrueta, y existe también canalización soterrada en la conexión con Plaza Santo Domingo, pero en la mitad Norte de c/Juan de Berrueta el reparto es en su práctica totalidad en aéreo) y alumbrado (este último con luminarias en fachada en la totalidad de la calle y canalización junto a los trenzados aéreos y soterrados de electricidad y telefonía).

También existe canalización de gas a lo largo de toda la c/Juan de Berrueta con conexión en c/Mayor y c/Alfonso Batallador (sin conexión con Plaza Santo Domingo o Paseo de la Almadía).

En la conexión con c/Paseo de la Almadía tenemos conexión eléctrica con el CT en una margen (Sur), y lo que parece una conexión en la otra margen (Norte) con un pedestal de Nasertic junto al CT. El unitario discurre por debajo de este pedestal, cercano también a un árbol de porte.



F1 Vista CT, pedestal Nasertic y U-1



F2 Vista pozo U-1 a c/J. Berrueta

MITAD SUR:

Al igual que ocurría en la mitad Norte en la mitad Sur tenemos canalización soterrada de electricidad, telefonía, gas y alumbrado soterrados por las aceras (en el caso del gas en calzada), con una distribución más ordenada de registros, ya que se canalizaron con las obras de 2000-2002 con la tipología correspondiente a cada servicio. La presencia de aéreos entre fachadas es mucho más reducida, pero sigue existiendo un importante aéreo lineal y transversal de electricidad a la altura del nº22 al nº31 en MD de c/Juan de Berrueta (solares cerrados pendientes edificación, jardines, etc.). En MD existe canalización soterrada hasta c/Alfonso el Batallador, pero este aéreo de MI, por algún motivo, se mantiene todavía en aéreo.

4.4 PAVIMENTACIÓN

MITAD NORTE:

La mitad Norte de la c/Juan de Berrueta está pavimentada en aglomerado asfáltico en calzada, con pequeñas aceras elevadas en ambas márgenes de 0,75-1,0m con bordillo calzada (trapezoidal, modelo antiguo color blanquecino, muy deteriorado en algunas zonas) pavimentadas con baldosa hidráulica color blanco (9x6 pastillas). En algunas zonas el bordillo supera los 13cm, estando sobreelevada unos 5cm, y el estado general de la rígola es muy defectuoso, presentando fisuración generalizada. La calle tiende a tener pendiente transversal hacia la MD.

Hasta la conexión desde c/Mayor hasta la plaza Santo Domingo la calzada es de unos 5m de ancho, por lo que tiene a utilizarse con formato de aparcamiento en línea (MD) y calzada de circulación (MI), aprovechando también el sobreancho del nº6 como zona de aparcamiento en MD. Pasada la conexión de Plaza Santo Domingo la calzada se va estrechado hasta un formato de 3-3,5m, por lo que ya no es viable la utilización de la MD como aparcamiento lineal. La accesibilidad peatonal es muy deficiente, limitada anchura de las aceras, por lo que la circulación peatonal suele hacerse por la calzada, retirándose de la misma al paso de los vehículos.

Debido a la antigüedad tanto de la pavimentación de la calzada (reposiciones en hormigón, grietas, asientos de firme, etc.) como de las aceras, el conjunto de la pavimentación se encuentra en un estado muy deficiente y con aspecto de suciedad (decoloración materiales).

MITAD SUR:

El firme de la calzada está ejecutado con subbase de zahorra ZA-25, solera de HM-20 de 15cm de espesor, cama de arena recebada con cemento de 3-4cm y adoquín de 6cm de canto (casco viejo, 18x12, 12x12 y 9x12). La pendiente transversal está más cerca del 3% que del 2% en la calzada. La sección es similar a la de calle Alfonso el Batallador, pero sin presencia de pilonas en el límite con la acera (el tráfico peatonal es mucho más reducido que en la c/Alfonso el Batallador). Es la tipología a la que se modificaría la mitad Norte de c/Juan de Berrueta, pero con calzada de MBC estampado, según lo ejecutado ya en la c/Alfonso el Batallador.

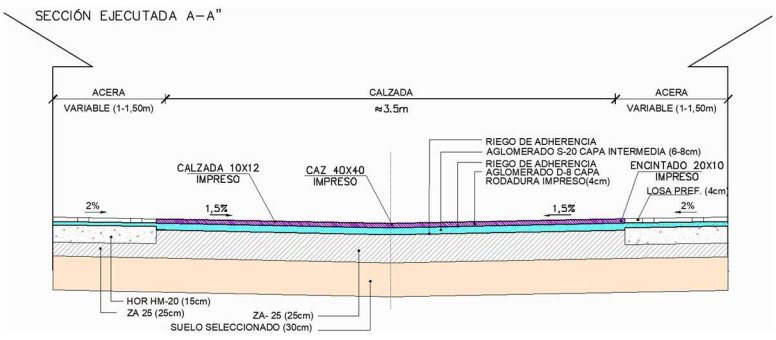


Fig 3.1 Sección transversal existente en la mitad Sur de la calle Juan de Berrueta

Se trata de una sección destinada a tráfico ligero o pesado muy reducido, ya que aunque la solera de hormigón es adecuada para tráficos de hasta 25-50 veh. Pesados/día (categoría C1) el espesor del adoquín de 6cm limita su uso a 4-14 veh. Pesados/día (categoría C3 y C4), tráfico muy inferior al que tiene en la actualidad. También debe tenerse en cuenta que la pavimentación tiene ya una antigüedad de 20 años, periodo habitual de diseño para firmes de adoquín.

La calle presenta algunas deficiencias en las bandas de rodadura de la calzada, con adoquines sueltos y ligero asentamiento (pérdida de la cama de arena por movimientos). En el trazado curvo y final de la calle es donde el deterioro es más acusado, al producir el giro de los vehículos una afección más generalizada en el pavimento. La situación actual supone un deterioro progresivo de la pavimentación, que obliga a numerosos y periódicas reparaciones así como a numerosas molestias al tráfico rodado y peatonal, así como molestias a los vecinos.

La situación no es todavía la que presentaba Alfonso el Batallador (calzada renovada en 2021 en asfalto estampado con trama de adoquín ante las continuas reparaciones del adoquín, el incremento de los ruidos por la circulación de tráfico rodado, presencia de cejas y afección a tráfico peatonal y de bicicletas) pero es comparable a la que presenta Enrique Labrit. En periodo estival y fines de semana se está cerrando al tráfico rodado la c/Alfonso el Batallador, por lo que es Juan de Berrueta junto con Enrique Labrit las calles encargadas de absorber el tráfico de entrada desde el Puente de Hierro.

5- REPORTAJE FOTOGRÁFICO.

MITAD NORTE



F1 Inicio Berrueta MI. Cámara tfno. coaxial dirección c/Mayor



F2 c/ Enrique Labrit. Inicio desde iglesia San Salvador (avance)



F3 Inicio Berrueta MD. Válvula abast. FNØ300mm. + Cruce elec. MI-MD



F4 Ejemplo de bajante tipo. Conectada a unitario o salida bordillo



F5 Ejemplo bajante sumidero a unitario. Sobreancho Berrueta nº6



F6 Pozo unitario HAØ500 U-4 previo Berrueta nº6. H=2,25m



F7 Berrueta nº7 MI. Acometida fecales, abast (caja) y bajante



F8 Berrueta nº11 MD conex. Plz. Sto. Domingo. Rejilla punto bajo pluvial.



F9 A Plz S. Domingo Unitario U-3 H=1,27+ nudo abast.



F10 Berrueta nº14-16. Fallo de firme por fuga y reparación pavimento.



F11 Berrueta nº15. Acceso a garage sobre acera 0, -1,0m baldosa hidra.



F12 Berrueta nº15-nº18. Tramo final previo a conexión a PS Almadía.



F13 nº18-nº20. Final mitad Norte unitario (pozo U-2). Inicio mitad Sur



F14 Berrueta nº18-nº20. Giro 90º unitario U-2 a emisario MI río Aragón



F15 Pozo emisario MI río Aragón junto a CT, destino unitario Berrueta.





F16-17 Ejemplos de los dos sistemas más habituales de acometida abastecimiento. Sólo un pequeño % dispone de contador en suelo público.



F18 Ejemplo acometida de fecales a unitario (estado general deficiente)

MITAD SUR



F19 Inicio red separativa de Berrueta nº20 hacia Alfonso Batallador



F20 Primer sumidero a pluv. Marcas laterales rodadura vehículos adoquín



F21 Berrueta nº22 Final tramo estrecho inicio sobreancho MD



F22 Tapas de red separativa. Reparación caz dañado.



F23 Vista hacia Alfonso Batallador desde Berrueta nº24



F24 Berrueta nº24 Registros separativa inicio quiebro a Batallador



F25 Reparación de calzada en el entorno Berrueta nº26



F26 Berrueta nº31. Zona giro final calle. Afección calzada y caz



F27 Berrueta nº31. Zona giro final calle (vista a Alfonso Batallador).



F28 Berrueta nº31 (vista retroceso). Afección registro calzada.



F29 Berrueta nº31 (vista avance). Conexión final Alfonso Batallador



F30 Final c/Berrueta y sumidero finla previo conexión Alfonso Batallador.

6- DISEÑO PROYECTADO.

Se expone a continuación los principales datos del diseño proyectado para la renovación de redes, servicios y pavimentación de la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta.

En la mitad Sur de la c/Juan de Berrueta no está previstas actuaciones en el presente proyecto.

6.1 DATOS GENERALES DEL DISEÑO.

MITAD NORTE

Para la renovación del saneamiento unitario se ha previsto una red separativa de PVCØ315mm para las fecales y PVCØ315mm para las pluviales. Para la red de abastecimiento la renovación de la general de FNØ200mm así como la conexión con FNØ100 hacia Plaza Santo Domingo.

Se ha incluido el soterramiento/reposición del conjunto de servicios de electricidad (3*PVCcØ160mm), telefonía (2*PVCcØ110mm) y alumbrado (2*PVCcØ110mm), así como la reposición del servicio de gas existente.

En relación a la pavimentación se ha previsto modificar la tipología actual y ejecutar una pavimentación similar a la existente en la mitad Sur de la calle, con sección de aceras a nivel con caída al medio y limahoya central, pero con pavimentación de aglomerado asfáltico estampado con trama de adoquín y simulación de caz central y encintados laterales, y aceras con losa prefabricada de hormigón 40x20x4cm. El formato es el mismo que el ejecutado en 2021 para la renovación de la calzada de la c/Alfonso el Batallador, así como el previsto a futuro para la mitad Sur de la propia c/Juan de Berrueta.

MITAD NORTE

No está previstas actuaciones en la mitad Sur de la c/Juan de Berrueta en el presente proyecto

6.2 RENOVACIÓN DE REDES.

MITAD NORTE

SANEAMIENTO: FECALES Y PLUVIALES

Para la renovación del saneamiento unitario se ha previsto una red separativa de PVCØ315mm para las fecales y PVCØ315mm para las pluviales, con registros visitables DN1000mm con tapa FN D600. La profundidad de partida (cabecera) deberá ser de H=2,53m para la fecales (conexión en registro de c/Mayor U-5) y será necesario ejecutar en esta zona un aliviado al nuevo pluvial de c/Juan de Berrueta a +20cm (70% capacidad fecal) hasta que se pueda garantizar que no tenemos aportes de pluviales del extremo Norte del casco urbano a las redes de c/Mayor y sobre todo a las de Avda. Príncipe de Viana.

Se ha descartado la opción de prolongar la red separativa hasta la propia c/Mayor, ya que la afección sobre esta vía (entrada Puente de Hierro) sería completa dada la profundad del unitario, incluyendo el paso bajo un coaxial de telefonía y canalización soterrada de BT en la acera de c/Mayor. A priori no se afectaría a la mineta de pluviales, que va mucho más profunda (H>3,7m).

Se ha optado por iniciar la red separativa el interior de la c/Juan de Berrueta, interceptando el unitario actual HAØ600mm y realizando sobre el mismo un registro in situ de 1,5x1,5m que dé continuidad, por un lado al colector de fecales PVCØ315mm, y por otro permita el aliviado lateral al colector de pluviales, cuya cabecera se dispondrá en este registro.

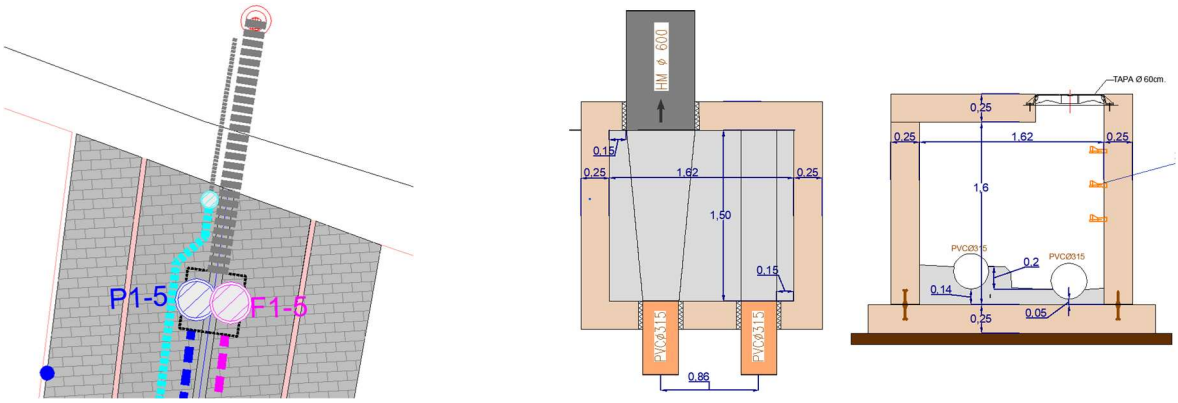


Fig 6.1 Cabecera red separativa c/J Berrueta en conexión con c/Mayor (antiguo unitario)

El aliviado se realizará con vertedero de hormigón a 20cm de calado (70% capacidad PVCØ315mm). Deberá retranquearse 1-2m respecto a la válvula de FN300mm del abastecimiento, punto de inicio para la renovación de la red de abastecimiento que apenas libra el unitario.Para la red de fecales se continuará con un colector PVCØ315mm entre este registro y la conexión con el Paseo de la Almadía, es decir, de c/Juan de Berrueta nº2 a c/Juan de Berrueta nº18, donde el colector girará 90º para conectarse, tal y como lo hace el unitario actual, con el emisario de Nilsa. Para la red de pluviales se ejecutará un colector paralelo al fecal, que en este caso se prolongará unos 5-10ml más allá del emisario HAØ400mm de Nilsa hasta alcanzar el pie de la terraza del río Aragón, donde mediante un encachado de piedra de 1m de ancho, terminará por verter en dicho río. La separación entre ambas redes será de 0,84m con alineación centrada.

Para su ubicación en planta se ha optado, dado que tenemos tramos en los extremos con profundidades de 2-2,5m en calles estrechas (el tramo de Paseo de la Almadía a Plaza Santo Domingo apenas cuenta con 4,7m de ancho entre fachadas) y servicios en las aceras, se ha optado por disponer los colectores los más próximos posible, separados unos 84cm y centrados en el eje, que nos permite “librar” los pozos prefabricados DN1000mm y mantener una separación entre tapas de 0,64m, ajustada pero suficiente para librar el caz estampado previsto de 40cm (recalcar en ejecución la correcta orientación de conos y losas). La zanja resultante rondaría los 1,5m de ancho de fondo (1,62m en zonas con entibación). Se ha descartado la opción de centrar cada colector en el semieje de calzada (separación 1,6m) dada la afección a las aceras y exceso de movimiento de tierras y sobrecostes que generaría.

En relación a las rasantes se valoró la opción de mantener el colector de fecales al 1º, ya que disponemos de un resalto de 1,7m en la conexión con el emisario de Nilsa para incrementar las pendientes, pero implicaba profundizar otros 40cm en el entorno de la conexión con Paseo de la Almadía, zona más estrecha de la calle, y complicar la conexión con el emisario de Nilsa, por lo que se optó por mantener una pendiente continua del 0,68% entre la conexión actual y nuestro nuevo registro de cabecera. La Cota hidráulica en el punto bajo de conexión con Plaza San Domingo quedaría limitada a 1,16m (0,85m de cobertura).

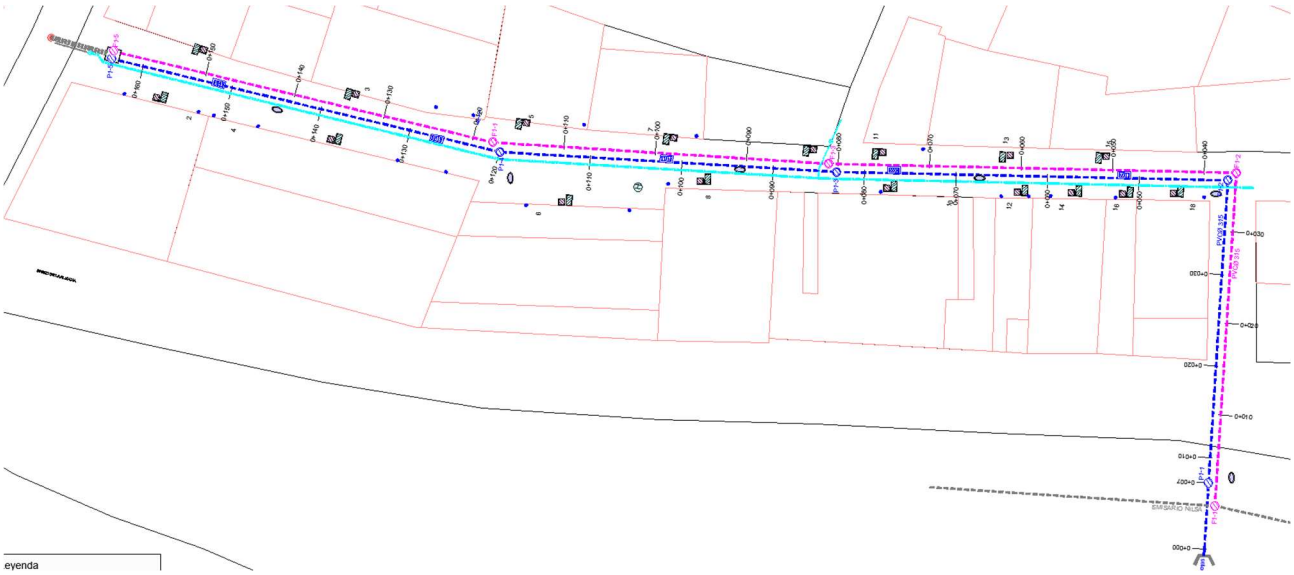


Fig 6.2 Planta proyectada para la red separativa c/J Berrueta

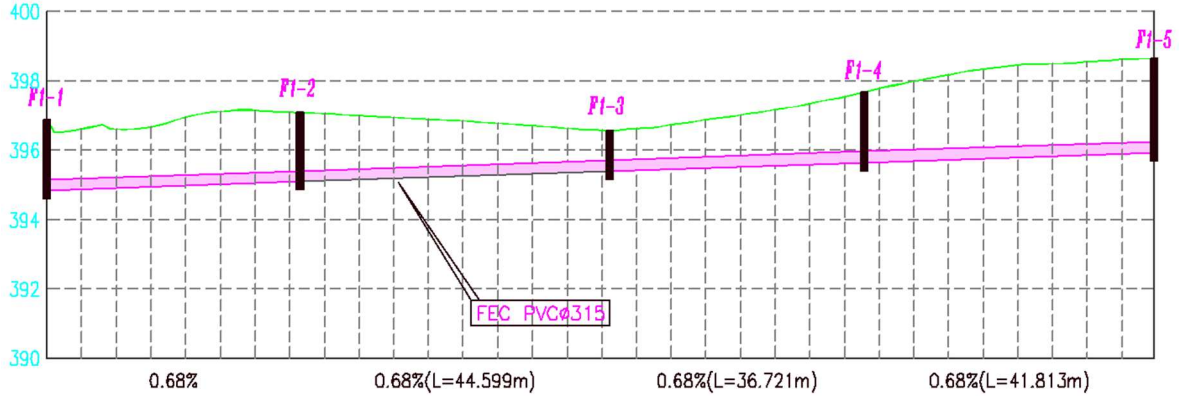


Fig 6.3.Longitudinal de la red separativa c/J Berrueta

Para el colector de pluviales, dada la necesidad de aliado desde el fecal, se ha optado por disponer el colector con la misma rasante (0,68%) pero a cota -8,5cm, al objeto de que ambas claves queden a la misma altura, se facilite el aliviado inicial, así como las conexiones de acometida y ejecución de zanjas. Dadas las limitadas pendientes y cobertura en el punto bajo de la calle no es posible dispone el pluvial sobre el fecal ,que sería lo deseable, e incrementar la pendiente profundizando aún más plantea los inconvenientes mencionados para las fecales.

En el tramo de conexión con Paseo de la Almadía, emisario Nilsa y pie de terraza del Aragón tendremos una zona de difícil ejecución. Hay un cruce muy sesgado de canalización soterrada al pedestal de Nasertic junto al CT. Será necesario cruzar además las conexiones eléctricas, y el espacio disponible entre el CT, el pedestal y el árbol más próximo son muy reducidas. Será prácticamente inviable realizar el cruce de la nueva red separativa sin afectar al pedestal y al árbol. El pedestal en todo caso debería desplazarse, para evitar, que al igual que ocurre en la actualidad, quede bajo la servidumbre de la nueva red separativa.

La red de fecales contará con acometidas domiciliarias en PVCØ160mm a pie de fachada con arqueta registros PVC DN400/160mm y tapa FN 40x40cm.Para la red de pluviales se realizará la recogida de la escorrentía superficial mediante sumideros (rejilla tipo squadra cóncava de 35x35cm) con PVCØ200mm así como la acometida directa a la general de las bajantes existentes con PVCØ90-110mm y pieza de protección FN registrable de pie de fachada.

ABASTECIMIENTO

Se ha previsto la renovación de la red en baja de abastecimiento con conducción de FNØ200mm para la general de c/Juan de Berrueta así como la conexión con FNØ100 hacia Plaza Santo Domingo, donde se habilitará una válvula de corte en la conexión con esta calle (en el tramo final del ramal de conexión, separada de la general de FNØ200mm para evitar los pozos de fecales y pluvial). Se ha descartado la necesidad de renovar según la conducción actual de FNØ300mm, heredada del diseño previo a la acometida en FNØ300mm del nuevo depósito de la mancomunidad junto a la iglesia de Santa María (Avda. Príncipe de Viana), optándose por FN200mm según la renovación de la c/Mayor, que es suficiente para el mallado de c/J de Berrueta

El inicio de la modificación se realizará directamente en la válvula existente en la conexión con c/Mayor, que debe ser renovada dado que da fallo de cierre. Será necesario realizar la reducción y el codo-contracodo para “librar” el registro de fec-pluv, por lo que la colocación más sencilla de la nueva válvula DN200mm puede ser una posición adelantada al registro en lugar de la actual.

Se incluye la renovación/reposición de acometidas domiciliaras en suelo (caja FN aislante) y a bloques edificación, así como nudos de llaves, desagües, bocas de riego e hidrantes y demás complementos habituales de la red de abastecimiento. La profundidad media de la conducción de abastecimiento será de 1,2m (en la conexión con Plaza Santo Domingo se ha optado, dada al limitada cobertura (0,85m) sobre el colector fecal, realizar el cruce por debajo de fec-pluv.

MITAD SUR

No está previstas actuaciones en la mitad Sur de la c/Juan de Berrueta en el presente proyecto

6.3 RENOVACIÓN/IMAPLANTACIÓN DE SERVICIOS.

MITAD NORTE

La renovación de servicios en la presente obra supone una importante problemática, ya que el gas discurre por la calzada en paralelo a la rígola, y en la margen contraria tenemos 2/3 del trazado con canalización soterrada de telefonía y alumbrado en uso por la pequeña acera existente. La ejecución de las redes apenas si permitirá librar las aceras en las zonas más estrechas, pero el gas se verá afectado como mínimo en el tramo desde Plaza Santo Domingo a Paseo de la Abadía. En la propia conexión con el Paseo de la Almadía tenemos canalización de electricidad en servicio en una margen (la menos afectada por las redes) y canalización de Nasertic en otra (que se verá vea afectada por la ejecución de las redes en su tramo final).

En base a la distribución actual se ha optado por mantener la canalización soterrada de electricidad y alumbrado por la acera de margen Oeste, dejando la margen Este para la canalización soterrada de telefonía y en su caso gas. El planteamiento base para la electricidad es mantener y/o ampliar (incrementar nº tubos) las canalizaciones soterradas en servicio, renovando sus registros, y ampliando la distribución soterrada hasta la c/Mayor para su futura canalización.

Para los registros de utilizarán arquetas troncopiramidales, arquetas 60x60 o registros in un situ según la disponibilidad de espacio e interferencia de otros servicios. Las tapas de los registros serán de FN 60x60cm, y las acometidas de 1*PVCcØ160mm.

Para el alumbrado se realizará la renovación completa de la red soterrada y su prolongación en los tramos que permanecen en aéreos para su futura canalización. Las tapas de paso y/o a pie de luminaria serán de 40x40cm con tapa FN.

Se ha previsto un paquete común equivalente de 3*PVCcØ160mm para electricidad y 2 PVCcØ160mm para alumbrado por la acera, con protección de dado de hormigón HM-20, que deberá desviarse a la calzada según la presencia de sus registros de paso o interferencia con otras acometidas. En los tramos de canalización soterrada existentes se valorará en cada zona el mantenimiento, la ampliación del numero de tubos actuales o la renovación, según los requisitos futuros a establecer por la compañía distribuidora.

Para el servicio de telefonía se ha incluido la canalización soterrada en la margen Este con 2*PVCcØ110mm con protección de dado de hormigón HM-20 y registros de distribución tipo “M” y tipo “H” con tapa de hormigón (o fundición, en caso de ubicarse en calzada). Al igual que con la electricidad, será necesario realzar la conexión con los servicios soterrados de Plaza Santo Domingo.

Tal y como se ha expuesto en la exposición de las redes, tenemos canalización de Nasertic en el entorno del CT (Paseo de la Almadía), así como a lo largo de la c/Mayor, aunque esta última no debería verse afectada por la ejecución de las obras.

Finalmente, para el caso de la canalización de gas, el mantenimiento y reposición de la canalización y acometidas existentes a lo largo de la calle Juan de Berrueta, bien por su trazado actual, o siempre que sea posible, por la margen Este, junto con la telefonía.

MITAD SUR

No está previstas actuaciones en la mitad Sur de la c/Juan de Berrueta en el presente proyecto

6.4 RENOVACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN.

MITAD NORTE

Para la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta se ha previsto la renovación de la pavimentación al formato existente en la mitad sur de la propia calle (aceras a nivel de losa prefabricada 40x20x4cm, con caída al medio y limhoya central para calzada), pero con el formato previsto para la calzada utilizado en la renovación de 2021 para la c/Alfonso el Batallador, donde en lugar de utilizar adoquín se ha empleado aglomerado asfáltico con estampado de trama de adoquín, con simulación tanto del caz central como de los encintados laterales, simulando las pavimentaciones del casco histórico de los años 2000-2002 pero sin la problemática que han ido sufriendo aquellas calles, que por los procesos de peatonalización del casco histórico de Sangüesa, han ido incrementando notablemente el tráfico pesado, como es el caso de los ejes Alfonso el Batallador+Juan de Berrueta y su prolongación por Enrique Labrit.

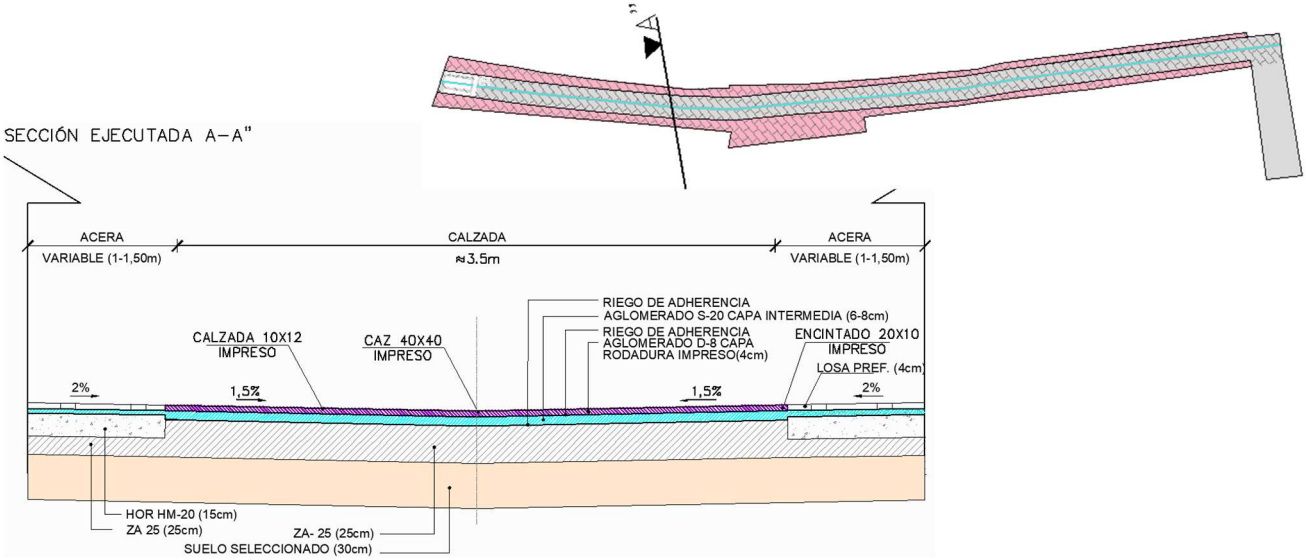


Fig 6.4.Seccion transversal prevista para la renovación de la pavimentación de la mitad Norte c/J Berrueta

Para las aceras se utilizará una sección de losa prefabricada de 40x20x4m sobre solera de 15cm de hormigón HM-20 y base de 15cm de ZA-25, incluyendo mejora de explanada de SS CBR>20 s/necesidad. Las anchuras serán de 1m, dadas las limitaciones de anchura existentes.

Para la calzada se utilizarán una sección de mejora de explanada de 30cm de SS CRB>20 s/necesidad, base de 25cm de ZA-25 y pavimento de aglomerado asfáltico formado por dos capas, una de base de 7cm de AC22 BIN 50/70 S CALIZA (S-20) y una capa de rodadura de 4cm de AC8 SURF 50/70 D OFITA (D-8).

El formato para el estampado será similar al utilizado en 2021 en la c/Alfonso el Batallador, con caz central formando o "simulando" por motivos estéticos con el estampado mediante la utilización de plantillas de borde de 3,61x0,23m frente a las plantillas de las semicalzadas. Para mejorar el ajuste del pavimento en torno a las rejillas, se empleará rejilla tipo squadra cóncava de 35x35cm en lugar de las rejillas planas tipo Ebro, por lo que la simulación del caz con el estampado se ampliaría a anchuras con valores iguales o superiores a este valor (≈0,35-0,45m).

Para el resto de la calzada (calzada central y aparcamiento en línea del nº2 al nº6) se utilizará plantilla de adoquín de 3,83x19,98m y tamaño de adoquín 22,5x12,4 o similar, así como plantilla lineal similar para la simulación del encintado de adoquín de límite con las aceras a nivel. Al objeto de facilitar la ejecución del estampado se podrá utilizar la técnica de calentado mediante infrarrojos posterior al extendido.

Finalmente se aplicará la resina de tratamiento superficial tipo Ruebond o similar mediante dos capas de rendimiento de 0,70kg/cm^2 aplicado a máquina. El color de acabado elegido será negro tráfico (RAL9017) o negro grafito (RAL7024) para la calzada, con color rojo tráfico (RAL3020) o rojo oxido (RAL3009) para encintados, pasos de cebra o señalización de aceras.

La extendedora a emplear sería una Super 1800-3(i) con regla extensible AB 500 (anchura básica 2,55m ampliable hasta 5m) de Vögele que dispone de ajuste del bombeo y peraltes continuos de hasta 2% en las extensiones hidráulica laterales, capaz de realizar perfiles en V o M, Λ o W, escalones o perfiles parabólicos (curvados). El extendido de ejecutará de una única vez con perfil en "V", a excepción de la zona de sobreancho de Enrique Berrueta nº6, donde la MD está excesivamente baja y deberá realizarse un perfil quebrado en "M".




Fig. 6.5 Perfil en M o parabólico de extendido



F1 Diferentes fases de ejecución c/Alfonso el Batallador.



F12 Diferentes fases de ejecución y acabado de la renovación de calzada en la c/Alfonso el Batallador.

Aunque en la actualidad la calle no cuenta con sistemas de reducción de velocidad, puede valorase en la ejecución la colocación de badenes plásticos similares a los colocados en la c/Alfonso en Batallador.

MITAD SUR

No está previstas actuaciones en la mitad Sur de la c/Juan de Berrueta en el presente proyecto, que se limitarían en una futura actuación a la calzada, sin afección a las aceras.

7- , CALCULO HIDRAULICO.

Tal y como se ha expuesto tenemos un colector de HAØ500-600mm en forma de "L" procedente de la c/Mayor. Solo dispone de pendiente inicial del 1% en la cabecera de c/Juan de Berrueta, discurriendo el resto con pendientes del 0,5%-0,6%. Para una pendiente media de 0,68% la capacidad hidráulica máxima de este colector unitario sería de 270 a 439 l/s.

A priori sólo recibe ya en la actualidad aguas fecales de c/Mayor (un colector PVCØ315mm en cada margen) y Avenida Príncipe Viana (PVCØ250-Ø315mm), por lo que las necesidades de capacidad serán inferiores, equivalentes a un PVCØ250-315mm. En todo caso, en todas las inspecciones realizadas se ha observado un caudal apreciable en el colector, por lo que no son descartables aguas parasitas de infiltración en zonas superiores a estas dos calles, o aportes pluviales en momentos de escorrentía de estas zonas.

Otra de las formas que tenemos de acotar las posibles necesidades del colector de fecales es evaluar la capacidad del emisario HAØ400mm de Nilsa. La pendiente del emisario de Nilsa aguas abajo de la conexión con el colector de c/Juan de Berrueta (pozo 15) ronda el 0,3-0,4%, por lo que la capacidad máxima de este emisario sería de 114 l/s. No es infrecuente en todo caso que este emisario entre en carga en época de lluvias, pero el área al Norte de la calle mayor sólo colaboraría en un 1/3·del área urbana total a esta situación, por lo que un valor máximo de referencia para el colector de Nilsa de 114 l/s es una estimación más que razonable para el entorno de la conexión con el unitario de c/Juan de Berrueta.

La capacidad de un nuevo colector de fecales PVCØ315mm para la c/Juan de Berrueta, con pendiente del 0,68%, sería de 84 l/s, en torno al 73.% de los 114 l/s estimados para el emisario de Nilsa en el punto de conexión. Existe la opción de disponer un colector de PVCØ250mm, con una capacidad de 45 l/s, en torno al 40% de los 114 l/s estimados para el emisario, cercano al 1/3 estimado de área urbana de servicio. Dado que no tenemos garantías de que no exista todavía un importante aporte de pluviales del extremo Norte del casco urbano, se ha optado por realizar el diseño con colector de PVCØ315mm para las fecales.

Para el colector de pluviales se valoraron dos opciones, una conducción de PVCØ315mm al 0,68%, con una capacidad de 84 l/s, así como una conducción de PVCØ400mm al 0,68%, con una capacidad de 158 l/s. La primera opción es más que suficiente para un colector de sólo recogería la pluviales de c/Juan de Berrueta (mitad Norte) y Plaza Santo Domingo, así como aportes parciales de pluviales desde c/Mayor y c/Príncipe de Viana al colector fecal. Se ha considerado como mejor opción ejecutar un colector pluvial de PVCØ315mm y disponer un aliviado al mismo desde el nuevo colector fecal en la conexión/cabecera con la c/Mayor, que pueda absorber, en caso de necesidad, estos aportes parciales.

La capacidad de la doble conducción de PVCØ315mm sería de 168 l/s (84+84 l/s), frente a la solución de una conducción de PVCØ315mm y PVCØ400mm, que rondaría una capacidad conjunta de 242 l/s. (84+158). Ambas soluciones superarían la capacidad estimada del colector de Nilsa (114 l/s).

La solución de una renovación estándar con PVCØ250mm para fecales y PVCØ315mm, con una capacidad conjunta de 129 l/s (45+84 l/s) también podría ser una solución válida (≥114 l/s), aunque con un margen de seguridad mucho menor.

En base a los cálculos hidráulicos se ha optado por diseñar una renovación de redes con colector de fecales en PVCØ315mm y pluviales en PVCØ315mm, con pendiente al 0,68%, disponiendo un aliviado de seguridad del fecal al pluvial en cabecera de la c/Juan de Berrueta para poder absorber situaciones extraordinarias por aporte de pluviales de las zonas urbanas por renovar en el extremo Norte del casco urbano de Sangüesa.

En el caso de que se pueda realizar un seguimiento en el próximo periodo invernal del comportamiento de la conexión de fecales entre Avda. Príncipe Viana-c/Mayor, y c/Juan de Berrueta, y se corrobore que no existe un aporte pluvial que pueda comprometer la capacidad del colector fecal, puede optarse por una solución estándar para la renovación de redes en PVCØ250mm y PVCØ315mm, o en caso contrario, ir a una solución de PVCØ315mm y PVCØ400mm que garantice un mayor margen de seguridad frente al aporte de pluviales.

8- , ORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO PEATONAL Y RODADO.



Fig 3.3.1: Fases, principales circuitos reguladores de accesos rodados al entorno de las obras y zonas de acopio/trasvase asfaltado

La calle Mayor, como viene siendo habitual, se cerrará (valla existente) de lunes a sábado a las 12:00, permaneciendo el Domingo cerrada. La calle Alfonso el Batallador deberá absorber el tráfico habitual y el de Juan de Berrueta. No será viable el cierre peatonal de la calle en periodo estival, fines de semana, etc., ya que por las obras ya no se puede hacer uso en sentido inverso de la de c/Juan de Berrueta. Se deberá señalizar el corte (calle sin salida y prohibido paso) de la conexión con Plaza Santo Domingo y avisar de obras en Plaza San Salvador a Paseo Almadía.

La conexión entre Plaza San Salvador y Paseo de la Almadía debe mantenerse abierta dentro de lo posible, ya que existe entre esta plaza y el Puente de Hierro una zona de transito rodado en el Paseo de la Almadía con números accesos a garages y sobreanchos para aparcamiento, muy utilizada por los vecinos de la zona (tanto la continuación Norte hacia c/San Babil como la continuación Sur a c/La Celada del Paseo de la Almadía son más estrechas y de uso peatonal).

Se deberá realizar la señalización de obras en entrada a c/Mayor desde el puente y desde la Avda. príncipe de Viana, así como a c/Alfonso el Batallador desde c/Mayor, al objeto de avisar al tráfico peatonal y rodado con posibles interferencias con el tráfico de obra de c/J. de Berrueta.

Es una opción a valorar en la ejecución, utilizar como punto de acopio principal y zona de trasvase de bañeras a dumper de obra, la explanada y sobreanchos existentes en la conexión de Paseo de la Almadía con la Plaza San Salvador (zona de acopio OP1 en fig 3.3.1) o el parking de conexión de Paseo Cantolagua con Pase de la Almadía (zonas de acopio OP2 en Fig 3.3.1). En este último caso se puede habilitar (tras retirada de la pilona de entrada a Paseo de la Almadía) un circuito alternativo de acceso a c/Juan de Berrueta y Alfonso el Batallador para el tráfico de obra. En caso de uso de esta opción, será necesario señalizar obras en la conexión de c/Magdalena con c/La Celada, por donde accederá el tráfico de obra al Paseo de la Almadía.

En relación a la propia c/Juan de Berrueta, al objeto de reducir la afección de las obras, se puede habilitar un acceso temporal en sentido contrario desde c/Alfonso el Batallador durante los primeros 80m de la mitad Sur, ya que en este punto tenemos un sobreancho, que previa señalización de prohibición de aparcar, puede hacer viable la entrada, maniobra y vuelta desde/a c/Alfonso el Batallador.

En el cruce del Paseo de la Almadía sería viable ejecutar el mismo en dos mitades, pero la presencia de servicios (CT, pedestal ONO) puede requerir el corte de 1-2 días de la zona al Norte del cruce.

9- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

En cumplimiento del Real Decreto RD 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo en cuenta lo preceptuado en la Ley 31/1995 de la cual se deriva dicho RD, y teniendo en cuenta también, en su redacción, la aplicación de las demás disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad y Salud que previsiblemente puedan afectar al desarrollo de las obras, se incluye, en el Anejo 8, el Estudio de Seguridad y Salud para las obras definidas en este Proyecto, estableciendo las previsiones de seguridad y bienestar de los trabajadores.

En función de las características de las obras, se analizan en este Estudio los riesgos profesionales para las principales unidades de ejecución de la obra, así como los riesgos de daños a terceros, definiendo las protecciones tanto individuales como colectivas a emplear.

Análogamente, se definen las protecciones colectivas que hay que adoptar en cuanto al vallado, señalización general, instalaciones eléctricas auxiliares, desbroce, explanación, excavación, canalizaciones y protección contra incendios.

El Estudio de Seguridad se ha desarrollado en los documentos que exigen el mencionado Real Decreto; Memoria, Planos y Presupuesto.

Las unidades presupuestadas en el Estudio de Seguridad se refieren únicamente a las protecciones colectivas puesto que el resto (individuales e instalaciones) se entienden incluidas en los precios de Proyecto.

El Presupuesto total de Ejecución Material (PEM) previsto para Seguridad y Salud es de OCHO MIL CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (8.053,96€), correspondiendo 4.026,98€ para la renovación de redes y 4.026,98€ para la renovación de la pavimentación.

10- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDs.

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, publicado en el B.O.E. el 13 de Febrero de 2008, por el cual se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de residuos de construcción y demolición (figura asimilable entre otras al promotor de la obra) deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo lo siguientes aspectos:

La estimación de la cantidad de residuos (en TN o m^3) que se van a producir, clasificados según su naturaleza y tipología, según normativa europea (listado según Orden MAM/304/2002).

Las medidas de minimización de residuos y de prevención a tener en cuenta en la obra.

Las instalaciones previstas para el almacenamiento (ubicación y nº de contenedores, etc.), manejo y demás operaciones de gestión, incluidas las medidas de separación de RCDs.

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.

Una valoración del coste previsto para la gestión correcta de los residuos de construcción.

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero se redacta en el Anejo 9 el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) relativo a las obras definidas en este Proyecto.

El Presupuesto total de Ejecución Material (PEM) previsto para la gestión de RCDs es de VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (24.379,77€), correspondiendo 11.949,48€ a la renovación de redes y 12.430.29€ a la renovación de la pavimentación.

11- PLAZO Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA

Se prevé que el plazo de ejecución de las obras sea de 3 MESES.

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

		1 MES				2 MES				3 MES			TOTAL
		1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S	11S	12S	
RENOVACIÓN DE REDES	MOVIMIENTO DE TIERRAS	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €	4,298.71 €					34,373.66 €
	ARQUETA CONEXIÓN							2,043.67 €	2,043.67 €					4,087.33 €
	FECALES		2,755.72 €	2,755.72 €	2,755.72 €	2,755.72 €	2,755.72 €	2,755.72 €						16,534.33 €
	PLUVIALES		2,668.38 €	2,668.38 €	2,668.38 €	2,668.38 €	2,668.38 €	2,668.38 €						16,010.28 €
	ABASTECIMIENTO			4,770.72 €	4,770.72 €	4,770.72 €	4,770.72 €	4,770.72 €						23,853.62 €
	GESTIÓN RCDs	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €	1,493.69 €					11,949.48 €
	SEGURIDAD Y SALUD	503.37 €	503.37 €	503.37 €	503.37 €	503.37 €	503.37 €	503.37 €	503.37 €					4,028.98 €
RENOVACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	DEMOLICIÓN Y CAJEADO CALZADA	3,448.48 €	3,448.48 €											6,896.95 €
	FIRME CALZADA			5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €	5,820.87 €			39,346.06 €
	ESTAMPADO CALZADA											4,698.12 €	4,698.12 €	9,396.24 €
	DEMOLICIÓN Y CAJEADO ACERA					1,468.10 €	1,468.10 €							2,936.19 €
	FIRME ACERA							5,695.56 €	5,695.56 €	5,695.56 €	5,695.56 €			22,782.22 €
	SEÑALIZACIÓN ACERA											2,830.16 €	2,830.16 €	5,660.31 €
	ELECTRICIDAD							1,488.95 €	1,488.95 €	1,488.95 €				4,466.85 €
	ALUMBRADO					724.13 €	724.13 €	724.13 €	724.13 €	724.13 €				3,620.67 €
	TELEFONÍA					1,014.58 €	1,014.58 €	1,014.58 €	1,014.58 €	1,014.58 €				5,072.88 €
	SERVICIOS AFECTADO GAS				568.86 €	568.86 €	568.86 €	568.86 €	568.86 €	568.86 €	568.86 €			3,982.00 €
	SERVICIOS AFECTADOS RESTO	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €	382.12 €			3,821.20 €
	GESTIÓN RCDs	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	1,035.88 €	12,430.29 €
	SEGURIDAD Y SALUD	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	335.58 €	4,026.98 €
PRESUPUESTO														235,275 €
Ejecución Material		11,496 €	16,920 €	18,242 €	24,432 €	27,639 €	27,639 €	35,399 €	25,204 €	16,886 €	13,639 €	8,900 €	8,900 €	
Ej. Mat. Mensual		11,496 €	28,416 €	46,658 €	71,090 €	27,639 €	55,277 €	90,676 €	115,880 €	16,886 €	30,505 €	39,405 €	48,305 €	
% Semanal/mensual		0 €	12%	20%	30%	12%	23%	39%	49%	7%	13%	17%	21%	
Ejecución Material Acumulado		11,496 €	28,416 €	46,658 €	71,090 €	98,728 €	128,367 €	161,788 €	186,970 €	203,838 €	217,476 €	226,376 €	235,275 €	
% semanal acumulado		5%	12%	20%	30%	42%	54%	69%	79%	87%	92%	96%	100 %	

12- DOCUMENTOS DEL PROYECTO

El proyecto constructivo de "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA" consta de los siguientes documentos:

DOCUMENTO nº1.- MEMORIA Y ANEJOS.

MEMORIA.

ANEJOS DE LA MEMORIA.

Anejo nº 1 de Topografía.
Anejo nº 2 de Trazado.
Anejo nº 3 de Cálculo hidráulico.
Anejo nº 4 de Justificación de Precios.
Anejo nº 5 de Estudio de Seguridad y Salud.
Anejo nº 6 de Estudio de Gestión de RCDs.

DOCUMENTO nº2.- PLANOS.

1.- SITUACIÓN E ÍNDICE..... 1 p
2.- EMPLAZAMIENTO..... 1 p
3.- TOPOGRAFÍA..... 1 p
4.- SITUACIÓN EXISTENTE..... 1 p
5.- REDES PROYECTADAS..... 2 p
5.1.- PLANTA ..... 1 p
5.2.- LONGITUDINALES..... 1 p
6.- SERVICIOS PROYECTADOS..... 1 p
7.- PAVIMENTACIÓN PROYECTADA..... 4 p
7.1.- PLANTA ..... 1 p
7.2.- LONGITUDINALES..... 1 p
7.3.- TRANSVERSALES..... 1 p
8.- DETALLES..... 3 p

Total Planos.....14 p

DOCUMENTO nº3.- PLIEGO DE CONDICIONES.

DOCUMENTO nº4.- VALORACIÓN.

MEDICIONES.
CUADRO DE PRECIOS nº1.
CUADRO DE PRECIOS nº2.
PRESUPUESTO

13- PRESUPUESTO

El **Presupuesto de Ejecución Material (PEM)** de las obras asciende a la cantidad de DOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS **(235.274,50 €).**

El **Presupuesto de Ejecución por Contrata (PLIC sin IVA)** de las obras asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS **(272.918,42 €).**

El **Presupuesto de Licitación (PLIC con IVA)** asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS **(330.231,29 €).**

En Tajonar, Agosto de 2023

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.

Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA**
ICCP, Colegiado nº19.233.

Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

Nº 1: TOPOGRAFÍA.

Nº 2: TRAZADO.

Nº 3: CÁLCULO HIDRÁULICO.

Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.

Nº 5: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Nº 6: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCDS.

ANEJOS

Anejo nº1

TOPOGRAFIA

INDICE

1 OBJETO DEL PROYECTO. 2
2 TOMA DE DATOS TOPOGRAFICOS 2
2.1 EQUIPOS EMPLEADOS 2
2.2 ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REPLANTEO 2
1.-LISTADO DE PUNTOS 3
2.-PLANO DE REFERENCIA DEL LEVANTAMIENTO 1

1 OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del proyecto es la renovación de redes y pavimentación de los 125ml de la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta, calle del casco urbano histórico de unos 250ml y 5-6m de anchura. Las obras incluyen la renovación completa de redes, mantenimiento y/o soterramiento de servicios, y la renovación de la pavimentación con la tipología de calzada de aglomerado asfáltico estampado con tipología de adoquín y aceras de loseta prefabricada de hormigón, similar a la realizada por el ayuntamiento de Sangüesa en la c/Alfonso el Batallador en 2021 y prevista para vías del casco urbano histórico con intenso tráfico.

En la mitad Sur de la calle no se realiza actuación alguna, quedando la renovación de su calzada con aglomerado asfáltico estampado para una fase posterior de pavimentación (inversión en reserva dentro del PIL 2023-2025).

A tal efecto se realizó el levantamiento topográfico la c/Juan de Berrueta y sus conexiones con c/Mayor, Paseo de la Almadía y c/Alfonso el Batallador para la redacción del proyecto.

2 TOMA DE DATOS TOPOGRAFICOS

2.1 EQUIPOS EMPLEADOS

Para la realización del levantamiento topográfico y el establecimiento de las bases de replanteo, se empleará:

- GPS marca LEICA modelo GS07 con conexión RGNS de precisión en las mediciones planimétricas y altimétricas de en torno a 2 cms.
- Estación total LEICA modelo TS 15 I de 3", robotizada, con seguimiento y centrado automático, con precisión milimétrica.
- Trabajos de gabinete se realizará mediante AUTOCAD Y MDT.

Para el levantamiento topográfico se empleará el GPS indicado conectado a la Red de Geodesia Activa de Navarra (RGAN), con lo que se obtiene un posicionamiento de alta precisión en proyección UTM, huso 30 datum ETRS89. Se emplean correcciones de código y fase para los sistemas de navegación GPS, GLONASS, GALILEO Y BEIDOU.

En zonas con menor precisión en la toma de datos se usará la Estación total.

Finalmente se ha procederá al volcado en gabinete de toda la información recogida en campo y a su procesado mediante el software indicado de manera que obtenemos la representación gráfica solicitada.

2.2 ESTABLECIMIENTO DE BASES DE REPLANTEO

Se establecerán bases de replanteo en el entorno, materializándolas en campo mediante el empleo de unas marcas y señalizándolas con spray de manera adecuada.

3 LISTADO DE PUNTOS

1	640785.054	4715045.358	397.098	FEC
2	640783.560	4715046.010	397.041	SUM
3	640783.439	4715046.421	397.043	SUM
4	640782.415	4715047.388	397.075	PLUV
5	640780.523	4715048.541	397.126	ADOQ
6	640779.276	4715048.325	397.122	ADOQ
7	640779.285	4715048.447	397.128	ADOQ
8	640779.352	4715047.006	397.065	CAZ
9	640779.333	4715046.700	397.065	CAZ
10	640780.418	4715044.972	397.149	ADOQ
11	640779.702	4715045.212	397.138	ADOQ
12	640771.201	4715045.801	397.060	ADOQ
13	640771.186	4715045.687	397.071	ADOQ
14	640771.252	4715047.133	397.018	CAZ
15	640771.305	4715047.430	397.011	CAZ
16	640771.285	4715048.753	397.050	ADOQ
17	640771.300	4715048.868	397.056	ADOQ
18	640763.753	4715049.251	397.016	ADOQ
19	640763.733	4715049.125	397.013	ADOQ
20	640761.672	4715049.350	397.001	ADOQ
21	640761.704	4715049.463	397.006	ADOQ
22	640760.283	4715049.919	396.997	ADOQ
23	640760.246	4715049.796	396.982	ADOQ
24	640758.339	4715051.319	396.972	ADOQ
25	640758.249	4715051.240	396.967	ADOQ
26	640756.173	4715053.506	396.939	ADOQ
27	640756.094	4715053.399	396.927	ADOQ
28	640755.065	4715052.562	396.897	CAZ
29	640754.844	4715052.353	396.898	CAZ
30	640753.869	4715051.461	396.945	ADOQ
31	640753.775	4715051.386	396.953	ADOQ
32	640756.035	4715049.097	396.988	ADOQ
33	640756.122	4715049.180	396.980	ADOQ
34	640757.785	4715047.807	396.993	ADOQ
35	640757.715	4715047.717	396.999	ADOQ
36	640759.376	4715046.827	397.003	ADOQ
37	640759.403	4715046.941	397.003	ADOQ
38	640761.525	4715046.376	397.005	ADOQ
39	640761.514	4715046.257	397.009	ADOQ
40	640763.655	4715046.050	397.013	ADOQ
41	640763.664	4715046.165	397.011	ADOQ
42	640763.420	4715047.519	396.969	CAZ
43	640763.432	4715047.824	396.977	CAZ
44	640761.461	4715048.045	396.962	CAZ
45	640761.423	4715047.742	396.951	CAZ
46	640760.479	4715048.281	396.964	CAZ
47	640760.387	4715047.996	396.961	CAZ
48	640758.725	4715049.140	396.946	CAZ
49	640758.547	4715048.888	396.943	CAZ
50	640757.175	4715050.427	396.924	CAZ
51	640756.970	4715050.211	396.920	CAZ
52	640754.807	4715052.403	396.899	CAZ
53	640755.020	4715052.609	396.898	CAZ
54	640750.528	4715059.550	396.865	ADOQ
55	640750.435	4715059.464	396.858	ADOQ
56	640749.421	4715058.607	396.817	CAZ
57	640749.201	4715058.395	396.824	CAZ
58	640748.071	4715057.501	396.882	ADOQ
59	640748.140	4715057.594	396.876	ADOQ
60	640741.311	4715064.745	396.808	ADOQ
61	640741.412	4715064.807	396.808	ADOQ
62	640742.365	4715065.719	396.746	CAZ
63	640742.578	4715065.945	396.747	CAZ
64	640743.529	4715066.857	396.794	ADOQ
65	640743.627	4715066.928	396.796	ADOQ
66	640737.882	4715073.090	396.724	ADOQ
67	640737.801	4715072.994	396.719	ADOQ
68	640736.855	4715072.074	396.679	CAZ
69	640736.628	4715071.881	396.684	CAZ
70	640735.640	4715071.000	396.742	ADOQ
71	640735.541	4715070.918	396.746	ADOQ
72	640733.568	4715073.122	396.723	ADOQ
73	640733.648	4715073.227	396.710	ADOQ
74	640734.596	4715074.134	396.646	CAZ
75	640734.852	4715074.328	396.656	CAZ
76	640735.919	4715075.100	396.686	ADOQ
77	640736.007	4715075.186	396.688	ADOQ
78	640733.972	4715078.177	396.680	ADOQ
79	640733.850	4715078.108	396.668	ADOQ
80	640732.596	4715077.625	396.633	CAZ
82	640731.292	4715076.656	396.694	ADOQ
83	640731.181	4715076.601	396.707	ADOQ
84	640732.340	4715077.444	396.641	CAZ
85	640732.344	4715081.091	396.650	ADOQ
86	640732.229	4715081.025	396.639	ADOQ
87	640731.054	4715080.435	396.589	CAZ
88	640730.781	4715080.304	396.591	CAZ
89	640729.598	4715079.742	396.672	ADOQ
90	640729.482	4715079.716	396.677	ADOQ
91	640728.321	4715080.321	396.697	GAS
92	640728.356	4715079.488	396.713	ABASCONT
93	640730.970	4715078.643	396.645	FEC
94	640732.645	4715079.010	396.655	PLUV
95	640733.356	4715081.212	396.662	ALUM40
96	640734.239	4715074.913	396.618	SUM
97	640731.491	4715074.846	396.717	GAS
98	640735.855	4715070.457	396.758	GAS
99	640734.472	4715070.888	396.762	FECACOM
100	640736.322	4715069.356	396.775	FUER
101	640736.674	4715068.724	396.784	PLUVACOM
102	640737.043	4715068.859	396.768	ABASACOM
103	640738.416	4715066.673	396.810	ALUM40
104	640740.865	4715071.115	396.778	ABASACOM
105	640741.558	4715069.721	396.784	ALUM40
106	640742.651	4715069.153	396.802	FECACOM
107	640745.917	4715065.467	396.833	GAS
108	640747.740	4715060.187	396.758	SUM
109	640745.149	4715059.491	396.871	FUER
110	640752.208	4715059.254	396.912	FECACOM
111	640756.348	4715054.825	396.952	GAS
112	640757.015	4715054.241	396.969	ALUM40
113	640758.231	4715053.636	396.986	ABASACOM
114	640759.069	4715052.906	397.019	FECACOM
115	640753.829	4715049.489	397.015	FECACOM
116	640757.901	4715045.616	397.039	FUER
117	640759.928	4715047.176	396.991	FEC
118	640760.394	4715048.713	396.982	PLUV
119	640761.135	4715047.952	396.916	SUM
120	640763.564	4715045.068	397.043	FECACOM
121	640772.416	4715049.298	397.080	GAS
122	640774.722	4715047.946	397.058	GAS
123	640774.631	4715048.996	397.098	ARQ40C
124	640776.617	4715049.248	397.123	BR
125	640777.158	4715049.164	397.131	FECACOM
126	640779.770	4715049.574	397.161	FUER
127	640781.346	4715044.661	397.140	TLFD

128	640777.938	4715044.734	397.165	FECACOM
129	640783.290	4715046.217	397.053	CAZ
130	640783.668	4715046.342	397.052	CAZ
131	640783.360	4715048.230	397.106	CAZ
132	640782.953	4715048.167	397.101	CAZ
133	640782.783	4715049.476	397.146	CAZ
134	640783.189	4715049.517	397.148	CAZ
135	640784.205	4715044.527	397.086	CAZ
136	640783.813	4715044.497	397.080	CAZ
137	640720.074	4715172.169	396.630	ARQ60C
138	640720.153	4715171.318	396.709	ARQ60C
139	640720.249	4715170.252	396.732	ARQ40C
140	640716.120	4715172.153	396.706	ARQ40C
141	640716.307	4715170.124	396.762	ARQ60C
142	640716.723	4715165.397	396.831	ARQ40C
143	640722.089	4715157.679	396.918	ARQ40C
144	640722.145	4715157.348	396.924	ARQ40C
145	640722.015	4715157.033	396.918	ABASCONT
146	640722.022	4715156.830	396.918	ABASCONT
147	640722.236	4715153.682	396.967	GAS
148	640722.586	4715151.066	396.995	GAS
149	640723.119	4715149.073	397.027	ARQ40C
150	640718.188	4715152.800	397.015	ARQ40C
151	640718.348	4715152.079	397.003	ARQ40C
152	640718.519	4715151.760	396.984	BR
153	640718.580	4715150.972	397.011	ABASCONT
154	640718.636	4715150.524	397.012	ABASCONT
155	640719.454	4715144.401	397.094	ARQ60C
156	640719.844	4715141.336	397.101	ALUM40
157	640720.097	4715139.608	397.108	ABASCONT
158	640722.109	4715134.320	397.056	ARQ60R
159	640725.252	4715134.179	397.129	ALUM40
160	640723.540	4715131.363	397.088	PLUV
161	640722.015	4715129.303	397.121	FUER
162	640720.856	4715128.945	397.147	ARQ60C
163	640725.792	4715130.192	397.139	FECACOM
164	640721.787	4715127.812	397.127	ABASCONT
165	640721.862	4715127.512	397.125	BR
166	640722.100	4715126.056	397.132	FECACOM
167	640722.678	4715124.149	397.097	GAS
168	640726.237	4715121.394	397.053	GAS
169	640724.189	4715120.088	397.033	PLUV
170	640725.710	4715118.239	397.005	ABAS60R
171	640723.404	4715115.378	396.998	FECACOM
172	640727.395	4715112.733	396.913	ALUM40
173	640727.827	4715111.774	396.894	FECACOM
174	640725.755	4715109.593	396.713	SUM
175	640723.997	4715108.750	396.808	ABASCONT
176	640724.222	4715109.026	396.811	GAS
177	640724.528	4715107.978	396.773	FUER
178	640728.577	4715105.852	396.763	FECACOM
179	640728.618	4715103.219	396.705	FECACOM
181	640728.077	4715092.299	396.517	ABAS60R
182	640726.528	4715091.449	396.525	PLUV
183	640726.065	4715092.847	396.522	ABASACOM
184	640727.445	4715093.351	396.450	SUM
185	640731.753	4715089.492	396.577	ALUM40
186	640723.594	4715093.063	396.579	TLFH
187	640731.410	4715083.216	396.623	ADOQ
188	640731.300	4715083.156	396.621	ADOQ
189	640730.080	4715082.657	396.585	CAZ
190	640729.793	4715082.498	396.585	CAZ
191	640728.565	4715082.114	396.656	ADOQ
192	640728.465	4715082.058	396.662	ADOQ
195	640727.064	4715086.167	396.601	ADOQ
196	640727.181	4715086.188	396.594	ADOQ
197	640728.431	4715086.573	396.541	CAZ
198	640728.725	4715086.645	396.540	CAZ
199	640729.986	4715087.055	396.563	ADOQ
200	640730.098	4715087.059	396.573	ADOQ
201	640729.257	4715091.442	396.543	ADOQ
202	640729.135	4715091.415	396.536	ADOQ
203	640727.823	4715091.288	396.487	CAZ
204	640727.510	4715091.245	396.495	CAZ
205	640726.196	4715091.117	396.533	ADOQ
206	640726.072	4715091.088	396.530	ADOQ
207	640725.215	4715099.489	396.636	ADOQ
208	640725.334	4715099.491	396.625	ADOQ
209	640726.659	4715099.558	396.584	CAZ
210	640726.964	4715099.585	396.586	CAZ
211	640728.279	4715099.743	396.631	ADOQ
212	640728.398	4715099.755	396.634	ADOQ
213	640727.665	4715107.068	396.772	ADOQ
214	640727.547	4715107.032	396.769	ADOQ
215	640726.225	4715106.969	396.699	CAZ
216	640725.925	4715106.945	396.702	CAZ
217	640724.579	4715106.973	396.752	ADOQ
218	640724.464	4715106.946	396.755	ADOQ
219	640723.576	4715115.743	396.988	ADOQ
220	640723.686	4715115.753	396.979	ADOQ
221	640724.989	4715116.010	396.933	CAZ
222	640725.291	4715116.069	396.933	CAZ
223	640726.593	4715116.284	396.972	ADOQ
224	640726.720	4715116.299	396.978	ADOQ
225	640725.794	4715125.486	397.086	ADOQ
226	640725.677	4715125.468	397.077	ADOQ
227	640724.324	4715125.518	397.047	CAZ
228	640724.030	4715125.515	397.052	CAZ
229	640722.672	4715125.626	397.101	ADOQ
230	640722.571	4715125.602	397.107	ADOQ
231	640722.222	4715128.862	397.127	ADOQ
232	640722.337	4715128.888	397.118	ADOQ
233	640723.692	4715128.712	397.073	CAZ
234	640723.987	4715128.756	397.070	CAZ
235	640725.332	4715128.731	397.101	ADOQ
236	640725.442	4715128.749	397.112	ADOQ
237	640724.707	4715134.845	397.112	ADOQ
238	640724.602	4715134.834	397.099	ADOQ
239	640724.082	4715135.816	397.019	ASF
240	640722.873	4715135.701	397.048	ASF
241	640721.653	4715135.475	397.060	ASF
242	640723.141	4715133.641	397.058	RELL
243	640721.206	4715129.323	397.143	ASF
244	640720.980	4715130.972	397.107	ASF
245	640720.749	4715132.966	397.099	ASF
246	640723.153	4715133.502	397.058	RELL
247	640721.918	4715131.335	397.103	RELL
248	640721.661	4715128.661	397.147	ESQ
249	640720.821	4715133.379	397.076	ESQ
250	640715.483	4715127.828	397.208	FACH
251	640709.448	4715126.946	397.062	FACH
252	640708.984	4715131.828	397.037	FACH
253	640715.520	4715132.683	397.179	FACH
254	640715.908	4715130.287	397.177	RELL
255	640711.470	4715129.658	397.107	RELL
256	640708.592	4715131.276	397.016	ALUM40

257	640707.082	4715128.809	396.940	RELL
258	640703.005	4715128.581	396.686	RELL
259	640703.686	4715126.182	396.758	ESQ
260	640703.190	4715131.141	396.692	ESQ
261	640700.969	4715130.901	396.648	RELL
262	640701.208	4715128.282	396.638	RELL
263	640701.253	4715126.069	396.612	RELL
264	640699.658	4715125.615	396.611	RELL
265	640698.477	4715125.412	396.622	RELL
266	640698.235	4715127.790	396.606	RELL
267	640699.668	4715127.874	396.607	RELL
268	640699.857	4715130.740	396.637	RELL
269	640697.913	4715130.486	396.625	RELL
270	640696.123	4715130.408	396.641	ASF
271	640695.986	4715130.363	396.723	BOR
272	640696.210	4715127.515	396.752	BOR
273	640696.396	4715127.536	396.625	ASF
274	640696.560	4715125.340	396.630	ASF
275	640696.417	4715125.299	396.630	ASF
276	640696.416	4715125.373	396.756	BOR
277	640695.571	4715125.318	396.719	ARQ60C
278	640696.018	4715125.024	396.631	ESQ
279	640693.045	4715124.611	396.508	ESQ
280	640692.727	4715124.796	396.613	ARQ40C
281	640693.547	4715125.010	396.613	ALUM40
282	640692.425	4715125.280	396.593	RELL
283	640692.126	4715127.557	396.592	RELL
284	640691.804	4715129.612	396.624	RELL
285	640693.786	4715129.754	396.715	RELL
286	640693.864	4715127.513	396.657	RELL
287	640694.206	4715125.433	396.633	RELL
288	640694.627	4715127.437	396.684	ARM
289	640695.097	4715127.479	396.739	ARM
290	640694.484	4715129.072	396.724	ARM
291	640694.945	4715129.104	396.725	ARM
292	640695.546	4715128.202	396.749	ALUM60
293	640688.998	4715124.229	396.402	RELL
294	640688.651	4715126.573	396.495	RELL
295	640688.195	4715128.874	396.499	RELL
296	640687.565	4715128.260	396.538	RELL
297	640686.934	4715127.827	396.491	RELL
298	640687.013	4715127.176	396.452	RELL
299	640687.667	4715126.921	396.513	RELL
300	640688.204	4715127.367	396.514	RELL
301	640687.218	4715124.757	396.331	RELL
302	640687.213	4715123.668	396.272	RELL
303	640687.570	4715127.603	396.930	FEC
304	640685.126	4715128.405	396.253	CT
305	640685.184	4715126.650	396.208	CT
306	640685.464	4715124.732	396.209	CT
307	640685.956	4715123.188	396.241	CT
308	640685.363	4715122.896	396.075	POSTE
309	640685.460	4715122.539	396.073	POSTE
310	640683.712	4715124.879	395.786	POSTE
311	640684.450	4715123.979	395.874	RELL
312	640721.017	4715133.202	397.076	RIG
313	640720.884	4715133.555	397.173	BOR
314	640720.814	4715133.489	397.174	FACH
315	640721.264	4715134.250	397.155	BOR
316	640721.566	4715133.889	397.064	RIG
317	640721.671	4715134.830	397.048	RIG
318	640721.284	4715134.800	397.138	BOR
319	640724.699	4715134.906	397.110	BOR
320	640724.462	4715135.818	397.022	RELL
321	640725.390	4715135.358	397.116	ESQ
322	640724.120	4715135.869	397.007	RIG
323	640725.280	4715136.216	397.103	FACH
324	640724.674	4715140.567	397.084	FACH
325	640723.754	4715147.065	397.043	FACH
326	640723.160	4715151.384	397.004	FACH
327	640722.665	4715155.005	396.949	FACH
328	640721.872	4715160.603	396.872	FACH
329	640721.333	4715164.177	396.815	FACH
330	640721.220	4715165.371	396.809	FACH
331	640720.914	4715167.868	396.772	FACH
332	640720.448	4715171.702	396.714	FACH
333	640720.457	4715171.867	396.607	ESQ
334	640715.805	4715170.740	396.761	FACH
335	640716.364	4715165.815	396.828	FACH
336	640716.812	4715161.743	396.893	FACH
337	640717.314	4715157.125	396.957	FACH
338	640717.696	4715154.744	396.998	FACH
339	640718.164	4715151.725	397.008	ESQ
340	640718.224	4715151.565	397.012	MUROB
341	640718.404	4715149.995	397.011	MUROB
342	640719.087	4715144.651	397.104	MUROB
343	640719.534	4715141.549	397.119	MUROB
344	640719.544	4715141.371	397.112	ESQ
345	640720.073	4715138.486	397.122	FACH
346	640720.744	4715138.380	397.109	BOR
347	640721.189	4715138.448	397.022	RIG
348	640722.491	4715138.629	397.016	RELL
349	640723.728	4715138.725	396.999	RIG
350	640724.189	4715138.799	397.077	BOR
351	640724.949	4715138.419	397.090	RELL
352	640720.136	4715136.457	397.135	RELL
353	640719.806	4715140.288	397.104	RELL
354	640724.056	4715144.722	397.059	RELL
355	640723.132	4715146.338	397.026	BOR
356	640722.688	4715146.304	396.932	RIG
357	640721.385	4715146.191	396.931	RELL
358	640720.110	4715146.061	396.924	RIG
359	640719.642	4715146.025	397.049	BOR
360	640718.541	4715149.250	397.030	RELL
361	640723.307	4715149.428	397.026	RELL
362	640722.849	4715152.770	396.984	RELL
363	640722.164	4715156.314	396.928	RELL
364	640722.186	4715153.246	396.958	BOR
365	640721.728	4715153.226	396.863	RIG
366	640720.553	4715153.104	396.854	RELL
367	640719.156	4715152.969	396.860	RIG
368	640718.691	4715152.944	396.988	BOR
369	640717.839	4715153.629	397.015	RELL
370	640717.733	4715155.283	396.990	RELL
371	640722.350	4715156.205	396.934	RELL
372	640720.990	4715161.960	396.839	BOR
373	640720.582	4715161.896	396.748	RIG
374	640719.278	4715161.804	396.748	RELL
375	640718.118	4715161.746	396.743	RIG
376	640717.657	4715161.703	396.857	BOR
377	640717.192	4715159.907	396.896	RELL
379	640718.240	4715156.251	396.952	BOR
380	640718.710	4715156.345	396.829	RIG
381	640716.557	4715164.516	396.849	RELL
382	640720.937	4715166.419	396.798	RELL
383	640720.718	4715168.740	396.763	RELL

384	640719.795	4715170.755	396.716	BOR
385	640719.330	4715170.732	396.618	RIG
386	640718.231	4715170.672	396.620	RELL
387	640717.109	4715170.736	396.608	RIG
388	640716.668	4715170.743	396.728	BOR
389	640715.745	4715172.055	396.725	RELL
390	640716.396	4715173.337	396.657	BOR
391	640716.831	4715173.329	396.582	RIG
392	640716.333	4715173.416	396.657	REJ
393	640716.216	4715174.384	396.644	REJ
394	640715.526	4715174.325	396.683	REJ
395	640715.654	4715173.284	396.703	REJ
396	640715.532	4715173.203	396.701	FACH
397	640719.679	4715170.831	396.700	HOR
398	640719.733	4715171.403	396.699	HOR
399	640719.905	4715171.660	396.699	HOR
400	640720.324	4715171.694	396.708	HOR
401	640720.244	4715171.849	396.622	HOR
402	640719.709	4715171.826	396.611	HOR
403	640719.415	4715171.379	396.609	HOR
404	640719.226	4715171.341	396.608	RIG
405	640718.178	4715172.075	396.599	RELL
406	640718.305	4715174.385	396.585	RELL
407	640719.888	4715174.278	396.609	RELL
408	640715.522	4715172.121	396.844	PUER
409	640720.985	4715168.783	396.743	PUER
410	640721.264	4715166.496	396.942	PUER
411	640716.312	4715164.518	396.843	PUER
412	640716.846	4715159.922	396.909	PUER
413	640717.555	4715155.255	397.066	PUER
414	640722.664	4715156.425	397.075	PUER
415	640723.198	4715152.820	397.056	PUER
416	640718.355	4715149.256	397.037	PUER
417	640723.645	4715149.540	397.162	PUER
418	640717.524	4715154.400	397.016	GARA
419	640717.747	4715152.591	397.014	GARA
420	640724.103	4715145.772	397.082	GARA
421	640724.385	4715143.808	397.073	GARA
422	640724.901	4715140.119	397.091	GARA
423	640725.436	4715136.642	397.098	GARA
424	640720.346	4715135.055	397.146	GARA
425	640719.864	4715137.979	397.125	GARA
426	640719.641	4715140.279	397.134	PUER
427	640715.082	4715176.573	396.845	PUER
428	640715.992	4715174.969	396.649	ARQ40C
429	640717.370	4715175.844	396.561	ABAS60R
430	640717.839	4715178.040	396.631	FEC
431	640716.265	4715174.433	396.639	BOR
432	640716.685	4715174.634	396.559	RIG
433	640715.913	4715181.146	396.680	RIG
434	640715.452	4715181.023	396.800	BOR
435	640714.717	4715180.837	396.833	FACH
436	640715.059	4715177.454	396.730	FACH
437	640715.316	4715175.341	396.666	FACH
438	640714.248	4715184.887	396.930	FACH
439	640714.683	4715184.106	396.914	ARQ40C
440	640714.832	4715186.062	396.948	BOR
441	640715.280	4715186.095	396.836	RIG
442	640714.069	4715187.704	397.028	ARQ40C
443	640713.777	4715188.387	397.044	FACH
444	640713.601	4715189.943	397.094	FACH
445	640713.291	4715192.595	397.142	ESQ
446	640713.539	4715193.600	397.162	ARQ60C
447	640713.854	4715194.043	397.158	BOR
448	640714.139	4715194.283	397.046	RIG
449	640715.588	4715194.410	397.057	RELL
450	640716.080	4715189.031	396.909	RELL
451	640716.627	4715185.087	396.792	RELL
452	640714.196	4715185.918	396.964	RELL
453	640714.043	4715185.945	397.121	PUER
454	640717.166	4715180.384	396.659	RELL
455	640717.993	4715176.019	396.571	RELL
456	640780.498	4715048.661	397.126	ADOQ
457	640779.668	4715045.102	397.138	ADOQ
458	640780.383	4715044.862	397.149	ADOQ
459	640720.920	4715246.628	398.673	FACH
460	640720.477	4715243.181	398.661	FACH
461	640720.358	4715242.229	398.589	FACH
462	640719.230	4715233.260	398.568	FACH
463	640718.280	4715226.312	398.365	FACH
464	640717.900	4715220.026	398.157	FACH
465	640717.463	4715212.574	397.790	ESQ
466	640717.932	4715212.579	397.787	ESQ
467	640718.177	4715206.896	397.562	FACH
469	640718.340	4715202.128	397.417	FACH
470	640718.676	4715194.414	397.140	FACH
471	640718.715	4715193.487	397.032	FACH
472	640718.930	4715189.184	396.972	ESQ
473	640718.976	4715189.004	396.980	ACERA
474	640718.229	4715189.047	396.961	BOR
475	640717.787	4715188.871	396.866	RIG
476	640718.435	4715181.190	396.644	RIG
477	640718.900	4715181.198	396.767	BOR
478	640719.637	4715181.323	396.785	ACERA
479	640719.723	4715180.365	396.756	ACERA
480	640719.994	4715177.234	396.609	ACERA
481	640719.074	4715179.182	396.667	BOR
482	640718.617	4715179.053	396.623	RIG
483	640718.781	4715177.220	396.570	RIG
484	640719.186	4715177.933	396.587	BOR
485	640719.243	4715177.903	396.591	ADOQ
486	640719.161	4715177.841	396.584	ADOQ
487	640719.612	4715177.503	396.603	ADOQ
488	640719.569	4715177.426	396.604	ADOQ
489	640720.007	4715177.209	396.604	ADOQ
490	640719.964	4715177.122	396.610	ADOQ
491	640722.038	4715176.063	396.620	ADOQ
492	640722.082	4715176.134	396.621	ADOQ
493	640723.164	4715175.652	396.633	ADOQ
494	640723.145	4715175.566	396.633	ADOQ
495	640723.102	4715173.289	396.613	CAZ
496	640723.103	4715172.988	396.613	CAZ
497	640722.836	4715171.468	396.632	FACH
498	640720.300	4715173.549	396.601	CAZ
499	640720.254	4715173.868	396.594	CAZ
500	640720.253	4715173.927	396.596	HOR
501	640720.124	4715175.455	396.595	HOR
502	640720.306	4715173.472	396.602	HOR
503	640720.400	4715172.602	396.599	HOR
504	640722.446	4715174.713	396.604	ALUM40
505	640719.576	4715178.367	396.628	ARQ60C
506	640719.369	4715179.564	396.700	ARQ40C
507	640718.505	4715189.365	396.975	ABASCONT
508	640718.517	4715190.050	396.995	ALUM40
509	640718.965	4715189.723	397.016	REJ
510	640718.881	4715191.486	397.017	REJ

511	640718.785	4715193.272	397.031	REJ
512	640717.839	4715193.542	397.051	BOR
513	640717.363	4715193.547	397.002	RIG
514	640717.772	4715194.282	397.124	BOR
515	640717.332	4715194.289	397.038	RIG
516	640716.650	4715202.148	397.287	RIG
517	640717.083	4715202.201	397.393	BOR
518	640717.263	4715202.228	397.392	GAS
519	640717.576	4715202.961	397.427	ARQ40C
520	640715.274	4715198.388	397.160	RELL
522	640714.807	4715202.025	397.262	RELL
523	640714.473	4715208.435	397.542	RELL
525	640716.881	4715208.688	397.614	BOR
526	640711.327	4715207.824	397.445	RELL
527	640712.363	4715202.393	397.249	RELL
528	640712.228	4715195.150	397.084	RELL
529	640710.256	4715210.787	397.471	RELL
530	640712.419	4715210.848	397.657	RELL
531	640714.469	4715210.792	397.659	RELL
532	640716.411	4715208.691	397.510	RIG
534	640716.727	4715213.223	397.811	BOR
535	640716.258	4715213.373	397.745	RIG
536	640714.159	4715213.414	397.813	RELL
537	640715.144	4715213.760	397.791	FEC
538	640714.625	4715220.395	398.091	RELL
539	640716.646	4715220.237	398.041	RIG
540	640717.128	4715220.213	398.144	BOR
541	640717.576	4715227.660	398.382	BOR
542	640717.112	4715227.688	398.317	RIG
543	640715.181	4715227.782	398.346	RELL
544	640716.240	4715234.949	398.494	RELL
545	640718.092	4715234.679	398.473	RIG
546	640718.522	4715234.592	398.580	BOR
547	640719.562	4715242.053	398.552	BOR
548	640719.126	4715242.097	398.513	RIG
549	640719.291	4715243.309	398.561	RIG
550	640719.731	4715243.231	398.639	BOR
551	640717.305	4715243.627	398.562	RELL
552	640717.068	4715241.105	398.518	RELL
553	640719.580	4715240.489	398.559	ARQ40C
554	640719.685	4715240.886	398.561	ARQ40C
555	640719.768	4715241.425	398.563	ARQ60C
556	640720.001	4715243.460	398.638	GAS
557	640720.511	4715248.841	398.666	BOR
558	640720.061	4715248.890	398.620	RIG
559	640717.863	4715249.229	398.636	RELL
560	640720.948	4715252.035	398.669	BOR
561	640720.539	4715252.093	398.616	RIG
562	640721.041	4715252.729	398.616	BOR
563	640720.653	4715252.806	398.601	RIG
564	640720.913	4715252.797	398.612	ADOQGRIS
565	640721.064	4715252.783	398.616	ADOQGRIS
566	640721.485	4715256.024	398.559	ADOQGRIS
567	640721.336	4715256.042	398.558	ADOQGRIS
568	640721.575	4715257.784	398.527	ADOQGRIS
569	640721.727	4715257.743	398.530	ADOQGRIS
570	640721.601	4715257.942	398.522	ADOQGRIS
572	640718.698	4715258.527	398.622	ADOQGRIS
573	640718.547	4715258.552	398.622	ADOQGRIS
574	640718.589	4715258.710	398.623	ADOQGRIS
575	640718.729	4715258.678	398.615	ADOQGRIS
576	640718.468	4715256.540	398.637	ADOQGRIS
577	640718.319	4715256.557	398.637	ADOQGRIS
578	640717.934	4715256.145	398.637	ARQ60C
579	640717.997	4715255.166	398.656	RELL
580	640722.326	4715257.570	398.525	ADOQGRIS
581	640722.351	4715257.719	398.524	ADOQGRIS
582	640722.311	4715257.905	398.517	ARQ40C
584	640720.928	4715255.924	398.552	PASOP
585	640718.390	4715256.518	398.625	PASOP
586	640717.911	4715252.925	398.656	PASOP
587	640720.472	4715252.302	398.612	PASOP
588	640720.957	4715245.220	398.669	PUER
589	640720.016	4715238.852	398.572	GARA
590	640719.566	4715235.249	398.591	GARA
591	640719.258	4715230.021	398.440	GARA
592	640718.804	4715226.364	398.332	GARA
593	640718.296	4715226.493	398.376	HOR
594	640718.510	4715228.336	398.430	HOR
595	640718.763	4715230.169	398.482	HOR
596	640720.670	4715245.303	398.667	RELL
597	640717.997	4715221.897	398.214	RELL
598	640718.130	4715221.914	398.325	PUER
599	640717.942	4715219.525	398.295	PUER
600	640718.280	4715212.074	397.646	GARA
601	640717.860	4715212.031	397.776	RELL
602	640717.992	4715209.312	397.657	RELL
603	640718.469	4715209.477	397.588	GARA
604	640718.272	4715203.420	397.450	RELL
605	640718.442	4715203.476	397.542	PUER
607	640711.469	4715193.998	397.057	RIG
608	640711.108	4715193.648	397.157	BOR
609	640711.047	4715193.749	397.131	BOR
610	640710.571	4715197.953	397.211	BOR
611	640711.019	4715198.038	397.132	RIG
612	640710.366	4715203.988	397.277	RIG
613	640709.909	4715203.975	397.361	BOR
614	640709.727	4715205.637	397.396	BOR
615	640710.163	4715205.695	397.325	RIG
616	640709.783	4715209.493	397.372	RIG
617	640709.284	4715209.449	397.421	BOR
618	640709.013	4715212.119	397.448	BOR
619	640709.521	4715211.583	397.428	RIG
620	640710.569	4715211.537	397.577	RIG
621	640710.523	4715211.943	397.696	BOR
622	640710.585	4715211.945	397.849	BOR
623	640711.073	4715211.908	397.860	BOR
624	640711.385	4715212.051	397.871	BOR
625	640711.862	4715212.026	397.702	RIG
626	640711.801	4715211.571	397.689	RIG
627	640710.580	4715211.978	397.849	ACERA
628	640710.637	4715212.679	397.894	ACERA
629	640710.654	4715212.676	397.774	ACERA
630	640710.562	4715212.007	397.709	ACERA
631	640710.675	4715212.672	397.895	ESQ
632	640708.924	4715212.993	397.446	FACH
633	640708.005	4715213.202	397.457	ESQ
634	640708.011	4715212.219	397.470	GARA
635	640708.372	4715209.077	397.466	GARA
636	640708.500	4715208.666	397.430	FACH
637	640708.402	4715210.629	397.450	RELL
638	640708.782	4715207.165	397.425	RELL
639	640708.428	4715208.375	397.428	GARA
640	640708.709	4715205.774	397.420	GARA
641	640709.085	4715204.107	397.382	FACH
642	640709.834	4715203.400	397.354	GAS

643	640709.811	4715202.263	397.334	ARQ40C
644	640709.429	4715202.296	397.345	RELL
645	640709.155	4715202.278	397.365	PUER
646	640709.559	4715200.809	397.301	RELL
647	640709.902	4715198.290	397.238	RELL
648	640709.659	4715198.339	397.344	GARA
649	640709.404	4715200.676	397.339	GARA
650	640709.773	4715197.842	397.219	FACH
651	640709.678	4715197.821	397.220	FACH
652	640709.887	4715196.696	397.191	RELL
653	640709.702	4715196.636	397.213	GARA
654	640710.033	4715193.796	397.205	GARA
655	640710.195	4715193.875	397.159	RELL
656	640710.118	4715193.540	397.162	FACH
657	640710.261	4715192.334	397.178	FACH
658	640711.105	4715212.711	397.893	ARQ60C
659	640711.307	4715213.491	397.924	ABASACOM
660	640712.276	4715217.310	397.971	RIG
661	640711.817	4715217.381	398.100	BOR
662	640711.078	4715217.421	398.106	FACH
663	640711.520	4715222.507	398.310	FACH
664	640712.250	4715222.433	398.306	BOR
665	640712.696	4715222.381	398.176	RIG
666	640713.123	4715227.297	398.332	RIG
667	640712.686	4715227.366	398.462	BOR
668	640711.962	4715226.477	398.440	RELL
669	640711.726	4715226.570	398.560	PUER
670	640711.987	4715227.911	398.477	FACH
671	640712.144	4715229.397	398.432	FACH
672	640712.842	4715229.353	398.418	BOR
673	640713.298	4715229.358	398.363	RIG
674	640712.765	4715228.358	398.491	BOR
675	640712.567	4715229.501	398.431	ABASCONT
676	640712.537	4715230.184	398.442	ARQ40C
677	640712.057	4715229.724	398.511	GARA
678	640712.362	4715233.507	398.502	GARA
679	640712.607	4715233.491	398.474	RELL
680	640712.512	4715231.655	398.469	RELL
681	640713.234	4715233.842	398.478	BOR
682	640713.682	4715233.772	398.436	RIG
683	640712.550	4715233.900	398.509	FACH
684	640712.597	4715234.871	398.617	FACH
685	640713.052	4715239.673	398.641	FACH
686	640713.733	4715239.546	398.631	BOR
687	640714.151	4715239.415	398.526	RIG
688	640713.090	4715238.764	398.637	RELL
689	640712.892	4715238.752	398.670	PUER
690	640713.000	4715240.704	398.714	PUER
691	640713.176	4715240.700	398.644	RELL
692	640713.230	4715242.065	398.656	FACH
693	640713.350	4715243.610	398.684	FACH
694	640713.658	4715247.378	398.754	FACH
695	640714.125	4715252.630	398.840	FACH
696	640714.224	4715253.769	398.808	FACH
697	640714.633	4715258.275	398.801	ESQ
698	640712.769	4715258.925	398.912	FACH
699	640713.200	4715259.951	398.875	ADOQGRIS
701	640713.249	4715260.095	398.868	ADOQGRIS
702	640715.719	4715259.426	398.713	ADOQGRIS
703	640715.563	4715259.465	398.719	ADOQGRIS
704	640715.690	4715259.275	398.716	ADOQGRIS
705	640715.545	4715259.315	398.729	ADOQGRIS
706	640715.321	4715255.759	398.706	ADOQGRIS
707	640715.167	4715255.758	398.714	ADOQGRIS
708	640715.123	4715253.922	398.699	ADOQGRIS
709	640714.971	4715253.935	398.711	ADOQGRIS
710	640715.416	4715253.567	398.688	PASOP
711	640715.818	4715257.207	398.693	PASOP
712	640714.972	4715253.871	398.717	BOR
713	640714.851	4715252.583	398.820	BOR
714	640715.271	4715252.606	398.691	RIG
715	640715.380	4715253.532	398.703	RIG
716	640714.394	4715247.388	398.724	BOR
717	640714.790	4715247.306	398.614	RIG
718	640713.921	4715242.006	398.645	BOR
719	640714.358	4715242.022	398.510	RIG
720	640713.617	4715244.810	398.718	RELL
721	640713.420	4715244.775	398.856	PUER
722	640714.145	4715247.230	398.744	ARQ40C
723	640714.783	4715253.809	398.745	ABASACOM
724	640714.800	4715255.679	398.763	GAS
725	640715.164	4715256.914	398.735	GAS
726	640715.091	4715257.798	398.767	ALUM60
727	640714.625	4715257.217	398.826	RELL
728	640714.321	4715253.955	398.809	RELL
729	640714.074	4715253.945	398.827	GARA
730	640714.290	4715257.357	398.818	GARA
731	640720.883	4715257.900	398.536	TLFH
732	640724.473	4715257.115	398.507	ADOQGRIS
733	640724.401	4715256.973	398.510	ADOQGRIS
734	640723.785	4715255.514	398.578	FACH
735	640725.236	4715258.925	398.483	CAZ
736	640725.375	4715259.293	398.481	CAZ
737	640725.788	4715261.261	398.534	ADOQGRIS
738	640725.818	4715261.403	398.543	ADOQGRIS
739	640721.774	4715262.562	398.580	ADOQGRIS
740	640721.591	4715262.458	398.578	ADOQGRIS
741	640721.967	4715263.747	398.608	ADOQGRIS
742	640722.108	4715263.737	398.605	ADOQGRIS
743	640721.445	4715263.432	398.605	ARQ60C
744	640721.902	4715263.756	398.606	PIEDRA
745	640719.740	4715263.943	398.634	PIEDRA
746	640718.597	4715264.154	398.643	PIEDRA
747	640716.623	4715264.619	398.703	PIEDRA
748	640713.727	4715265.307	398.885	PIEDRA
749	640712.979	4715262.797	398.895	CAZ
750	640712.834	4715262.416	398.895	CAZ
751	640718.009	4715261.367	398.588	CAZ
752	640717.897	4715260.977	398.587	CAZ
753	640719.274	4715260.603	398.550	CAZ
754	640719.387	4715260.991	398.538	CAZ
755	640718.941	4715260.992	398.548	FEC
756	640717.479	4715260.138	398.614	FUER
757	640718.201	4715261.130	398.554	SUM
758	640720.090	4715262.182	398.582	ABASACOM
759	640721.980	4715256.421	398.567	ALUM40
760	640717.732	4715252.246	398.660	RELL
761	640718.088	4715254.644	398.656	RELL
762	640722.248	4715255.990	398.584	ESQ

4 PLANO DE REFERENCIA DEL LEVANTAMIENTO



AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: 1:250	MTV: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: TOPOGRAFIA	REV 23/08/2023	FECHA JUNIO 2022	PLANO Nº A1
						DOCUMENTO DWG TOPOGRAFIA		HOJA 1 DE 1

Anejo nº2

TRAZADO

INDICE

1.- COLECTORES 2
1.1.- FECALES F1 2
1.2.- PLUVIALES P1 3
2.- VIALES 5
2.1.- EJE 1 C/JUAN DE BERRUETA 5
2.2.- EJE 2 PASEO DE LA ALMADÍA 11

1.-COLECTORES

1.1.- FECALES F1

PLANTA: PUNTOS SINGULARES

Estación	Longitud	Coord. X	Coord. Y	Acimut	Radio	Parám.	X Centro	Y Centro
0+000.000	0.000	640,687.581	4,715,127.678	94.4555	Infinito			
0+036.479	36.479	640,723.922	4,715,130.851	94.4555	Infinito			
0+036.484	0.005	640,723.921	4,715,130.850	391.7678	0.001		640,723.922	4,715,130.850
0+081.083	44.599	640,718.170	4,715,175.077	391.7678	Infinito			
0+081.083	0.000	640,718.170	4,715,175.077	394.3964	0.001		640,718.171	4,715,175.077
0+117.803	36.720	640,714.942	4,715,211.655	394.3964	Infinito			
0+117.804	0.000	640,714.942	4,715,211.655	5.3366	0.001		640,714.943	4,715,211.655
0+159.617	41.814	640,718.443	4,715,253.322	5.3366	Infinito			

PLANTA: PUNTOS CADA 10m

	Estación	Coor. X	Coor. Y	Acimut	Radio	Parám.
PS	0+000.000	640,687.581	4,715,127.678	94.4555	Infinito	
	0+010	640,697.543	4,715,128.548	94.4555		
	0+020	640,707.505	4,715,129.418	94.4555		
	0+030	640,717.467	4,715,130.287	94.4555		
PS	0+036.479	640,723.922	4,715,130.851	94.4555	Infinito	
PS	0+036.484	640,723.921	4,715,130.850	391.7678	0.001	
	0+040	640,723.468	4,715,134.337	391.7678		
	0+050	640,722.178	4,715,144.253	391.7678		
	0+060	640,720.889	4,715,154.170	391.7678		
	0+070	640,719.599	4,715,164.086	391.7678		
	0+080	640,718.310	4,715,174.003	391.7678		
PS	0+081.083	640,718.170	4,715,175.077	391.7678	Infinito	
	0+090	640,717.386	4,715,183.959	394.3964		
	0+100	640,716.507	4,715,193.920	394.3964		
	0+110	640,715.628	4,715,203.882	394.3964		
PS	0+117.803	640,714.942	4,715,211.655	394.3964	Infinito	
PS	0+117.804	640,714.942	4,715,211.655	394.3964	Infinito	
	0+120	640,715.126	4,715,213.844	5.3366		
	0+130	640,715.963	4,715,223.809	5.3366		
	0+140	640,716.800	4,715,233.774	5.3366		
	0+150	640,717.638	4,715,243.738	5.3366		
	0+159.617	640,718.443	4,715,253.322	5.3366		

RASANTE: VERTICES

Ver.	Estación	Cota	Pente.(%)	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha
1	0+000.000	393.030•				
2	0+000.010	393.120•	899.9634	0.000•	0.000	0.000
3	0+000.020	394.850•	17,300.1099	0.000•	0.000	0.000
4	0+036.484	395.099	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
5	0+081.083	395.404	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
6	0+117.804	395.654	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
7	0+159.617	395.940•	0.6829			

RASANTE: PUNTOS CADA 10m

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
	0+000.000	393.030	899.9634					
TE	0+000.010	393.120	899.9634					
V	0+000.010	393.120	899.9634	393.120	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+000.010	393.120	899.9634					
TE	0+000.020	394.850	17,300.1099					
V	0+000.020	394.850	17,300.1099	394.850	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+000.020	394.850	17,300.1099					
	0+010.000	394.918	0.6830					
	0+020.000	394.986	0.6830					
	0+030.000	395.055	0.6830					
TE	0+036.484	395.099	0.6830					

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
V	0+036.484	395.099	0.6830	395.099	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+036.484	395.099	0.6830					
	0+040.000	395.123	0.6830					
	0+050.000	395.191	0.6830					
	0+060.000	395.260	0.6830					
	0+070.000	395.328	0.6830					
	0+080.000	395.396	0.6830					
TE	0+081.083	395.404	0.6830					
V	0+081.083	395.404	0.6830	395.404	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+081.083	395.404	0.6830					
	0+090.000	395.465	0.6830					
	0+100.000	395.533	0.6830					
	0+110.000	395.601	0.6830					
TE	0+117.804	395.654	0.6830					
V	0+117.804	395.654	0.6830	395.654	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+117.804	395.654	0.6830					
	0+120.000	395.669	0.6829					
	0+130.000	395.738	0.6829					
	0+140.000	395.806	0.6829					
	0+150.000	395.874	0.6829					
	0+159.617	395.940	0.6829					

1.2.- PLUVIALES P1

PLANTA: PUNTOS SINGULARES

Estación	Longitud	Coord. X	Coord. Y	Acimut	Radio	Parám.	X Centro	Y Centro
0+000.000	0.000	640,682.813	4,715,128.114	94.3771	Infinito			
0+007.210	7.210	640,689.995	4,715,128.750	94.3771	Infinito			
0+007.210	0.000	640,689.995	4,715,128.750	94.3738	0.001		640,689.995	4,715,128.749
0+040.306	33.096	640,722.962	4,715,131.671	94.3738	Infinito			
0+040.311	0.005	640,722.961	4,715,131.670	391.7297	0.001		640,722.962	4,715,131.670
0+083.008	42.697	640,717.430	4,715,174.007	391.7297	Infinito			
0+083.008	0.000	640,717.430	4,715,174.007	394.1046	0.001		640,717.431	4,715,174.007
0+119.884	36.876	640,714.020	4,715,210.725	394.1046	Infinito			
0+119.884	0.000	640,714.020	4,715,210.725	5.3397	0.001		640,714.021	4,715,210.725
0+162.723	42.840	640,717.609	4,715,253.414	5.3397	Infinito			

PLANTA: PUNTOS CADA 10m

	Estación	Coor. X	Coor. Y	Acimut	Radio	Parám.
PS	0+000.000	640,682.813	4,715,128.114	94.3771	Infinito	
PS	0+007.210	640,689.995	4,715,128.750	94.3771	Infinito	
	0+010	640,692.774	4,715,128.996	94.3738		
	0+020	640,702.735	4,715,129.879	94.3738		
	0+030	640,712.696	4,715,130.761	94.3738		
	0+040	640,722.657	4,715,131.644	94.3738		
PS	0+040.306	640,722.962	4,715,131.671	94.3738	Infinito	
PS	0+040.311	640,722.961	4,715,131.670	391.7297	0.001	
	0+050	640,721.706	4,715,141.277	391.7297		
	0+060	640,720.411	4,715,151.193	391.7297		
	0+070	640,719.115	4,715,161.109	391.7297		
	0+080	640,717.820	4,715,171.025	391.7297		
PS	0+083.008	640,717.430	4,715,174.007	391.7297	Infinito	
	0+090	640,716.783	4,715,180.969	394.1046		
	0+100	640,715.859	4,715,190.926	394.1046		
	0+110	640,714.934	4,715,200.884	394.1046		
PS	0+119.884	640,714.020	4,715,210.725	394.1046	Infinito	
	0+120	640,714.030	4,715,210.841	5.3397		
	0+130	640,714.868	4,715,220.806	5.3397		
	0+140	640,715.705	4,715,230.770	5.3397		
	0+150	640,716.543	4,715,240.735	5.3397		
	0+160	640,717.381	4,715,250.700	5.3397		
	0+162.723	640,717.609	4,715,253.414	5.3397		

RASANTE: VERTICES

Ver.	Estación	Cota	Pente.(%)	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha
1	0+000.000	394.715•				
2	0+007.210	394.793•	1.0819	0.000	0.000•	0.000
3	0+040.311	395.019	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
4	0+083.008	395.311	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
5	0+119.884	395.563	0.6830•	0.000•	0.000	0.000
6	0+162.723	395.855	0.6830•			

RASANTE: PUNTOS CADA 10m

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
	0+000.000	394.715	1.0819					
TE	0+007.210	394.793	1.0819					
V	0+007.210	394.793	1.0819	394.793	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+007.210	394.793	1.0819					
	0+010.000	394.812	0.6830					
	0+020.000	394.880	0.6830					
	0+030.000	394.949	0.6830					
	0+040.000	395.017	0.6830					
TE	0+040.311	395.019	0.6830					
V	0+040.311	395.019	0.6830	395.019	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+040.311	395.019	0.6830					
	0+050.000	395.085	0.6830					
	0+060.000	395.154	0.6830					
	0+070.000	395.222	0.6830					
	0+080.000	395.290	0.6830					
TE	0+083.008	395.311	0.6830					
V	0+083.008	395.311	0.6830	395.311	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+083.008	395.311	0.6830					
	0+090.000	395.358	0.6830					
	0+100.000	395.427	0.6830					
	0+110.000	395.495	0.6830					
TE	0+119.884	395.563	0.6830					
V	0+119.884	395.563	0.6830	395.563	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+119.884	395.563	0.6830					
	0+120.000	395.563	0.6830					
	0+130.000	395.632	0.6830					
	0+140.000	395.700	0.6830					
	0+150.000	395.768	0.6830					
	0+160.000	395.837	0.6830					
	0+162.723	395.855	0.6830					

2.-VIALES

2.1.- EJE 1 C/JUAN DE BERRUETA

PLANTA: PUNTOS SINGULARES

Estación	Longitud	Coord. X	Coord. Y	Acimut	Radio	Parám.	X Centro	Y Centro
0+000.000	0.000	640,779.343	4,715,046.853	303.2728	Infinito			
0+016.310	16.310	640,763.054	4,715,047.691	303.2728	Infinito			
0+023.612	7.302	640,756.596	4,715,050.698	352.2059	9.500		640,763.543	4,715,057.179
0+052.638	29.026	640,736.795	4,715,071.921	352.2059	Infinito			
0+075.357	22.718	640,727.567	4,715,092.246	393.5285	35.000		640,762.386	4,715,095.797
0+109.978	34.622	640,724.054	4,715,126.689	393.5285	Infinito			
0+110.851	0.873	640,723.950	4,715,127.555	391.3063	-25.000		640,699.183	4,715,124.152
0+134.804	23.953	640,720.689	4,715,151.285	391.3063	Infinito			
0+135.028	0.224	640,720.660	4,715,151.507	391.8771	25.000		640,745.457	4,715,154.688
0+154.755	19.727	640,718.149	4,715,171.074	391.8771	Infinito			
0+155.514	0.759	640,718.064	4,715,171.828	393.8104	25.000		640,742.946	4,715,174.255
0+188.770	33.256	640,714.836	4,715,204.927	393.8104	Infinito			
0+209.466	20.696	640,714.965	4,715,225.585	6.9856	100.000		640,814.364	4,715,214.634
0+242.785	33.319	640,718.614	4,715,258.704	6.9856	Infinito			
0+242.785	0.000	640,718.614	4,715,258.704	17.4618	0.001		640,718.615	4,715,258.704
0+248.197	5.412	640,720.080	4,715,263.914	17.4618	Infinito			

PLANTA: PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

	Estación	Coor. X	Coor. Y	Acimut	Radio	Parám.
PS	0+000.000	640,779.343	4,715,046.853	303.2728	Infinito	
	0+005	640,774.350	4,715,047.110	303.2728		
	0+010	640,769.356	4,715,047.367	303.2728		
	0+015	640,764.363	4,715,047.624	303.2728		
PS	0+016.310	640,763.054	4,715,047.691	303.2728	Infinito	
	0+020	640,759.498	4,715,048.583	327.9991		
PS	0+023.612	640,756.596	4,715,050.698	352.2059	9.500	
	0+025	640,755.650	4,715,051.712	352.2059		
	0+030	640,752.239	4,715,055.368	352.2059		
	0+035	640,748.828	4,715,059.024	352.2059		
	0+040	640,745.417	4,715,062.680	352.2059		
	0+045	640,742.006	4,715,066.336	352.2059		
	0+050	640,738.595	4,715,069.992	352.2059		
PS	0+052.638	640,736.795	4,715,071.921	352.2059	Infinito	
	0+055	640,735.244	4,715,073.701	356.5018		
	0+060	640,732.374	4,715,077.790	365.5964		
	0+065	640,730.116	4,715,082.247	374.6909		
	0+070	640,728.516	4,715,086.979	383.7855		
	0+075	640,727.605	4,715,091.891	392.8801		
PS	0+075.357	640,727.567	4,715,092.246	393.5285	35.000	
	0+080	640,727.096	4,715,096.865	393.5285		
	0+085	640,726.589	4,715,101.839	393.5285		
	0+090	640,726.081	4,715,106.814	393.5285		
	0+095	640,725.574	4,715,111.788	393.5285		
	0+100	640,725.066	4,715,116.762	393.5285		
	0+105	640,724.559	4,715,121.736	393.5285		
PS	0+109.978	640,724.054	4,715,126.689	393.5285	Infinito	
	0+110	640,724.052	4,715,126.710	393.4729		
PS	0+110.851	640,723.950	4,715,127.555	391.3063	-25.000	
	0+115	640,723.385	4,715,131.666	391.3063		
	0+120	640,722.705	4,715,136.619	391.3063		
	0+125	640,722.024	4,715,141.573	391.3063		
	0+130	640,721.343	4,715,146.526	391.3063		
PS	0+134.804	640,720.689	4,715,151.285	391.3063	Infinito	
	0+135	640,720.663	4,715,151.480	391.8061		
PS	0+135.028	640,720.660	4,715,151.507	391.8771	25.000	
	0+140	640,720.027	4,715,156.439	391.8771		
	0+145	640,719.391	4,715,161.398	391.8771		
	0+150	640,718.755	4,715,166.358	391.8771		
PS	0+154.755	640,718.149	4,715,171.074	391.8771	Infinito	
	0+155	640,718.120	4,715,171.317	392.5005		
PS	0+155.514	640,718.064	4,715,171.828	393.8104	25.000	
	0+160	640,717.629	4,715,176.293	393.8104		
	0+165	640,717.144	4,715,181.269	393.8104		
	0+170	640,716.658	4,715,186.246	393.8104		
	0+175	640,716.173	4,715,191.222	393.8104		
	0+180	640,715.687	4,715,196.198	393.8104		

	Estación	Coor. X	Coor. Y	Acimut	Radio	Parám.
	0+185	640,715.202	4,715,201.175	393.8104		
PS	0+188.770	640,714.836	4,715,204.927	393.8104	Infinito	
	0+190	640,714.724	4,715,206.152	394.5935		
	0+195	640,714.425	4,715,211.142	397.7766		
	0+200	640,714.375	4,715,216.142	0.9597		
	0+205	640,714.575	4,715,221.137	4.1428		
PS	0+209.466	640,714.965	4,715,225.585	6.9856	100.000	
	0+210	640,715.024	4,715,226.117	6.9856		
	0+215	640,715.571	4,715,231.086	6.9856		
	0+220	640,716.119	4,715,236.056	6.9856		
	0+225	640,716.666	4,715,241.026	6.9856		
	0+230	640,717.214	4,715,245.996	6.9856		
	0+235	640,717.762	4,715,250.966	6.9856		
	0+240	640,718.309	4,715,255.936	6.9856		
PS	0+242.785	640,718.614	4,715,258.704	6.9856	Infinito	
	0+245	640,719.214	4,715,260.837	17.4618		
PS	0+248.197	640,720.080	4,715,263.914	17.4618	Infinito	

RASANTE: LISTADO DE VERTICES

Ver.	Estación	Cota	Pente.(%)	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha
1	0+000.000	397.065•				
2	0+020.000	396.945•	-0.6000	0.190	-100.000•	0.000
3	0+077.000	396.495•	-0.7900	2.340	100.000•	0.007
4	0+090.000	396.696	1.5500•	1.033	100.000•	0.001
5	0+099.000	396.929•	2.5829	1.461	-100.000•	-0.003
6	0+111.000	397.063	1.1220•	0.000	0.000•	0.000
7	0+114.500	397.087•	0.6785	2.120	-100.000•	-0.006
8	0+117.000	397.051•	-1.4417	0.371	50.000•	0.000
9	0+122.000	397.016	-0.7000•	0.000	0.000•	0.000
10	0+137.000	396.911	-0.7000•	0.000	0.000•	0.000
11	0+152.000	396.695•	-1.4399	0.000	0.000•	0.000
12	0+160.000	396.580	-1.4400•	4.040	100.000•	0.020
13	0+172.000	396.892	2.6000•	0.000	0.000•	0.000
14	0+177.000	397.022	2.6000•	0.000	0.000•	0.000
15	0+187.000	397.342	3.2000•	0.000	0.000•	0.000
16	0+193.000	397.534	3.2000•	0.905	50.000•	0.002
17	0+204.000	398.085•	5.0108	1.210	-50.000•	-0.004
18	0+215.000	398.370•	2.5909	0.609	-50.000•	-0.001
19	0+237.447	398.678•	1.3727	11.014	-435.000•	-0.035
20	0+242.982	398.614	-1.1592•	0.000•	0.000	0.000
21	0+245.000	398.544•	-3.4671	0.000	0.000•	0.000
22	0+246.000	398.575•	3.1006	0.000	0.000•	0.000
23	0+247.000	398.599•	2.3987	0.000	0.000•	0.000
24	0+248.000	398.624•	2.4994			

RASANTE: PUNTOS DEL EJE CADA 5 METROS

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
	0+000.000	397.065	-0.6000					
	0+005.000	397.035	-0.6000					
	0+010.000	397.005	-0.6000					
	0+015.000	396.975	-0.6000					
TE	0+019.905	396.946	-0.6000					
V	0+020.000	396.945	-0.6950	396.945	0.190	-100.000	0.000	-0.1901
	0+020.000	396.945	-0.6950					
TS	0+020.095	396.944	-0.7900					
	0+025.000	396.906	-0.7900					
	0+030.000	396.866	-0.7900					
	0+035.000	396.827	-0.7900					
	0+040.000	396.787	-0.7900					
	0+045.000	396.747	-0.7900					
	0+050.000	396.708	-0.7900					
	0+055.000	396.668	-0.7900					
	0+060.000	396.629	-0.7900					
	0+065.000	396.589	-0.7900					
	0+070.000	396.550	-0.7900					
	0+075.000	396.510	-0.7900					
TE	0+075.830	396.504	-0.7900					
PB	0+076.620	396.501	0.0000					
V	0+077.000	396.502	0.3800	396.495	2.340	100.000	0.007	2.3400
TS	0+078.170	396.513	1.5500					
	0+080.000	396.541	1.5500					

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
	0+085.000	396.619	1.5500					
TE	0+089.484	396.688	1.5500					
V	0+090.000	396.698	2.0664	396.696	1.033	100.000	0.001	1.0329
	0+090.000	396.698	2.0664					
TS	0+090.516	396.710	2.5829					
	0+095.000	396.825	2.5829					
TE	0+098.270	396.910	2.5829					
V	0+099.000	396.926	1.8524	396.929	1.461	-100.000	-0.003	-1.4609
TS	0+099.730	396.937	1.1220					
	0+100.000	396.940	1.1220					
	0+105.000	396.996	1.1220					
	0+110.000	397.052	1.1220					
TE	0+111.000	397.063	1.1220					
V	0+111.000	397.063	1.1220	397.063	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+111.000	397.063	1.1220					
TE	0+113.440	397.080	0.6785					
PA	0+114.118	397.082	0.0000					
V	0+114.500	397.081	-0.3816	397.087	2.120	-100.000	-0.006	-2.1201
	0+115.000	397.078	-0.8816					
TS	0+115.560	397.072	-1.4417					
TE	0+116.815	397.054	-1.4417					
V	0+117.000	397.051	-1.0708	397.051	0.371	50.000	0.000	0.7417
TS	0+117.185	397.050	-0.7000					
	0+120.000	397.030	-0.7000					
TE	0+122.000	397.016	-0.7000					
V	0+122.000	397.016	-0.7000	397.016	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+122.000	397.016	-0.7000					
	0+125.000	396.995	-0.7000					
	0+130.000	396.960	-0.7000					
	0+135.000	396.925	-0.7000					
TE	0+137.000	396.911	-0.7000					
V	0+137.000	396.911	-0.7000	396.911	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+137.000	396.911	-0.7000					
	0+140.000	396.868	-1.4399					
	0+145.000	396.796	-1.4399					
	0+150.000	396.724	-1.4399					
TE	0+152.000	396.695	-1.4399					
V	0+152.000	396.695	-1.4399	396.695	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+152.000	396.695	-1.4399					
	0+155.000	396.652	-1.4400					
TE	0+157.980	396.609	-1.4400					
PB	0+159.420	396.599	0.0000					
V	0+160.000	396.600	0.5800	396.580	4.040	100.000	0.020	4.0400
	0+160.000	396.600	0.5800					
TS	0+162.020	396.632	2.6000					
	0+165.000	396.710	2.6000					
	0+170.000	396.840	2.6000					
TE	0+172.000	396.892	2.6000					
V	0+172.000	396.892	2.6000	396.892	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+172.000	396.892	2.6000					
	0+175.000	396.970	2.6000					
TE	0+177.000	397.022	2.6000					
V	0+177.000	397.022	2.6000	397.022	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+177.000	397.022	2.6000					
	0+180.000	397.118	3.2000					
	0+185.000	397.278	3.2000					
TE	0+187.000	397.342	3.2000					
V	0+187.000	397.342	3.2000	397.342	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+187.000	397.342	3.2000					
	0+190.000	397.438	3.2000					
TE	0+192.547	397.519	3.2000					
V	0+193.000	397.536	4.1054	397.534	0.905	50.000	0.002	1.8108
TS	0+193.453	397.556	5.0108					
	0+195.000	397.634	5.0108					
	0+200.000	397.885	5.0108					
TE	0+203.395	398.055	5.0108					
V	0+204.000	398.081	3.8009	398.085	1.210	-50.000	-0.004	-2.4198
TS	0+204.605	398.101	2.5909					
	0+205.000	398.111	2.5909					
	0+210.000	398.240	2.5909					
TE	0+214.695	398.362	2.5909					
V	0+215.000	398.369	1.9818	398.370	0.609	-50.000	-0.001	-1.2182
	0+215.000	398.369	1.9818					
TS	0+215.305	398.374	1.3727					
	0+220.000	398.439	1.3727					
	0+225.000	398.507	1.3727					
	0+230.000	398.576	1.3727					

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
TE	0+231.940	398.603	1.3727					
	0+235.000	398.634	0.6693					
V	0+237.447	398.643	0.1068	398.678	11.014	-435.000	-0.035	-2.5319
PA	0+237.912	398.644	0.0000					
	0+240.000	398.639	-0.4801					
TS	0+242.954	398.614	-1.1592					
TE	0+242.982	398.614	-1.1592					
V	0+242.982	398.614	-1.1592	398.614	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+242.982	398.614	-1.1592					
TE	0+245.000	398.544	-3.4671					
PB	0+245.000	398.544	-3.4671					
V	0+245.000	398.544	-3.4671	398.544	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+245.000	398.544	-3.4671					
	0+245.000	398.544	-3.4671					
TE	0+246.000	398.575	3.1006					
V	0+246.000	398.575	3.1006	398.575	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+246.000	398.575	3.1006					
TE	0+247.000	398.599	2.3987					
V	0+247.000	398.599	2.3987	398.599	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+247.000	398.599	2.3987					
	0+248.000	398.624	2.4994					

LISTADO BASE DE PLATAFORMA

Estación	Acera I.	Calz. I.	Calz. D.	Acera D.
0+000	0.750	1.600	1.600	0.750
0+155	0.750			0.750
0+172	1.000			1.000
0+176.690	1.150			
0+176.700	2.500			
0+188	2.500			
0+196.399	2.900			1.950
0+196.400	2.150			1.500
0+205	1.500			1.750
0+210	1.600	1.600	1.600	1.600
0+220	1.800	1.600	1.600	1.800
0+240	1.800	2.100	2.100	1.800
0+248.197	1.800	2.100	2.100	1.800

LISTADO BASE DE PERALTES

Estación	Acera I.	Prof.eje	Acera D.
0+000	-3.000	0.000	-3.000
0+155	-3.000	0.000	-3.000
0+158	-3.000	0.000	-0.500
0+162	-3.000	0.000	-3.000
0+176	-3.000	0.000	-3.000
0+179	1.000	0.000	-3.000
0+187	4.250	0.000	-3.000
0+195	9.500	0.000	-3.000
0+197	-3.000	0.000	-3.000
0+230	-3.000	0.000	-3.000
0+240	-3.000	0.000	-3.000
0+242	-3.000	0.000	3.000
0+248.197	-3.000	0.000	3.000

LISTADO BASE DE PENDIENTES

Estación	Acera I.	Prof.eje	Acera D.
0+000	-3.000	0.000	-3.000
0+155	-3.000	0.000	-3.000
0+158	-3.000	0.000	-0.500
0+162	-3.000	0.000	-3.000
0+176	-3.000	0.000	-3.000
0+179	1.000	0.000	-3.000
0+187	4.250	0.000	-3.000
0+195	9.500	0.000	-3.000
0+197	-3.000	0.000	-3.000
0+230	-3.000	0.000	-3.000
0+240	-3.000	0.000	-3.000
0+242	-3.000	0.000	3.000
0+248.197	-3.000	0.000	3.000

REPLANTEO DE LINEAS: CALZADA MD CADA 5m

	Estación	X	Y	Dist.	Cota
PS	0+000	640,779.425	4,715,048.451	1.600	397.113
	0+005	640,774.432	4,715,048.708	1.600	397.083
	0+010	640,769.438	4,715,048.965	1.600	397.053
	0+015	640,764.445	4,715,049.222	1.600	397.023
	0+020	640,760.179	4,715,050.030	1.600	396.992
	0+025	640,756.820	4,715,052.804	1.600	396.953
	0+030	640,753.409	4,715,056.460	1.600	396.914
	0+035	640,749.998	4,715,060.116	1.600	396.874
	0+040	640,746.587	4,715,063.772	1.600	396.835
	0+045	640,743.176	4,715,067.428	1.600	396.795
	0+050	640,739.765	4,715,071.083	1.600	396.755
	0+055	640,736.484	4,715,074.711	1.600	396.716
	0+060	640,733.746	4,715,078.614	1.600	396.676
	0+065	640,731.591	4,715,082.866	1.600	396.637
	0+070	640,730.064	4,715,087.382	1.600	396.597
	0+075	640,729.195	4,715,092.070	1.600	396.558
	0+080	640,728.688	4,715,097.028	1.600	396.589
	0+085	640,728.180	4,715,102.002	1.600	396.666
	0+090	640,727.673	4,715,106.976	1.600	396.745
	0+095	640,727.166	4,715,111.950	1.600	396.873
	0+100	640,726.658	4,715,116.924	1.600	396.987
	0+105	640,726.151	4,715,121.899	1.600	397.043
	0+110	640,725.643	4,715,126.874	1.600	397.100
	0+115	640,724.970	4,715,131.883	1.600	397.126
	0+120	640,724.290	4,715,136.837	1.600	397.077
	0+125	640,723.609	4,715,141.790	1.600	397.042
	0+130	640,722.928	4,715,146.744	1.600	397.007
	0+135	640,722.250	4,715,151.685	1.600	396.972
	0+140	640,721.614	4,715,156.642	1.600	396.915
	0+145	640,720.978	4,715,161.602	1.600	396.843
	0+150	640,720.342	4,715,166.561	1.600	396.771
	0+155	640,719.708	4,715,171.505	1.600	396.699
	0+160	640,719.221	4,715,176.448	1.600	396.620
	0+165	640,718.736	4,715,181.425	1.600	396.757
	0+170	640,718.251	4,715,186.401	1.600	396.887
	0+175	640,717.765	4,715,191.377	1.600	397.017
	0+180	640,717.280	4,715,196.354	1.600	397.165
	0+185	640,716.795	4,715,201.330	1.600	397.325
	0+190	640,716.318	4,715,206.288	1.600	397.485
	0+195	640,716.024	4,715,211.198	1.600	397.682
	0+200	640,715.975	4,715,216.118	1.600	397.932
	0+205	640,716.172	4,715,221.033	1.600	398.158
PS	0+210	640,716.614	4,715,225.941	1.600	398.288
	0+215	640,717.162	4,715,230.911	1.600	398.417
PS	0+220	640,717.709	4,715,235.881	1.600	398.486
	0+225	640,718.381	4,715,240.837	1.725	398.559
	0+230	640,719.053	4,715,245.794	1.850	398.631
	0+235	640,719.725	4,715,250.750	1.975	398.633
PS	0+240	640,720.396	4,715,255.706	2.100	398.575
	0+245	640,721.236	4,715,260.268	2.100	398.481
PS	0+248.197	640,722.101	4,715,263.345	2.100	

REPLANTEO DE LINEAS: CALZADA MI CADA 5m

	Estación	X	Y	Dist.	Cota
PS	0+000	640,779.261	4,715,045.255	-1.600	397.113
	0+005	640,774.267	4,715,045.512	-1.600	397.083
	0+010	640,769.274	4,715,045.769	-1.600	397.053
	0+015	640,764.281	4,715,046.026	-1.600	397.023
	0+020	640,758.817	4,715,047.135	-1.600	396.992
	0+025	640,754.480	4,715,050.621	-1.600	396.953
	0+030	640,751.069	4,715,054.277	-1.600	396.914
	0+035	640,747.658	4,715,057.933	-1.600	396.874
	0+040	640,744.247	4,715,061.589	-1.600	396.835
	0+045	640,740.836	4,715,065.245	-1.600	396.795
	0+050	640,737.425	4,715,068.900	-1.600	396.755
	0+055	640,734.003	4,715,072.691	-1.600	396.716
	0+060	640,731.002	4,715,076.967	-1.600	396.676
	0+065	640,728.641	4,715,081.627	-1.600	396.637
	0+070	640,726.967	4,715,086.576	-1.600	396.597
	0+075	640,726.015	4,715,091.713	-1.600	396.558
	0+080	640,725.504	4,715,096.703	-1.600	396.589
	0+085	640,724.997	4,715,101.677	-1.600	396.666
	0+090	640,724.489	4,715,106.651	-1.600	396.745
	0+095	640,723.982	4,715,111.625	-1.600	396.873
	0+100	640,723.475	4,715,116.600	-1.600	396.987
	0+105	640,722.967	4,715,121.574	-1.600	397.043
	0+110	640,722.460	4,715,126.547	-1.600	397.100
	0+115	640,721.800	4,715,131.448	-1.600	397.126
	0+120	640,721.119	4,715,136.401	-1.600	397.077
	0+125	640,720.439	4,715,141.355	-1.600	397.042
	0+130	640,719.758	4,715,146.308	-1.600	397.007
	0+135	640,719.077	4,715,151.274	-1.600	396.972
	0+140	640,718.440	4,715,156.235	-1.600	396.915
	0+145	640,717.804	4,715,161.195	-1.600	396.843
	0+150	640,717.168	4,715,166.154	-1.600	396.771
	0+155	640,716.531	4,715,171.129	-1.600	396.699
	0+160	640,716.036	4,715,176.138	-1.600	396.648
	0+165	640,715.551	4,715,181.114	-1.600	396.757
	0+170	640,715.066	4,715,186.090	-1.600	396.887
	0+175	640,714.580	4,715,191.067	-1.600	397.017
	0+180	640,714.095	4,715,196.043	-1.600	397.165
	0+185	640,713.610	4,715,201.020	-1.600	397.325
	0+190	640,713.130	4,715,206.016	-1.600	397.485
	0+195	640,712.826	4,715,211.087	-1.600	397.682
	0+200	640,712.775	4,715,216.166	-1.600	397.932
	0+205	640,712.979	4,715,221.241	-1.600	398.158
PS	0+210	640,713.433	4,715,226.292	-1.600	398.288
	0+215	640,713.981	4,715,231.262	-1.600	398.417
PS	0+220	640,714.528	4,715,236.232	-1.600	398.486
	0+225	640,714.952	4,715,241.215	-1.725	398.559
	0+230	640,715.375	4,715,246.199	-1.850	398.631
	0+235	640,715.798	4,715,251.182	-1.975	398.693
PS	0+240	640,716.222	4,715,256.166	-2.100	398.701
	0+245	640,717.193	4,715,261.405	-2.100	398.607
PS	0+248.197	640,718.059	4,715,264.483	-2.100	

2.2.- EJE 2 PASEO DE LA ALMADÍA

PLANTA: PUNTOS SINGULARES

Estación	Longitud	Coord. X	Coord. Y	Acimut	Radio	Parám.	X Centro	Y Centro
0+000.000	0.000	640,685.242	4,715,126.251	91.6151	Infinito			
0+040.264	40.264	640,725.157	4,715,131.539	91.6151	Infinito			
0+040.264	0.000	640,725.157	4,715,131.539	91.6151	5,000.000		641,381.799	4,710,174.844

PLANTA: PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

	Estación	Coor. X	Coor. Y	Acimut	Radio	Parám.
PS	0+000.000	640,685.242	4,715,126.251	91.6151	Infinito	
	0+005	640,690.199	4,715,126.908	91.6151		
	0+010	640,695.155	4,715,127.564	91.6151		
	0+015	640,700.112	4,715,128.221	91.6151		
	0+020	640,705.069	4,715,128.878	91.6151		
	0+025	640,710.025	4,715,129.534	91.6151		
	0+030	640,714.982	4,715,130.191	91.6151		
	0+035	640,719.939	4,715,130.847	91.6151		
	0+040	640,724.896	4,715,131.504	91.6151		
PS	0+040.264	640,725.157	4,715,131.539	91.6151	Infinito	

RASANTE: LISTADO DE VERTICES

Ver.	Estación	Cota	Pente.(%)	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha
1	0+018.000	396.690•				
2	0+027.000	397.212	5.8000•	10.413	-150.000•	-0.090
3	0+038.526	397.080•	-1.1417	0.000•	0.000	0.000
4	0+040.264	397.133	3.0000•			

RASANTE: PUNTOS DEL EJE CADA 10 METROS

	Estación	Cota	Pente.(%)	Cota Ver.	Long.(L)	Radio(kv)	Flecha	Theta(%)
	0+018.000	396.690	5.8000					
	0+020.000	396.806	5.8000					
TE	0+021.794	396.910	5.8000					
	0+025.000	397.062	3.6625					
V	0+027.000	397.122	2.3292	397.212	10.413	-150.000	-0.090	-6.9417
	0+030.000	397.162	0.3292					
PA	0+030.494	397.162	0.0000					
TS	0+032.206	397.153	-1.1417					
	0+035.000	397.121	-1.1417					
TE	0+038.526	397.080	-1.1417					
PB	0+038.526	397.080	-1.1417					
V	0+038.526	397.080	-1.1417	397.080	0.000	0.000	0.000	0.0000
TS	0+038.526	397.080	-1.1417					
	0+040.000	397.125	3.0000					
	0+040.264	397.133	3.0000					

LISTADO BASE DE PERALTES

Estación	Peralte izq.	Peralte der.
0+018	-1.000	-2.000
0+023	3.000	-3.000
0+032	3.000	-3.000
0+037	-1.000	-1.000
0+040.264	0.000	0.000

LISTADO BASE DE COTAS DE CALZADA

Estación	Acera I.	Prof.eje	Acera D.
0+018	-1.000	0.000	-2.000
0+023	-3.000	0.000	-3.000
0+032	-3.000	0.000	-3.000
0+037	1.000	0.000	-1.000
0+040.264	0.000	0.000	0.000

Anejo nº3

CALCULO HIDRAULICO

INDICE

1.- UNITARIO ACTUAL 2
2.- EMISARIO DE NILSA 3
3.- REDES C/JUAN DE BERRUETA 4
3.1.- FECALES 4
3.2.- PLUVIALES 5
3.3.- CAPACIDAD CONJUNTA CONDUCCIONES 6

1.-UNITARIO ACTUAL

En la c/Juan de Berrueta tenemos colector de HAØ500-600mm en forma de "L" procedente de la c/Mayor. Solo dispone de pendiente inicial del 1% en la cabecera de c/Juan de Berrueta, discurriendo el resto con pendientes del 0,5%-0,6%. Para una pendiente media de 0,68% la capacidad hidráulica máxima de este colector unitario sería de 270 a 439 l/s.

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.5	0.025	0.0150	0.0068	0.902	0.004	0.226	0.016	0.353	1.296	0.05		0.031
0.5	0.05	0.0150	0.0068	1.287	0.010	0.322	0.032	0.551	5.63	0.1		0.065
0.5	0.075	0.0150	0.0068	1.591	0.018	0.398	0.046	0.710	13.12	0.15		0.101
0.5	0.1	0.0150	0.0068	1.855	0.028	0.464	0.060	0.845	23.63	0.2		0.136
0.5	0.125	0.0150	0.0068	2.094	0.038	0.524	0.073	0.963	36.97	0.25		0.172
0.5	0.15	0.0150	0.0068	2.319	0.050	0.580	0.085	1.067	52.85	0.3		0.208
0.5	0.175	0.0150	0.0068	2.532	0.061	0.633	0.097	1.159	70.96	0.35		0.243
0.5	0.2	0.0150	0.0068	2.739	0.073	0.685	0.107	1.240	90.94	0.4		0.278
0.5	0.225	0.0150	0.0068	2.941	0.086	0.735	0.117	1.312	112.40	0.45		0.313
0.5	0.25	0.0150	0.0068	3.142	0.098	0.785	0.125	1.374	134.93	0.5		0.346
0.5	0.275	0.0150	0.0068	3.342	0.111	0.835	0.132	1.428	158.06	0.55		0.379
0.5	0.3	0.0150	0.0068	3.544	0.123	0.886	0.139	1.474	181.30	0.6		0.411
0.5	0.325	0.0150	0.0068	3.751	0.135	0.938	0.144	1.511	204.12	0.65		0.441
0.5	0.333	0.0150	0.0068	3.821	0.139	0.955	0.146	1.521	211.54	0.6667		0.451
0.5	0.35	0.0150	0.0068	3.965	0.147	0.991	0.148	1.539	225.93	0.7		0.471
0.5	0.36	0.0150	0.0068	4.053	0.151	1.013	0.149	1.548	234.23	0.72		0.482
0.5	0.37	0.0150	0.0068	4.143	0.156	1.036	0.150	1.555	242.22	0.74		0.493
0.5	0.38	0.0150	0.0068	4.235	0.160	1.059	0.151	1.560	249.84	0.76		0.504
0.5	0.39	0.0150	0.0068	4.330	0.164	1.083	0.152	1.564	257.05	0.78		0.515
0.5	0.4	0.0150	0.0068	4.429	0.168	1.107	0.152	1.566	263.78	0.8		0.525
0.5	0.41	0.0150	0.0068	4.531	0.172	1.133	0.152	1.567	269.97	0.82		0.535
0.5	0.42	0.0150	0.0068	4.637	0.176	1.159	0.152	1.565	275.54	0.84		0.545
0.5	0.43	0.0150	0.0068	4.749	0.180	1.187	0.151	1.561	280.41	0.86		0.554
0.5	0.45	0.0150	0.0068	4.996	0.186	1.249	0.149	1.545	287.61	0.9		0.572
0.5	0.475	0.0150	0.0068	5.381	0.193	1.345	0.143	1.505	289.96	0.95		0.590
0.5	0.4685	0.0150	0.0068	5.268	0.191	1.317	0.145	1.518	290.28	0.937	maximo	0.586
0.5	0.500	0.0150	0.0068	6.283	0.196	1.571	0.125	1.374	269.86	1	llena	0.596
0.5	0.500	0.0150	0.0068	6.283	0.196	1.571	0.125	1.374	269.86	1.000		0.596

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.6	0.03	0.0150	0.0068	0.902	0.005	0.271	0.020	0.399	2.107	0.05		0.038
0.6	0.06	0.0150	0.0068	1.287	0.015	0.386	0.038	0.623	9.16	0.1		0.080
0.6	0.09	0.0150	0.0068	1.591	0.027	0.477	0.056	0.802	21.33	0.15		0.123
0.6	0.12	0.0150	0.0068	1.855	0.040	0.556	0.072	0.955	38.43	0.2		0.166
0.6	0.15	0.0150	0.0068	2.094	0.055	0.628	0.088	1.087	60.11	0.25		0.210
0.6	0.18	0.0150	0.0068	2.319	0.071	0.696	0.103	1.205	85.93	0.3		0.254
0.6	0.21	0.0150	0.0068	2.532	0.088	0.760	0.116	1.308	115.38	0.35		0.297
0.6	0.24	0.0150	0.0068	2.739	0.106	0.822	0.129	1.400	147.88	0.4		0.340
0.6	0.27	0.0150	0.0068	2.941	0.123	0.882	0.140	1.481	182.78	0.45		0.382
0.6	0.3	0.0150	0.0068	3.142	0.141	0.942	0.150	1.552	219.41	0.5		0.423
0.6	0.33	0.0150	0.0068	3.342	0.159	1.003	0.159	1.613	257.02	0.55		0.463
0.6	0.36	0.0150	0.0068	3.544	0.177	1.063	0.167	1.664	294.81	0.6		0.501
0.6	0.39	0.0150	0.0068	3.751	0.195	1.125	0.173	1.706	331.92	0.65		0.538
0.6	0.400	0.0150	0.0068	3.821	0.200	1.146	0.175	1.718	343.98	0.6667		0.550
0.6	0.42	0.0150	0.0068	3.965	0.211	1.189	0.178	1.738	367.39	0.7		0.574
0.6	0.432	0.0150	0.0068	4.053	0.218	1.216	0.179	1.748	380.89	0.72		0.588
0.6	0.444	0.0150	0.0068	4.143	0.224	1.243	0.180	1.756	393.87	0.74		0.601
0.6	0.456	0.0150	0.0068	4.235	0.231	1.271	0.181	1.762	406.27	0.76		0.614
0.6	0.468	0.0150	0.0068	4.330	0.237	1.299	0.182	1.766	417.98	0.78		0.627
0.6	0.48	0.0150	0.0068	4.429	0.242	1.329	0.183	1.769	428.93	0.8		0.639
0.6	0.492	0.0150	0.0068	4.531	0.248	1.359	0.183	1.769	438.99	0.82		0.652
0.6	0.504	0.0150	0.0068	4.637	0.254	1.391	0.182	1.767	448.06	0.84		0.663
0.6	0.516	0.0150	0.0068	4.749	0.259	1.425	0.182	1.763	455.98	0.86		0.674
0.6	0.54	0.0150	0.0068	4.996	0.268	1.499	0.179	1.745	467.69	0.9		0.695
0.6	0.57	0.0150	0.0068	5.381	0.277	1.614	0.172	1.699	471.51	0.95		0.717
0.6	0.5622	0.0150	0.0068	5.268	0.275	1.581	0.174	1.715	472.03	0.937	maximo	0.712
0.6	0.600	0.0150	0.0068	6.283	0.283	1.885	0.150	1.552	438.82	1	llena	0.723
0.6	0.600	0.0150	0.0068	6.283	0.283	1.885	0.150	1.552	438.82	1.000		0.723

A priori este unitario sólo recibe ya en la actualidad aguas fecales de c/Mayor (un colector PVCØ315mm en cada margen) y Avenida Príncipe Viana (PVCØ250-Ø315mm), por lo que las necesidades de capacidad serán inferiores, equivalentes a un PVCØ250-315mm. En todo caso, en todas las inspecciones realizadas se ha observado un caudal apreciable en el colector, por lo que no son descartables aguas parasitas de infiltración en zonas superiores a estas dos calles, o aportes pluviales en momentos de escorrentía de estas zonas.

2.- EMISARIO DE NILSA

El emisario de Nilsa recorre la MI del Aragón tras su cruce al Norte del casco urbano (c/San Babil) y continua por el Paseo de la Almadía con un primer tramo de HAØ300mm y un segundo tramo, al que acomete ya c/Juan de Berrueta, en HAØ400mm de Nilsa. La pendiente del emisario de Nilsa aguas abajo de la conexión con el colector de c/Juan de Berrueta (pozo 15) ronda el 0,3-0,4%, por lo que la capacidad máxima de este emisario sería de 114 l/s. No es infrecuente en todo caso que este emisario entre en carga en época de lluvias, pero el área al Norte de la calle mayor sólo colaboraría en un 1/3·del área urbana total a esta situación, por lo que un valor máximo de referencia para el colector de Nilsa de 114 l/s es una estimación más que razonable para el entorno de la conexión con el unitario de c/Juan de Berrueta.

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.4	0.02	0.0150	0.0040	0.902	0.002	0.180	0.013	0.233	0.55	0.05		0.023
0.4	0.04	0.0150	0.0040	1.287	0.007	0.257	0.025	0.364	2.38	0.1		0.047
0.4	0.06	0.0150	0.0040	1.591	0.012	0.318	0.037	0.469	5.55	0.15		0.071
0.4	0.08	0.0150	0.0040	1.855	0.018	0.371	0.048	0.559	10.00	0.2		0.096
0.4	0.1	0.0150	0.0040	2.094	0.025	0.419	0.059	0.636	15.64	0.25		0.121
0.4	0.12	0.0150	0.0040	2.319	0.032	0.464	0.068	0.705	22.35	0.3		0.145
0.4	0.14	0.0150	0.0040	2.532	0.039	0.506	0.077	0.766	30.01	0.35		0.170
0.4	0.16	0.0150	0.0040	2.739	0.047	0.548	0.086	0.820	38.47	0.4		0.194
0.4	0.18	0.0150	0.0040	2.941	0.055	0.588	0.093	0.867	47.55	0.45		0.218
0.4	0.2	0.0150	0.0040	3.142	0.063	0.628	0.100	0.908	57.08	0.5		0.242
0.4	0.22	0.0150	0.0040	3.342	0.071	0.668	0.106	0.944	66.86	0.55		0.265
0.4	0.24	0.0150	0.0040	3.544	0.079	0.709	0.111	0.974	76.69	0.6		0.288
0.4	0.26	0.0150	0.0040	3.751	0.086	0.750	0.115	0.999	86.35	0.65		0.311
0.4	0.267	0.0150	0.0040	3.821	0.089	0.764	0.116	1.005	89.48	0.6667		0.318
0.4	0.28	0.0150	0.0040	3.965	0.094	0.793	0.118	1.017	95.57	0.7		0.333
0.4	0.288	0.0150	0.0040	4.053	0.097	0.811	0.119	1.023	99.08	0.72		0.341
0.4	0.296	0.0150	0.0040	4.143	0.100	0.829	0.120	1.028	102.46	0.74		0.350
0.4	0.304	0.0150	0.0040	4.235	0.102	0.847	0.121	1.031	105.68	0.76		0.358
0.4	0.312	0.0150	0.0040	4.330	0.105	0.866	0.121	1.034	108.73	0.78		0.366
0.4	0.32	0.0150	0.0040	4.429	0.108	0.886	0.122	1.035	111.58	0.8		0.375
0.4	0.328	0.0150	0.0040	4.531	0.110	0.906	0.122	1.036	114.20	0.82		0.383
0.4	0.336	0.0150	0.0040	4.637	0.113	0.927	0.122	1.034	116.56	0.84		0.391
0.4	0.344	0.0150	0.0040	4.749	0.115	0.950	0.121	1.032	118.62	0.86		0.398
0.4	0.36	0.0150	0.0040	4.996	0.119	0.999	0.119	1.021	121.66	0.9		0.413
0.4	0.38	0.0150	0.0040	5.381	0.123	1.076	0.115	0.995	122.66	0.95		0.430
0.4	0.3748	0.0150	0.0040	5.268	0.122	1.054	0.116	1.004	122.79	0.937	maximo	0.426
0.4	0.400	0.0150	0.0040	6.283	0.126	1.257	0.100	0.908	114.15	1	llena	0.442
0.4	0.400	0.0150	0.0040	6.283	0.126	1.257	0.100	0.908	114.15	1.000		0.442

3.- REDES C/JUAN DE BERRUETA

3.1.- FECALES

La capacidad de un nuevo colector de fecales PVCØ315mm para la c/Juan de Berrueta, con pendiente del 0,68%, sería de 84 l/s, en torno al 73.% de los 114 l/s estimados para el emisario de Nilsa en el punto de conexión. Existe la opción de disponer un colector de PVCØ250mm, con una capacidad de 45 l/s, en torno al 40% de los 114 l/s estimados para el emisario, cercano al 1/3 estimado de área urbana de servicio. Dado que no tenemos garantías de que no exista todavía un importante aporte de pluviales del extremo Norte del casco urbano, se ha optado por realizar el diseño con colector de PVCØ315mm para las fecales.

Capacidad Colector PVCØ250mm

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.2354	0.01177	0.0120	0.0068	0.902	0.001	0.106	0.008	0.267	0.22	0.05		0.015
0.2354	0.02354	0.0120	0.0068	1.287	0.002	0.151	0.015	0.417	0.94	0.1		0.032
0.2354	0.03531	0.0120	0.0068	1.591	0.004	0.187	0.022	0.537	2.20	0.15		0.050
0.2354	0.04708	0.0120	0.0068	1.855	0.006	0.218	0.028	0.639	3.96	0.2		0.068
0.2354	0.05885	0.0120	0.0068	2.094	0.009	0.247	0.035	0.728	6.20	0.25		0.086
0.2354	0.07062	0.0120	0.0068	2.319	0.011	0.273	0.040	0.807	8.86	0.3		0.104
0.2354	0.08239	0.0120	0.0068	2.532	0.014	0.298	0.046	0.876	11.90	0.35		0.122
0.2354	0.09416	0.0120	0.0068	2.739	0.016	0.322	0.050	0.938	15.25	0.4		0.139
0.2354	0.10593	0.0120	0.0068	2.941	0.019	0.346	0.055	0.992	18.85	0.45		0.156
0.2354	0.1177	0.0120	0.0068	3.142	0.022	0.370	0.059	1.040	22.62	0.5		0.173
0.2354	0.12947	0.0120	0.0068	3.342	0.025	0.393	0.062	1.081	26.50	0.55		0.189
0.2354	0.14124	0.0120	0.0068	3.544	0.027	0.417	0.065	1.115	30.40	0.6		0.205
0.2354	0.15301	0.0120	0.0068	3.751	0.030	0.441	0.068	1.143	34.23	0.65		0.220
0.2354	0.157	0.0120	0.0068	3.821	0.031	0.450	0.069	1.151	35.47	0.6667		0.224
0.2354	0.16478	0.0120	0.0068	3.965	0.033	0.467	0.070	1.164	37.88	0.7		0.234
0.2354	0.169488	0.0120	0.0068	4.053	0.034	0.477	0.070	1.171	39.28	0.72		0.239
0.2354	0.174196	0.0120	0.0068	4.143	0.035	0.488	0.071	1.176	40.61	0.74		0.245
0.2354	0.178904	0.0120	0.0068	4.235	0.035	0.498	0.071	1.180	41.89	0.76		0.250
0.2354	0.183612	0.0120	0.0068	4.330	0.036	0.510	0.071	1.183	43.10	0.78		0.255
0.2354	0.18832	0.0120	0.0068	4.429	0.037	0.521	0.072	1.185	44.23	0.8		0.260
0.2354	0.193028	0.0120	0.0068	4.531	0.038	0.533	0.072	1.185	45.27	0.82		0.265
0.2354	0.197736	0.0120	0.0068	4.637	0.039	0.546	0.072	1.184	46.20	0.84		0.269
0.2354	0.202444	0.0120	0.0068	4.749	0.040	0.559	0.071	1.181	47.02	0.86		0.274
0.2354	0.21186	0.0120	0.0068	4.996	0.041	0.588	0.070	1.169	48.23	0.9		0.282
0.2354	0.22363	0.0120	0.0068	5.381	0.043	0.633	0.067	1.138	48.62	0.95		0.290
0.2354	0.2205698	0.0120	0.0068	5.268	0.042	0.620	0.068	1.149	48.67	0.937	maximo	0.288
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1	llena	0.290
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1.000		0.290

Capacidad Colector PVCØ315mm

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.2354	0.01177	0.0120	0.0068	0.902	0.001	0.106	0.008	0.267	0.22	0.05		0.015
0.2354	0.02354	0.0120	0.0068	1.287	0.002	0.151	0.015	0.417	0.94	0.1		0.032
0.2354	0.03531	0.0120	0.0068	1.591	0.004	0.187	0.022	0.537	2.20	0.15		0.050
0.2354	0.04708	0.0120	0.0068	1.855	0.006	0.218	0.028	0.639	3.96	0.2		0.068
0.2354	0.05885	0.0120	0.0068	2.094	0.009	0.247	0.035	0.728	6.20	0.25		0.086
0.2354	0.07062	0.0120	0.0068	2.319	0.011	0.273	0.040	0.807	8.86	0.3		0.104
0.2354	0.08239	0.0120	0.0068	2.532	0.014	0.298	0.046	0.876	11.90	0.35		0.122
0.2354	0.09416	0.0120	0.0068	2.739	0.016	0.322	0.050	0.938	15.25	0.4		0.139
0.2354	0.10593	0.0120	0.0068	2.941	0.019	0.346	0.055	0.992	18.85	0.45		0.156
0.2354	0.1177	0.0120	0.0068	3.142	0.022	0.370	0.059	1.040	22.62	0.5		0.173
0.2354	0.12947	0.0120	0.0068	3.342	0.025	0.393	0.062	1.081	26.50	0.55		0.189
0.2354	0.14124	0.0120	0.0068	3.544	0.027	0.417	0.065	1.115	30.40	0.6		0.205
0.2354	0.15301	0.0120	0.0068	3.751	0.030	0.441	0.068	1.143	34.23	0.65		0.220
0.2354	0.157	0.0120	0.0068	3.821	0.031	0.450	0.069	1.151	35.47	0.6667		0.224
0.2354	0.16478	0.0120	0.0068	3.965	0.033	0.467	0.070	1.164	37.88	0.7		0.234
0.2354	0.169488	0.0120	0.0068	4.053	0.034	0.477	0.070	1.171	39.28	0.72		0.239
0.2354	0.174196	0.0120	0.0068	4.143	0.035	0.488	0.071	1.176	40.61	0.74		0.245
0.2354	0.178904	0.0120	0.0068	4.235	0.035	0.498	0.071	1.180	41.89	0.76		0.250
0.2354	0.183612	0.0120	0.0068	4.330	0.036	0.510	0.071	1.183	43.10	0.78		0.255
0.2354	0.18832	0.0120	0.0068	4.429	0.037	0.521	0.072	1.185	44.23	0.8		0.260
0.2354	0.193028	0.0120	0.0068	4.531	0.038	0.533	0.072	1.185	45.27	0.82		0.265
0.2354	0.197736	0.0120	0.0068	4.637	0.039	0.546	0.072	1.184	46.20	0.84		0.269
0.2354	0.202444	0.0120	0.0068	4.749	0.040	0.559	0.071	1.181	47.02	0.86		0.274
0.2354	0.21186	0.0120	0.0068	4.996	0.041	0.588	0.070	1.169	48.23	0.9		0.282
0.2354	0.22363	0.0120	0.0068	5.381	0.043	0.633	0.067	1.138	48.62	0.95		0.290
0.2354	0.2205698	0.0120	0.0068	5.268	0.042	0.620	0.068	1.149	48.67	0.937	maximo	0.288
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1	llena	0.290
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1.000		0.290

3.2.- PLUVIALES

Para el colector de pluviales se valoraron dos opciones, una conducción de PVCØ315mm al 0,68%, con una capacidad de 84 l/s, así como una conducción de PVCØ400mm al 0,68%, con una capacidad de 158 l/s. La primera opción es más que suficiente para un colector de sólo recogería la pluviales de c/Juan de Berrueta (mitad Norte) y Plaza Santo Domingo y aportes parciales de pluviales desde c/Mayor y c/Príncipe de Viana al colector fecal. Teniendo en cuenta que estos aportes pueden ser mayores de los estimados, así como la presencia del punto bajo de c/J. Berrueta nº10 (antiguo matadero), se ha de valorar la opción de un colector pluvial de PVCØ400mm. En ambos casos dispondríamos de un aliviado al mismo desde el nuevo colector fecal en la conexión/cabecera con la c/Mayor para que ambas conducción, en caso de aportes pluviales, puedan trabajar de manera conjunta.

Capacidad Colector PVCØ315mm

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.2354	0.01177	0.0120	0.0068	0.902	0.001	0.106	0.008	0.267	0.22	0.05		0.015
0.2354	0.02354	0.0120	0.0068	1.287	0.002	0.151	0.015	0.417	0.94	0.1		0.032
0.2354	0.03531	0.0120	0.0068	1.591	0.004	0.187	0.022	0.537	2.20	0.15		0.050
0.2354	0.04708	0.0120	0.0068	1.855	0.006	0.218	0.028	0.639	3.96	0.2		0.068
0.2354	0.05885	0.0120	0.0068	2.094	0.009	0.247	0.035	0.728	6.20	0.25		0.086
0.2354	0.07062	0.0120	0.0068	2.319	0.011	0.273	0.040	0.807	8.86	0.3		0.104
0.2354	0.08239	0.0120	0.0068	2.532	0.014	0.298	0.046	0.876	11.90	0.35		0.122
0.2354	0.09416	0.0120	0.0068	2.739	0.016	0.322	0.050	0.938	15.25	0.4		0.139
0.2354	0.10593	0.0120	0.0068	2.941	0.019	0.346	0.055	0.992	18.85	0.45		0.156
0.2354	0.1177	0.0120	0.0068	3.142	0.022	0.370	0.059	1.040	22.62	0.5		0.173
0.2354	0.12947	0.0120	0.0068	3.342	0.025	0.393	0.062	1.081	26.50	0.55		0.189
0.2354	0.14124	0.0120	0.0068	3.544	0.027	0.417	0.065	1.115	30.40	0.6		0.205
0.2354	0.15301	0.0120	0.0068	3.751	0.030	0.441	0.068	1.143	34.23	0.65		0.220
0.2354	0.157	0.0120	0.0068	3.821	0.031	0.450	0.069	1.151	35.47	0.6667		0.224
0.2354	0.16478	0.0120	0.0068	3.965	0.033	0.467	0.070	1.164	37.88	0.7		0.234
0.2354	0.169488	0.0120	0.0068	4.053	0.034	0.477	0.070	1.171	39.28	0.72		0.239
0.2354	0.174196	0.0120	0.0068	4.143	0.035	0.488	0.071	1.176	40.61	0.74		0.245
0.2354	0.178904	0.0120	0.0068	4.235	0.035	0.498	0.071	1.180	41.89	0.76		0.250
0.2354	0.183612	0.0120	0.0068	4.330	0.036	0.510	0.071	1.183	43.10	0.78		0.255
0.2354	0.18832	0.0120	0.0068	4.429	0.037	0.521	0.072	1.185	44.23	0.8		0.260
0.2354	0.193028	0.0120	0.0068	4.531	0.038	0.533	0.072	1.185	45.27	0.82		0.265
0.2354	0.197736	0.0120	0.0068	4.637	0.039	0.546	0.072	1.184	46.20	0.84		0.269
0.2354	0.202444	0.0120	0.0068	4.749	0.040	0.559	0.071	1.181	47.02	0.86		0.274
0.2354	0.21186	0.0120	0.0068	4.996	0.041	0.588	0.070	1.169	48.23	0.9		0.282
0.2354	0.22363	0.0120	0.0068	5.381	0.043	0.633	0.067	1.138	48.62	0.95		0.290
0.2354	0.2205698	0.0120	0.0068	5.268	0.042	0.620	0.068	1.149	48.67	0.937	maximo	0.288
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1	llena	0.290
0.2354	0.235	0.0120	0.0068	6.283	0.044	0.740	0.059	1.040	45.25	1.000		0.290

Capacidad Colector PVCØ400mm

DIAMETRO	CALADO	MANNING	PENDIENTE	ALFA	AREA	PERIMETRO	RADIO HID.	VELOCIDAD	CAUDAL	Y / D		E
0.3766	0.01883	0.0120	0.0068	0.902	0.002	0.170	0.012	0.365	0.761	0.05		0.026
0.3766	0.03766	0.0120	0.0068	1.287	0.006	0.242	0.024	0.571	3.31	0.1		0.054
0.3766	0.05649	0.0120	0.0068	1.591	0.010	0.300	0.035	0.735	7.70	0.15		0.084
0.3766	0.07532	0.0120	0.0068	1.855	0.016	0.349	0.045	0.875	13.87	0.2		0.114
0.3766	0.09415	0.0120	0.0068	2.094	0.022	0.394	0.055	0.996	21.70	0.25		0.145
0.3766	0.11298	0.0120	0.0068	2.319	0.028	0.437	0.064	1.104	31.02	0.3		0.175
0.3766	0.13181	0.0120	0.0068	2.532	0.035	0.477	0.073	1.199	41.65	0.35		0.205
0.3766	0.15064	0.0120	0.0068	2.739	0.042	0.516	0.081	1.283	53.38	0.4		0.235
0.3766	0.16947	0.0120	0.0068	2.941	0.049	0.554	0.088	1.357	65.99	0.45		0.263
0.3766	0.1883	0.0120	0.0068	3.142	0.056	0.592	0.094	1.422	79.21	0.5		0.291
0.3766	0.20713	0.0120	0.0068	3.342	0.063	0.629	0.100	1.478	92.79	0.55		0.318
0.3766	0.22596	0.0120	0.0068	3.544	0.070	0.667	0.105	1.525	106.43	0.6		0.345
0.3766	0.24479	0.0120	0.0068	3.751	0.077	0.706	0.109	1.563	119.83	0.65		0.369
0.3766	0.251	0.0120	0.0068	3.821	0.079	0.720	0.110	1.574	124.18	0.6667		0.377
0.3766	0.26362	0.0120	0.0068	3.965	0.083	0.747	0.112	1.593	132.63	0.7		0.393
0.3766	0.271152	0.0120	0.0068	4.053	0.086	0.763	0.113	1.602	137.50	0.72		0.402
0.3766	0.278684	0.0120	0.0068	4.143	0.088	0.780	0.113	1.609	142.19	0.74		0.411
0.3766	0.286216	0.0120	0.0068	4.235	0.091	0.798	0.114	1.615	146.67	0.76		0.419
0.3766	0.293748	0.0120	0.0068	4.330	0.093	0.815	0.114	1.619	150.90	0.78		0.427
0.3766	0.30128	0.0120	0.0068	4.429	0.096	0.834	0.115	1.621	154.85	0.8		0.435
0.3766	0.308812	0.0120	0.0068	4.531	0.098	0.853	0.115	1.621	158.48	0.82		0.443
0.3766	0.316344	0.0120	0.0068	4.637	0.100	0.873	0.114	1.619	161.75	0.84		0.450
0.3766	0.323876	0.0120	0.0068	4.749	0.102	0.894	0.114	1.615	164.62	0.86		0.457
0.3766	0.33894	0.0120	0.0068	4.996	0.106	0.941	0.112	1.599	168.84	0.9		0.469
0.3766	0.35777	0.0120	0.0068	5.381	0.109	1.013	0.108	1.557	170.22	0.95		0.481
0.3766	0.3528742	0.0120	0.0068	5.268	0.108	0.992	0.109	1.571	170.41	0.937	maximo	0.479
0.3766	0.377	0.0120	0.0068	6.283	0.111	1.183	0.094	1.422	158.42	1	llena	0.480
0.3766	0.377	0.0120	0.0068	6.283	0.111	1.183	0.094	1.422	158.42	1.000		0.480

3.3.- CAPACIDAD CONJUNTA CONDUCCIONES

La capacidad conjunta de la conducción de PVCØ315mm y PVCØ400mm sería de 242 l/s (84+158), frente a la solución de doble conducción de PVCØ315mm, con una capacidad conjunta de 168 l/s (84+84 l/s). Ambas superarían la capacidad estimada del colector de Nilsa (114 l/s).

La solución de una renovación estándar con PVCØ250mm para fecales y PVCØ315mm, con una capacidad conjunta de 129 l/s (45+84 l/s) también podría ser una solución válida (≥114 l/s), aunque con un margen de seguridad mucho menor.

Anejo nº4

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

INDICE

1 ELEMENTOS.....2
2 DESCOMPUESTOS.....3

1 ELEMENTOS

E L E M E N T O S

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Um	Descripción	Precio
h	Peón ordinario.	16,00
h	Oficial 2ª	18,00
h	Oficial 1ª	20,00
h	Encargado	22,00
ud	Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, color negro de medidas 1000X100 mm	28,00
ud	Base bolardo desmontable	80,00
ud	Collarín de toma en fundición nodular con recubrimiento de resina epoxi y tornillería de acero inox. para tubería de fundición o de polietileno y salida de 1"	28,00
ud	Collarín de toma en fundición nodular con recubrimiento de resina epoxi y tornillería de acero inox. para tubería de fundición o de polietileno y salida de 2"	21,00
ud	Pieza enlace (manguito, codo, enlace rosca macho, enlace rosca hembra, etc.) de latón, para tuberia de PE-B con diametro de 32 mm.	2,90
ud	Pieza enlace (manguito, codo, enlace rosca macho, enlace rosca hembra, etc.) de polipropileno con fibra de vidrio, para tuberia de PE-B con diametro de 50 mm.	2,36
ud	Contador antihielo de D=13/15 mm homologado.	20,00
ud	Arqueta de contadores de fundición, con aislante térmico, de 52x21x21 cm.	130,00
ud	Valvulería y piecerío dentro de la caja de contador, para acometidas de 1",	18,00
ud	Codo de fundición nodular EE con juntas, D=200mm.	214,96
ud	Manguito de fundición nodular, Enlace-Brida, con todos sus accesorios, diámetro 200 mm.	55,29
ud	Reducción de fundición nodular BB con juntas, D=300mm.	381,00
ud	Te de fundición dúctil, brida-brida con todos sus accesorios, derivación a varios diámetros, diámetro DN=200 mm.	180,00
ml	Te de fundición dúctil, enchufe-brida con todos sus accesorios, derivación a varios diámetros, D 200mm.	74,19
ud	Alargadera telescópica de longitud 900-1300mm para válvulas de DN100/125/150	71,90
ud	Arqueta registro para válvula enterrada	19,50
ml	Tuberia de fundición dúctil de junta automática flexible diámetro 100 mm.	41,60
ml	Tubería de fundición dúctil con junta automática flexible diámetro 200 mm.	73,60
ud	Conjunto de tornillo y tuerca en acero bicromatado, para bridas, DN-200	1,26
ud	Conjunto de tornillo y tuerca en acero bicromatado, para bridas, DN-300	2,46
ud	Junta de PVC, para diámetro DN-200 mm.	2,40
ud	Junta de PVC, para diámetro DN-250 mm.	2,70
ud	Manguitos electrosoldados de Polietileno D=90	13,00

Um	Descripción	Precio
ud	Enlace Mixto Brida de Polietileno D=90	19,11
ud	Te de Polietileno D=90, electrosoldable	24,80
ml	Tuberia de polietileno de baja densidad para una presión de 10 atm. con un diámetro exterior de 32 mm.	2,20
ml	Tuberia de polietileno de baja densidad para una presión de 10 atm. con un diámetro exterior de 63 mm. p.p de elementos de unión, en obra.	8,20
ml	Tuberia de polietileno de baja densidad para una presión de 10 atm. con un diámetro exterior de 75 mm.	11,70
ud	Válvula de compuerta cierre elástico, con cuerpo de fundición nodular, con bridas PN-16 y cuerpo largo, D=200mm. Tipo funditubo o similar.	700,00
ud	Boca de riego arqueta de DN=50mm. de cuadradillo, incluido adquisición y colocación del pie-cerio y arqueta metálica incorporada.	98,15
kg	Pintura vial	1,85
kg	Micro-esferas de vidrio	0,85
ud	Señal circular 60 cm. reflectante	70,00
ud	Señal cuadrada 40 cm. reflectante	65,00
ml	Poste hierro galvanizado, para señales	7,00
ud	Pieza sujección señales A	1,35
m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, procedente de planta, en obra.	85,00
m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa, procedente de planta, en obra.	88,00
kg	Mortero con resinas de apoyo y fijación	1,30
m2	Mallazo 15/15/8/8	4,21
m2	Mallazo 15/15/10/10	7,92
m2	Mallazo 15/15/12/12	10,82
kg	Alambre de atar para montaje de armaduras	1,60
m3	Madera escuadrada a dos ó cuatro caras de 50X50 mm.,50X100mm.	350,00
m3	Tabla de encofrar de 30 mm.	120,20
m2	P/p de panel fenólico con sus accesorios en alquiler.	3,60
m2	P/p de andamios, pasarelas y medidas de seguridad.	1,80
ud	Medios auxiliares, separadores, desencofrante, espadas,.. etc.	1,08
t	Betún asfáltico par mezcla.	620,00
ud	Derivación pinza de unión de tubo de acometida de PVC 160 mm. a colector de PVC 250 mm.	48,08

Um	Descripción	Precio
ud	Marco y tapa, fuerte, de fundición nodular de 40x40 cm.	26,50
ud	Módulo recrecido prefabricado de hormigón armado, para pozo de registro de saneamiento, de 1000 mm. de diámetro interior y 250 mm. de altura, incluso p/p de juntas.	98,00
ud	Cono para pozo 0-1000, incluso junta "Forshide F-114" de unión, de 0,85 m. de altura.	170,00
ud	Módulo base, para pozo de registro de saneamiento, prefabricado de hormigón armado con cemento sulforresisente, de 1000 mm. de diámetro interior, incluso p/p de taladros y juntas para las acometidas del colector, puesto en obra.	295,00
ud	Arqueta prefabricada de hormigón para sumidero de 50x30x50 cm.	38,00
ud	Pate aluminio estrusionado con tacos incorporados, para colocación en seco, para pozo de registro.	6,01
ud	Tapa de registro en fundición ductil, tipo D400 PAMREX de Funditubo osimilar, para 40 Tm., con asiento de neopreno, cierre en FD. y luz libre diámetro 60cm.	196,00
ud	Rejilla cóncava SQUADRA 400 clase C250 Marco y rejilla de fundición nodular de 400 x 400 mm.	98,00
ml	Tuberia de PVC. de saneamiento UNE-1452, diámetro exterior 110 mm.	3,60
ml	Tuberia de PVC. de saneamiento UNE-1452, diámetro exterior 160 mm.	11,35
ml	Tuberia de PVC. de saneamiento s/UNE EN-14011, diámetro exterior 200 mm.	17,37
ml	Tuberia de PVC. de saneamiento (5 atm.), color teja, diámetro exterior 315 mm.	38,00
ud	Base arqueta de PVC de D=400 mm, con varias salidas d=160 mm, en obra.	46,00
ml	Cinta de señalización enterrada en zanjas, indicando distintas conducciones enterradas.	0,17
m2	Entibación mediante paneles metálicos, de altura variable, incluídas todas las operaciones necesarias, alquiler de materiales, mano de obra, etc. (la medición incluye las dos caras)	5,00
t	Grava, de tamaño variable, procedente de cantera, puesto en obra.	10,80
t	Zahorra artificial procedente de cantera ZA-25, en obra.	9,80
t	Suelo seleccionado procedente de cantera, todo uno de 2ª, en obra.	8,50
t	Grava, de tamaño variable, procedente de cantera, puesto en obra.	7,60
t	Mezcla asfáltica de árido calizo S-20	19,00
t	Mezcla asfáltica de árido ofítico D-12	25,90
m2	Baldosa prefabricada hidraúlica estriadas de color gris o negro tipo a decidir en obra	11,00
ml	Lámina plástica para señalizacion de canalización eléctrica.	0,50
ml	Tubo TPC de polietileno de D=160 mm., con doble pared, exterior corrugado e interior liso. S/UNE EN 50086-2-4. Para canalización electrica	4,30
ud	Base prefabricada de hormigón para arqueta tipo Iberdrola de 1.00x1.00x060 m., puesta en obra.	59,80
ud	Troncopirámide prefabricada de hormigón para arqueta tipo Iberdrola de 1.00x1.00x060, puesta en obra.	30,05

Um	Descripción	Precio
ud	Marco y tapa de fundición dúctil tipo M2-T2, Norma Iberdrola NI-50.20.02, de 0.70x0.70	140,00
ml	Tubo TPC de polietileno de D=110 mm., con doble pared, exterior corrugado e interior liso. S/UNE EN 50086-2-4. Para canalización electrica	2,70
ud	Arqueta tipo HF, prefabricada, incluyendo tapa y cerco, en obra.	180,00
ud	Tapa de arqueta H prefabricada de hormigón armado, en obra.	140,00
ud	Arqueta tipo MF, prefabricada, incluyendo tapa y cerco, en obra.	62,81
ud	Tapa y marco fundición fuerte 417X400 mm., para arqueta de alumbrado.	18,00
ud	Arqueta prefabricada de hormigón de medidas interiores 40x40 cm y altura variable, puesto en obra.	18,00
h	Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente	80,00
h	Planta de aglomerado asfáltica en caliente de una producción 150 Tn/h	400,00
h	Compactador autopropulsado de neumáticos	45,00
h	Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn	45,00
h	Compactador vibrador autopropulsado de 160Tn.	48,00
h	Compactador vibrador manual de bandeja grande	6,41
h	Camión basculante de 24 toneladas	55,00
h	Camión cisterna de 10.000 litros	40,00
h	Camión dumper de 3 ejes	52,00
h	Camión grua con brazo telescópico.	45,00
h	Camión grúa de 5 toneladas	45,00
h	Pala mixta sobre neumaticos	48,00
h	Pala cargadora sobre orugas (tipo CAT9551)	50,00
h	Retroexcavadora de orugas mediana	54,00
h	Retroexcavadora sobre neumaticos mediana	50,00
m3	Bombeo de Hormigòn por equipo especial.	7,00
h	Equipo especial, martillo rompedor acoplado a retroexcavadora.	16,83
h	Equipo especial Marcador de viales pesado	24,02
h	Equipo especial Taladro para perforar tuberia de PVC en cualquier diametro, para acometida de 250 mm.	4,81
h	Compresor con martillos neumáticos	9,00
h	Dumper de obra	12,00
h	Perforadora con broca de diamante	4,00
h	Pequeño equipo Vibrador de agujas.	2,00

Um	Descripción	Precio
h	Grupo electrógeno hasta 10 KVA	8,00
m3	Mortero 1:6	85,00
kg	Cemento	0,30

2 DESCOMPUESTOS.

D E S C O M P U E S T O S

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

1 **ml** Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada. **5,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0500	ml	Tuberia PE-A 10atm. 32mm.	2,20	2,3100
0,0340	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	2,1148
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,2655
			Suma	4,6903
			Redondeo	-0,0003
			Total	**4,69**

2 **ml** Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada. **13,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tuberia PE-A 10atm. 63mm.	8,20	8,2000
0,0300	ud	Manguitos electrosoldadosde Polietileno D=90	13,00	0,3900
0,1200	h	Oficial 2ª	18,00	2,1600
0,1200	h	Peón ordinario.	16,00	1,9200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,7602
			Suma	13,4302
			Redondeo	-0,0002
			Total	**13,43**

3 **ml** Te de Polietileno D=90 , electrosoldable con salida a varios diámetros, p/p de reducciones , medios auxiliares, totalmente instalada y probada. **32,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Enlace Mixto Brida de Polietileno D=90	24,80	24,8000
0,1580	h	Peón ordinario.	16,00	2,5280
0,1580	h	Oficial 1ª	20,00	3,1600
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,8293
			Suma	32,3173
			Redondeo	0,0027
			Total	**32,32**

4 **ud** Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=200 mm., con piezas necesarias, suministro y colocación. Totalmente instalado. **72,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Manguito FN, E-B. D=200mm	55,29	55,2900
0,1200	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	7,4640
0,1200	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	5,4000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	4,0892
			Suma	72,2432
			Redondeo	-0,0032
			Total	**72,24**

5 **ud** Codo de fundición nodular, D=200mm. E-E, para cualquier ángulo, con junta expres y accesorios, totalmnete colocado y probado. **245,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Codo FN, D=200mm.	214,96	214,9600
0,1500	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	9,3300
0,1500	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	6,7500
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	13,8624
			Suma	244,9024
			Redondeo	-0,0024
			Total	**244,90**

6 **ud** Reducción de fundición nodular BB ,de D=300mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y probado. **458,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Reducción, BB D=300mm.	381,00	381,0000
1,0000	ud	Junta PVC DN-250	2,70	2,7000
12,0000	ud	Tornilo y tuerca DN-300	2,46	29,5200
0,1800	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	11,1960
0,1800	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	8,1000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	25,9510
			Suma	458,4670
			Redondeo	0,0030
			Total	**458,47**

7 **ud** Trampillón de maniobra para válvula de compuerta enterrada en vial, formado por eje telescópico de maniobra de fundición dúctil, trampillón para todo tipo de válvulas de fundición, protección compuesta por tubería de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigón. S/planos, totalmente instalado y probado. **120,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tbria.PVC saneto.D=110mm.	3,60	3,6000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Arqueta registro para válvula enterrada	19,50	19,5000
1,0000	ud	Alargadera telescópica	71,90	71,9000
0,5000	h	Peón ordinario.	16,00	8,0000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
		Costes Indirectos	6,00	6,7800
			Suma	119,7800
			Redondeo	0,0000
			Total	**119,78**

8 ud "Te" de fundición nodular, brida-brida-brida, derivación a varios diámetros, con piezas necesarias, suministro y colocación, D=200mm. **258,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Te BBB, D=200m.	180,00	180,0000
1,0000	ud	Junta PVC DN-200	2,40	2,4000
12,0000	ud	Tornilo y tuerca DN-200	1,26	15,1200
0,2000	h	Camión grua brazo telesco	45,00	9,0000
0,6000	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	37,3200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	14,6304
			Suma	258,4704
			Redondeo	-0,0004
			Total	**258,47**

9 ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=100 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada. **50,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0300	ml	Tub. fundicion duc. D=100	41,60	42,8480
0,0400	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	2,4880
0,0400	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	1,8000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	2,8282
			Suma	49,9642
			Redondeo	-0,0042
			Total	**49,96**

10 ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=200 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada. **84,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tub. fundicion duc. D=200	73,60	73,6000
0,0500	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	3,1100
0,0500	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	2,2500
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	4,7376
			Suma	83,6976
			Redondeo	0,0024
			Total	**83,70**

11 ud Válvula de compuerta con bridas, de fundición nodular, de diámetro D=200 mm. y PN-16, tipo Euro-21 de Saint-Gobain o similar. Incluso p/p de tornillería bicromatada, juntas y volante.Totalmente instalada y probada. **780,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	VC D=200mm. PN-16	700,00	700,0000
0,2500	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	15,5500
2,0000	ud	Junta PVC DN-200	2,40	4,8000
12,0000	ud	Tornilo y tuerca DN-200	1,26	15,1200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	44,1282
			Suma	779,5982
			Redondeo	0,0018
			Total	**779,60**

12 ud Arqueta de registro de fundición nodular con aislante térmico, para el alojamiento del contador de 52x21x21 cm., con soporte fijo en interior, racord de desmontaje y juntas tóricas, llaves de entrada y salida de 1", enlaces, contador de 20 mm antihielo, piezas especiales y conexión a la acometida existente. Incluso relleno de la arqueta de material aislante témico, p/p de asiento con material granular y recibido con la rasante del pavimento.Totalmente instalada y probada. **197,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Arqueta de contadores de fundición, con aislante t	130,00	130,0000
1,0000	ud	Contador antihielo de D=20 mm	20,00	20,0000
1,0000	ud	Piecerío	18,00	18,0000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
0,5000	h	Peón ordinario.	16,00	8,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	11,1600
			Suma	197,1600
			Redondeo	0,0000
			Total	**197,16**

13 ud Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado. **42,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Collarín para 1"	28,00	28,0000
1,0000	ud	Pieza enlace PPFV.,D= 1"	2,90	2,9000
0,2500	h	Peón ordinario.	16,00	4,0000
0,2500	h	Oficial 1ª	20,00	5,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	2,3940
			Suma	42,2940
			Redondeo	-0,0040
			Total	**42,29**

14 ud Collarín de toma de 2" para boca de riego, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado. **32,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Collarín para 2"	21,00	21,0000
1,0000	ud	Pieza enlace PPFV.,D=11/2	2,36	2,3600
0,2000	h	Peón ordinario.	16,00	3,2000
0,2000	h	Oficial 1ª	20,00	4,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,8336
			Suma	32,3936
			Redondeo	-0,0036
			Total	**32,39**

15 Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía. **1.200,00**

Sin descomposición

16 ml Mantenimiento del funcinamiento de alumbrado, incluye cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento, con cable de tierra y tomas de tierra. Mantenimiento del funcinamiento. **11,00**

Sin descomposición

17 ud Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm para empotrar con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado. **68,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
0,9000	h	Peón ordinario.	16,00	14,4000
1,0000	ud	Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o si	28,00	28,0000
3,0000	kg	Mortero expansivo	1,30	3,9000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,5000	h	Grupo electrógeno hasta 10 KVA	8,00	4,0000
0,5000	h	Perforadora con broca de diamante	4,00	2,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	3,8700
			Suma	68,3700
			Redondeo	0,0000
			Total	**68,37**

18 ud Bolardo polipropileno flexible, desmontable, tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm., inclusos bases de sujección con cierre mediante llave de cabeza triangular para su extracción, con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado. **244,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
1,0000	h	Peón ordinario.	16,00	16,0000
1,0000	ud	Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o si	28,00	28,0000
2,0000	ud	Base bolardo de extracción	80,00	160,0000
6,0000	kg	Mortero expansivo	1,30	7,8000
0,5000	h	Grupo electrógeno hasta 10 KVA	8,00	4,0000
0,6000	h	Perforadora con broca de diamante	4,00	2,4000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	13,8240
			Suma	244,2240
			Redondeo	-0,0040
			Total	**244,22**

19 h Cuadrilla albañileria y colocación de elementos de urbanismo **54,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	h	Oficial 1ª	20,00	20,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
1,0000	h	Peón ordinario.	16,00	16,0000
			Suma	54,0000
			Redondeo	0,0000
			Total	**54,00**

20 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes. **114,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0500	m3	HM-20	85,00	89,2500
1,0000	m3	Bombeo Hormigòn eq. esp.	7,00	7,0000
0,1500	h	Cuadrilla hormigonado	72,20	10,8300

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,4248
			Suma	113,5048
			Redondeo	-0,0048
			Total	**113,50**

21 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado. **119,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	m3	HA-25	88,00	88,0000
1,0000	m3	Bombeo Hormigòn eq. esp.	7,00	7,0000
0,2000	h	PE Vibrador de agujas	2,00	0,4000
0,2400	h	Cuadrilla hormigonado	72,20	17,3280
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,7637
			Suma	119,4917
			Redondeo	-0,0017
			Total	**119,49**

22 m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado. **34,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,1000	m2	Panel fenólico.	3,60	3,9600
0,0100	m3	Madera escuadrada	350,00	3,5000
1,0000	ud	Medios auxiliares, separadores, desen	1,08	1,0800
0,1000	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	4,5000
0,2400	h	Cuadrilla encofradores	72,20	17,3280
1,0000	m2	P/p de andamios y medios de seguridad	1,80	1,8000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,9301
			Suma	34,0981
			Redondeo	0,0019
			Total	**34,10**

23 m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares. **17,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,1000	m2	Mallazo 15/15/10/10	7,92	8,7120
0,2100	kg	Alambre de atar	1,60	0,3360
0,1000	h	Cuadrilla ferrallas	72,20	7,2200

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,9761
			Suma	17,2441
			Redondeo	-0,0041
			Total	**17,24**

24 m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares. **22,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,1000	m2	Mallazo 15/15/12/12	10,82	11,9020
0,2500	kg	Alambre de atar	1,60	0,4000
0,0250	h	Camión grua brazo telesco	45,00	1,1250
0,1000	h	Cuadrilla ferrallas	72,20	7,2200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,2388
			Suma	21,8858
			Redondeo	0,0042
			Total	**21,89**

25 ml Mantenimiento de servicios de abastecimiento, tendidos aéreos con tubería de polietileno (protegida con coquilla aislante), conexiones provisionales a la red y a las viviendas.. etc. durante la ejecución de las obras. Incluye las dos fachadas de la calle. Incluso retirada de todas las instalaciones provisionales una vez finalizadas las obras. **14,00**

Sin descomposición

26 ml Localización de la tubería con medios mecánicos y/o manual asi como el mantenimiento del servicio del gas, incluye descubrir, protección de la tubería con arena y/o hormigón acondicionado de los paso con los distintos servicios de saneamiento y abastecimineto. Siguiendo la indicaciones de Gas Navarra. **22,00**

Sin descomposición

27 m3 Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares. **27,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,2000	t	Todo uno de 2ª	8,50	18,7000
0,0460	h	Peón ordinario.	16,00	0,7360
0,0460	h	Camión cisterna de 10 M3	40,00	1,8400
0,0460	h	Compactador autoprodo.160	48,00	2,2080
0,0460	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	2,3000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,5470
			Suma	27,3310
			Redondeo	-0,0010
			Total	**27,33**

28 m2 Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes **6,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,0400	h	EE.Martillo retro mediano	16,83	0,6732
0,0400	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	2,0000
0,0460	h	Camión dumper de 3 ejes	52,00	2,3920
0,0400	h	Peón ordinario.	16,00	0,6400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,3423
			Suma	6,0475
			Redondeo	0,0025
			Total	**6,05**

29 m3 Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. **8,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,0400	h	Peón ordinario.	16,00	0,6400
0,0400	h	Pala cargadora orugas me	50,00	2,0000
0,0400	h	Retroexcavadora orugas me	54,00	2,1600
0,0200	h	Compactador autoprodo.160	48,00	0,9600
0,0400	h	Camión dumper de 3 ejes	52,00	2,0800
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,4704
			Suma	8,3104
			Redondeo	-0,0004
			Total	**8,31**

30 m3 Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares. **27,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,2000	t	Todo uno de 2ª	8,50	18,7000
0,0400	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	1,9200
0,0200	h	Camión cisterna de 10 M3	40,00	0,8000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,2000	h	Compactador bandeja grand	6,41	1,2820
0,2000	h	Peón ordinario.	16,00	3,2000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,5541
			Suma	27,4561
			Redondeo	0,0039
			Total	**27,46**

31 m3 Relleno de zanjas con zahorra artificial (ZA-25), procedente de cantera, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 95% de Próctor Modificado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado. **28,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,2200	t	ZA-25	9,80	21,7560
0,0150	h	Cuadrilla de tierras	27,20	0,4080
0,0150	h	Camión cisterna de 10 M3	40,00	0,6000
0,0400	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	1,9200
0,2000	h	Compactador bandeja grand	6,41	1,2820
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,5580
			Suma	27,5240
			Redondeo	-0,0040
			Total	**27,52**

32 m3 Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario. **11,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,0300	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	1,4400
0,0300	h	Retroexcavadora orugas me	54,00	1,6200
1,0000	m2	Entibación mediante paneles metálicos, de altura variable, incluídas todas las operaciones necesarias, alquiler de materiales, mano de obra, etc. (la medición incluye las dos caras)	5,00	5,0000
0,0300	h	EE.Martillo retro mediano	16,83	0,5049
0,0300	h	Camión dumper de 3 ejes	52,00	1,5600
0,0300	h	Peón ordinario.	16,00	0,4800
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,6363
			Suma	11,2412
			Redondeo	-0,0012
			Total	**11,24**

33 m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares. **29,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,7000	t	Piedra caliza, de tamaño variable, pr	10,80	18,3600
0,1400	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	6,7200
0,1400	h	Peón ordinario.	16,00	2,2400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,6392
			Suma	28,9592
			Redondeo	0,0008
			Total	**28,96**

34 m3 Gravillín 3/8 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares. **29,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,7000	t	Piedra caliza, de tamaño variable, pr	10,80	18,3600
0,1400	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	6,7200
0,1400	h	Peón ordinario.	16,00	2,2400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,6392
			Suma	28,9592
			Redondeo	0,0008
			Total	**28,96**

35 m2 Losa prefabricada de hormigón similar a la existente, asentada sobre capa de mortero de cemento nivelada 6 cm de espesor, cemento de unión entre mortero y baldosa, humectado, maceado de las baldosas con medios manuales y mecánicos, recebados de las juntas con cemnto y arena silicea, barrido y limpieza. P/p de cortes y remates con arquetas y finales. Medios auxiliares, totalmente colocado. **30,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	m2	Bladosa Hidraúlica	11,00	11,0000
0,0300	m3	Mortero 1:3	85,00	2,5500
1,0000	kg	Cemento	0,30	0,3000
0,2500	h	Cuadrilla albañileria y	54,00	13,5000
0,0250	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	1,1250
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,7085
			Suma	30,1835
			Redondeo	-0,0035
			Total	**30,18**

36 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, AC 16 SURF 50/70 D OFITA (D-8), en capa de rodadura, incluído transporte, p/p de operaciones intermedias de su puesta en obra, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. (Art. 542 del PPTP) **127,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0300	t	Mezcla asfáltica de árido ofítico D-12 ofitico	25,90	26,6770
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,4000	h	Oficial 1ª	20,00	8,0000
0,8000	h	Peón ordinario.	16,00	12,8000
0,0240	h	Planta de aglomerado asfáltica	400,00	9,6000
0,2400	h	Compactador autopropulsado de neumáticos	45,00	10,8000
0,2400	h	Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn	45,00	10,8000
0,2400	h	Camión basculante 24 Tn.	55,00	13,2000
0,1000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	5,0000
0,2400	h	Dumper de obra	12,00	2,8800
0,2200	h	Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente	80,00	17,6000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	7,1734
			Suma	126,7304
			Redondeo	-0,0004
			Total	**126,73**

37 t Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas. **119,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	t	Mezcla asfáltica de árido calizo S-20	19,00	19,0000
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,4000	h	Oficial 1ª	20,00	8,0000
0,8000	h	Peón ordinario.	16,00	12,8000
0,0200	h	Planta de aglomerado asfáltica	400,00	8,0000
0,2400	h	Compactador autopropulsado de neumáticos	45,00	10,8000
0,2400	h	Compactador vibratorio utopropulsado de 12-14 Tn	45,00	10,8000
0,2400	h	Camión basculante 24 Tn.	55,00	13,2000
0,1000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	5,0000
0,2400	h	Dumper de obra	12,00	2,8800
0,2400	h	Extendedora de aglomerado asfáltico en caliente	80,00	19,2000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,7128
			Suma	118,5928
			Redondeo	-0,0028
			Total	**118,59**

38 m2 Impresión con una malla de acero o plástico de alta densidad con formato a decidir en obra po la D.O., sobre capa de aglomerado asfáltico recién extendida o recalentando previamente la superficie asfáltica con máquina de Infrarrojos. El sistema se acaba con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgaste tipo ZoruBond-PU o similar. **20,00**

Sin descomposición

39 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente. **657,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	t	Betún asfáltico	620,00	620,0000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	37,2000
			Suma	657,2000
			Redondeo	0,0000
			Total	**657,20**

40 m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. **1,00**

Sin descomposición

41 m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con una dotación de 1.5 kg/m2 de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. **1,00**

Sin descomposición

42 m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado. **29,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,2200	t	ZA-25	9,80	21,7560
0,0310	h	Peón ordinario.	16,00	0,4960
0,0310	h	Camión cisterna de 10 M3	40,00	1,2400
0,0310	m3	Grava de tamaño 19-24 mm.	28,96	0,8978
0,0310	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	1,5500
0,0310	h	Compactador autoprodo.160	48,00	1,4880
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,6457
			Suma	29,0735
			Redondeo	-0,0035
			Total	**29,07**

43 ml Acondicionado y reposiciones de las fachadas a la nueva rasante de la calle, con materiales igual o similar a los existentes, todo incluido, según las indicaciones de la Dirección de Obra. **13,00**

Sin descomposición

44 ud Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto **8.054,00**

Sin descomposición

45 ud Arqueta de Telefonos, tipo H prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos, regletas de suspensión de cables, soportes de enganches de poleas, marcco y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañia telefonía. **367,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Arqueta tipo HF	180,00	180,0000
1,0000	ud	Tapa arqueta tipo H	140,00	140,0000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	4,5000
0,2000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	9,6000
0,2000	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	12,4400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	20,7924
			Suma	367,3324
			Redondeo	-0,0024
			Total	**367,33**

46 ud Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañía de telefonía. **109,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Arqueta tipo MF	62,81	62,8100
0,3000	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	13,5000
0,3000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	14,4000
0,2000	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	12,4400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,1890
			Suma	109,3390
			Redondeo	0,0010
			Total	**109,34**

47 ml Canalización de telefonía, comprendiendo apertura de zanja, colocación de 2 tubos de PVC 110 mm.hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulforresistente, cinta de señalización relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20 no plástico, según planos. Totalmente terminado y probado. **26,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	1,1240
0,0300	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	0,8238
2,0300	ml	Tubo TPC D=110mm.	2,70	5,4810
0,1200	m3	HM-20	85,00	10,2000
1,0000	ml	Lámina plástica señalizac	0,50	0,5000
0,1000	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	6,2200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,4609
			Suma	25,8097
			Redondeo	0,0003
			Total	**25,81**

48 ml Canalización telefónica, comprendiendo apertura de zanja en terrenos libres, colocación de2 tubos PVC rígidos de 63 mm. (aportados por Telefónica), hormigonado del prisma con HM-20, relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20. Totalmente terminado y probado. **8,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	1,1240
0,0300	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	0,8238
0,0600	m3	HM-20	85,00	5,1000
0,0100	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	0,6220
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,4602
			Suma	8,1300
			Redondeo	0,0000
			Total	**8,13**

49 ud Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre de válvula de asiento elastico y válvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barcelona incluido arqueta de hormigón con marco y tapa,"T" de derivación, adquisición y colocación del piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado s/planos. **609,00**

Sin descomposición

50 ud Boca de riego de arqueta, de DN=50 mm., incluso arqueta, refuerzo bloque de apoyo de hormigón, abrazadera, tuberia de PAD 63 mm., adquisición y colocación del piecerío de enlace, s/planos, totalmente instalada y probada.. **212,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Boca de riego arqueta	98,15	98,1500
1,0000	ml	Te electr. Polietileno D=90	32,32	32,3200
2,0000	ud	Pieza enlace PPFV.,D=11/2	2,36	4,7200
4,0000	ml	Tuberia PE-A 10atm. 63mm.	8,20	32,8000
0,9000	h	Peón ordinario.	16,00	14,4000
0,9000	h	Oficial 1ª	20,00	18,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	12,0234
			Suma	212,4134
			Redondeo	-0,0034
			Total	**212,41**

51 m2 Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje. **18,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,8900	kg	Pintura vial	1,85	1,6465
0,5900	kg	Micro-esferas de vidrio	0,85	0,5015
0,4000	h	Peón ordinario.	16,00	6,4000
0,4000	h	Oficial 1ª	20,00	8,0000
0,0300	h	EE Marcas viales pesado	24,02	0,7206
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,0361
			Suma	18,3047
			Redondeo	-0,0047
			Total	**18,30**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe

52 ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción. **122,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Señal circular 60 cm. ref	70,00	70,0000
2,8000	ml	Poste hierro galvanizado.	7,00	19,6000
1,0000	ud	Pieza sujección señales A	1,35	1,3500
0,1000	m3	HM-20	85,00	8,5000
0,3000	h	Oficial 1ª	20,00	6,0000
0,3000	h	Peón ordinario.	16,00	4,8000
0,1000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	4,8000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,9030
			Suma	121,9530
			Redondeo	-0,0030
			Total	**121,95**

53 ud Señal cuadrada de 40 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción. **117,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Señal cuadrada 40 cm. reflectante	65,00	65,0000
2,8000	ml	Poste hierro galvanizado.	7,00	19,6000
1,0000	ud	Pieza sujección señales A	1,35	1,3500
0,1000	m3	HM-20	85,00	8,5000
0,3000	h	Oficial 1ª	20,00	6,0000
0,3000	h	Peón ordinario.	16,00	4,8000
0,1000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	4,8000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	6,6030
			Suma	116,6530
			Redondeo	-0,0030
			Total	**116,65**

54 ud Aletas de hormigón armado HA-25/B/20-IIa, de entrada o salida de desagües, incluso excavaciones y rellenos, p/p de impostas, según planos totalmente terminado. **179,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,0000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	22,4800
2,0000	m2	Encofrado plano V. P.P.	34,10	68,2000
0,6000	m3	Hormigón HA-25	119,49	71,6940

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
4,0000	m2	Mallazo 15/15/8/8	4,21	16,8400
			Suma	179,2140
			Redondeo	-0,0040
			Total	**179,21**

55 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta. **0,00**

Sin descomposición

56 t Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado. **90,00**

Sin descomposición

57 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5). **4,00**

Sin descomposición

58 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados. **7,00**

Sin descomposición

59 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados. **20,00**

Sin descomposición

60 ud Arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento con tubo de PVC D=160, incluyendo aqueta base de PVC D=400 mm. y altura variable inferior, marco y tapa de fundición nodular de 40 x 40 cm., formación de media caña de tubo de PVC en fondo, conexión a la tubería domiciliaria existente y a la nueva tubería de acometida. Incluso la localización de tubería de la acometida existente, medios auxiliares, según planos, totalmente terminado. **228,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,5000	ml	Tbria.PVC saneto.D=315mm.	38,00	95,0000
1,0000	ud	Base arqueta de polipropileno de D=315 mm, con var	46,00	46,0000
0,3000	m3	HM-20	85,00	25,5000
1,0000	ud	Tapa arqueta 40x40	26,50	26,5000
1,0000	h	Compresor con martillos neumáticos	9,00	9,0000
0,3000	h	Peón ordinario.	16,00	4,8000
0,4000	h	Oficial 1ª	20,00	8,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	12,8880
			Suma	227,6880
			Redondeo	0,0020
			Total	**227,69**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe

61 ud Marco y rejilla de fundición nodular cóncava SQUADRA 400 o simlar clase C250., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente instalado. **128,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Marco y rejilla de fundición nodular de 400x 400	98,00	98,0000
0,1500	m3	HM-20	85,00	12,7500
0,2000	h	Oficial 1ª	20,00	4,0000
0,4000	h	Peón ordinario.	16,00	6,4000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	7,2690
			Suma	128,4190
			Redondeo	0,0010
			Total	**128,42**

62 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores 0.4x0.40x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente terminado. **90,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Arqueta sumidero de 50x30x50 cm.	38,00	38,0000
0,1000	m3	HM-20	85,00	8,5000
0,2000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	10,0000
0,4500	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	27,9900
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	5,0694
			Suma	89,5594
			Redondeo	0,0006
			Total	**89,56**

63 ml Zanja para redes, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-25, con un ancho de zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. **13,00**

Sin descomposición

64 ud Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado. **204,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Cono 0-1000, estanco.	170,00	170,0000
0,2000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	10,0000
0,2000	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	12,4400

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	11,5464
			Suma	203,9864
			Redondeo	0,0036
			Total	**203,99**

65 ud Módulo recrecido para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior s/planos, y 250 mm. de altura, incluso p.p. de juntas, colocado y probado. **128,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Módulo recr. M-25	98,00	98,0000
0,2000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	10,0000
0,2000	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	12,4400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	7,2264
			Suma	127,6664
			Redondeo	0,0036
			Total	**127,67**

66 ud Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado. **359,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Base pozo D=1000 mm	295,00	295,0000
0,2000	h	Retroexcavadora neuma me	50,00	10,0000
0,4000	t	Piedra caliza, de tamaño variable, pr	10,80	4,3200
0,2000	m3	HM-20	85,00	17,0000
0,2000	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	12,4400
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	20,3256
			Suma	359,0856
			Redondeo	0,0044
			Total	**359,09**

67 ud Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado. **367,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Tapa rtro. PAMREX FD.40T D=60cm.	196,00	196,0000
0,1500	m3	HM-20	85,00	12,7500
0,0200	m3	Tabla de encofrar 30mm.	120,20	2,4040
1,0000	h	Compresor con martillos neumáticos	9,00	9,0000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	h	Dumper de obra	12,00	12,0000
1,0000	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	62,2000
40,0000	kg	Mortero expansivo	1,30	52,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	20,7812
			Suma	367,1352
			Redondeo	0,0048
			Total	**367,14**

68 ud Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado. **13,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ud	Pate aluminio para PR.	6,01	6,0100
0,1000	h	Cuadrilla fontaneria	62,20	6,2200
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,7338
			Suma	12,9638
			Redondeo	-0,0038
			Total	**12,96**

69 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/ UNE EN 1452-2, de 160 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas, entronques y conexiones a tuberías o pozoa de registro, pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. **16,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tbria.PVC saneto.D=160mm.	11,35	11,3500
0,0600	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	3,7320
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	0,9049
			Suma	15,9869
			Redondeo	0,0031
			Total	**15,99**

70 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE EN 1452-2, de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. **23,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tbria.PVC saneto.D=200mm.	17,37	17,3700
0,0700	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	4,3540

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,3034
			Suma	23,0274
			Redondeo	0,0026
			Total	**23,03**

71 ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. **44,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,0000	ml	Tbria.PVC saneto.D=315mm.	38,00	38,0000
0,0300	h	Cuadrilla tubo saneamient	62,20	1,8660
0,0300	h	Camión grúa de 5 TN.	45,00	1,3500
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	2,4730
			Suma	43,6890
			Redondeo	0,0010
			Total	**43,69**

72 ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado. **26,00**

Sin descomposición

73 ud Salida de bajante de pluviales a la calzada mediante adaptador en "T" de fundición nodular tipo Funditubo o similar, con brida de registro, de D=80-125 y tubería de PVC hasta conectar con pluviales, sujecciones y conexiones, totalmente terminado. **120,00**

Sin descomposición

74 ud Conexión del nuevo colector a la red de saneamiento existente, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento. **160,00**

Sin descomposición

75 ud Conexión a la red de abastecimiento existente con piecerío de fundición nodular, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento. **280,00**

Sin descomposición

76 ml Canalización eléctrica para alumbrado, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado. **26,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,2000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	2,2480

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	2,7460
2,0000	ml	Tubo TPC D=110mm.	2,70	5,4000
0,1200	m3	HM-20	85,00	10,2000
1,0000	ml	Cinta de señalización enterrada en zanjas, indican	0,17	0,1700
0,1000	h	Peón ordinario.	16,00	1,6000
0,1000	h	Oficial 1ª	20,00	2,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,4618
			Suma	25,8258
			Redondeo	0,0042
			Total	**25,83**

77 ml Canalización eléctrica para fuerzas eléctricas, compuesta de 1 tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado. **18,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,0800	m3	Excavación zanja todo.	11,24	0,8992
0,0400	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	1,0984
1,0000	ml	Tubo TPC D=110mm.	2,70	2,7000
0,1000	m3	HM-20	85,00	8,5000
1,0000	ml	Lámina plástica señalizac	0,50	0,5000
0,0600	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	3,7320
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,0458
			Suma	18,4754
			Redondeo	0,0046
			Total	**18,48**

78 ml Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 2 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado. **31,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1200	m3	Excavación zanja todo.	11,24	1,3488
0,0400	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	1,0984
2,0000	ml	Tubo TPC. D=160 mm.	4,30	8,6000
0,1400	m3	HM-20	85,00	11,9000
1,0000	ml	Lámina plástica señalizac	0,50	0,5000
0,1000	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	6,2200

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	1,7800
			Suma	31,4472
			Redondeo	0,0028
			Total	**31,45**

79 ml Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 3 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado. **36,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,3000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	3,3720
0,1000	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	2,7460
3,0000	ml	Tubo TPC. D=160 mm.	4,30	12,9000
0,1200	m3	HM-20	85,00	10,2000
1,0000	ml	Lámina plástica señalizac	0,50	0,5000
0,0700	h	Cuadrilla albañileria y	62,20	4,3540
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	2,0443
			Suma	36,1163
			Redondeo	0,0037
			Total	**36,12**

80 ud Arqueta prefabricada de hormigón, de M.T. y B.T., troncopiramidal modelo Iberdrola, de 1m. de profundidad tipo M2-T2. Con marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. Incluso excavación y rellenos, lecho de grava. Totalmente terminada. **303,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
0,5000	h	Peón ordinario.	16,00	8,0000
0,5000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	24,0000
1,0000	ud	Base arq. Iberdrola.	59,80	59,8000
1,0000	ud	Troncopirámide prefabricada de hormig	30,05	30,0500
0,2000	t	Piedra caliza, de tamaño variable, pr	7,60	1,5200
0,1500	m3	HM-20	85,00	12,7500
1,0000	ud	Marco y tapa Iberdrola.	140,00	140,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	17,1672
			Suma	303,2872
			Redondeo	0,0028
			Total	**303,29**

81 ud Reposición de arquetas existentes, con reposición de marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA, herramientas y medios auxiliares. **238,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
1,2000	h	Oficial 1ª	20,00	24,0000
1,2000	h	Peón ordinario.	16,00	19,2000
0,6000	h	Pala mixta sobre neumatic	48,00	28,8000
0,1500	m3	HM-20	85,00	12,7500
1,0000	ud	Marco y tapa Iberdrola.	140,00	140,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	13,4850
			Suma	238,2350
			Redondeo	0,0050
			Total	**238,24**

82 ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada. **65,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,3000	m3	Excavación zanja todo.	11,24	3,3720
0,0500	m3	Grava de tamaño 19-24 mm.	28,96	1,4480
1,0000	ud	Arqueta 40x40 cm.	18,00	18,0000
1,0000	ud	Tapa marco fción 417x400mm.	18,00	18,0000
0,8000	h	Peón ordinario.	16,00	12,8000
0,4000	h	Oficial 1ª	20,00	8,0000
		COSTOS INDIRECTOS	6,00	3,6972
			Suma	65,3172
			Redondeo	0,0028
			Total	**65,32**

83 h Cuadrilla fontaneria para acometidas y valvulas **62,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
			Suma	62,2000
			Redondeo	0,0000
			Total	**62,20**

84 h Cuadrilla encofradores **72,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
1,0000	h	Oficial 1ª	20,00	20,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
		Suma		72,2000
		Redondeo		0,0000
		Total		**72,20**

85 h Cuadrilla ferrallas **72,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
1,0000	h	Oficial 1ª	20,00	20,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
		Suma		72,2000
		Redondeo		0,0000
		Total		**72,20**

86 h Cuadrilla hormigonado de estructuras **72,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
1,0000	h	Oficial 1ª	20,00	20,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
		Suma		72,2000
		Redondeo		0,0000
		Total		**72,20**

87 h Cuadrilla colocación tubos saneamiento y pozos **62,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
			Suma	62,2000
			Redondeo	0,0000
			Total	**62,20**

88 h Cuadrilla de tierras **27,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 2ª	18,00	9,0000
1,0000	h	Peón ordinario.	16,00	16,0000
			Suma	27,2000
			Redondeo	0,0000
			Total	**27,20**

89 h Cuadrilla albañileria y colocación de elementos de urbanismo **62,00**

Cantidad	UM	Descripción	Precio	Importe
0,1000	h	Encargado	22,00	2,2000
0,5000	h	Oficial 1ª	20,00	10,0000
1,0000	h	Oficial 2ª	18,00	18,0000
2,0000	h	Peón ordinario.	16,00	32,0000
			Suma	62,2000
			Redondeo	0,0000
			Total	**62,20**

Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ªplanta
31192 Tajonar (NAVARRA)
Tfno.: (+34) 948 29 02 37
eunate@eunateing.com
EUNATE COMPAÑÍA DE INGENIERÍA, S.L

RELACIÓN DE UNIDADES POR ORDEN DE IMPORTE

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Tajonar, Agosto 2023

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Código	ud	Descripción de la Unidad	Precio	Med. Pres.	Imp. Pres.	%	Imp. Acumulado.	% Ac.
MTEZ00E11	m3	Relleno selec. zanjas. prestamos	27,46	543,31	14.919,29	6,34	14.919,29	6,34
USTV00031	ml	Tuberia PVC san. D=315	43,69	320,00	13.980,80	5,94	28.900,09	12,28
PAVCRS200	t	Mezcla calizo S-20	118,59	109,10	12.938,17	5,50	41.838,26	17,78
MTEZN0016	m3	Excavación zanja todo.	11,24	1.012,24	11.377,58	4,84	53.215,84	22,62
ABTFDU020	ml	Tubería fundición D=200	83,70	130,00	10.881,00	4,62	64.096,84	27,24
URCTC020	mk	Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros	0,12	90.531,34	10.863,76	4,62	74.960,60	31,86
PAVESTAM	m2	Estampación con cuadricula	19,60	479,40	9.396,24	3,99	84.356,84	35,85
PAV525BAH	m2	Losa prefabricada	30,18	302,50	9.129,45	3,88	93.486,29	39,73
PAVCRD128	t	Mezcla D-8, capa rodad.	126,73	64,94	8.229,85	3,50	101.716,14	43,23
MTED00010	m3	Suelo selecc. CBR>20 98%PM	27,33	297,49	8.130,40	3,46	109.846,54	46,69
SGYS1	ud	Partida alzada a justificar para la seguridad y sa	8.053,96	1,00	8.053,96	3,42	117.900,50	50,11
PAVZA0001	m3	Base zahorra artificial	29,07	237,98	6.918,08	2,94	124.818,58	53,05
MTXMI0014	m3	Gravillín 3/8 mm. asiento tuberia	28,96	232,74	6.740,15	2,86	131.558,73	55,92
URCTCb	m3	Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados	6,50	985,70	6.407,05	2,72	137.965,78	58,64
URCTCa	m3	Tasa en concepto de gestión de tierras y rocas	4,00	1.564,74	6.258,96	2,66	144.224,74	61,30
ESH0V200M	m3	Hormigón HM-20.	113,50	52,18	5.922,43	2,52	150.147,17	63,82
MTEDEM055	m2	Demolición de pavimento	6,05	951,90	5.759,00	2,45	155.906,17	66,27
PAVL00011	t	Lig.bitum.mezcla asf.cal.	657,20	8,48	5.573,06	2,37	161.479,23	68,63
USABH0R11	ud	Arqueta acomet. saneamiento D160	227,69	18,00	4.098,42	1,74	165.577,65	70,38
MTEDN0010	m3	Cajeado de la calle	8,31	490,27	4.074,14	1,73	169.651,79	72,11
PRANSATE	ml	Acondicionado de las fachadas a la nu	13,00	310,00	4.030,00	1,71	173.681,79	73,82
IMPGAS	ml	Mantenimiento del gas.	22,00	181,00	3.982,00	1,69	177.663,79	75,51
ABXHACONT	ud	Arqueta de registro de fundición nodular, par aloj	197,16	18,00	3.548,88	1,51	181.212,67	77,02

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Código	ud	Descripción de la Unidad	Precio	Med. Pres.	Imp. Pres.	%	Imp. Acumulado.	% Ac.
USMTPAR61	ud	Marco y tapa de fundición PAMREX	367,14	9,00	3.304,26	1,40	184.516,93	78,43
TFNCT2H10	ml	Can. telef. 2 D-110 HM-20	25,81	126,60	3.267,55	1,39	187.784,48	79,82
UUEAL02H2	ml	Can.eléc. 2 0-110 HM-20	25,83	125,00	3.228,75	1,37	191.013,23	81,19
UUEFE03H0	ml	Can.eléc. 3 0-160 HM-20	36,12	80,000	2.889,60	1,23	193.902,83	82,42
USMASE100	ud	Módulo base pozo D=1000	359,09	8,00	2.872,72	1,22	196.775,55	83,64
UUAX00002	ud	Salida de bajante de pluviales calzada.	120,00	21,00	2.520,00	1,07	199.295,55	84,71
IMPA	ml	Partida Alzada de abono integro abastecimiento	14,00	150,00	2.100,00	0,89	201.395,55	85,60
BOLARFDES	ud	Bolardo polipropileno desmontable	244,22	8,00	1.953,76	0,83	203.349,31	86,43
BOLARF	ud	Bolardo polipropileno tipo barcelona	68,37	28,00	1.914,36	0,81	205.263,67	87,24
USCONO100	ud	Modulo cónico D=1000	203,99	8,00	1.631,92	0,69	206.895,59	87,94
ABVVF2020	ud	Válvula comp. D=200mm	779,60	2,00	1.559,20	0,66	208.454,79	88,60
USAXXX001	ml	Zanja para redes	13,00	114,00	1.482,00	0,63	209.936,79	89,23
ALUMM	ml	Cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento:	11,00	130,00	1.430,00	0,61	211.366,79	89,84
ESHEMP002	m2	Encofrado plano V. P.P.	34,10	38,40	1.309,44	0,56	212.676,23	90,39
UUVAEL100	ud	Arqueta Iberdrola 1 m.	303,29	4,00	1.213,16	0,52	213.889,39	90,91
AFTEF		Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.	1.200,00	1,000	1.200,00	0,51	215.089,39	91,42
UUVAEL101	ud	Arqueta Iberdrola 1 m.	238,24	5,00	1.191,20	0,51	216.280,59	91,93
ABTFDU010	ml	Tubería fundición D=100	49,96	23,00	1.149,08	0,49	217.429,67	92,42
UUAX00001	ud	Conexiónes tuberias.	26,00	40,00	1.040,00	0,44	218.469,67	92,86
ESH0V250A	m3	Hormigón HA-25	119,49	7,60	908,12	0,39	219.377,79	93,24
UBSHS0002	m2	Marca vial símbolos, letr	18,30	46,36	848,39	0,36	220.226,18	93,60
USTV00016	ml	Tuberia PVC san. D=160	15,99	51,00	815,49	0,35	221.041,67	93,95
ABXXCONA1	ud	Collarín de toma 1"	42,29	18,00	761,22	0,32	221.802,89	94,27

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Código	ud	Descripción de la Unidad	Precio	Med. Pres.	Imp. Pres.	%	Imp. Acumulado.	% Ac.
PAVRI0000	m2	Riego de imprimación	1,15	649,40	746,81	0,32	222.549,70	94,59
TFNAT0H02	ud	Arqueta Telef.tipo HF	367,33	2,00	734,66	0,31	223.284,36	94,90
PAVRC0000	m2	Riego de adherencia.	1,10	649,40	714,34	0,30	223.998,70	95,21
UBSVCU4401	ud	Señal cuadrada 40 cm. ref	116,65	6,00	699,90	0,30	224.698,60	95,50
ESTRU2110	m2	Mallazo 15x15/10	17,24	38,400	662,02	0,28	225.360,62	95,79
TFNAT0M01	ud	Arqueta Telef.tipo MF	109,34	6,00	656,04	0,28	226.016,66	96,07
USAR00F01	ud	Marco y rejilla caz 40 x 40	128,42	5,000	642,10	0,27	226.658,76	96,34
UAXXXX0031	ud	Boca de riego	212,41	3,00	637,23	0,27	227.295,99	96,61
UAXHE2211	ud	Hidrante ent.D=100mm.2sal	609,00	1,00	609,00	0,26	227.904,99	96,87
UUAX00004	ud	Conexión a la red de abastecimiento existente, p.p	280,00	2,00	560,00	0,24	228.464,99	97,11
USM30-10O	ud	Anillo H=250 mm. D=1000	127,67	4,00	510,68	0,22	228.975,67	97,32
ABPFCE020	ud	Codo FN E-E, D=200mm.	244,90	2,000	489,80	0,21	229.465,47	97,53
ABPFRE030	ud	Reducción B-B, D=300mm.	458,47	1,000	458,47	0,19	229.923,94	97,73
URCTC030	t	Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)	90,00	5,00	450,00	0,19	230.373,94	97,92
USASCAH40	ud	Arqueta sumidero 40 x 40	89,56	5,000	447,80	0,19	230.821,74	98,11
USPATEPRC	ud	Pate para pozo registro	12,96	34,00	440,64	0,19	231.262,38	98,29
TFNCT2H63	ml	Can. telef. 2 D-63 HM-20	8,13	51,00	414,63	0,18	231.677,01	98,47
URCTCbb	t	Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados	20,00	20,00	400,00	0,17	232.077,01	98,64
UUVAX0H00	ud	Arqueta hormigón,40x40cm	65,32	6,00	391,92	0,17	232.468,93	98,81
MTXMI0012	m3	Grava de tamaño 19-24 mm.	28,96	12,00	347,52	0,15	232.816,45	98,96
USTV00020	ml	Tuberia PVC san. D=200	23,03	15,00	345,45	0,15	233.161,90	99,10
UUEFE01H0	ml	Can.eléc. 1 0-110 HM-20	18,48	18,00	332,64	0,14	233.494,54	99,24
ABTBBB020	ud	"Te" FN BBB, D=200mm.	258,47	1,00	258,47	0,11	233.753,01	99,35

Código	ud	Descripción de la Unidad	Precio	Med. Pres.	Imp. Pres.	%	Imp. Acumulado.	% Ac.
UBSVCR601	ud	Señal circular 60 cm. ref	121,95	2,00	243,90	0,10	233.996,91	99,46
@ABTAPREGV	ud	Suministro y colocación de Trampillón	119,78	2,00	239,56	0,10	234.236,47	99,56
ABPEA1032	ml	Tubería de polietileno 32 mm	4,69	51,00	239,19	0,10	234.475,66	99,66
UDA01A081	ud	Aletas desagües	179,21	1,00	179,21	0,08	234.654,87	99,74
UUAX00003	ud	Conexión de tuberías a la red de saneamiento exist	160,00	1,00	160,00	0,07	234.814,87	99,80
ABPFBE020	ud	Enlace FN B-E, D=200	72,24	2,000	144,48	0,06	234.959,35	99,87
ABPEA1063	ml	Tubería de polietileno 63mm	13,43	9,00	120,87	0,05	235.080,22	99,92
ABXXCONA2	ud	Collarín de toma 2"	32,39	3,00	97,17	0,04	235.177,39	99,96
ESTRU2112	m2	Mallazo 15x15/12	21,89	3,000	65,67	0,03	235.243,06	99,99
UUEFE02H0	ml	Can.eléc. 2 0-160 HM-20	31,45	1,00	31,45	0,01	235.274,51	100,00

Anejo nº5

MEMORIA

PLANOS

PLIEGO DE CONDICIONES

PRESUPUESTO

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

ÍNDICE

MEMORIA

1.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD..... 1
2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 2
3.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA OBRA. .. 4
3.1.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VAN A AEJECUTAR LAS OBRAS..... 4
3.2.- FINALIDAD PRINCIPAL DE LAS OBRAS. 7
3.3.- INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA..... 8
4.- ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA. 12
5.- OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES... 12
6.- MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA. 13
6.1.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 13
6.2.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA..... 13
7.- UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES..... 15
7.1.- PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA. 15
7.2.- PROCESO PRODUCTIVO PREVISTO. 15
7.3.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA REALIZACIÓN PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA. 15
8.- INSTALACIONES DE OBRA. 16
8.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS..... 16
8.2.- ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 17
9.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS. 18
9.1.- RIESGOS PROFESIONALES. 18
9.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 18
9.3.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS..... 18
9.4.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA OBRA. 73
10.- PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA. 73
11.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA. 74
12.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS. 75
12.1.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO..... 75
12.2.- SEÑALIZACIÓN VIAL. 76
13.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 77
13.1.- PRIMEROS AUXILIOS. 77
13.2.- LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS. 77
13.3.- MEDICINA PREVENTIVA. 77
13.4.- EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS. 77
14.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO. 78
15.- DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU APLICACIÓN, DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO. 78
16.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 80
17.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA. 80
18.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD. 80
19.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS FUTUROS. 81
20.- VALORACIÓN. 81

1.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El nombre del proyecto sobre el que se trabaja es "RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN GABARDERAL (SANGÜESA)".

Las actuaciones del presente proyecto se ubican en la calle Juan de Berrueta de Sangüesa/Zangoza, ciudad de la Comunidad Foral de Navarra situada a unos 45km al Este de Pamplona, en la MD del río Aragón, y a unos 10km al Suroeste del Embalse de Yesa. Su población ronda los 5.000 habitantes. Las obras se realizan en su práctica totalidad dentro del casco urbano y asociados a la calle referida, situada entre la c/Mayor (al Norte), la c/Alfonso el Batallador (al Este y al Sur) y el Paseo de la Almadía (al Oeste)

Las coordenadas UTM ETRS-89 (H30N) de la zona de actuación son:

Inicio actuación:	X=640.717	Y=4.715.258
Final actuación:	X=640.781	Y=4.715.046

La autoría tanto del Proyecto como del presente Estudio de Seguridad y Salud es de EUNATE COMPAÑIA DE INGENIERIA S.L.

La dirección y el teléfono de contacto EUNATE COMPAÑIA DE INGENIERIA S.L. son Parque Empresarial La Estrella, c/Berroa nº2 Tajonar (Navarra), con teléfono 948-290237 y correo electrónico eunate@eunateing.com.

El presupuesto de licitación del proyecto, (ejecución material + gastos generales + beneficio industrial + impuesto del valor añadido –IVA.-) asciende a la cantidad de **TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (330.231,29 €).**

El Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra será el responsable técnico nombrado por el promotor de las obras.

El plazo inicial de la ejecución de la obra es de **3 MESES**.

El tipo de estudio de Seguridad y salud a realizar según el Real Decreto del 24 de Octubre de 1.997, en el Artículo 4, del Capítulo I es de tipo completo, al no cumplirse varios de los supuestos que permiten realizar Básico de Seguridad y Salud.

TABLA 1: EVALUACIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y SALUDA A REDACTAR				
Nº de Meses de Plazo (1)	3 meses	Nº horas año conv. Construcción (5)		1.738h
PEM	235.274,50 €	Coste global/hora proyecto (6)=(2)*12/(5)*(1)		95 €/h
PEC (2)	330.231,29 €	Coste hora/trabajador construcción (7)		20,75€
% Mano de obra en proyecto. (3)	12,50%	Nº medio mensual trabajadores (8)=(6)/(7)		4,6 pers/mes
PEC Mano de Obra en proyecto (4)=(2)*(3)	41.278,91 €	Redondeo max. Trabajadores s/planificación		4-6 per/día.
Estudio Básicos o Completo:		**COMPLETO**		
Horas laborales por Dia:	9.00			
1º,-Ppt. Contata>450,000 Euros		330.231 euros		NO
2º,-Nº Días>30 de trabajo		66 días de trabajo	si	SI
Si en algún momento se emplea más de 20		6 max nº trab./día	no	
3º,-Nº de Días de trabajo total >500 jornadas		249 días de trabajo		NO

(2) Por coeficiente de seguridad adicional se incluirá en el cálculo de requisitos para el tipo de estudio el valor del IVA

2.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud da cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, referente a la Prevención de Riesgos Laborales.

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra: "PROYECTO DE RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN DE LA C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA" se enfrenta con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de construir.

Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo.

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales.

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean ajenas a ella.

Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas.

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de un mismo rango:

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el trabajo.

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción.

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de Seguridad y Salud, a través del plan de Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos.

Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.

Esta autoría de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de analizar primero sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L. ha suministrado a través del proyecto de ejecución.

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo.

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales.

3.- DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA OBRA.

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL LUGAR EN EL QUE SE VAN A EJECUTAR LAS OBRAS.

El municipio de Sangüesa se sitúa en la Merindad del mismo nombre, a 45km al Este de Pamplona, en la MI del río Aragón y a unos 10km al Suroeste del Pantano de Yesa. Limita la Este con Aragón. Su población ronda los 4.800-5.000 habitantes en las dos últimas décadas. Su c/Mayor conecta con la NA-132 al Oeste y con la NA-127 al Este, que conecta al Norte con la NA-2420/A-21, principales vías del entorno. La cota media de la población ronda la 400m.



Fig 3.1 Ubicación de Sangüesa

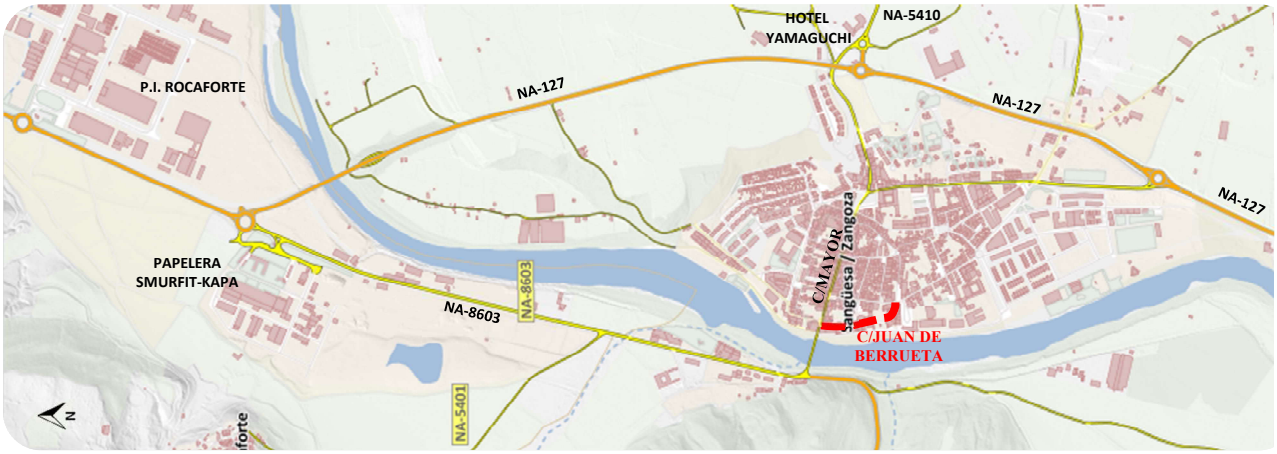


Fig 3.2 Emplazamiento general del casco urbano de Sangüesa y principales vías de acceso

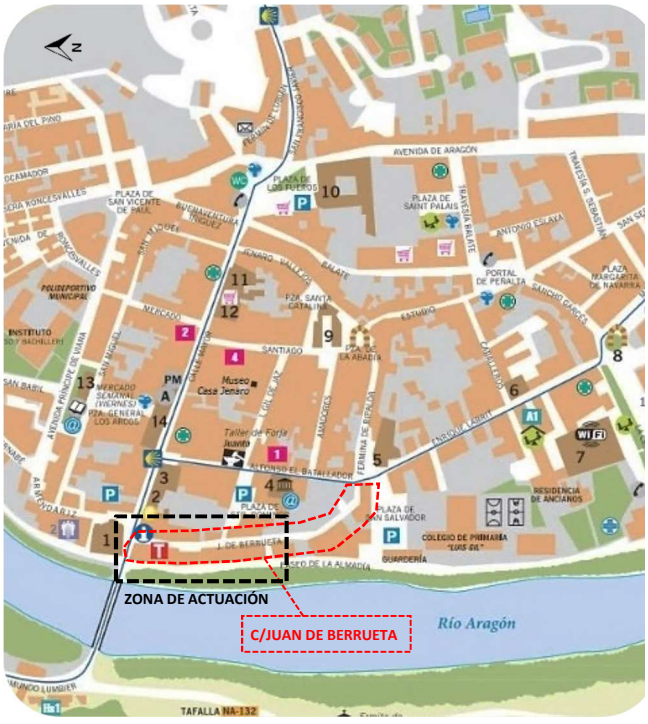


Fig 3.3 Callejero y zona de actuación en casco urbano de Sangüesa



Fig 3.4 Ortofoto y zona de actuación en casco urbano de Sangüesa

El clima en Sangüesa (Papadakis) es de tipo mediterráneo templado (húmedo), con una precipitación media de 650-700mm/año, repartida en unos 105 días de lluvia y 5 de nieve al año. La temperatura media es de 13ºC, medias máximas de 19ºC (rara vez sube más de 35ºC) y medias mínimas de 7,6ºC (rara vez baja de -4ºC). los veranos son calurosos, secos y mayormente despejados y los inviernos son muy fríos y parcialmente nublados (45 días de helada entre finales de Octubre y finales de Abril).

Los tres accesos viables al casco urbano son desde el Oeste por la rotonda de la NA-5410 y la c/San Francisco Javier (conex. con c/Mayor), desde el Sur por la rotonda de la NA-127 y la Avenida de Aragón o desde el Oeste por el puente de hierro sobre el Aragón (conex. con c/Mayor).

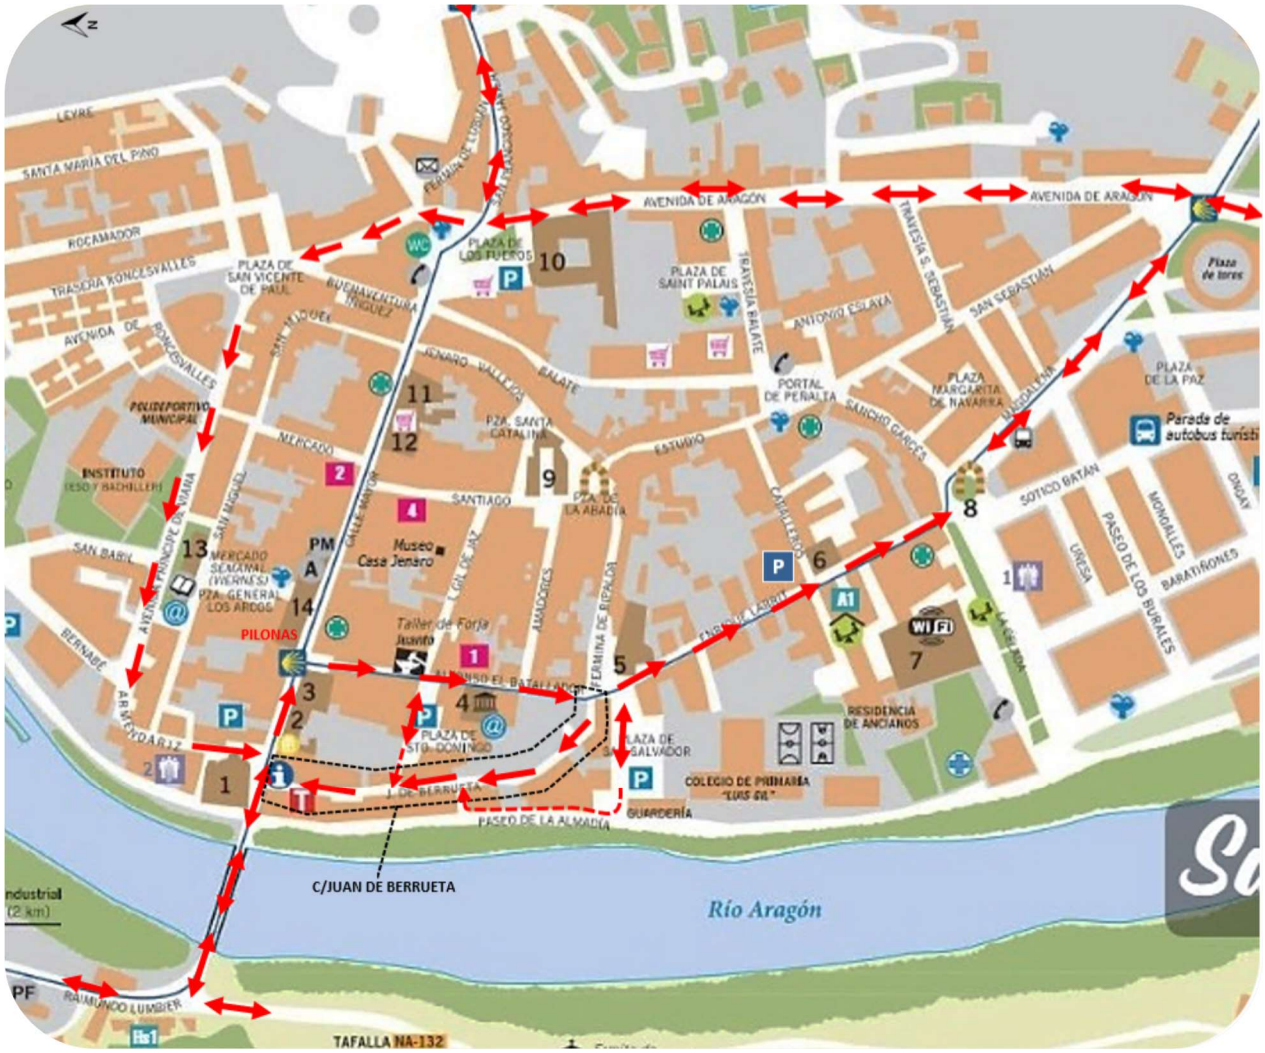


Fig 3.5: Sentidos de circulación y principal circuito regulador accesos rodados al casco urbano de Sangüesa

En la actualidad existe un circuito regulador del tráfico perimetral al centro histórico de Sangüesa desde el Este (c/San Francisco Javier) y desde el Sur (Avenida de Aragón y c/Magdalena, vías de doble sentido de circulación, que permiten la interconectividad con las calles de menor anchura y tráfico de sentido único. La salida hacia el Oeste de este circuito se articula circunvalando por el Norte, por la Avenida Príncipe de Viana, hasta el inicio de la calle Mayor, en su tramo de doble sentido, que nos permite dirigirnos hacia el puente de Hierro (limitada a 3,5 Tn por el municipio). El acceso y circuito desde el Oeste está limitado por el río Aragón y el acceso por el puente de hierro. Con el cierre y peatonalización de la c/Mayor a la altura de la c/Alfonso el Batallador, son esta calle, su prolongación por c/Enrique Labrit y el retorno por c/Juan de Berrueta, las calles que regulan el circuito de acceso Oeste, pero en este caso se trata de calles de sentido único y relativamente estrechas. La movilidad y accesibilidad desde el Oeste está mucho más limitada. La c/Alfonso el Batallador y la c/Berrueta son las dos únicas opciones de habilitar un acceso directo desde el Oeste y puente de hierro. Es la primera la que articula realmente esta opción, ya que es la de mayor anchura y la que mejor conexión tiene con las plazas de San Salvador y Santo Domingo, ya que la unión de estas con la c/Juan de Berrueta son bastante estrechas, sobre todo en el caso de la Plaza Santo Domingo (≈3,5m). La posibilidad de volver desde la Plaza San Salvador por la c/Juan de Berrueta ha hecho que esta vía mantenga habitualmente un sentido Sur-Norte, aunque en los casos de cierre de la c/Alfonso el Batallador o las regulaciones establecidas a partir de Junio de 2020 (cierre a partir de las 12:00 de c/Mayor y c/Alfonso el Batallador) se cambia el sentido de circulación de c/Juan de Berrueta a Norte-Sur, al objeto de dar salida a los tráficos procedentes del puente de hierro o la Avenida príncipe de Viana.



F1 Inicio Berrueta MI. Cámara tfno. coaxial dirección c/Mayor



F3 Inicio Berrueta MD. Válvula abast. FNØ300mm. + Cruce elec.



F6 Pozo unitario HAØ500-600mm U-4 previo Berrueta nº6. H=2,25m



F8 Berrueta nº11 MD conex. Plz. Sto. Domingo. Rejilla PB pluvial.



F9 A Plz S. Domingo
Unitario U-3 H=1,27+ nudo abast.



F11 Berrueta nº15. Acceso a garage sobre acera <1m.



F12 Berrueta nº15-nº18. Tramo final previo conex a PS Almadía.



F13 nº18-nº20. Final mitad Norte unitario. Inicio mitad Sur



F14 Berrueta nº18-nº20. Giro 90º unitario U-2 a emisario MI Aragón



F19 Inicio red separativa de Berrueta nº20 a A. Batallador



F21 Berrueta nº22 Final tramo estrecho inicio sobreancho MD



F23 Vista hacia Alfonso Batallador desde Berrueta nº24



F27 Berrueta nº31. Zona giro final calle (vista a Alfonso Batallador).



F29 Berrueta nº31 (vista avance). Conexión final Alfonso Batallador

3.2.- FINALIDAD PRINCIPAL DE LAS OBRAS.

La finalidad principal de la obra a realizar consiste en:

MITAD NORTE DE C/JUAN DE BERRUETA

- Renovación del saneamiento unitario actual HAØ600mm por una red separativa de PVCØ315mm para las fecales (160ml) y PVCØ315mm para las pluviales (170ml).
- Renovación de la general de abastecimiento de FNØ200mm (125ml) así como de la conexión con FNØ100 hacia Plaza Santo Domingo.
- Soterramiento/reposición del conjunto de servicios de electricidad (3*PVCcØ160mm), telefonía (2*PVCcØ110mm+ tritubo) y alumbrado (2*PVCcØ110mm), así como la reposición del servicio de gas existente.
- Renovación de la pavimentación con sección de firme de 25cm de ZA-25 (165m^3) y pavimento de aglomerado asfáltico estampado con trama de adoquín y simulación de caz central y encintados laterales (650m^2), constituido por una base de 7cm de mezcla bituminosa caliente (MBC) tipo AC22 BIN 50/70 S CALIZA (S-20) y rodadura de 4cm de MBC tipo AC8 SURF 50/70 D OFITA (D-8). Las aceras (300m^2) se ejecutarán con losa prefabricada de hormigón 40x20x4cm sobre solera de hormigón HM-20 de 15cm (75m^2).El formato es el mismo que el ejecutado en 2021 para la renovación de la calzada de la c/Alfonso el Batallador, así como el previsto en calzada para la mitad Sur de la propia c/Juan de Berrueta o para la c/Enrique Labrit.

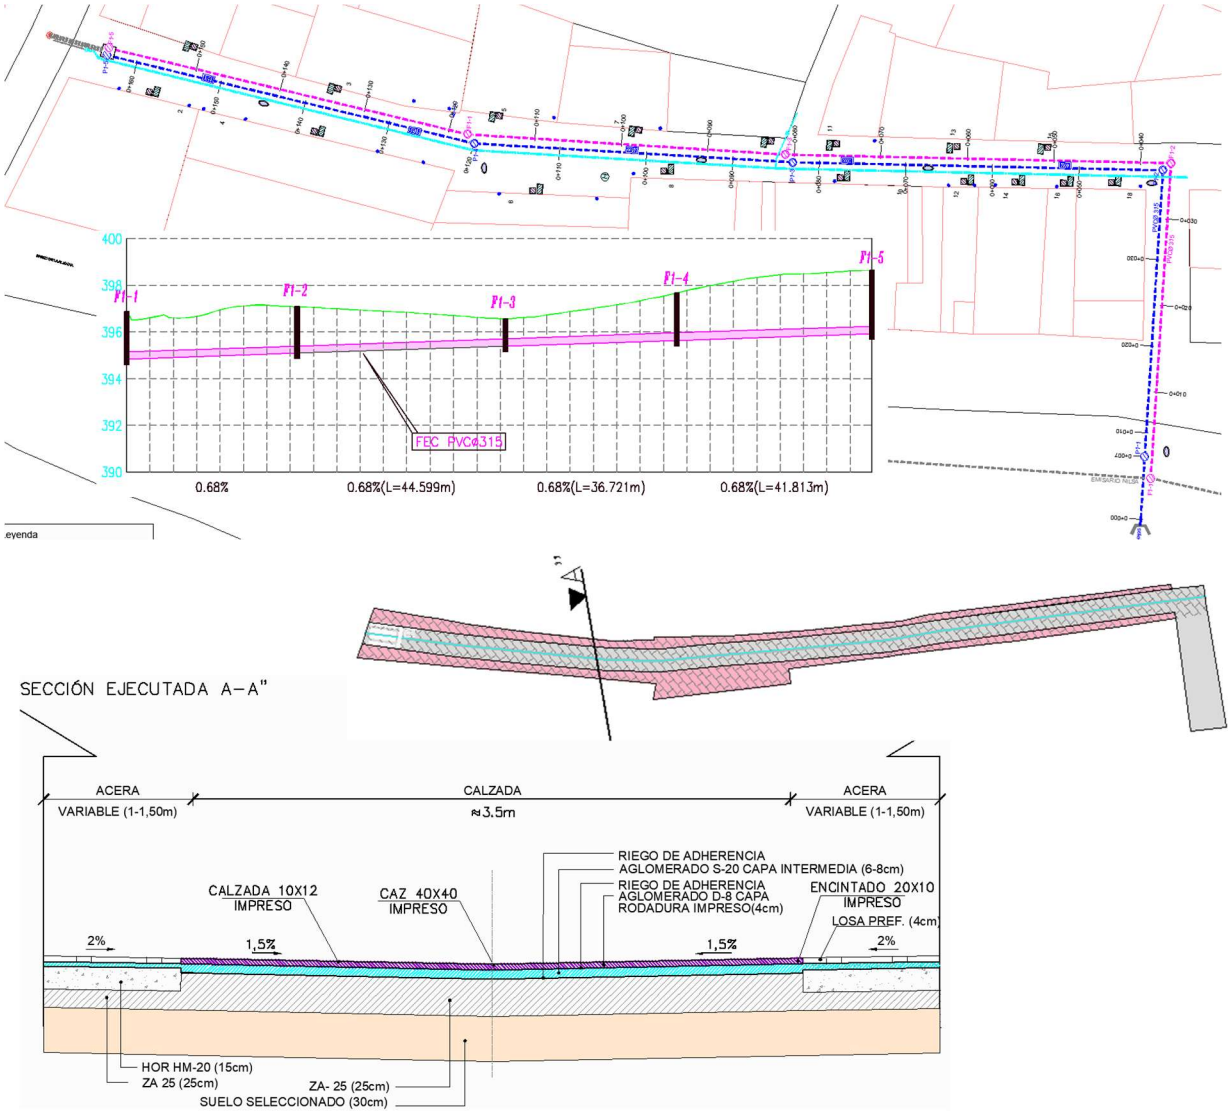


Fig 3.6. Croquis de actuaciones de renovación de redes y pavimentación diseñadas en la mitad Norte de c/Juan de Berrueta de Sangüesa

3.3.- INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

Las interferencias con infraestructuras de toda índole han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar los diversos riesgos. Las interferencias detectadas son:

- ACCESOS RODADOS A LA OBRA: Se produce afección por tránsito de vehículos y maquinaria en los accesos rodados a la calle Juan de Berrueta, principalmente Avda. Aragón, c/Magdalena, c/La Celada desde el Sur, y c/Mayor, c/Alfonso el Batallador, Plaza Santo Domingo, Plaza San Salvador y c/Enrique Labrit desde el Norte. El Paseo de la Almadía, con conexión con c/Juan de Berrueta en su zona central y Plaza San Salvador también se articulará como una alternativa de acceso a las obras.

  La calle c/Juan de Berrueta, objeto de las obras, se ve completamente afectada en el tránsito rodado. Será necesario cortar el tráfico rodado de esta calle para las obras y derivar el conjunto de los tráficos rodado por la c/Alfonso el Batallador.

- CIRCULACIONES PEATONALES: Se produce afección por tránsito de vehículos y maquinaria a los tránsitos peatonales en el conjunto de calle referidas, donde sólo Avda. Aragón c/Magdalena y c/La Celada disponen de acera elevada para el tráfico peatonal, siendo en el resto acera a nivel (la c/Alfonso el Batallador es la única que cuenta con algunas zonas de bolardos). El Paseo de la Almadía es una calle destinada a uso eminentemente peatonal (paseo del río).

  El tráfico peatonal en la c/Juan de Berrueta es reducido, limitado a los vecinos, ya que los tráficos de paso tienden a coger como vía preferente la c/Alfonso el Batallador. Será necesario mantener el acceso peatonal a las viviendas y comercios de c/Juan de Berrueta durante las obras.

  ORGANIZACIÓN DEL TRAFICO PEATONAL Y RODADO PARA LAS OBRAS



Fig 3.3.1: Fases, principales circuitos reguladores de accesos rodados al entorno de las obras y zonas de acopio/trasvase asfaltado

La calle Mayor, como viene siendo habitual, se cerrará (valla existente) de lunes a sábado a las 12:00, permaneciendo el Domingo cerrada. La calle Alfonso el Batallador deberá absorber el tráfico habitual y el de Juan de Berrueta. No será viable el cierre peatonal de la calle en periodo estival, fines de semana, etc., ya que por las obras ya no se puede hacer uso en sentido inverso de la de c/Juan de Berrueta. Se deberá señalizar el corte (calle sin salida y prohibido paso) de la conexión con Plaza Santo Domingo y avisar de obras en Plaza San Salvador a Paseo Almadía.

La conexión entre Plaza San Salvador y Paseo de la Almadía debe mantenerse abierta dentro de lo posible, ya que existe entre esta plaza y el Puente de Hierro una zona de transito rodado en el Paseo de la Almadía con números accesos a garages y sobreanchos para aparcamiento, muy utilizada por los vecinos de la zona (tanto la continuación Norte hacia c/San Babil como la continuación Sur a c/La Celada del Paseo de la Almadía son más estrechas y de uso peatonal).

Se deberá realizar la señalización de obras en entrada a c/Mayor desde el Puente de Hierro y desde la Avenida príncipe de Viana, así como a c/Alfonso el Batallador desde c/Mayor, al objeto de avisar al tráfico peatonal y rodado con posibles interferencias con el tráfico de obra de la c/Juan de Berrueta.

Es una opción a valorar en la ejecución, utilizar como punto de acopio principal y zona de trasvase de bañeras a dumper de obra, la explanada y sobreanchos existentes en la conexión de Paseo de la Almadía con la Plaza San Salvador (zona de acopio OP1 en fig 3.3.1) o el parking de conexión de Paseo Cantolagua con Pase de la Almadía (zonas de acopio OP2 en Fig 3.3.1). En este último caso se puede habilitar (tras retirada de la pilona de entrada a Paseo de la Almadía) un circuito alternativo de acceso a c/Juan de Berrueta y Alfonso el Batallador para el tráfico de obra. En caso de uso de esta opción, será necesario señalizar obras en la conexión de c/Magdalena con c/La Celada, por donde accederá el tráfico de obra al Paseo de la Almadía.

En relación a la propia c/Juan de Berrueta, al objeto de reducir la afección de las obras, se puede habilitar un acceso temporal en sentido contrario desde c/Alfonso el Batallador durante los primeros 80m de la mitad Sur, ya que en este punto tenemos un sobreancho, que previa señalización de prohibición de aparcar, puede hacer viable la entrada, maniobra y vuelta desde/a c/Alfonso el Batallador.

En el cruce del Paseo de la Almadía sería viable ejecutar el mismo en dos mitades, pero la presencia de servicios (CT, pedestal ONO) puede requerir el corte de 1-2 días de la zona al Norte del cruce.

- ACCESIBILIDAD DE COMERCIOS Y ESTABLECIMIENTOS: En la calle Juan de Berrueta están ubicados dos centros de masajes/yoga, con unas necesidades básicas de acceso peatonal, pero reducidas en relación a suministros. También se ubica Fontaneria Leire, en situación similar, pero que sí puede requerir de suministros puntuales de equipos y materiales, por lo que es conveniente organizar los mismos previamente o en momentos de mayor accesibilidad en las obras (desde c/Mayor o Plaza Santo Domingo). Finalmente, frente a la conexión con Plaza Santo Domingo, se localiza el tanatorio Ntra. Señora Rocamador. Gracias a esta conexión (que cuenta además con un solar de sobreancho para maniobras) será más sencillo mantener la accesibilidad a este establecimiento (es viable entrar, maniobrar y volver desde/a Plaza Santo Domingo).
- CRUCE/PARALELISMO DE CARRETERAS**:** No se produce el cruce de carreteras con los trabajos de obra, ni trabajos en paralelismo a estas vías.

  CRUCE/PARALELISMO DE CALLES**:** La calle c/Juan de Berrueta, objeto de las obras, se ve completamente afectada en el tránsito peatonal y rodado, en cuya mitad Norte de realiza la completa renovación de redes y pavimentación. Existen numerosos accesos a viviendas así como a garajes. Aunque pueden realizarse fases (mitad Norte y Mitad Sur, Mitad Norte c/Mayor-Plaza Santo Domingo, Mitad Norte Plaza Santo Domingo-conexión Paseo de la Almadía) los tramos son reducidos y la afección, en el mejor de los casos, podrá dividirse en mitad Norte y mitad Sur. Debido a la estrechez de la calle y la necesidad de renovación de redes incluso mantener el acceso peatonal a las viviendas será complicado. En la mitad Sur, donde no se actúa, la afección se limita a la conexión con el Paseo de la Almadía.
- CRUCE/PARALELISMO DE CAMINOS**:** No se produce el cruce de caminos con los trabajos de obra, ni trabajos en paralelismo a estas vías.
- ZONAS INUNDABLES: El Paseo de la Almadía se ve afectado teóricamente para las láminas de inundación de PR=10 años del río Aragón, mientras que Juan de Berrueta se ve afectado en su zona central por las avenidas de PR=25 años y en su totalidad para PR=50 y PR=100 años. Las posibilidades de afección de las avenidas reales del río Aragón son, según la experiencia, más limitadas, pero no pueden descartase afecciones por avenidas extraordinarias en las obras.

En todo caso se estará al tanto y se cumplirán las actuaciones previstas en el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones en Sangüesa/Zangoza (PAMRIS) en lo relativo a la situación de colapso de la presa de Yesa, que supone un riesgo excepcional frente a otros municipios.

- ZONAS DE ARBOLADO: No existe arbolado en la zona de actuación, a excepción de la zona final de conexión con el emisario de Nilsa y vertido pluvial al Aragón (cruce Paseo de la almadía). En este caso sí puede ser necesario ejecutar labores puntuales de poda e incluso tala de un árbol muy próximo al CT y al pedestal de ONO. También en el resto del Paseo de la Almadía, en el caso de que se habilite un circuito de acceso desde el Sur, pueden ser necesarias labores puntuales de poda para el transito de la maquinaria de transporte.
- SANEAMIENTO: Se realiza la renovación de redes en la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta, mientras que en la mitad Sur las actuaciones estarán asociadas a la reposición de tapas en calzada.

  MIITAD NORTE

  Se realiza la renovación de redes del unitario actual de HAØ500-600mm con conducción para fecales de PVCØ315mm, con profundidades de 1,3m a 2,6m, por lo que se afecta por completo a la red de fecales. Los trabajos de excavación se realizan en tramos de calle estrecha, con inferencia de servicios (gas por calzada, resto por aceras), pudiendo requerir el uso de entibaciones. Será necesario mantener en servicio la evacuación de fecales, que en el caso de c/Juan de Berrueta tienen un aporte constante y de cierta entidad.
- PLUVIALES/ODT: Se realiza la renovación de redes en la mitad Norte de la c/Juan de Berrueta, mientras que en la mitad Sur las actuaciones estarán asociadas a la reposición de tapas en calzada.

  MIITAD NORTE

  Se realiza la renovación de redes del unitario actual de HAØ500-600mm con conducción para pluviales de PVCØ315mm, con profundidades de 1,3m a 2,6m, por lo que se afecta a la red de sumideros existente y las conexiones de bajantes. Los trabajos de excavación se realizan en tramos de calle estrecha, con inferencia de servicios (gas por calzada, resto por aceras), pudiendo requerir el uso de entibaciones.
- ABASTECIMIENTO: Se realizar la renovación de la red de abastecimiento existente, en FNØ300-200mm así como FNØ100mm, así como del conjunto de acometidas, por lo que se afecta por completo a la red de abastecimiento. Las presiones actuales son de 4,5 bar, dentro del rango de baja presión (< 6 bar), por lo que a priori no suponen un riesgo importante en los trabajos, pero se trata de presiones que pueden generar golpes de ariete de cierta importancia en conducciones de FNØ300-200mm, por lo que se deberá tener precaución en las operaciones de cierre/apertura de las conducciones.
- RIEGO: No hay datos de presencia de redes de riego. En el cruce de Paseo de la Almadía y su tramo final por zona verde del saneamiento, no puede descartarse la existencia puntual de acometidas del abastecimiento a Bocas de Riego para riego en estas zonas verdes.
- ELECTRICIDAD: A pesar de la estrechez de sus aceras, la c/Juan de Berrueta dispone de una importante red de canalización soterrada de electricidad, motivada por la presencia de un CT en el Paseo de la Almadía a la altura de c/Juan Berrueta nº18-nº20, que utiliza este punto y esta vía como infraestructura del reparto hacia el casco urbano.

  Ésta canalización soterrada, que se desarrolla preferentemente por la acera de MD (Oeste) de la zona central de c/Juan de Berrueta, y de números cruces soterrados (cruces de calle, conexión Plaza Santo Domingo y Paseo de la Almadía), no impide que exista una red de aéreos entre fachadas, tanto lineales como transversales, de BT, sobre todo en el tramo final de la mitad Norte (conexión con c/Mayor) y en el grueso de la mitad Sur (a pesar de contar con canalización soterrada en paralelo). También existe canalización soterrada en la c/Mayor que se vera afectada por la conexión del saneamiento.

Sólo la renovación de redes será compleja en relación a esta instalación, con algunos cruces y paralelismos complicados, por lo que la propia renovación de estas canalizaciones será también muy difícil de ejecutar debido a la estrechez de la calle y de sus aceras.

ALUMBRADO: Existe canalización soterrada de alumbrado a luminarias en fachada a lo largo de toda la calle. En la mitad Sur están perfectamente localizadas por acera. En la mitad Norte discurren soterradas y en aéreo aprovechando las canalizaciones de electricidad y telefonía, también por acera.

Sólo la renovación de redes será compleja en relación a esta instalación, con algunos cruces y paralelismos complicados, por lo que la propia renovación de estas canalizaciones será también muy difícil de ejecutar debido a la estrechez de la calle y de sus aceras.

- TELEFONIA: Existe canalización soterrada de telefonía en c/Mayor (un coaxial, con cámara de reparto en la conexión con c/Juan de Berrueta), y también en la conexión con Plaza Santo Domingo, pero en la mitad Norte de c/Juan de Berrueta el reparto es en su práctica totalidad en aéreo. En la mitad Sur está canalizado por la acera Oeste.

  Existe canalización de ONO en el Paseo de la Almadía, con un pedestal junto al CT, así como a lo largo de c/Mayor. El unitario actual de saneamiento discurre bajo este pedestal. Aunque no reflejado en planos, hay una reposición de zanja entre este pedestal y la c/Juan de Berrueta (en la margen Norte; en la margen Sur se supone que va soterrada la electricidad), por lo que hay que contar con una conexión adicional a las relejadas en el PCCS, con cruce muy sesgado sobre el unitario actual de saneamiento a renovar. La renovación del saneamiento hará casi con seguridad necesario el desplazamiento de este pedestal unos metros al Norte.

  Dado que apenas existen redes soterradas de telefonía en la zona prevista de renovación de redes y pavimentación de aceras, la implantación de canalización soterrada de este servicio no será tan complicada como la de electricidad, pero los cruces en conexión con c/Mayor y con el pedestal de Paseo de la Almadía serán de complicada ejecución.

- GAS: Existe canalización soterrada de gas a lo largo de toda la c/Juan de Berrueta, con conexión a las redes de c/Mayor y c/Alfonso el Batallador (no existe conexión con Plaza Santo Domingo. Solo en la mitad Norte parece discurrir por acera, mientras que en el resto parece discurrir por la calzada.

  Sólo la renovación de redes será compleja en relación a esta instalación, con algunos cruces y paralelismos complicados, por lo que la propia renovación de esta infraestructura será también muy difícil de ejecutar debido a la estrechez de la calle y de sus aceras.

4.- ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA.

Se definen las siguientes actividades de obra:

- Replanteo y topografía
- Construcción de arquetas de saneamiento
- Demoliciones de estructuras de hormigón
- Demoliciones por procedimientos neumáticos
- Encofrado y desencofrado de muros de hormigón
- Trabajo de encofrado y desencofrado con madera
- Excavación de tierras a máquinas en zanjas
- Excavación de tierras en pozos
- Explanación de tierras
- Hormigonado de zapatas: zapatas aisladas, zarpas, riostras y asimilables
- Instalación de tuberías
- Manipulación, montaje y puesta en obra de la ferralla
- Pocería y saneamiento
- Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montajes
- Taller de montaje y elaboración de encofrados de madera
- Taller de montaje y elaboración de ferralla
- Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa
- Vertido de hormigones por canaleta
- Acometidas para servicios provisionales (electricidad, agua, alcantarillado)
- Alumbrado (desmontaje y montaje de luminarias, y mástiles)
- Extendido de subbase y base
- Extendido de mezclas bituminosas
- Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos
- Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas
- Señalización y balizamiento
- Marcas viales

5.- OFICIOS CUYA INTERVENCIÓN ES OBJETO DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES.

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes oficios:

- Carpinteros y encofradores
- Ferrallistas
- Pocería y saneamiento
- Albañilería

6.- MEDIOS AUXILIARES Y MAQUINARIA.

6.1.- MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad del su plan de ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer.

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares:

- ESCALERAS DE MANO.

  Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de Seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

6.2.- MAQUINARIA PREVISTA PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra.

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista adjudicatario.

En el listado que se suministra, se incluyen los diversos supuestos propietarios y su forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del sector, estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de Seguridad y Salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones técnicas y particulares, suministra las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria.

Se les supone de alquiler larga duración, por lo que se considera con la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable, y que su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso, por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler en el momento de realizar la obra.

- Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor (ruptura de terrenos; losas de hormigón , pavimentos)
- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
- Rodillo vibrante autopropulsado (compactación firmes)
- Camión para transporte de tierras
- Camión de transporte en el interior de las obras
- Camión dumper para movimiento de tierras
- Camión hormigonera
- Camión cuba de agua
- Dumper-motovolquete autransportado
- Maquinaria para movimientos de tierras (en general)
- Mesa de sierra circular para madera
- Motoniveladora
- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos
- Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual

Se les supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de realizarse la obra

- Camión de transporte para materiales
- Camión regador de emulsión
- Camión grúa
- Espadones (Sierras para pavimentos, losas, capas de rodadura)
- Extendedora de productos bituminosos
- Grúa autotransportada
- Plataforma elevadora
- Martillo neumático, martillos rompedores, taladradores para bulones o barrenos
- Pisones mecánicos para compactación de tierras (urbanización)
- Pequeñas compactadoras (pisones mecánicos "ranitas")

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata, por lo que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material viejo en buen uso.

- Dobladora mecánica de ferralla
- Máquinas herramientas eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras
- Pistola automática hinca clavos
- Hormigonera eléctrica, pastera
- Taladro eléctrico portátil
- Compresor

7.- UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

7.1.- PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA.

PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

		1 MES	2 MES	3 MES	TOTAL
RENOVACION DE REDES	MOVIMIENTO DE TIERRAS	17,187 €	17,187 €		34,374 €
	ARQUETA CONEXIÓN		4,087 €		4,087 €
	FECALES	8,267 €	8,267 €		16,534 €
	PLUVIALES	8,005 €	8,005 €		16,010 €
	ABASTECIMIENTO	9,541 €	14,312 €		23,854 €
	GESTIÓN DE RCDs	5,975 €	5,975 €		11,949 €
	SEGURIDAD Y SALUD	2,013 €	2,013 €		4,027 €
RENOVACION DE PAVIMENTACIÓN	DEMOLICIÓN Y CAJEADO CALZADA	6,897 €			6,897 €
	FIRME CALZADA	5,621 €	22,483 €	11,242 €	39,346 €
	ESTAMPADO CALZADA			9,396 €	9,396 €
	DEMOLICIÓN Y CAJEADO ACERA		2,936 €		2,936 €
	FIRME ACERA		11,391 €	11,391 €	22,782 €
	SEÑALIZACIÓN ACERA			5,660 €	5,660 €
	ELECTRICIDAD		2,978 €	1,489 €	4,467 €
	ALUMBRADO		2,897 €	724 €	3,621 €
	TELEFONÍA		4,058 €	1,015 €	5,073 €
	SERVICIOS AFECTADO GAS	569 €	2,275 €	1,138 €	3,982 €
	SERVICIOS AFECTADOS RESTO	1,528 €	1,528 €	764 €	3,821 €
	GESTIÓN RCDs	4,143 €	4,143 €	4,143 €	12,430 €
	SEGURIDAD Y SALUD	1,342 €	1,342 €	1,342 €	4,027 €
PRESUPUESTO					
Ejecución Material Mensual		71,090 €	115,880 €	48,305 €	235,275 €
Ejecución Material Acumulado		71,090 €	186,970 €	235,275 €	
Ejec. Contrata (IVA) Mensual		99,782 €	162,649 €	67,801 €	
Personal mes		3-5 pers	4-6 pers	3-4 pers	
% Obra mes		30%	49%	21%	

7.2.- PROCESO PRODUCTIVO PREVISTO.

El camino crítico para la prevención de riesgos pasa por el 2 mes, con el 50% de producción, que es en el que mayor personal de obra se necesita contratar y por tanto mayores son los riesgos y mayor el cuidado y la atención que se debe prestar para evitar accidentes de carácter grave al personal de obra. En el resto de meses la producción es menor, del 30% y del 21%.

7.3.- CÁLCULO MENSUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES A INTERVENIR SEGÚN LA REALIZACIÓN PREVISTA, MES A MES, EN EL PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Para el cálculo mensual del número de trabajadores se utiliza el cálculo global de la influencia en el precio de mercado de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra cualquiera, que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de ofertas de empresas constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en cuantificaciones prolijas, en función de rendimientos teóricos.

Este cálculo lo realizamos mes a mes, así como semana a semana en función de la planificación prevista, con objeto de tener una mejor aproximación a las necesidades diarias de las instalaciones.

El número medio de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los Trabajadores", será de 6. En este número (6) que surge del cálculo efectuado en el plan de ejecución de obra de este Estudio de Seguridad y Salud (ver tabla 7.1 del punto anterior), quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.

Para ello se parte del cálculo medio mensual y semanal obtenido con el fin de disponer de un intervalo de posibles usuarios de las instalaciones. En base a este número se ha estimado un número medio de usuarios de las instalaciones de 6 personas, que en el mes de mayor producción alcanzarán un máximo de 6 USUARIOS, valor utilizado para los cálculos dotacionales.

Si el plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

8.- INSTALACIONES DE OBRA.

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra.

- Instalación eléctrica provisional de obra.
- Instalación con módulos prefabricados metálicos (vestuarios, comedor, oficinas).
- Instalación de abastecimiento provisional de obra.
- Instalación de fecales provisional de obra.

8.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS METÁLICOS COMERCIALIZADOS.

En base a los circuitos y circulaciones expuestas en el punto 3.3, se ha propuesto como punto de acopio principal y zona de trasvase de bañeras a dumper de obra la explanada y sobreanchos existentes en la conexión de Paseo de la Almadía con la Plaza San Salvador, que ya se ha utilizado en otras ocasiones (zona de acopio OP1 en fig 8.1). Para las operaciones de asfaltado, si se considera más adecuado (o incluso como acopio principal, si así se estima), puede hacerse el trasvase en el parking de conexión de Paseo Cantolagua con Paseo de la Almadía (zonas de acopio OP2 en Fig 8.1).

La implantación de las instalaciones de obra, así como de las instalaciones de Seguridad y Salud y área de gestión de RCDs, se situarían prioritariamente asociadas a la zona de acopio del Paseo de la Almadía con Plaza San Salvador. Podrán derivarse, previo consenso con los servicios municipales y por motivos de operatividad, parte de estas instalaciones a la Plaza Santo Domingo, por su situación central y más cercana a las obras, o a la propia Plaza San Salvador.

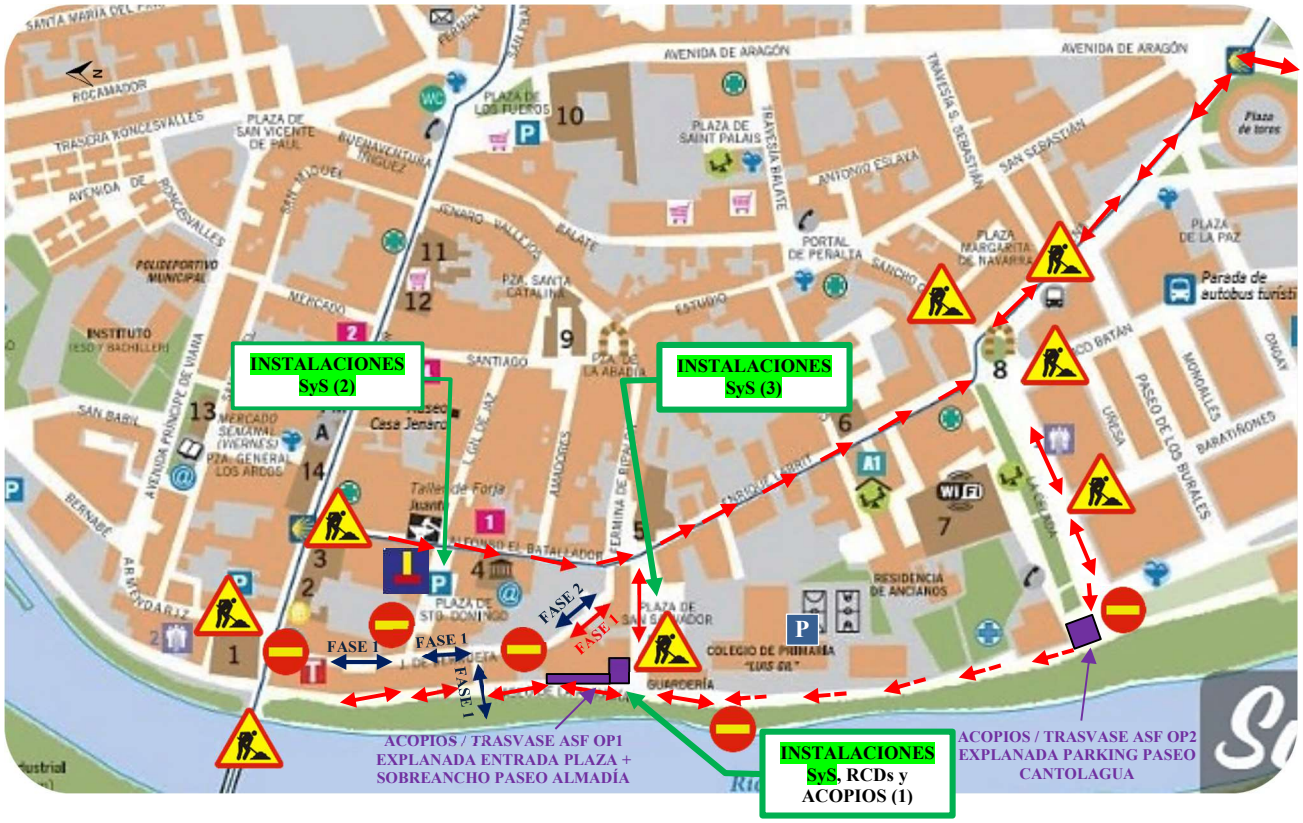


Fig 8.1: Fases, principales circuitos accesos y zonas prioritarias ubicación instalaciones de obra, seguridad y salud, acopios y gestión RCDs

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para **6** trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores previstos en las obras.

TABLA 8.1. CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES	
Superficie de vestuario aseo:	8 m^2.
Nº de módulos necesarios:	1-2 unid.
Superficie de comedor:	6 x 2 m^2. = 12 m^2.
Nº de retretes:	6 trab. : 25 trab. = 1 unid.
Nº de lavabos:	6 trab. : 10 trab. = 1 unid.
Nº de duchas:	6 trab. : 10 trab. = 1 unid.
Nº armarios taquilla:	6 trab: 1 trab = 10 unid.
Nº bancos para 5 personas:	6 trab: 5 = 2 bancos.
Nº calentadores elec de 2000:	6 trab: 10 trab = 1 unid.
Nº mesas tipo parque:	6 trab: 10 trab = 1 unid.
Nº calienta comidas:	6 trab. : 25 trab. = 1 unid.
Nº piletas friegaplatos:	6 trab. : 25 trab. = 1 unid.
Nº frigoríficos domésticos:	6 trab. : 25 trab. = 1 unid.

8.2.- ACOMETIDAS PARA LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA.

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas de electricidad y de agua potable, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales, siendo viable su realización por cercanía y disponibilidad de redes y servicios.

En el caso del saneamiento, en todo caso, puede recurrirse a baños químicos portátiles para dotar de este servicio a las instalaciones de obra tanto provisional como de manera permanente.

La acometida de agua puede solucionarse provisionalmente con un depósito plástico de 1.000l sobre los módulos prefabricados, bien en el caso de que no existan redes de abastecimiento cercanas o si la conexión se considera complicada.

Finalmente, en relación a la acometida eléctrica a las instalaciones, puede solucionarse mediante grupo electrógeno en el caso de soluciones/actuaciones temporales o hasta la conexión de obra a redes existentes. .

9.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS.

9.1.- RIESGOS PROFESIONALES.

En los siguientes riesgos se encuentran incluidos todos los derivados de la ejecución de las unidades anteriormente citadas integrándose a su vez cualquier otro derivado de los métodos y medios a emplear que se utilicen:

- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Atrapamientos por o entre objetos, o por vuelco de máquinas.
- Vuelcos y colisiones.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de materiales u objetos por desplome o desprendimiento.
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.
- Heridas por objetos punzantes.
- Proyección de partículas a los ojos.
- Explosiones en uso de equipos de oxicorte y soldadura.
- Incendios.
- Inhalación de polvo.
- Descargas eléctricas.
- Sobre esfuerzos.
- Vibraciones.
- Ruido.
- Quemaduras.
- Proyecciones.

9.2.- RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.

- Atropellos y colisiones.
- Inhalación de polvo.
- Caída de materiales.
- Ruido.
- Derivados de la intromisión de ajenos en zonas de obra.

9.3.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS.

9.3.0.- REPLANTEOS Y TOPOGRAFÍA.

9.3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

10.3.1.1.- Movimiento de tierras.
10.3.1.2.- Demolición de pavimentos.

9.3.2.- ZANJAS Y TUBOS.

9.3.2.1.- Trabajo en zanjas.
9.3.2.2.- Instalación de tuberías.

9.3.3.- ESTRUCTURAS.

9.3.3.1.- Encofrado.
9.3.3.2.- Encofrado de Obras de Fábrica.
9.3.3.3.- Hormigonado de Obras de Fábrica, cunetas y aceras.
9.3.3.4.- Construcción de muros.

9.3.4.- FIRMES.

9.3.4.1.- Extendido de subbase, bases.
9.3.4.2.- Extendido de bituminosos.
9.3.4.3.- Refuerzo de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente.

9.3.5.- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.

9.3.5.1.- Pintura reflectante en eje de 10 cm con Spray plástico.
9.3.5.2.- Pintura reflectante en bordes de 15 a 20 cm.
9.3.5.3.- Pintura reflectante en banda continua micro rugosa con pintura de 20 cm de ancho.
9.3.5.4.- Pintura reflectante para cebreado.
9.3.5.5.- Pintor de carretera.
9.3.5.6.- Retirada de elementos de señalización vertical.
9.3.5.7.- Colocación de elementos de señalización vertical.
9.3.5.8.- Instalación de señalización vertical y horizontal.
9.3.5.9.- Colocación de barandillas.

9.3.6.- ELECTRICIDAD.

9.3.6.1.- Proximidad de líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión.
9.3.6.2.- Instalación eléctrica provisional
9.3.6.3.- Instalaciones eléctricas de Alumbrado y redes en Baja Tensión.
9.3.6.4.- Maniobras del camión grúa y maquinaria para obra civil.

9.3.7.- MEDIOS AUXILIARES.

9.3.7.1.- Escalera de mano.
9.3.7.2.- Riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de instalaciones provisionales para los trabajadores.

9.3.8.- MAQUINARIA.

9.3.8.1.- Camión basculante.
9.3.8.2.- Camión cuba de agua.
9.3.8.3.- Camión grúa.
9.3.8.4.- Camión hormigonera.
9.3.8.5.- Camión transporte.
9.3.8.6.- Compresor.
9.3.8.7.- Excavadora.
9.3.8.8.- Extendedora bituminosos.
9.3.8.9.- Plataforma elevadora.
9.3.8.9.- Maquinaria en general.
9.3.8.11.- Maquinaria movimiento de tierras.
9.3.8.12.- Martillo neumático.
9.3.8.13.- Rodillo.
9.3.8.14.- Vibrador.
9.3.8.15.- Compactador.
9.3.8.16.- Motoniveladora.
9.3.8.17.- Conductor de tanque regador de emulsión.

9.3.0.- **REPLANTEOS Y TOPOGRAFÍA.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Replanteos y topografía**

1. - RIESGOS MÁS COMUNES.

- Atropellos por vehículos.
- Ruido.
- Exposición a radiaciones láser.
- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Proyección de fragmentos.
- Atrapamiento por vuelco de máquinas.
- Pisadas sobre objetos.
- Golpes con objetos desprendidos.
- Caídas al mismo nivel.

2. - NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.

- No colocar las estaciones de trabajo en las zonas de influencia de las máquinas ni en la parte trasera de los camiones y máquinas. Caso de ser necesario avisar al conductor y señalizar la zona.
- Utilizar cascos de seguridad cuando se realicen trabajos en zonas de paso de vehículos.
- No realizar trabajos en las áreas de influencia de los equipos de trabajo.
- No realizar trabajos cuando en niveles superiores se estén realizando otros.
- No caminar sobre los materiales almacenados.
- Respetar la señalizar existente en la obra sobre desniveles, pozos y terraplenes.

3. -PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.

9.3.1.- **MOVIMIENTO DE TIERRAS.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Movimiento de tierras**

1. - RIESGOS MÁS COMUNES.

- Desplome de tierras.
- Deslizamientos de la coronación de los taludes.
- Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.
- Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo.
- Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y camiones).
- Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Otros.

2. - NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.

- En caso de presencia de agua en la obra, (fuertes lluvias, inundaciones por rotura de conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes.
- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el capataz. (Encargado o Vigilante de Seguridad), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento.
- Se señalizara mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m. como mínimo al borde del vaciado, (como norma general).
- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situado a 2 m. como mínimo del borde de coronación del talud.
- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables.
- Se inspeccionaran antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado.
- Se instalara una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal al fondo de vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos.
- Se prohíbe permanecer (o trabajar) a pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su saneo, (entibado).
- Las maniobras de carga o cuchara de camiones serán dirigidas por el capataz, (encargado o Vigilante de Seguridad).
- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

3. -PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Casco de polietileno (lo utilizaran, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción).
- Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad.
- Trajes impermeables para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Demolición de pavimentos**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Cortes en las manos.
- Pinchazos en los pies con resto de demoliciones
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Proyección de fragmentos.
- Lesiones por trabajos con martillo rompedor.
- Otros.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se revisará el martillo rompedor o los otros equipos antes de empezar la tarea.
- Se mantendrá la zona de trabajo lo más limpia posible, retirando los escombros a una zona específica que no moleste en la tarea.
- No se permitirá estar en la zona a personas no autorizadas.
- El trabajo nunca lo realizará una persona sola.
- Se delimitará correctamente la zona de trabajo.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Gafas de seguridad para proyecciones (según casos)

9.3.2.- **ZANJAS Y TUBOS.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Instrucciones de trabajo.**
TIPO:	**Trabajo en zanjas**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Desprendimientos de tierras (por sobrecarga o tensiones internas).
- Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga.
- Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno suelto o embarrado).
- Caídas de personas al interior de la zanja (falta de señalización o iluminación).
- Atrapamiento de personas con los equipos de las máquinas (con la cuchara al trabajar refinando).
- Golpes por objetos desprendidos.
- Caídas de objetos sobre los trabajadores.
- Estrés térmico (generalmente por alta temperatura).
- Ruido ambiental.
- Sobre esfuerzos.
- Polvo ambiental.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRABAJO.

2.1. Fase previa

- Antes de iniciar los trabajos en zanja de un nuevo tajo, el director de obra deberá dar la autorización del mismo.
- En el caso de existencia de conductos de servicio públicos subterráneos, se indicará con claridad en base a la información existente. Aun con todo, en estos tajos se trabajará con precaución hasta localizarlos.
- Se tendrá localizado el material de señalización y cerramiento de la zanja que no se haya podido terminar en el día.
- En caso de fuertes lluvias u otras inclemencias, se incrementarán las precaucione ante posibles desprendimientos de tierra, por lo que disminuirá la longitud de la zanja, así como otras medidas que se estimen oportunas.

2.2. Durante el trabajo de excavación de zanjas

- Para zanjas de profundidad inferior a 1.30 metros, no es necesario entibar, salvo que las circunstancias del terreno lo aconsejen, por lo que será el director de obra o encargado del tajo el que considere esta opción.
- En caso de ser necesario entibar, se seguirá su instrucción de trabajo particular.
- Si no se procede a la entibación, aun en profundidades superiores a 1.30 metros, se realizarán los taludes oportunos, en base al terreno y a las circunstancias, y previa autorización del director de la obra o bien del responsable del tajo.
- Como norma general, no se permitirá acopiar a menos de 2 metros del borde de la zanja.
- Como lo normal es la utilización de máquinas para los trabajos de excavación de zanjas, éstos pueden crear una sobrecarga en el terreno, por lo que se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas.
- Durante el trabajo de las máquinas de excavación, los trabajadores deberán permanecer apartados fuera del radio de acción de las mismas.

- En zanjas de profundidad superior a 1.30 metros y con operarios en su interior, se tendrá a uno de ellos en el exterior que será tanto de ayudante como el encargado de dar la voz de alarma.
- Cuando la profundidad de la zanja supere 1.50 metros, se dispondrá de escaleras metálicas de mano cada 30 metros de longitud de la zanja, para el acceso y salida del personal de la zanja. Las escaleras seguirán sus instrucciones de trabajo.
- En el caso que sea necesario poner un lugar de paso peatonal, éste se protegerá con pasarelas provistas de barandillas sólidas a un metro de altura, banda intermedia y rodapié.

2.3. Al finalizar la jornada de trabajo.

- Todas las zanjas que queden abiertas al finalizar la jornada de trabajo, y que no hayan podido ser cerradas, deberán señalizarse con cintas y valla, valla tipo stopper, (todo el perímetro) para impedir el paso por error a las personas.
- Asimismo, se señalizará la zona de la zanja con iluminación independiente, si ello fuera necesario.

2.4. Actuación en caso de accidente.

- Se seguirá el protocolo normal de accidentes de la empresa, utilizando para ello los botiquines del tajo.
- Dependiendo de la gravedad del mismo, y ante la duda, se llamará al 112 - SOS Navarra, siguiendo el protocolo de actuación normal para estas situaciones.
- En caso de rotura accidental de conducciones eléctricas, se avisará inmediatamente a la compañía suministradora y se mantendrá alejados a los trabajadores. El maquinista descenderá de la máquina saltando, en caso que fuera necesario, para evitar el contacto simultáneo con la máquina y con la tierra.
- En caso de rotura accidental de conducciones de gas, se avisará inmediatamente a la compañía suministradora, y se evacuará la zona en un radio no inferior a los 300 metros. Asimismo, se avisará al 112 – SOS Navarra, indicando la existencia de un escape de gas, solicitando el protocolo de actuación. Es necesario informar de la existencia de edificios, de la dirección del viento, así como de la distancia a la carretera.
- En caso de rotura accidental de conducciones de agua, se avisará inmediatamente a la compañía suministradora, y se mantendrá alejados a los trabajadores de la zona, ya que posiblemente ésta se inunde, por lo que el terreno se volverá inestable. Si no fuera peligroso, se retirarán inmediatamente a la rotura todas las máquinas para evitar sobrepresiones en el terreno, y se prohibirá trabajar en las zanjas.
- En caso de rotura accidental de conducciones telefónicas o afines, se avisará inmediatamente a la compañía suministradora, si bien no es necesario realizar ninguna otra actuación sobre la obra. La zona dañada no se tocará hasta la llegada de los técnicos de la compañía suministradora.
- En la obra se dispondrán de material de emergencia, como palancas, cuñas, puntales… que se utilizarán en el caso de ocurrir un accidente o eventualidad.

3. –<u>PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES</u>

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Calzado de seguridad.
- Botas de seguridad de goma (según casos)
- Cinturón de seguridad, en el caso que la altura de caída libre sea superior a los dos metros.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Instrucciones de trabajo.**
TIPO:	**Instalación de tuberías**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.).
- Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual.
- Interferencias: conducciones subterráneas; (inundación súbita, electrocución).
- Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas).
- Estrés térmico (por lo general por temperatura alta).
- Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales.
- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería.
- Dermatitis por contacto con el cemento.
- Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y sellados).
- Caída de tuberías sobre personas por: eslingado incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante su instalación, uña u horquilla de suspensión e instalación corta o descompensada, rodar el tubo con caída en la zanja "acopio al borde sin freno o freno incorrecto".
- Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa, rodar el tubo "acopio sin freno o freno incorrecto").
- Polvo (corte de tuberías en vía seca).
- Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en vía seca).
- Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a brazo, cargar tubos a hombro).

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS DE TRABAJO.

- Se seguirán las medidas básicas de seguridad de zanjas (ver instrucción de seguridad)
- El personal que maneja la grúa será competente y estará autorizado para ello.
- Nunca se intentarán bajar tuberías entre una sola persona, por lo que como mínimo deberá haber un peón y el gruista.
- Se comprobará que los ganchos de los camiones grúa estén dotados de pestillos de seguridad.
- No se sobrepasará la carga máxima admisible de la grúa.
- Nunca se arrastrarán las tuberías con la grúa.
- Las tuberías en suspensión se evitará en todo lo posible manejarlas con medios manuales, por lo que se procurará utilizar cabos.
- Bajo ningún motivo habrá personas por debajo de las cargas de suspensión.
- Se evitará pasar el paso de la grúa en vacío, sobre el personal.
- No se permitirá abandonar la grúa con cargas suspensivas.
- Antes de empezar a colocar tuberías con la grúa se observará de la presencia de líneas aéreas eléctricas.
- En caso de fuertes lluvias u otras inclemencias, se incrementarán las precaucione ante posibles desprendimientos de tierra, por lo que disminuirá la longitud de la zanja, así como otras medidas que se estimen oportunas.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo), siempre que se baje de la grúa.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

9.3.3.- **ESTRUCTURAS.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Encofrado**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Cortes en las manos.
- Pinchazos en los pies en fase de desencofrado.
- Caída de objetos a distinto nivel.
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
- Atrapamientos.
- Otros.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída.
- Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, vertidos de hormigón etc...
- Una vez desencofrado los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza se realizará tanto en la zona de trabajo como en la que se desencofra.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Cinturón de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Encofrado de Obras de Fábrica**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a distinto nivel desde encofrados.
- Caídas de los materiales al encofrar o desencofrar.
- Caídas de personal al mismo nivel.
- Golpes y cortes con herramientas o materiales.
- Contactos eléctricos por el uso de herramientas eléctricas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Sobreesfuerzos.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.

RIESGOS DETECTABLES MAS COMUNES (CONTINUACIÓN)

- Proyecciones de partículas.
- Defectos de sujeción y cierres.
- Dermatitis por contacto con desencofrante.
- Riesgos del trabajo realizado en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad intensos).
- Riesgos derivados de trabajos sobre superficies mojadas (resbalones o caídas).

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Montar encofrados desde plataformas independientes a estos. Estas plataformas deberán estar protegidas adecuadamente con barandillas en todo su perímetro.
- Proteger los huecos interiores mediante barandillas, tapas, etc.
- Cuando no hay otro remedio de protección, utilizar cinturón de seguridad anclado a un elemento resistente.
- Al terminar de encofrar, revisar minuciosamente los acodalamientos, cierres, etc.
- Asegurar correctamente cada pieza que se coloque en el encofrado.
- Al desencofrar no quitar piezas que pudieran estar sujetando otros elementos, tratar de llevar el orden inverso al encofrado.
- Mantener los encofrados acopiados en pilas que no superen una altura prudente y estén alejados de lugares de tránsito de maquinaria, para evitar vibraciones o choques.
- Se irán retirando o acopiando ordenadamente, sin poner en peligro la estabilidad del material acopiado.
- Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra.
- Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el que está diseñada.
- Eliminar los clavos y objetos punzantes.
- Cuando haya que manipular cargas elevadas, se utilizarán los equipos auxiliares adecuados (camión grúa, etc.).
- Si no es posible, se manipularán las cargas entre varias personas.
- Se adiestrará al personal sobre los métodos correctos para manipular cargas.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco homologado barbuquejo.
- Gafas panorámicas o pantalla facial abatible de seguridad.
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálica.
- Cinturón de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Traje de agua impermeable.
- Guantes de cuero.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Barandillas.
- Pasos o pasarelas.
- Tableros o planchas en huecos horizontales.
- Escaleras auxiliares adecuadas.
- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Hormigonado de Obras de Fábrica, cunetas y aceras**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Hundimiento o rotura de encofrados.
- Contactos eléctricos por el uso de herramientas eléctricas.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Afecciones a la piel.
- Vibraciones por el uso o proximidad a vibraciones.
- Proyecciones de partículas a los ojos.
- Atrapamientos de manos.
- Ruido ambiental y puntual (vibradores).

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra.
- Comprobar la estabilidad de los encofrados antes de comenzar el hormigonado.
- Hormigonar desde una altura que no produzca movimientos bruscos en los encofrados.
- Hormigonar desde una altura que no produzca movimientos bruscos en los encofrados.
- Hormigonar por tongadas repartiendo el peso uniformemente por todo el encofrado.
- En el vibrado procurar no tocar los encofrados con el vibrador.
- Poner el máximo de cuidado en manipulación de canaletas y/o cubiletes.
- Eliminar los clavos y objetos punzantes.
- Los operarios que puedan estar bajo los efectos de vibraciones llevarán equipos adecuados.
- Utilizar gafas o pantallas faciales abatibles en los trabajos en que puedan producirse proyecciones de partículas, vertido y vibrado del hormigón.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco homologado barbuquejo.
- Gafas panorámicas o pantalla facial abatible de seguridad.
- Calzado de seguridad con plantilla y puntera metálica.
- Cinturón de seguridad.
- Cinturón antivibratorio.
- Ropa de trabajo.
- Traje de agua impermeable.
- Guantes de cuero.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Barandillas.
- Pasos o pasarelas.
- Tableros o planchas en huecos horizontales.
- Escaleras auxiliares adecuadas.
- Limpieza de zonas de trabajo y tránsito.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Construcción de Muros**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro.
- Vuelco de la máquina y falsas maniobras.
- Atrapamientos y quemaduras.
- Ruido y vibraciones.
- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico.
- Contacto con líneas eléctricas.
- Caída de material desde la pala.
- Deslizamientos o desprendimientos de tierras o rocas.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- El manejo de las máquinas se encomendará a personal suficientemente capacitado.
- Se prohíbe permanecer o trabajar dentro del radio de acción del brazo de cualquier máquina.
- Se paralizará cualquier trabajo a realizar en la coronación o a pié de excavación o entibación cuando estas ofrezcan las más mínima duda sobre su estabilidad o eficiencia.
- Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. Así mismo al iniciar o dejar un trabajo el encargado o capataz inspeccionará el frente y los paramentos verticales de la excavación a fin de que se señale si debe realizarse algún retoque.
- Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación, que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimientos.
- Queda prohibido el permanecer o trabajar al pié de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber procedido a su inspección y saneo o entibado.
- Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, estas se delimitarán convenientemente, indicándose los distintos peligros.
- Los movimientos de la máquina serán regulados, si fuese necesario por personal auxiliar que ayudará al maquinista en la correcta ejecución de los trabajos.
- Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del radio de acción de las cargas.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco protector.
- Botas de seguridad impermeables.
- Mascarilla antipolvo filtrantes y protectores auditivos.
- Cinturón antivibratorio.
- Traje de agua impermeable.
- Guantes de cuero, goma o P.V.C.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

- Barandillas de protección y cinta balizadora con soportes.
- Topes de desplazamiento de vehículos.

9.3.4.- **FIRMES.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Extendido de subbase, bases**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caída a igual nivel.
- Atropello con maquinaria.
- Vuelco de maquinaria.
- Choque de vehículos.
- Golpes con objetos móviles.
- Pisadas sobre objetos.
- Sobreesfuerzos.
- Proyección de materiales
- Polvo.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de inicial un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…)
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se señalizará las zonas no transitables con cordón balizador o bien vallado.
- No se permitirá que haya personas en el radio de acción de la maquinaría, salvo que sea imprescindible, y extremando las precauciones. Los conductores antes de iniciar cualquier operación comprobarán que saben la situación de todas las personas que hay al alcance de su máquina, y en caso de duda, no iniciará las operaciones hasta que estén todos visibles.
- Se regará la zona si fuera necesario para evitar el polvo.
- Al interferir en algunos tramos con el tráfico rodado, los señalistas harán disminuir la velocidad de los vehículos en esa zona.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
- Botas de seguridad (según casos).
- Calzado antideslizante (según caso).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Ropa de alta visibilidad.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Extendido de bituminosos**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas a igual nivel.
- Quemaduras.
- Ruido y vibraciones.
- Choque de vehículos.
- Exposición a sustancias nocivas.
- Sobreesfuerzos.
- Atropello.
- Golpes con objeto móvil.
- Atrapamiento con objeto móvil.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo.
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- Los conductores extremarán las precauciones al haber personas trabajando. Antes de iniciar una maniobra comprobarán la presencia de todo el personal, y en caso de duda no la iniciarán hasta haber comprobado (preguntando o bajándose) la no existencia de personas en su trayectoria.
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se señalizará las zonas no transitables con cordón balizador o bien vallado.
- Al interferir en algunos tramos con el tráfico rodado, los señalistas harán disminuir la velocidad de los vehículos en esa zona.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Guantes de cuero.
- Calzado apropiado.
- Ropa de alta visibilidad.

4. –NOTA

- Para este tipo de trabajo se exime la obligación del uso del calzado de seguridad reglamentario (con puntera y suela antiperforaciones) debido a las altas temperaturas, lo cual les podría ocasionar mayores problemas. En todo caso, utilizarán suela antitérmica, o bien aquella medida preventiva adecuada que previamente se autorice, conforme avance las circunstancias de la obra.
- Para este tipo de trabajo se exime la obligación del uso de casco de seguridad reglamentario, debido a que la presencia de trabajo con alta temperatura podría ocasionar lipotimias por calor, golpes de calor o similares. Si se recomienda que lleven permanentemente gorras o gorros que además de protegerles del sol eviten que se manchen con estos productos.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Refuerzo de pavimento con aglomerado asfáltico en caliente**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas a igual nivel.
- Quemaduras
- Ruido y vibraciones.
- Choque de vehículos.
- Exposición a sustancias nocivas.
- Sobreesfuerzos.
- Atropello
- Golpes con objeto móvil.
- Atrapamiento con objeto móvil.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo.
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- La señalización de la obra se realizará según lo establecido en la 8.3. I.C., siguiendo además las indicaciones del Jefe de Obra de Conservación.
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- Se limpiarán las manchas de aceite o grasa de los vehículos
- Los conductores extremarán las precauciones al haber personas trabajando. Antes de iniciar una maniobra comprobarán la presencia de todo el personal, y en caso de duda no la iniciarán hasta haber comprobado (preguntando o bajándose) la no existencia de personas en su trayectoria.
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Mascarilla (en caso de necesidad)
- Faja lumbar (en caso de necesidad)
- Gafas contra impactos (en caso de necesidad)
- Protectores auditivos (en caso de necesidad)

9.3.5.- **SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Pintura reflectante en eje de 10 cm con Spray plástico**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a igual nivel.
- Atropello.
- Intoxicaciones.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos.
- Dermatitis.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo.
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- La señalización de la obra se realizará según lo establecido en la 8.3. I.C., siguiendo además las indicaciones del Jefe de Obra de Conservación.
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- A la hora de trabajar con el spray, se seguirán los datos de la ficha de seguridad del spray.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Utilizar E.P.I. aconsejados en la ficha de seguridad del producto

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Pintura reflectante en bordes de 15 a 20 cm.**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a igual nivel.
- Atropello.
- Intoxicaciones.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos.
- Dermatitis.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de iniciar un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…)
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se extremarán las precauciones respecto a la señalización, ya que los trabajadores suelen estar más desprotegidos. En caso de necesidad, se pondrán vehículos con dispositivos luminosos a modo de protección para los trabajadores.
- La señalización vertical definitiva colocada se tapará con una bolsa o similar, a fin de no entrar en conflicto con la señalización provisional de obra.
- Si el tráfico estuviera abierto en ese tramo, se seguirán las especificaciones de señalización provisional conforme a la I.C. 8.3.
- A la hora de trabajar con la pintura, se seguirán los datos de la ficha de seguridad de la pintura, si ésta estuviera clasificada como mercancía peligrosa, actuándose según los protocolos de actuación. En este caso, se incluirá como anejo al plan la ficha de seguridad de la pintura, documento que no se tiene en la actualidad. En este sentido se tomarán los EPI´s incluidos en la misma como obligatorios

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Utilizar E.P.I. aconsejados en la ficha de seguridad del producto

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Pintura reflectante en banda continua micro rugosa con pintura de 20 cm. de ancho.**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a igual nivel.
- Atropello.
- Intoxicaciones.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos.
- Dermatitis.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de inicial un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…)
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se extremarán las precauciones respecto a la señalización, ya que los trabajadores suelen estar más desprotegidos. En caso de necesidad, se pondrán vehículos con dispositivos luminosos a modo de protección para los trabajadores.
- La señalización vertical definitiva colocada se tapará con una bolsa o similar, a fin de no entrar en conflicto con la señalización provisional de obra.
- Si el tráfico estuviera abierto en ese tramo, se seguirán las especificaciones de señalización provisional conforme a la I.C. 8.3.
- A la hora de trabajar con la pintura, se seguirán los datos de la ficha de seguridad de la pintura, si ésta estuviera clasificada como mercancía peligrosa, actuándose según los protocolos de actuación. En este caso, se incluirá como anejo al plan la ficha de seguridad de la pintura, documento que no se tiene en la actualidad. En este sentido se tomarán los EPI´s incluidos en la misma como obligatorios

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Utilizar E.P.I. aconsejados en la ficha de seguridad del producto

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Pintura reflectante para cebreado.**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a igual nivel.
- Atropello.
- Intoxicaciones.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos.
- Dermatitis.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de iniciar un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…)
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se extremarán las precauciones respecto a la señalización, ya que los trabajadores suelen estar más desprotegidos. En caso de necesidad, se pondrán vehículos con dispositivos luminosos a modo de protección para los trabajadores.
- La señalización vertical definitiva colocada se tapará con una bolsa o similar, a fin de no entrar en conflicto con la señalización provisional de obra.
- Si el tráfico estuviera abierto en ese tramo, se seguirán las especificaciones de señalización provisional conforme a la I.C. 8.3.
- A la hora de trabajar con la pintura, se seguirán los datos de la ficha de seguridad de la pintura, si ésta estuviera clasificada como mercancía peligrosa, actuándose según los protocolos de actuación. En este caso, se incluirá como anejo al plan la ficha de seguridad de la pintura, documento que no se tiene en la actualidad. En este sentido se tomarán los EPI´s incluidos en la misma como obligatorios

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Utilizar E.P.I. aconsejados en la ficha de seguridad del producto

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Pintor de carretera.**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Exposición a temperaturas ambientales extremas.
- Caídas a igual nivel.
- Atropello.
- Intoxicaciones.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos durante la manipulación.
- Golpes y cortes con los cubos de pintura.
- Ruido.
- Exposición a contactos térmicos.
- Exposición a contactos eléctricos.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de iniciar un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…), debiendo estar la zona limpia y en un buen estado de orden.
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se extremarán las precauciones respecto a la señalización, ya que los trabajadores suelen estar más desprotegidos. En caso de necesidad, se pondrán vehículos con dispositivos luminosos a modo de protección para los trabajadores.
- La señalización vertical definitiva colocada se tapará con una bolsa o similar, a fin de no entrar en conflicto con la señalización provisional de obra.
- Si el tráfico estuviera abierto en ese tramo, se seguirán las especificaciones de señalización provisional conforme a la I.C. 8.3.
- A la hora de trabajar con la pintura, se seguirán los datos de la ficha de seguridad de la pintura, si ésta estuviera clasificada como mercancía peligrosa, actuándose según los protocolos de actuación. En este caso, se incluirá como anejo al plan la ficha de seguridad de la pintura, documento que no se tiene en la actualidad. En este sentido se tomarán los EPI´s incluidos en la misma como obligatorios
- No se deberán utilizar bidones de pintura en los que existan aristas vivas en la parte superior.
- Se deberán manipular los pesos utilizando soportes para su manipulación.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Utilizar E.P.I. aconsejados en la ficha de seguridad del producto
- Calzado de seguridad.
- Gafas de seguridad durante el pintado.
- Protectores auditivos durante el empleo de pistolas de aire comprimido.
- Guantes y mascarilla para manipular la pintura.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Retirada de elementos de señalización vertical**

1. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas a igual nivel.
- Choques y Golpes.
- Atropellos.
- Proyecciones.
- Sobreesfuerzos
- Polvo
- Ruido y vibraciones

2. – MEDIDAS TÉCNICAS PREVENTIVAS

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- Se limpiarán las manchas de aceite o grasa de los vehículos.
- Se recogerán las tablas con clavos, recortes de chapa...
- La señalización de la obra se realizará según lo establecido en la 8.3. I.C., siguiendo además las indicaciones del Jefe de Obra de Conservación.
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- En los trabajos en los cuales se emplee el equipo de oxicorte, se mantendrán las distancias de seguridad en torno al mismo
- Se seguirán las indicaciones de la ficha de seguridad de ambos productos (documentos que están a continuación) y en caso de accidente con heridos se llamará a SOS – NAVARRA 112, indicando los datos de la ficha de producto químico

3. – EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Faja lumbar (en caso de necesidad)
- Gafas contra impactos (en caso de necesidad)
- Pantalla de soldador (en operaciones de soldadura)
- Mandil de soldador (en operaciones de soldadura)
- Polainas de soldador (en operaciones de soldadura)
- Guantes de soldador (en operaciones de soldadura)
- Protectores auditivos

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Colocación de elementos de señalización vertical**

1. – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- Caídas a igual nivel.
- Choques y Golpes.
- Atropellos.
- Proyecciones.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Quemaduras y radiaciones en operaciones de oxicorte
- Sobreesfuerzos

2. – MEDIDAS TÉCNICAS PREVENTIVAS

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- Se limpiarán las manchas de aceite o grasa de los vehículos
- Se recogerán las tablas con clavos, recortes de chapa...
- La señalización de la obra se realizará según lo establecido en la 8.3. I.C., siguiendo además las indicaciones del Jefe de Obra de Conservación
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- En los trabajos en los cuales se emplee el equipo de oxicorte, se mantendrán las distancias de seguridad en torno al mismo
- Se seguirán las indicaciones de la ficha de seguridad de ambos productos (documentos que están a continuación) y en caso de accidente con heridos se llamará a SOS – NAVARRA 112, indicando los datos de la ficha de producto químico
- Las herramientas tendrán doble aislamiento o toma de tierra
- El circuito se protegerá con interruptor diferencial de 0.03 A de sensibilidad
- No se dejarán en funcionamiento las máquinas eléctricas cuando no sea necesario
- En zonas mojadas se extremarán las precauciones
- Los cables se dispondrán de forma ordenada
- Si se utiliza la soldadura por arco, se conectará el cable de masa lo más directamente posible a la pieza, se enrollarán los cables antes de transportarlos y se depositará siempre el portalectrodo sobre objetos aislantes.

3. – EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Pantalla de soldador (en operaciones de soldadura)
- Mandil de soldador (en operaciones de soldadura)
- Polainas de soldador (en operaciones de soldadura)
- Guantes de soldador (en operaciones de soldadura)
- Mascarilla (en caso de necesidad)
- Faja lumbar (en caso de necesidad)
- Gafas contra impactos (en caso de necesidad)

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Instalación de señalización vertical y horizontal**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caída a igual nivel.
- Atropello
- Intoxicación.
- Sobreesfuerzos.
- Pisada sobre objetos.
- Caída de objetos.
- Dermatitis

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Antes de iniciar un tajo se comprobará la zona para evitar que no hay problemas (climatológicos, desprendimientos…)
- Los vehículos que estén cerca de una zona de tránsito rodado, o bien cuando accedan al mismo, deberán llevar conectado el rotativo luminoso.
- Se extremarán las precauciones respecto a la señalización, ya que los trabajadores suelen estar más desprotegidos. En caso de necesidad, se pondrán vehículos con dispositivos luminosos a modo de protección para los trabajadores.
- La señalización vertical definitiva colocada se tapará con una bolsa o similar, a fin de no entrar en conflicto con la señalización provisional de obra.
- Si el tráfico estuviera abierto en ese tramo, se seguirán las especificaciones de señalización provisional conforme a la I.C. 8.3.
- A la hora de trabajar con la pintura, se seguirán los datos de la ficha de seguridad de la pintura, si ésta estuviera clasificada como mercancía peligrosa, actuándose según los protocolos de actuación. En este caso, se incluirá como anejo al plan la ficha de seguridad de la pintura, documento que no se tiene en la actualidad. En este sentido se tomarán los EPI´s incluidos en la misma como obligatorios.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Botas de seguridad (según casos).
- Ropa de trabajo.
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Ropa de alta visibilidad.
- Guantes de cuero para la colocación de la señalización vertical.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Colocación de barandillas**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas a igual nivel.
- Choques y Golpes.
- Atropellos.
- Proyecciones.
- Quemaduras y radiaciones en operaciones de oxicorte
- Sobreesfuerzos

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo.
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- La señalización de la obra se realizará según lo establecido en la 8.3. I.C., siguiendo además las indicaciones del Jefe de Obra de Conservación.
- Antes de iniciar un tajo se revisará el mismo, así como la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- Mantenerse alejado del radio de acción de la maquinaria
- Se recogerán las tablas con clavos, recortes de chapa...

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Faja lumbar (en caso de necesidad)
- Gafas contra impactos (en caso de necesidad)

9.3.6.- **ELECTRICIDAD,**






	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Proximidad de líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Posible arco en los basculantes de los camiones.

2. - MEDIOS DE PROTECCIÓN.

- Colocación de pórticos de limitación de gálibo.
- Se establecerá un puesto de vigilancia, control y coordinación de las maniobras para garantía del nivel de seguridad necesario para el montaje de los pórticos de seguridad.
- Marcaje de los límites de servidumbre-afección de las líneas.

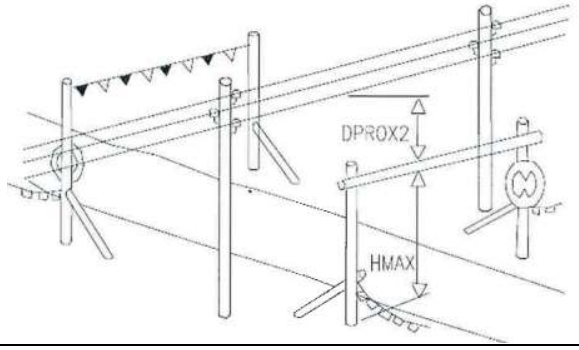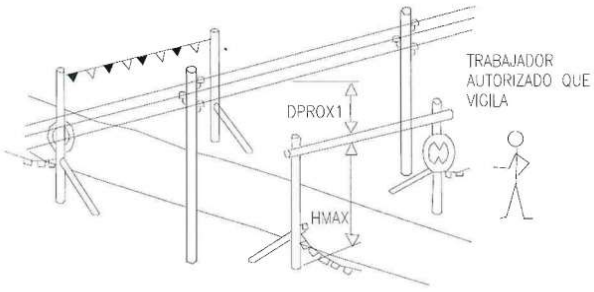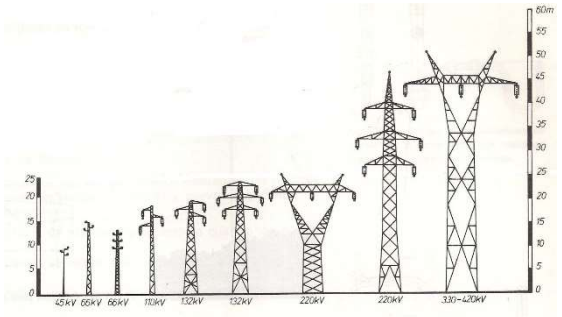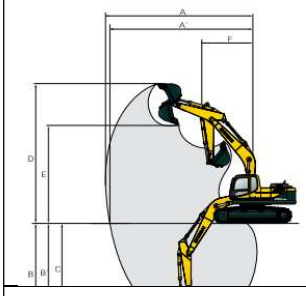Tensión Nominal de las líneas Aéreas	13,2Kv (AT)
Distancia de seguridad (RD614/2001; Tabla1): D_{PROX-1} (se puede delimitar con precisión la zona de trabajo respecto al límite de la zona de proximidad) / D_{PEL} (Distancia peligro) D_{PROX-2} (no se puede delimitar con precisión la zona de trabajo respecto al límite de la zona de proximidad) / D_{PEL} (Distancia peligro)	$D_{PROX-1=}$116 cm./ D_{PEL-1}=66 cm $D_{PROX-2=}$300 cm./ D_{PEL-2}=57 cm
  **HMAX:** ALTURA LIBRE DISPONIBLE	
Gálibo disponible bajo líneas.(Se comprobará el gálibo de cada línea en el replanteo y se ajustarán las medidas a tomar según los datos obtenidos $G_{línea}$>A medir en obra.	
Altura máxima de trabajo de la maquinaria	5,0m<$H_{MAQ\ Trabajo}$ <7,0m $H_{MAQ\ max\ Trabajo}$ <10,m
RANGOS DE TRABAJO R290LC-9 / R290NLC-9  Longitud del pluma monoblock: 6250 (20' 6") Longitud del balancín: 2100 (6' 11") / 2500 (8' 2") / 3050 (10' 0") / 3750 (12' 4") A Alcance máx. de excavación: 10020 (32' 10") / 10280 (33' 7") / 10820 (35' 6") / 11400 (37' 5") A' Alcance máx. de excavación a nivel de suelo: 9820 (32' 3") / 10080 (33' 1") / 10620 (34' 10") / 11220 (36' 10") B Profundidad de excavación: 6440 (21' 1") / 6840 (22' 5") / 7500 (24' 7") / 8090 (26' 7") B' Profundidad de excavación (a 2,4 mm de profundidad): 6240 (20' 6") / 6630 (21' 9") / 7300 (23' 11") / 7920 (25' 12") C Profundidad máx. de excavación vertical: 6000 (19' 8") / 5850 (19' 2") / 6410 (21' 0") / 7080 (23' 3") D Altura máx. de excavación: 10070 (33' 0") / 10110 (33' 2") / 10160 (33' 4") / 10360 (33' 12") E Altura máx. de descarga: 6940 (22' 9") / 7030 (23' 1") / 7110 (23' 4") / 7310 (23' 12") F Radio mín.de giro: 4380 (14' 4") / 4260 (13' 12") / 4230 (13' 11") / 4140 (13' 7")	**Volvo EC-240**  •Pluma monobloque de 6,0 m, 19' 8" con conexión directa del cuchara Brazo: unidad: 2,0 m, 6' 7" / 2,5 m, 8' 2" / Std. 2,97 m, 9' 9" / 3,6 m, 11' 10" A. Alcance de excavación máx.: mm, ft in: 9 550, 31' 4" / 9 880, 32' 5" / 10 260, 33' 8" / 10 730, 35' 2" B. Alcance de excavación máx. en suelo: mm, ft in: 9 360, 30' 9" / 9 690, 31' 9" / 10 080, 33' 1" / 10 560, 34' 8" C. Prof. de excavación máx.: mm, ft in: 6 060, 19' 11" / 6 500, 21' 4" / 6 980, 22' 11" / 7 600, 24' 11" D. Prof. de excavación máx. (niv. 2,5 m): mm, ft in: 5 780, 19' 0" / 6 280, 20' 7" / 6 740, 22' 1" / 7 380, 24' 3" E. Prof. de excavación vertical en pared máx.: mm, ft in: 4 960, 16' 3" / 5 730, 18' 10" / 5 970, 19' 7" / 6 270, 20' 7" F. Altura de corte máx.: mm, ft in: 9 660, 31' 8" / 9 630, 31' 7" / 9 730, 31' 11" / 9 870, 31' 9" G. Altura máx. de descarga: mm, ft in: 6 720, 22' 1" / 6 670, 21' 11" / 6 800, 22' 4" / 6 790, 22' 3" H. Radio de giro frontal mín.: mm, ft in: 4 030, 13' 3" / 3 860, 12' 8" / 3 830, 12' 7" / 3 850, 12' 8"	
Límite Zona de Trabajo / Actuación Prevista	H_{LZT}=10,36+3.00=13,52m < $G_{línea}$
Actuación prevista: Se comprobarán los gálibos y se realizarán en los cruces bajo líneas eléctricas que no cumplan con los mínimos la colocación de dos pórticos de gálibo, uno a cada lado de la línea.	

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLE-.

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Prendas de abrigo (en caso de necesidad)
- Impermeable (en caso de necesidad)
- Guantes de cuero
- Faja lumbar (en caso de necesidad)
- Gafas contra impactos (en caso de necesidad)

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Instalación eléctrica provisional**

1. - RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

- Heridas punzantes en manos.
- Caídas al mismo nivel.
- Electrocución: contactos eléctricos e indirectos derivados esencialmente de:
  - Trabajos con tensión.
  - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que esta efectivamente interrumpida.
  - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
  - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular.

2. - NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO

A) Sistema de protección contra contactos indirectos.

- Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales).

B) Normas de prevención tipo para los cables.

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo, y sin defectos apreciables (rasgones, repelones, etc.). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuara mediante canalizaciones enterradas.
- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras este se realizara a una altura mínima de 2m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra como ya se ha indicado anteriormente, se efectuara enterrado. Se señalizara el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la asistencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable ira además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
- Caso de tener que efectuar empalmes se tendrá en cuenta:
  - Siempre estarán elevados. Sé prohíbe mantenerlos en el suelo.
  - Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.
  - Los empalmes definitivos se ejecutaran utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuara mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo.

- Las mangueras de "alargadera".
    - Si no para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo pero arrimadas a los parámetros verticales.
    - Se empalmaran mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).
    - Normas de prevención tipo para los interruptores.
- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los interruptores se instalaran en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro electricidad".
- Las cajas de interruptores serán colgadas bien de los parámetros verticales, bien de pies derechos estables.

C) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324.
- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
- Los cuadros eléctricos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. Grado de protección recomendable IP.447.

D) Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de distribución mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
- Cada toma de corriente suministrara energía a un solo aparato, máquina o máquina – herramienta.
- Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionan un grado similar de inaccesibilidad.

E) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
- Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas y aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
    - 300 mA.- (según R:E:B:T.)-Alimentación.
    - 300 mA.- (según R:E:B:T.)-Alimentación a la maquinaria en mejora del nivel de seguridad.
    - 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
- El alumbrado portátil se alimentara de 24 v. Mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de circuitos.
- Todos los circuitos eléctricos se protegerán mediante disyuntores diferenciales.

F) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos los aspectos específicos en la Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora.
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de tomas de tierra.
- El neutro de las instalaciones estará puesto a tierra.
- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional obra.
- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador de reparación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra el resto de carcasas de motores o máquinas se conectaran debidamente a la red general de tierra.
- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar del hincado de la pica (placa o conductor), estará protegido en interior de arqueta practicable.

G) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectaran a la red general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado protección recomendable IP.447).
- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las ordenanzas de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de seguridad e Higiene en el Trabajo.
- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcado (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
- La iluminación de los tajos se situara a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada para disminuir sombras.
- Las zonas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra.
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión del carnet profesional correspondiente.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos**
TIPO:	**Instalación eléctrica de alumbrado y redes en baja tensión y montaje y desmontaje de luminarias**

1. - RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES

- Electrocución.
- Contactos eléctricos con la instalación provisional.
- Contactos eléctricos con la maquinaria.
- Electrocución durante las pruebas de instalación.
- Contacto eléctrico por conexión intempestiva con la corriente.
- Contactos eléctricos debidos a actos inseguros.
- Contactos eléctricos por mal aislamiento de los equipos y útiles de trabajo.
- Contactos eléctricos por malas condiciones de la zona de trabajo.
- Caídas de personal a distinto y mismo nivel.
- Cortes por uso de herramientas manuales.
- Cortes y pinchazos por manejo de guías y conductores.
- Caídas de objetos en manipulación.
- Atropellos por vehículos.

2. - NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS

- Antes de comenzar cualquier trabajo, se informará a los trabajadores del estado de la instalación, por los medios de comunicación apropiados.
- En instalaciones complejas o confusas, se entregará a los instaladores documentación referente a la instalación.
- El tendido se realizará previamente a cualquier conexión.
- Se comprobará la estanqueidad de los guantes aislantes.
- Se verificará la ausencia de conducciones próximas en servicio, desnudas, enterradas o empotradas.
- Se anularán, eliminarán, identificarán y aislarán los conductores eléctricos próximos. Se guardarán las distancias reglamentarias a otros servicios.
- Se utilizará alfombra aislante, herramientas aisladas, voltímetro y pinzas sacafusibles.
- Se comprobará el funcionamiento del voltímetro.
- Se comprobará la ausencia de tensión en la carcasa de la caja de acometida.
- Se comprobará que la tapa de la acometida pueda estar instalada al revés, cuando se abra.
- Se comprobará el sentido de rotación de las fases en contadores trifásicos.
- Se cumplirán las tareas de abrir el interruptor general, extracción de los fusibles, cierre y precinto de la caja de acometida, comprobación de la ausencia de tensión, aislamiento de las partes accesible que puedan estar en tensión y viceversa después del conexionado.
- Utilizar escaleras y plataformas de trabajo.
- En trabajos en altura al aire libre o a nivel de suelo señalizar la zona de trabajo.

- Existirán instrucciones de no realizar manipulación ni reparación provisional de la instalación eléctrica con personas sin conocimientos.
- Se instalará como último cableado el que va del cuadro general al de la compañía suministradora y se mantendrán los mecanismos necesarios para esta instalación en lugar seguro hasta su montaje, evitando así conexiones accidentales de la red.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación, se realizará una inspección de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación, se comprobará la existencia de la banqueta de maniobras, extintores de polvo seco y botiquín.
- La entrada en servicio de las celdas de los grupos de transformación se hará con el edificio desalojado de personal.
- Se efectuará la prueba para comprobar si los automáticos (disyuntores) funcionan y "cortan" con la intensidad prevista. Esta prueba se llevará a cabo estando bajo tensión pero sin carga.
- Existirán instrucciones de no realizar manipulación ni reparación provisional de la instalación eléctrica con personas sin conocimientos.
- Se instalará como último cableado el que va del cuadro general a la compañía suministradora y se mantendrán los mecanismos necesarios para esta instalación en lugar seguro hasta su montaje, evitando así conexiones accidentales de la red.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación, se realizará una inspección de las conexiones de los mecanismos, protecciones y empalmes.
- Antes de hacer entrar en carga la instalación, se comprobará la existencia de la banqueta de maniobras, extintores de polvo químico y botiquín.
- La entrada en servicio de las celdas de los grupos de transformación se hará con el edificio desalojado de personal.
- Se efectuará la prueba para comprobar si los automáticos (disyuntores) funcionan y "cortan" con la intensidad prevista. Esta prueba se llevará a cabo estando bajo tensión pero sin carga.
- La maquinaria eléctrica portátil estará equipada con doble aislamiento de seguridad.
- Las bases de los enchufes serán totalmente estancas.
- El cuadro principal de la instalación provisional de la obra estará dotado de los elementos de seguridad imprescindibles, tales como interruptor diferencial (300 mA de sensibilidad), magnetotérmico e interruptor seccionador de la corriente.
- El cuadro eléctrico será metálico de tipo normalizado para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad.
- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
- El cuadro estará situado en una zona seca y protegida del sol y de la lluvia.
- El cuadro de mandos estará señalizado mediante una señal normalizada de "PELIGRO ELECTRICIDAD".
- Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a pies derechos firmes.
- Los cuadros eléctricos tendrán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, del tipo macho-hembra, estando la tensión siempre en la clavija hembra.
- Los cables de colores amarillos y verdes sólo se emplearán para la toma de tierra.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina-herramienta.

- Los cables de suministro dispondrán de una funda protectora que estará en perfecto estado de mantenimiento.
- Los cables para salvar viales de obra se taparán mediante una cubierta que permita el paso de vehículos sin dañarlos.
- Si se usaran cables de extensión, las conexiones se harán comenzando por la máquina y siguiendo hacia la toma de corriente.
- La distribución general del cuadro principal a los secundarios se realizará mediante una manguera eléctrica antihumedad.
- Se evitarán los empalmes de cables.
- Las mangueras de alargaderas provisionales se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad, o fundas aislantes termorretráctiles.
- El trazado de suministro de las mangueras eléctricas no coincidirá con el de suministro provisional de agua.
- No se ubicarán los cuadros eléctricos en los bordes del forjado ni en otras partes de la obra dónde se comprometa la seguridad del trabajador.
- No se desconectarán las mangueras por el método del tirón, se desconectarán tirando de la clavija del enchufe.
- Antes de utilizar cualquier aparato o instalación eléctrica, se asegurará su perfecto estado (cables, clavijas, carcasa de protección, etc.).
- Todas las máquinas que no posean doble aislamiento deberán estar puestas a tierra.
- No se alterarán las características de la máquina, ni se eliminarán sus dispositivos de seguridad.
- No se utilizarán máquinas eléctricas si se tienen las manos o pies mojados, o si la propia máquina está mojada.
- Se protegerá con material aislante normalizado todas las herramientas que vayan a utilizar los instaladores.
- Si se trabaja en ambientes húmedos, se asegurará que se están utilizando aparatos con las condiciones de protección indicadas para estos casos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Los aparatos de iluminación trabajarán con una tensión de seguridad de 24 v., y las lámparas estarán aisladas y dispondrán de una rejilla de protección de la bombilla.
- Se instalará como último cableado el que va del cuadro general al de la compañía suministradora y se mantendrán los mecanismos necesarios para esta instalación en lugar seguro hasta su montaje, evitando así conexiones accidentales de la red.

3. – PROTECCIONES COLECTIVAS

- Alfombra aislante.
- Banqueta de maniobras.
- Material aislante normalizado para las herramientas de los instaladores.
- Cubierta para cables en viales de obra

4. – PROTECCIONES INDIVIDUALES

- Calzado de seguridad con suela aislante.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes aislantes.
- Cascos de seguridad.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Trabajos en proximidad de tensión.**
TIPO:	**Maniobras del camión grúa y maquinaria para obra civil.**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Contactos eléctricos.
- Quemaduras.
- Radiaciones.
- Proyecciones.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- El mando planificará los trabajos y maniobras a realizar indicando claramente a sus operarios de las precauciones a tener en cuenta.
- En los trabajos en proximidad de tensión, se mantendrán las distancias de seguridad indicadas en la siguiente tabla:

TENSIÓN ENTRE FASES KV	DISTANCIA MÍNIMA M
Hasta 10	0,80
Hasta 15	0,90
Hasta 20	0,95
Hasta 25	1,00
Hasta 30	1,10
Hasta 45	1,20
Hasta 66	1,40
Hasta 110	1,80
Hasta 132	2,00
Hasta 220	3,00
Hasta 380	4,00

9.3.7.- **MEDIOS AUXILIARES.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Medios auxiliares**
TIPO:	**Escalera de mano**

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. Suele ser objeto de "prefabricación rudimentaria" en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra

1– RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
- Vuelco lateral por apoyo irregular.
- Rotura por defectos ocultos.
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas" para la altura a salvar)

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

A) De aplicación al uso de escaleras de madera.

- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

B) De aplicación al uso de escaleras metálicas.

- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad.
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidante que las preserven de las agresiones de la intemperie.
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas.

C) De aplicación al uso de escaleras de tijera.

- Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de madera y metal.
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad.
- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
- Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas sobre pavimentos horizontales.

D) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen.

- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra se instalaran de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.
- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o al hombro), iguales o superiores a 25kgs. Sobre las escaleras de mano.
- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.
- El acceso de operarios en esta obra, a través de escaleras de mano, se realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la misma a dos o más operarios.
- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.

- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Medios auxiliares**
TIPO:	**Construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa.**

1– RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atrapamientos entre objetos durante maniobras de carga y descarga de los módulos metálicos.
- Golpes por penduleos (intentar dominar la oscilación de la carga directamente con las manos, no usar cuerdas de guía segura de cargas).
- Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo de la caja del camión, polvo depositado sobre los módulos, demolición de la cimentación de hormigón).
- Caída de carga por eslingado peligroso (no usar aparejos de descarga a gancho de grúa).
- Dermatitis por contacto con el cemento (cimentación).
- Contactos con la energía eléctrica.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Se mantendrá el mayor orden y limpieza posible en la zona de trabajo.
- Se guardarán ordenadamente los materiales y herramientas
- Antes de iniciar el trabajo se revisará la maquinaria. En caso de anomalía no se comenzará hasta haberla solucionado.
- Se prohibirá la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa o chaleco de alta visibilidad homologada EN-471
- Calzado con plantilla y puntera homologados EN-345
- Guantes de cuero

9.3.8.- **MAQUINARIA.**

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Camión basculante**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello de personas (Entrada, salida, etc.).
- Choques contra otros vehículos.
- Vuelco del camión.
- Caída (al subir o bajar de la caja).
- Atrapamientos (Apertura o cierre de la caja).

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

- Las entradas y salidas a la obra se realizaran con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa el vehículo quedara frenado y calzado con topes.
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (Al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra).
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Camión cuba de agua**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caída de personas desde el camión.
- Sobreesfuerzos.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Las rampas de acceso al tajo no superaran el 20 % de pendiente en prevención de atoramientos o vuelco.
- El camión irá permanentemente con el rotativo luminoso conectado encendido, debido a su velocidad, así como a la presencia de trabajadores en la zona.
- Las operaciones de carga de agua se realizan en las zonas indicadas al efecto.
- Si el conductor baja del camión, deberá llevar peto de alta visibilidad, salvo en aquellas zonas en las cuales no hay otras máquinas transitando o en la zona de carga de agua si así estuviera establecido.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo
- Calzado para la conducción de camiones.

4. - PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Se respetaran las señales de tráfico interiores de la obra.
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobrabilidad del camión.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Camión grúa**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Vuelco.
- Atrapamientos.
- Caídas al subir o bajar.
- Atropello.
- Desplome de la carga.
- Golpes de la carga.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Antes de iniciar maniobras de descarga, se instalaran calzos, inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
- Se prohíbe estrictamente sobrepasar la carga admisible.
- El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida. Si no fuese posible, las maniobras estarán dirigidas por un señalista.
- Las rampas para acceso del camión grúa no superaran el 20 %.
- Se prohíbe arrastrar cargas.
- Las cargas se guiaran con cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas entorno al camión grúa a distancias inferiores a 5 m. y bajo cargas suspendidas.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Calzado para conducción.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Camión hormigonera**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caída de personas desde el camión.
- Golpes en el manejo de las canaletas.
- Golpes por el cubilete del hormigón.
- Sobreesfuerzos.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Las rampas de acceso al tajo no superaran el 20 % de pendiente en prevención de atoramientos o vuelco.
- La limpieza de la cuba y canaletas se realizará en los lugares señalados en los planos para dicha labor.
- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno.
- Botas impermeables de seguridad.
- Ropa de trabajo
- Mandil impermeable.
- Guantes impermeabilizados.
- Calzado para la conducción de camiones.

4. - PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Se respetaran las señales de tráfico interiores de la obra.
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobrabilidad del camión.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Camión transporte**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello de personas.
- Colisión con otras máquinas.
- Vuelco del camión.
- Caída de personas desde el camión.
- Atrapamientos.
- Sobreesfuerzos.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material será obligatorio instalar el freno de mano. Si la pendiente fuera pronunciada, o bien el terreno resbaladizo, se instalarán también calzos de inmovilización en las ruedas.
- Todas las operaciones de carga y descarga serán dirigidas por una persona competente, conocedor de la mercancía a cargar y de sus características.
- Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme, compensando los pesos.
- Si fuera necesario se sujetarán las cargas de manera firme, o bien se colocará un toldo (dependiendo del tipo de carga y de sus características).

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno.
- Ropa de trabajo
- Calzado para la conducción de camiones de seguridad.
- Peto de alta visibilidad (según casos)

4. - PROTECCIONES COLECTIVAS.

- Se respetaran las señales de tráfico interiores de la obra.
- El personal ajeno a este trabajo en particular se mantendrá alejado de la zona de maniobrabilidad del camión.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Compresor**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Vuelco.
- Atrapamientos de personas.
- Caída por terraplén.
- Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
- Otros.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se realizara a una distancia nunca inferior a los 2 m. (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del riesgo de desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga.
- El transporte en suspensión se efectuara mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma que quede garantizada la seguridad de la carga.
- El compresor a utilizar en esta obra, quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en su totalidad esta nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.
- Los compresores a utilizar en esta obra serán los llamados silenciosos en la intención de disminuir la contaminación acústica.
- Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra estarán siempre instaladas en posición cerradas, en prevención de posibles atrapamientos y ruido.
- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. (como norma general), en su entorno, instalándose señales de obligatorio el uso de protectores auditivos para sobrepasar la línea de limitación.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en prevención de incendios o de explosión.
- Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso; es decir, sin grietas o desgastes que puedan predecir un reventón.
- El Vigilante de Seguridad controlara el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados diariamente con el fin de que sean subsanados.
- Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de presión según cálculo.
- Las mangueras de presión se mantendrán elevadas a 4 m. de altura en los cruces sobre los caminos de la obra.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (si existe el riesgo de golpes en la cabeza).
- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados (en especial para realizar las maniobras de arranque y parada).
- Protectores auditivos (ídem al anterior).
- Taponcillos auditivos (ídem al anterior).
- Ropa de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Guantes de goma o P.V.C.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Excavadora**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello.
- Vuelco de la máquina.
- Choque contra otros vehículos.
- Quemaduras.
- Atrapamientos.
- Caída de personas desde la máquina..
- Golpes.
- Ruido propio y de conjunto.
- Vibraciones.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuaran siempre utilizando marchas cortas.
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuara a velocidad lenta.
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante.
- Botas impermeables.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Extendedora Bituminosos**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico.
- Quemaduras.
- Atropello durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte de aglomerado asfáltico con la extendedora.
- Caída de personas desde la máquina

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su conductor, para evitar accidentes por caída.
- Todos los operarios de auxilio quedaran en posición en la cuneta por delante de la máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante las maniobras.

3. –PROTECCIONES COLECTIVAS

- Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Guantes impermeables antiabrasivos.
- Botas de media caña, impermeables con suela de neopreno.
- Botas de caña alta anticalóricas.
- Gorros protectores del sol.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Plataforma elevadora**

Las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP), son máquinas especialmente diseñadas, fabricadas y destinadas para la elevación de personas, cuyo manejo en los lugares de trabajo se realiza habitualmente por operadores ajenos a la empresa del propietario o arrendador y que dependen del usuario o arrendatario.

Por lo tanto, hay dos notas características diferenciales, DESTINO Y MANEJO, que inciden en la importancia de conseguir máxima SEGURIDAD y adecuada FORMACION, durante la utilización de la PEMP.

1. – NORMATIVA LEGAL.

- *General.* La fuente legislativa de seguridad brota en su mayor parte de la normalización de directivas comunitarias europeas, cuya transposición al derecho español se basa en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Reglamento de los Servicios de Prevención y otras disposiciones complementarias.

  La seguridad de PRODUCTO está tipificada en la denominada Directiva de Máquinas, texto refundido de otras cuatro, que están vertidas en nuestros RR.DD. 1435/1992 y 56/1995.

  La seguridad de las PERSONAS que utilizan las máquinas, por los RR.DD. 1215/1997 (equipos de trabajo), 1627/1997 (obras de construcción), y 2177/2004 (trabajos temporales en altura).

- *Plataformas elevadoras.* Las PEMP carecen actualmente de una regulación específica obligatoria en España. Situación legal:

  FABRICACION. Norma Europea EN-280 "Plataformas elevadoras móviles de personal, cálculos de diseño, criterios de estabilidad, construcción, seguridad, exámenes y ensayos", que sirve de apoyo a los requisitos esenciales de la Directiva de Máquinas 98/37/CE, y la conformidad de su contenido es un medio para satisfacer los requisitos esenciales específicos de la citada Directiva, desde Julio de 2002.

  UTILIZACION. Norma Española UNE-58921-IN "Instalaciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal" publicada por AENOR en Noviembre de 2002.

  PAGINA WEB DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA. "La Directiva de Máquinas, la Ley de prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención, así como las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo tipificados en el Real Decreto 1215/1997, establecen los principios básicos que han de cumplir las PEMP.

  "La Norma UNE-EN-280 "plataformas elevadoras móviles de personal, cálculos de diseño, criterios de estabilidad, construcción, seguridad, exámenes y ensayos" es norma armonizada que da presunción de conformidad con la Directiva de Máquinas y cumplimiento, por tanto, con los requisitos constructivos exigibles".

"No existiendo una reglamentación específica para este tipo de máquinas, sobre las condiciones de instalación, manejo, mantenimiento, etc., que desarrollen los principios exigibles en la reglamentación anteriormente señalada, se considera que el cumplimiento con la norma UNE-58921-IN "Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal" constituye una forma de cumplir con las exigencias legalmente antes señaladas". (texto literal de la web del Ministerio).

- *Proyecto de Instrucción Técnica Complementaria para las PEMP*

El Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, aprobado por el R.D. 2291/1985, de 8 de Noviembre (BOE de 11/11/85) extender su ámbito a las grúas, plataformas elevadoras y aparatos de manutención análogos que puedan ser objeto de accidentes, a partir del momento de la entrada en vigor de las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), en los plazos establecidos en cada una de ellas.

Hasta la fecha, han sido publicadas cuatro ITCs numeradas: Ascensores, Grúas Torre para Obras, Carretillas Automotoras de Manutención y Grúas Móviles Autopropulsadas. La segunda y la cuarta han sido objeto de nuevos RR.DD. en julio de 2003.

El proyecto de la ITC-5 pata Plataformas Elevadoras Móviles de Personal se encuentra en fase de tramitación en el Ministerio de Industria.

2. – PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UTILIZACIÓN DE LAS PEMP.

- *Manual de Instrucciones de Seguridad y Manejo de las PEMP*

La "Asociación Nacional de Alquiladores de Plataformas Aéreas de Trabajo" (ANAPAT), organización profesional empresarial creada el año 1993 para defender los interesas generales y comunes de sus miembros, fue desde el primer momento consciente de su obligación de prevenir los riesgos generados por unas máquinas capaces de elevar personas y manejadas por operarios de las empresas usuarias de las mismas, y, en consecuencia, elaboró un MANUAL DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO DE PEMP, destinado fundamentalmente a sus operadores, con objeto de cumplir los requisitos legales mínimos de formación e información prescritos en el Real Decreto 1215/1997 para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y demás normas concordantes.

Más de treinta ediciones y 600.000 ejemplares del MANUAL, recomendado por los más importantes fabricantes de PLATAFORMAS del mundo, justifican los objetivos iniciales de la obra.

El MANUAL de "ANAPAT" se entrega por las empresas miembros al formalizar los contratos de alquiler, después de que cada operador haya leído y comprendido sus treinta instrucciones de seguridad, con sus breves textos trilingües (español, francés e inglés), acompañado por los correspondientes pictogramas.

El análisis por conceptos y en orden alfabético de todas las obligaciones y requisitos tipificados en las diferentes normas generales y específicas aplicables a las PEMP, que ANAPAT ha realizado para informar a sus asociados, requeriría un exhaustivo y prolijo estudio. En virtud de ello, vamos a exponer algunas de las cuestiones más relevantes que originan frecuentes consultas.

- *Campo de aplicación de las normas de seguridad para las PEMP*

  Las medidas técnicas de seguridad para las plataformas elevadoras móviles de personal se aplican a las PEMP de todos los tipos y de todas las capacidades, destinadas a desplazar personas hasta una posición de trabajo, donde llevan a cabo una tarea desde la plataforma de trabajo, con la intención de que las personas entren y salgan de las plataformas de trabajo en una posición de acceso definida (EN-280, 1.1.).

  La plataforma de trabajo: Plataforma rodeada por una barandilla o una cabina que puede desplazarse con su carga hasta una posición que permita efectuar trabajos de montaje, reparación, inspección u otros trabajos similares (EN-280, 3.2.)

-
- *Barandillas*

  R.D. 1215/1997, apartado 1.6. del anexo I. "Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo" (texto modificado por el artículo único del R.D. 2177/2004 (BOE 274, de 13/11/2004). Apartado 6. "…en particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente de una protección intermedia y de un rodapiés".

  R.D. 1627/1997, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Anexo IV, Parte C, 3. Caídas de altura, letra B) (BOE 256, de 25/10/1997, pág. 30885): Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente".

- *Formación e información (R.D. 1215/1997) -ADECUADAS: Garantizadas por el empresario (empleador del operador) para cubrir los riesgos de los equipos*

  - CONTENIDO: Como mínimo, indicaciones relativas a:

    □□Condiciones y utilización (normas fabricante y peligros)
    □□Conclusiones por experiencia en la utilización
    □□Cualquier otra información preventiva

  - FORMA: comprensible para los trabajadores (folletos). Puesta a disposición de los trabajadores.

  - EQUIPOS CERCANOS: atención a riesgos del entorno.

  - FORMACION ESPECÍFICA: equipos que requieran un mantenimiento especial.

  Conclusión: Normas generales a falta de otras disposiciones específicas obligatorias para los operadores de plataformas.

3. – ELEVACIÓN DE PERSONAS.

Resumen esquemático de las normas relativas a diferentes equipos de elevación:

- *Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP):*

  Regla general: "La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de trabajo y accesorios previstos a tal efecto" (R.D. 1215/1997)

  Confirmación: R.D. 1627/1997, seguridad en obras de construcción; Directiva de Máquinas; Norma Europea EN-280; Norma Española "UNE-58921-IN".

  Certificación: Declaración y marcado CE por EXAMEN DE TIPO (Anexo VI, D.M.)

- *Carretillas Automotoras de Elevación*

  Definición: "Vehículo de ruedas destinado a transportar, tirar, empujar, levantar o apilar y almacenar cargas de cualquier naturaleza…" (ITC-MIE-3).

  Certificación: Expediente Técnico de Construcción (Anexo V, D.M.): "No pueden elevar personas (Máquinas no comprendidas en el Anexo IV, como aparatos de elevación de personas con peligro de caída vertical superior a tres metros).

- *Grúas cargadoras*

  Definición: "Grúa motorizada comprendiendo una columna que gira sobre una base y un sistema de pluma fijado a la parte superior de la columna. Generalmente la grúa está montada sobre un vehículo y está diseñada para la carga y descarga del vehículo (Norma UNE-EN-12999; 3.1.1.). No cubre los peligros relacionados con la elevación de personas (idem. 1. Párrafo 4.)

  Certificación: Expediente del fabricante (Anexo V. D.M.) Máquina no comprendida en el anexo IV, como aparato de elevación de personas con peligro de caída vertical superior a tres metros.

- *Equipos de trabajo temporales en altura: Escaleras, Andamios y Técnicas de acceso mediante cuerdas (trabajos verticales).*

  Norma R.D. 2177/2004, de 12/11/2004 (BOE 274 de 13/11/2004)

  Reglas generales: Prioridad de las medidas de protección colectiva sobre las individuales y la elección no puede subordinarse a criterios económicos. Limita la utilización a casos de bajo riesgo que no justifiquen otros medios más seguros.

  Reglas específicas:

  - Escaleras de mano: Exige, además, protección individual anticaídas a más de 3,5 metros; estabilidad; puntos de apoyo y garantía de resistencia.
  - Andamios: Requiere plan de montaje, desmontaje y mantenimiento
  - Cuerdas: Necesita formación adecuada del trabajador, arneses, doble cuerda y planificación y supervisión del trabajo.

Conclusión: En la elevación de personas, las plataformas elevadoras móviles de personal cumplen las exigencias legales vigentes y los requisitos de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Maquinaria en general**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Vuelcos.
- Hundimientos.
- Choques y Golpes.
- Los derivados de atmósferas agresivas o molestas.
- Ruido.
- Explosión e incendios.
- Atropellos.
- Caídas a cualquier nivel.
- Atrapamientos.
- Cortes.
- Golpes y proyecciones.
- Contactos con la energía eléctrica.
- Los inherentes al propio lugar de utilización.
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.).
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación.
- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la leyenda: "MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR"
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación.
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MÁQUINA AVERIADA", será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control.
- Sólo el personal autorizado podrá utilizar una determinada máquina o máquina-herramienta.
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre elementos nivelados y firmes.
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de descenso.
- Las cargas de transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador.
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas de bajo la trayectoria de cargas suspendidas.
- Los aparatos de izar a emplear en estas obras, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.
- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para lo que se instala.
- La sustitución de cables deteriorados se efectuara mediante mano de obra especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos para evitar deformaciones y cizalladuras.
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionaran como mínimo una vez a la semana por el vigilante de seguridad, que previa comunicación al jefe de obra, ordenara la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos.
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo de seguridad, estando prohibidos los de tipo artesanal.
- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresas la carga máxima que pueden soportar.
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante.
- Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personasen el interior de los jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra.
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su término mediante topes de seguridad de final de carrera.
- Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.).
- Semanalmente, el vigilante de seguridad revisara el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a la Dirección Facultativa.
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedaran interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero
- Gafas de seguridad antiproyecciones.
- Otros.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Maquinaria movimiento de tierras**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Vuelco.
- Atropello.
- Atrapamientos.
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, Atrapamientos, etc.)..
- Ruido.
- Polvo ambiental.
- Caídas al subir o bajar de la máquina.
- Otros.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.
- Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar riesgos por atropellos.
- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
- Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras para evitar los riesgos por caída de la máquina. Esto se realizará cuando se considere que la altura es peligrosa.
- Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas del tráfico.
- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso para la maquinaria, o alejarla a otros tajos.
- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
- Gafas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Botas de seguridad.
- Protecciones auditivas.
- Botas de goma o de P.V.C.
- Cinturón elástico anti vibratorio.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Martillo neumático**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo.
- Ruido y polvo ambiental.
- Sobreesfuerzos.
- Rotura de manguera bajo presión.
- Contactos con líneas de energía eléctrica enterradas.
- Proyección de objetos y/o partículas.

2. – NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO.

- Cada tajo con martillos estará trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
- Los trabajadores, que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo neumático, serán sometidos a examen médico mensual para detectar posibles alteraciones.
- En el acceso a un tajo de martillos se instalaran sobre los pies derechos señales de "Obligatorio el uso de gafas antiproyecciones" y "Obligatorio el uso de mascarillas de respiración".
- En esta obra, a los operarios encargados de manejar los martillos neumáticos, se les informara de la normativa precisa para su utilización.
- El personal de esta obra que debe manejar los martillos neumáticos será especialista en estas máquinas, en prevención de los riesgos de impericia.
- Se prohíbe expresamente en esta obra el uso de martillo neumático en las excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada la banda o señalización de aviso.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los parámetros que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
- Se prohíbe expresamente en esta obra, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m. del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido.
- La circulación de viandantes en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara por el lugar más alejado posible que permita el trazado de la calle en que se actúa.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados.
- Protectores auditivos.
- Mandil, manguitos, manoplas y polainas de cuero.
- Gafas antiproyecciones.
- Mascarillas antipolvo con filtro recambiable.
- Faja elástica de protección de cintura.
- Muñequeras elásticas.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Rodillo**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Atropello.
- Caída por pendientes.
- Vuelco.
- Choque contra otros vehículos.
- Incendio y quemaduras.
- Ruido.
- Vibraciones.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina, de acuerdo con el manual del fabricante.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Prohibición de transportar personal en la máquina.
- Consideración del terreno donde se encuentra la máquina actuando.
- No se funcionara durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.

3. –PROTECCIONES COLECTIVAS

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.
- Señalización del viaje.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo adecuada.
- Cinturón elástico antivibratorio.
- Protectores auditivos y gafas de protección polvo.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Vibrador**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas desde altura durante su manejo.
- Caídas a distinto nivel del vibrador.
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
- Vibraciones.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Las operaciones de vibrado se realizaran siempre sobre posiciones estables.
- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios.
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Ropa de trabajo.
- Botas de goma.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de protección contra salpicaduras.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Compactador**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas distinto nivel.
- Golpes, cortes y pinchazos
- Atrapamientos entre partes giratorias, o rodillo y cabina.
- Proyección de fragmentos y fluidos.
- Atrapamientos.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos durante el mantenimiento.
- Atrapamiento por vuelco.
- Problemas dorsolumbares por transmisión de vibraciones de la máquina.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Incendio.
- Atropellos y golpes con vehículos.
- Polvo ambiental.
- Gases y vapores.
- Ruido.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros.
- Subir y bajar de frente a la máquina y no utilizar para ello los soportes del rodillo.
- Mantener la máquina limpia de restos de aceite, lubricantes, etc.
- Tener herramienta adecuada a las operaciones a realizar y saber cómo hacerlas.
- Asegurarse de que la máquina está parada antes de hacer ninguna operación en ella.
- Asegurarse de que no hay nadie entre el rodillo y la cabina o delante del rodillo o detrás de la máquina cuando ésta esté en funcionamiento.
- Proteger las partes móviles.
- Llevar siempre las protecciones de la máquina puestas y con las señales de peligro correspondiente bien visibles.
- Hacer operaciones con la máquina parada y en frío, frenada y estabilizada.
- Eliminar energías residuales antes de operar.
- Llevar cabina ROPS para evitar aplastamiento en caso de vuelco.
- No trabajar junto a los taludes o zanjas, hacerse indicar por otros en caso de realizar estos trabajos y asegurar la resistencia de taludes o zanjas si se ha de trabajar cerca de ellas.
- Mantener la cabina y el rodillo lo más cercano al eje longitudinal para evitar vuelcos, especialmente en terrenos con inclinación.
- Los movimientos en pendiente, hacerlos en el sentido de la misma y no lateralmente.
- Tener un asiento con suspensión que absorba las vibraciones de la máquina
- Climatizar la cabina
- Trabajar con la cabina cerrada y llevar ropa adecuada a la temperatura ambiente
- Tener la máquina limpia y eliminar restos de lubricantes.
- No acumular trapos ni grasas junto al motor.
- Llevar extintor en uso.
- Avisar de nuestro arranque y movimiento, mirando antes si hay alguien delante del rodillo o detrás de la máquina.

- Llevar señales acústicas de marcha atrás.
- Llevar dispositivos de seguridad, retrovisores, luces y señales en perfecto estado y utilizarlas para avisar de nuestra presencia y maniobras con antelación.
- Mantener la distancia con la extendedora u otros compactadores para evitar choque.
- Llevar la cabina cerrada.
- Tener cristales y juntas en perfecto estado.
- Mantener la distancia con las demás máquinas (extendedora y otros compactadores) para evitar nubes de polvo, gases de combustión y de bituminosos producidos por ellas.
- Hacer mediciones de ruido.
- Llevar la cabina cerrada.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Guantes de protección.
- Calzado aislante.
- Gafas antiproyección.
- Cinturón de seguridad.
- Faja elástica para sujeción lumbar
- Protectores auditivos adecuados si hiciera falta

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Motoniveladora**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas distinto nivel.
- Choques y golpes contras las cuchillas o partes giratorias.
- Golpes, cortes y pinchazos.
- Proyección de partículas.
- Atrapamientos entre partes giratorias, ruedas o cuchillas
- Vuelco de la máquina.
- Vuelco de la máquina.
- Exposición a temperaturas extremas.
- Proyección de fragmentos y fluidos.
- Atrapamientos.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos durante el mantenimiento.
- Incendio.
- Atropellos y golpes con vehículos.
- Polvo ambiental.
- Ruido.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Subir y bajar de la máquina por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros.
- Subir y bajar de frente a la máquina y no utilizar las ruedas para ello.
- Mantener la máquina limpia de restos de aceite, lubricantes, etc.
- Para acceder a las zonas entre cuchillas no utilizar éstas como peldaños.

- La máquina tiene muchas partes móviles, salientes y cortantes, prestar atención cuando hacemos cualquier operación junto a esos puntos
- No debe situarse nadie en el entorno de la máquina mientras ésta trabaja para evitar ser golpeado por las cuchillas o ruedas
- Tener herramienta adecuada a las operaciones a realizar y saber cómo hacerlas.
- No situarse cerca de la máquina mientras trabaja para evitar proyecciones del material que se extiende.
- La máquina presenta un gran número de huecos entre engranajes, partes móviles y accesorios móviles en continuo movimiento (cuchillas, tornamesa, brazos, ruedas delanteras, etc.), lo que la hace especialmente peligrosa por este motivo. Asegurarse de que la máquina está parada y con las cuchillas apoyadas antes de hacer ninguna operación en ella.
- Asegurarse de que no hay nadie entre las ruedas, entre las cuchillas, delante o detrás de la máquina antes de accionar cualquier mecanismo.
- A pesar de la estabilidad que proporcionan las cuchillas, la máquina trabaja en planos inclinados y en ángulos máquina complementos que facilitan el vuelco. Por ello hay que tener cuidado con el lugar donde trabajamos.
- Revisar previamente las zonas de trabajo para ver terrenos poco firmes o inestables que puedan hundirse o fallar y, asegurarlos o evitarlos.
- No trabajar junto a los taludes o zanjas, hacerse indicar por otros en caso de realizar estos trabajos y asegurar la resistencia de taludes o zanjas si se ha de trabajar cerca .
- Llevar cabina ROPS para evitar aplastamiento en caso de vuelco.
- Trabajar en los límites de inclinación de la máquina que marque el fabricante.
- Los movimientos en pendiente, hacerlos en el sentido de la misma y no lateralmente.
- Climatizar la cabina.
- Trabajar con la cabina cerrada.
- Llevar siempre las protecciones de la máquina puestas y con las señales de peligro correspondientes bien visibles.
- Hacer operaciones con la máquina parada y en frío, las cuchillas apoyadas en el suelo y la máquina frenada y estabilizada.
- Eliminar energías residuales antes de operar.
- Tener la máquina limpia y eliminar restos de lubricantes.
- No acumular trapos ni grasas junto al motor.
- Llevar extintor en uso.
- Avisar de nuestro arranque y movimiento, mirando antes si hay alguien delante de las cuchillas o entre ellas o delante o detrás de la máquina.
- Llevar señales acústicas de marcha atrás.
- Llevar dispositivos de seguridad, retrovisores, luces y señales en perfecto estado y utilizarlas para avisar de nuestra presencia y maniobras con antelación.
- Llevar la cabina cerrada.
- Tener cristales y juntas en perfecto estado, especialmente en esta máquina por la generación de polvo en el arrastre de materiales.
- Hacer mediciones de ruido.
- Llevar la cabina cerrada.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Guantes de protección.
- Calzado aislante.
- Gafas antiproyección.
- Cinturón de seguridad.
- Faja elástica para sujeción lumbar
- Protectores auditivos adecuados si hiciera falta.

	FICHAS DE SEGURIDAD EN CONSTRUCCIÓN
CLASE:	**Maquinaria**
TIPO:	**Conductor de tanque regador de emulsión**

1. – RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES.

- Caídas distinto nivel.
- Atrapamientos a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos
- Contactos térmicos.
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.
- Incendios.
- Atropellos o golpes con vehículos.
- Accidentes de tráfico.
- EE.PP. Causadas por agentes físicos.

2. – NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD.

- Subir y bajar del vehículo por los lugares indicados para ello, utilizando peldaños y asideros.
- Subir y bajar de frente a la máquina y no utilizar las ruedas para ello.
- Mantener la máquina limpia de restos de aceite, lubricantes, etc.
- No manipular ningún órgano en movimiento sin los motores parados.
- Todos los órganos que puedan cortar, pinchar o golpear deberán estar protegidos con carcasas.
- Cumplir las instrucciones recibidas sobre las posturas de trabajo.
- El mando de riego se adaptará a la persona.
- Se debe evitar que el betún llegue a la piel. Hay que recordar el se pega y es difícil de quitar.
- Si el betún caliente le toca la piel, enfríese la zona afectada con agua o con el método indicado por el médico. No usar disolvente para quitar el betún de la zona quemada.
- Si cae betún caliente en los ojos, seguir las instrucciones de la ficha de seguridad.
- Para no exponerse a sustancias nocivas o tóxicas, hay que situarse en el lado de donde viene el viento
- Hay que asegurarse del buen funcionamiento de los medidores de temperatura de la caldera.
- Conocer el punto de inflamación del betún que tiene en su caldera.
- Comprobar la temperatura del betún y evitar que se aproxime excesivamente al punto de inflamación.
- Si la temperatura se aproxima excesivamente al punto de inflamación apagar inmediatamente la caldera.
- Cumplir las instrucciones y recomendación del producto (betún) que se está utilizando.
- Extintores revisados en las máquinas y vehículos.
- Comunique a su jefe directo de forma inmediata toda anomalía y/o deficiencia que detecte en su máquina, vehículo o lugar de trabajo.
- Cumpla las instrucciones del libro de mantenimiento para la conservación de su máquina.
- Compruebe diariamente los órganos importantes de su vehículo (frenos, dirección, luces, etc).
- No transporte personal si no está autorizado.
- Respete la señalización de obras.
- La cabina debe disponer de espejos.

- Utilizar señales ópticas y acústicas.
- Recuerde que transporta un producto peligroso y que en caso de derrames debe aislar del tráfico la zona de vertido.
- Si no está regando, permanezca en la zona asignada.
- El riego hágalo en la zona indicada y las maniobras hágalas en los puntos asignados.
- No sobrepase la distancia de seguridad a los bordes de los taludes.
- Antes de iniciar el riego, asegúrese de que la zona esté despejada.
- Realizar mediciones de los niveles de ruido, para adoptar las medidas necesarias en caso de que se superen los niveles recomendados.
- Utilizar asientos antivibratorios.
- Ajustar el asiento a las dimensiones del conductor.

3. –PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES

- Guantes de protección.
- Calzado aislante.
- Cinturón de seguridad del vehículo.
- Faja elástica para sujeción lumbar.
- Protectores auditivos adecuados si hiciera falta
- Ropa de trabajo con mangas bajadas y cuello cerrado.
- Guante de manguito largo.
- Mandil de cuero.
- Botas cerradas que impidan que el betún llegue a la piel.
- Protección de cara y ojos (pantallas y gafas).
- Mascarilla con filtro adecuado.
- Sillón antivibratorio.
- Muñequeras.

4. –PRENDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

- Extintores.

9.4.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS DE LA OBRA.

El proyecto **de construcción**, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio. Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas. Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra.

1. Las hogueras de obra.
2. La madera.
3. El desorden de la obra.
4. La suciedad de la obra.
5. El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
6. La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
7. El poliestireno expandido.
8. Pinturas.
9. Barnices.
10. Disolventes.
11. Desencofrantes.
12. El uso de lamparillas de fundido.
13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.
14. El uso de explosivos.

10.- PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA.

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:

- Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.
- Andamio metálico tubular apoyado.
- Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjado o losas.
- Cables fiadores para cinturones de seguridad.
- Cuerdas auxiliares: GUÍA SEGURA DE CARGAS.
- Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento.
- Extintores de incendios.
- Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable.
- Interruptor diferencial de 30 mA.
- Interruptor diferencial de 300 mA.
- Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte.
- Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera.
- Pasarelas de seguridad sobre zanjas.
- Portátil de seguridad para iluminación eléctrica.
- Sistema de redes tipo 'toldo'. Obra civil.
- Toma de tierra normalizada general de la obra.
- Transformador de seguridad a 24 voltios. (1500 W).

11.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA.

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver con la instalación de la protección colectiva. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:

DESCRIPCIÓN
Botas impermeables
Botas de seguridad con retuerzo metálico en puntera y plantilla antipunzonamiento.
Buzo o mono de trabajo.
Chaleco reflectante.
Traje completo impermeable. (Traje de agua).
Cinturón de seguridad homologado.
Filtro para mascarilla antipolvo.
Gafas antipolvo y antimpacto.
Guantes de cuero.
Juego de guantes dieléctricos para protección del contacto eléctrico en baja tensión, hasta 1000 voltios.
Guantes de goma finos.
Mascarilla respiración antipolvo.
Casco de seguridad homologado.

12.- SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:

12.1.-SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO.

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.

- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DE PELIGRO INDETERMINADO. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA DEL RIESGO ELÉCTRICO. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA EXPLOSIÓN. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. ADVERTENCIA INCEND. MATERIAS INFLAMABLES. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. BANDA DE ADVERTENCIA DE PELIGRO.
- Riesgo en el trab. PROHIBIDO FUMAR. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA MANOS. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA OIDOS. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA PIES. tamaño mediano.
- Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA VISTA. tamaño mediano.
- Señal salvamento SEÑAL DE DIRECCIÓN DE SOCORRO. Tamaño mediano.
- Señal salvamento. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano.
- Señal salvamento. LOCALIZACIÓN PRIMEROS AUXILIOS. Tamaño mediano.

12.2.-SEÑALIZACIÓN VIAL.

Los trabajos a realizar originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra por la posible presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, si hubiera tráfico sería necesario instalar la oportuna señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.

- Señal. vial LINEA HORIZONTAL REFLEXIVA. 15 cm COLOR AMARILLA.
- Señal. vial CONO DE BALIZAMIENTO TB-6
- Señal. vial interna de obra. BALIZAMIENTO LATERAL DE RAMPAS.
- Señal. vial. (manual) DISCO AZUL DE PASO PERMITIDO. TM-2.
- Señal. vial. (manual) DISCO DE STOP O PASO PROHIBIDO. TM-3.
- Señal. vial. BARRERA DE SEGURIDAD. TD-1
- Señal. vial. CARTEL CROQUIS. TR-210.
- Señal. vial LUZ AMBAR INTERMITENTE TL-2.
- Señal. vial. CASCADA EN LÍNEA DE LUCES AMARILLAS TL-8.
- Señal. vial. ENTRADA PROHIBIDA. TR-101. 60 cm. de diámetro.
- Señal. vial. LONGITUD TRAMO PELIGROSO O SUJETO A PRESCRIPCIÓN. TS-10.
- Señal. vial. PANELES DIRECCIONALES TB-1
- Señal. vial. PIQUETES DE BALIZAMIENTO. TB-7
- Señal. vial. PROHIBIDO EL ADELANTAMIENTO. TR-305. 60 cm. de diámetro.
- Señal. vial. SENTIDO OBLIGATORIO DERECHA. TR-400a. 60 cm. de diámetro.
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-15. 'perfil irregular' 90 cm. de lado.
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-28. 'gravilla' 90 cm. de lado.
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-18. 'obras' 60 cm. de lado.
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-30. 'escalón lateral' 90 cm. de lado.
- Señal. vial. TRIANGULAR PELIGRO TP-50. 'otros peligros' 90 cm. de lado.
- Señal. vial. VELOCIDAD MÁXIMA. TR-301. 90 cm. de diámetro.
- Señal. vial TRIANGULO PELIGRO TP-17-ab "estrechamiento calzada"

13.- PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

13.1.-PRIMEROS AUXILIOS.

Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

13.2.-LOCAL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS.

Es necesario dotar a la obra de un local botiquín de primeros auxilios, en el que se den las primeras atenciones sanitarias a los posibles accidentados.

También puede utilizarse para la atención sanitaria que dispense en obra el Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado.

El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la concertación de un servicio de ambulancias, que el plan de seguridad definirá exactamente.

13.3.-MEDICINA PREVENTIVA.

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.

13.4.-EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS.

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

14.- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO.

Como es de todos conocido, el futuro mantenimiento de la obra quedará a cargo de la sección de conservación de la Propiedad. Por lo tanto, será necesario que, una vez terminada la obra, el contratista efectúe el análisis y evaluación de los riesgos del mantenimiento posterior de lo construido, todo esto en colaboración con los departamentos de conservación y seguridad vial de la Propiedad. Debiendo quedar terminado, el análisis, antes de la recepción definitiva de la obra.

Aquí, y de forma breve, nos limitaremos a enunciar un plan tentativo de mantenimiento, que puede ser el definitivo si así lo creyere adecuado la administración.

Las unidades que necesitan **mantenimiento**, a nuestro entender, son las siguientes:

- Cunetas en tierras y hormigonadas.
- Colectores, sumideros y registros.
- Pozos y obras de drenaje transversal y longitudinal.
- Pavimento.
- Señalización y balizamiento.

El mantenimiento de las tres primeras unidades de obra requiere en su mayor parte de limpieza y, ocasionalmente, de reposición de tramos dañados.

Una vez que el pavimento presente daños importantes, será necesario recurrir al bacheo ocasional, y en último caso al refuerzo del mismo.

Oportunamente se volverá a pintar las líneas sobre el pavimento, reponer las señales que hayan sufrido daños y limpieza ocasional y oportuna de las mismas.

15.- DESCRIPCIÓN DE LA PREVENCIÓN PROYECTADA PARA SU APLICACIÓN, DURANTE EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO.

De acuerdo a las características de la obra que se va a construir, los niveles de intensidad de tráfico y las unidades de conservación que se describieron en el punto anterior de este estudio, sugerimos las siguientes medidas de seguridad:

- Protecciones individuales.
- Protecciones colectivas.
- Señalización y balizamiento de la obra.

Tomando en cuenta que por lo menos se deberá disponer de una cuadrilla de personal de conservación y limpieza, formada por:

- Encargado.
- Oficial de primera.
- Peones especialistas (2)dos.

Las medidas de protección individual deberían ser, entre otras, las siguientes:

- Botas impermeables.
- Cascos de seguridad, clase "N".
- Comando impermeable "tipo ingeniero".
- Chaleco reflectante.
- Manguitos reflectantes.
- Polainas reflectantes.
- Par de guantes fabricados en cuero flor.
- Unidad de "mono" o "buzo" de trabajo.
- Ropa impermeable, fabricada en material plástico sintético.

Las señales de advertencia de peligro deberán ser en su mayor parte fabricadas en chapa de acero con soporte basculante, pudiendo ser, si la administración lo creyere oportuno, fabricadas en material plástico con pintura reflectante.

En general de fácil transporte y cambio de posición. Se deberán escoger, de acuerdo a las circunstancias de peligro que se puedan producir por efecto de las labores que se estén desarrollando, de entre las que a continuación se detallan:

- Señal vial tipo TP-15, TP-15a), TP-15b)
- Señal vial tipo TP-17, TP-17a), TP-17b)
- Señal vial tipo TP-18
- Señal vial tipo TP-19
- Señal vial tipo TP-26
- Señal vial tipo TP-28
- Señal vial tipo TP-30
- Señal vial tipo TP-50
- Señal vial manual tipo TM-2
- Señal vial manual tipo TM-3
- Cono de balizamiento reflectante de plástico tipo TB-6.

16.- SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

1º El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud.

2º El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlarán mediante la ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.

4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:

- Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares.
- Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud pueda medir las cantidades desechadas.

17.- DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA.

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como partes integrantes del plan de Seguridad y Salud.

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.
- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.
- Documento del nombramiento del señalista de maniobras.
- Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.

18.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de Seguridad y Salud.

19.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS FUTUROS.

El contratista, al finalizar los trabajos, facilitará al director de la obra un informe valorado en el que se recoja todos los accidentes laborales ocurridos durante el transcurso de la misma, así como una relación de Medidas Preventivas y de EPI que hubieran evitado tales sucesos.

El informe se completará valorando la repercusión que tales medidas hubieran supuesto en la organización de los tajos y en la duración de la obra.

A tal efecto, y para facilitar su control, se puede emplear para consignar los accidentes de trabajo acaecidos en la obra el modelo que se acompaña y que es reproducción del incluido en el R.D. 773/1997.

Revisado el documento por el director de la obra, éste lo remitirá al Promotor.

20.- VALORACIÓN.

Sólo serán objeto las unidades de protección colectiva o especial indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto y las aprobadas en el Plan de Seguridad y Salud que sea aprobado para la obra, así como lo relativo a las protecciones individuales, el equipamiento y vestuario del personal, la disposición y mantenimiento de las instalaciones médicas y de higiene y bienestar (botiquín, comedores, letrinas, etc.).

En concreto serán a cargo del Contratista los costes de los servicios de prevención, vigilancia y comité de Seguridad y Salud, así como de las reuniones formativas e informativas.

Tajonar Agosto 2023

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.


Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA.**
ICCP, Colegiado nº19.233.

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.


Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

PLANOS

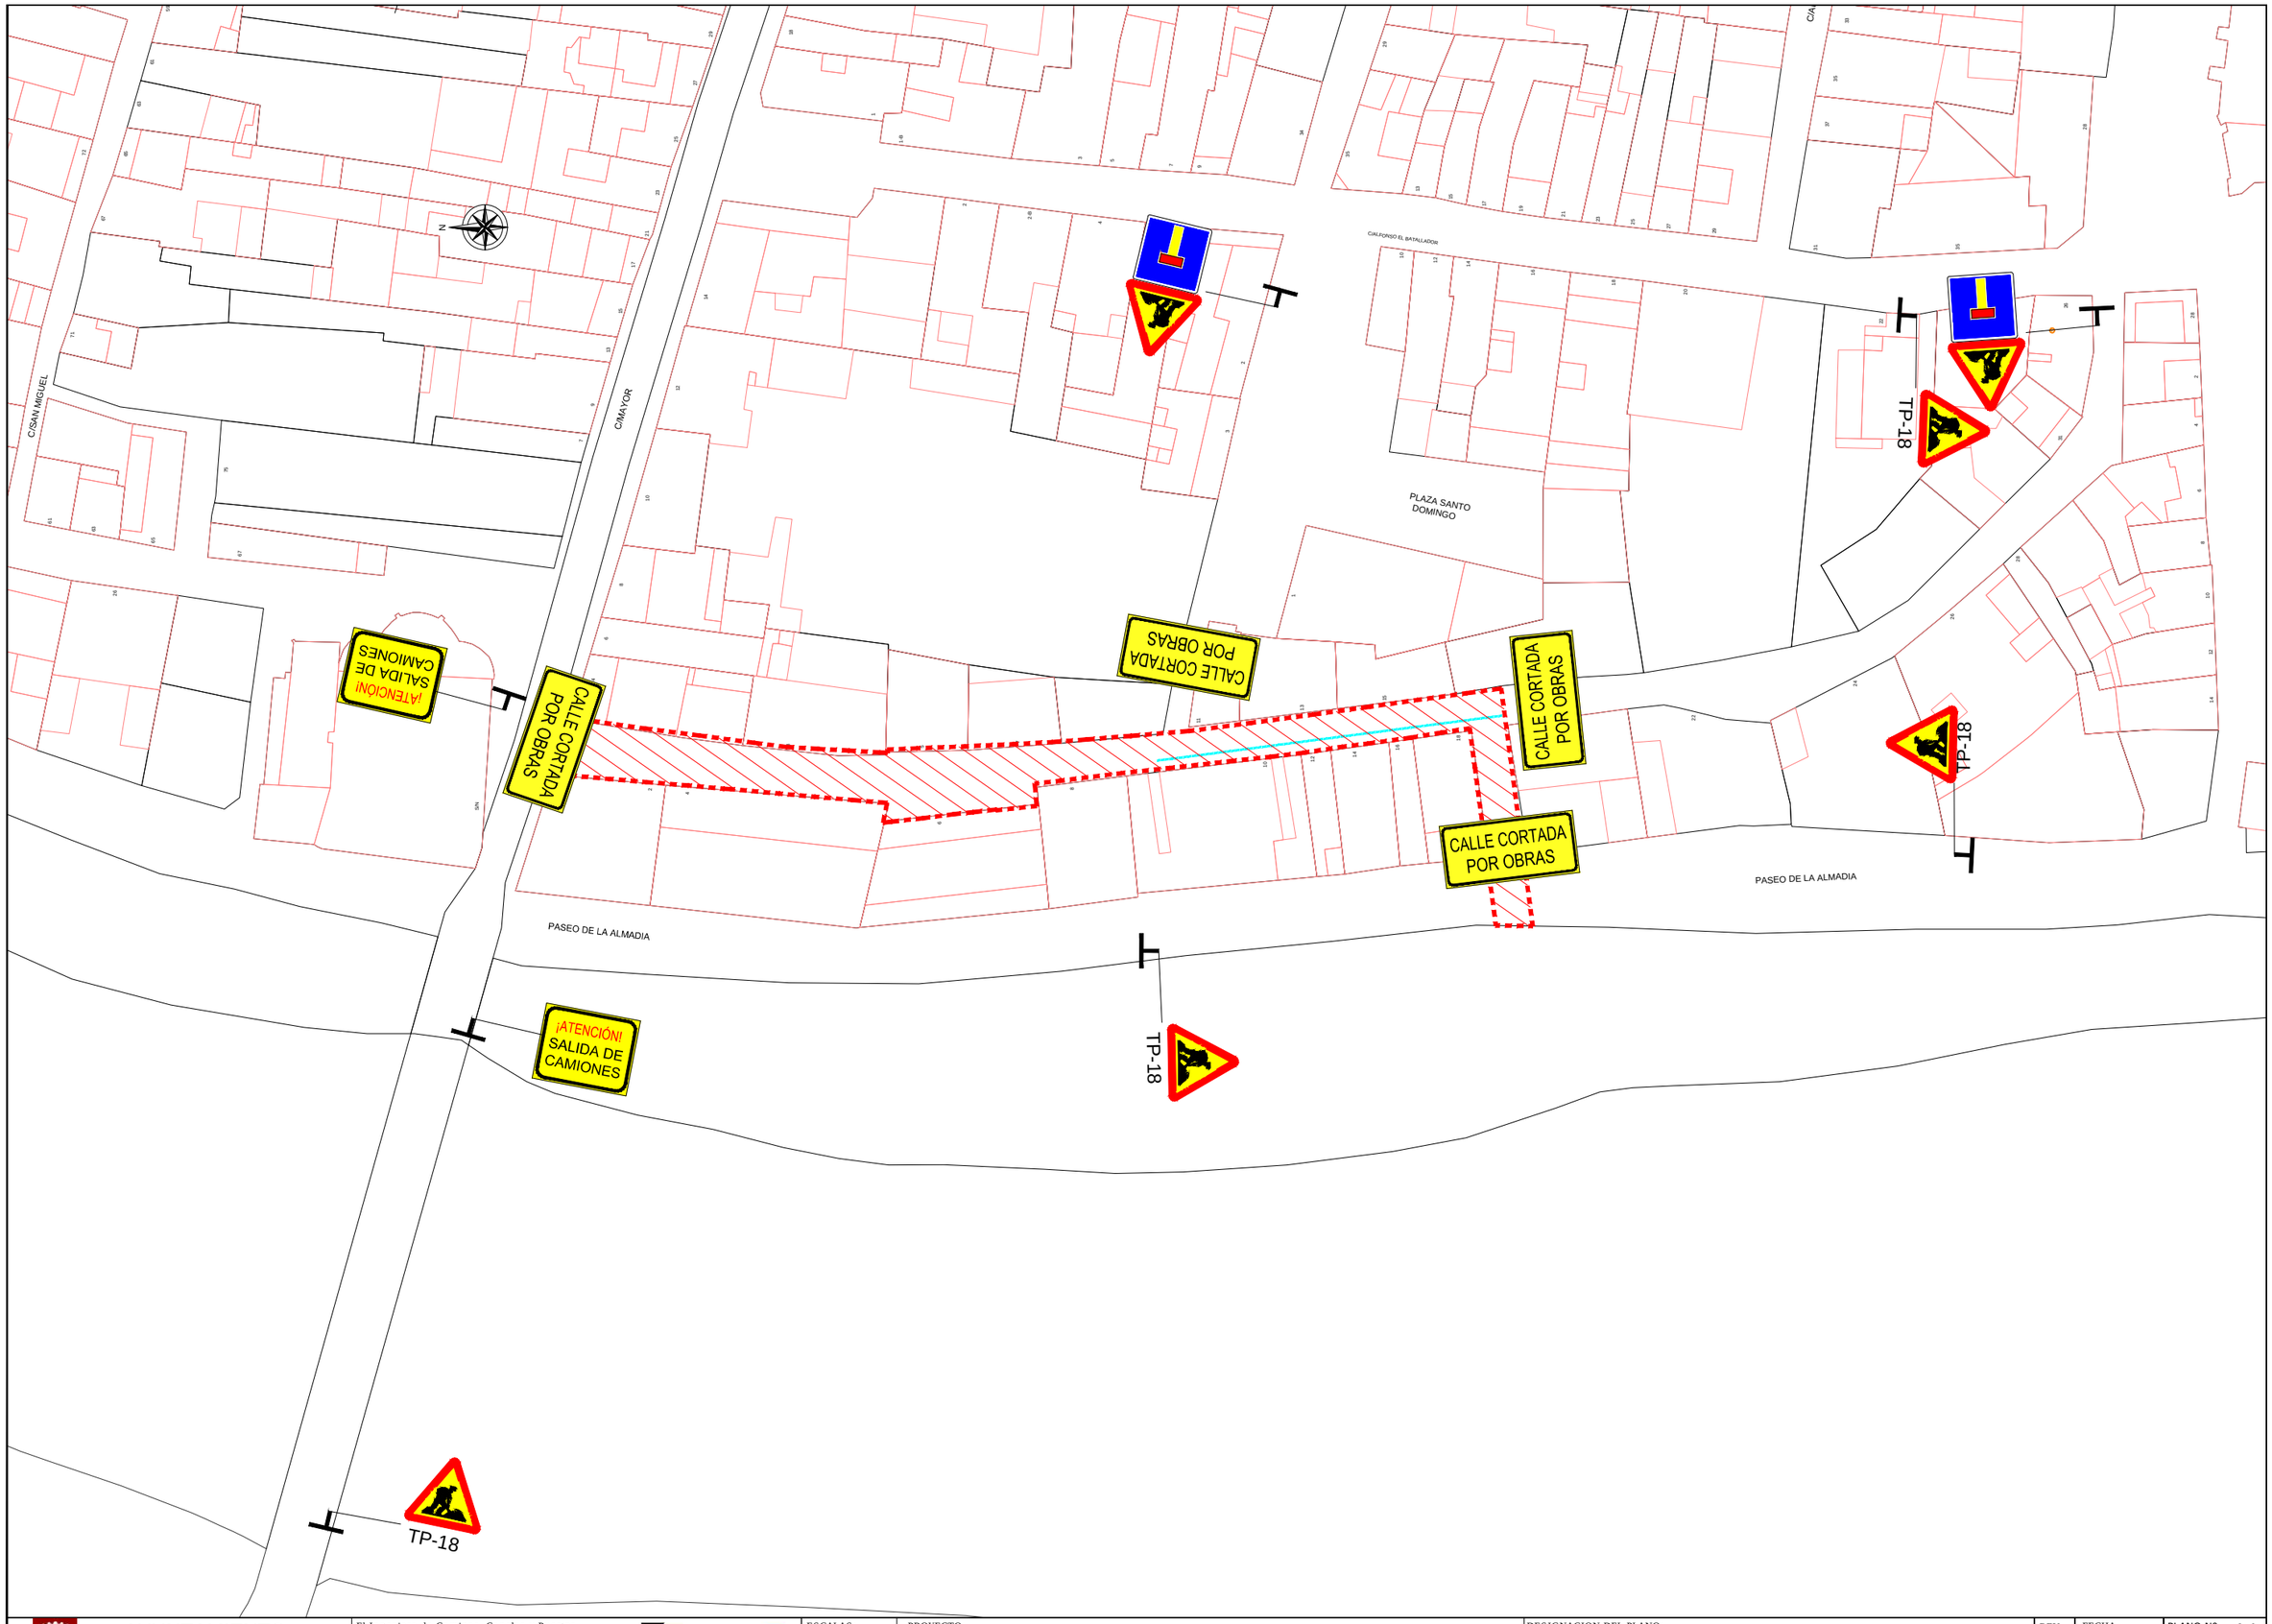


AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: 1:650	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: SEGURIDAD Y SALUD	REV 24/08/2023 FECHA AGOSTO 2023 DOCUMENTO DWG SYS PLANTA	PLANO Nº A4 HOJA 1 DE 3


COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA AUTÓNOMA

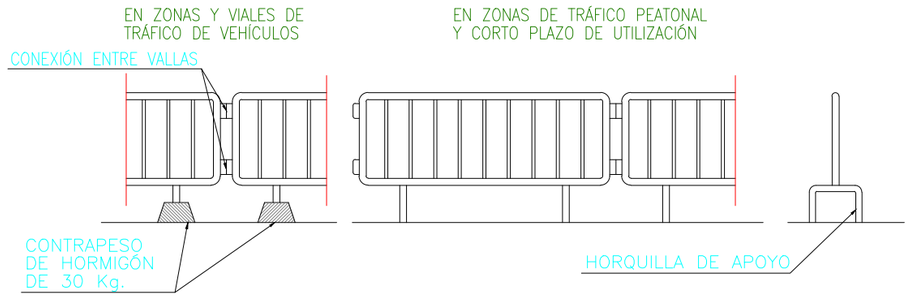



VALLA DE CERRAMIENTO DE MALLAZO

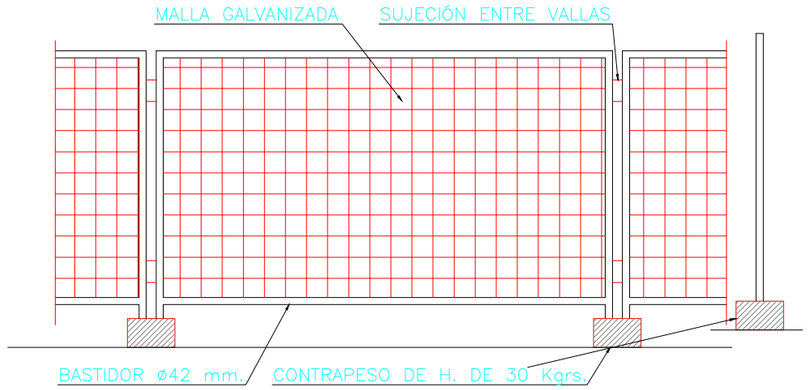


COLOCACIÓN DE SEÑALES DE TRAFICO

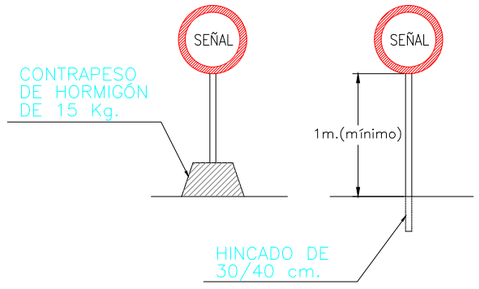


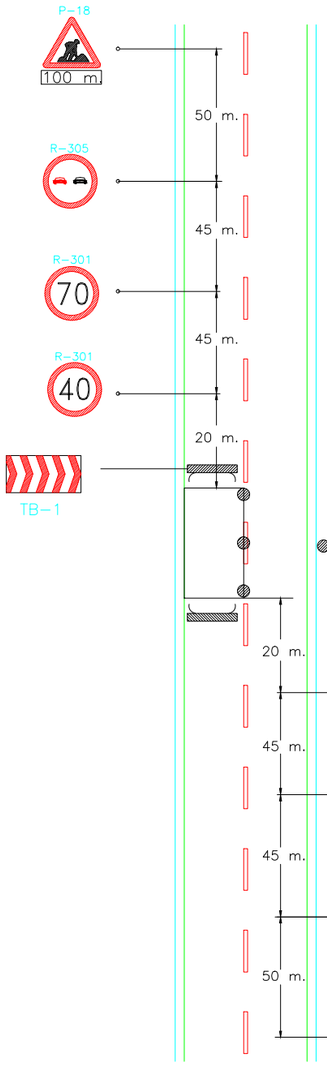

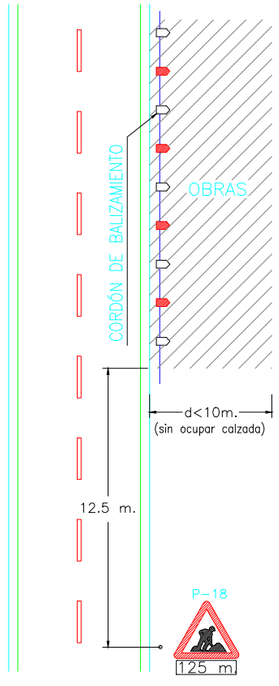


PÓRTICOS DE PROTECCIÓN

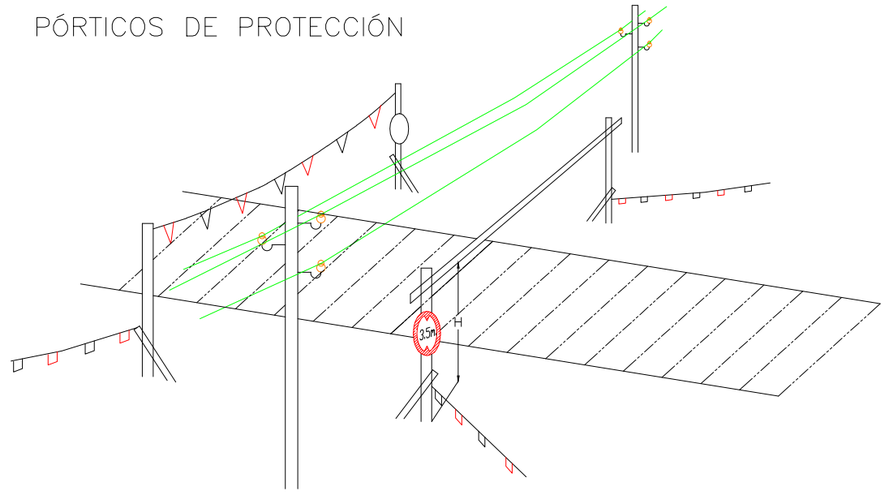


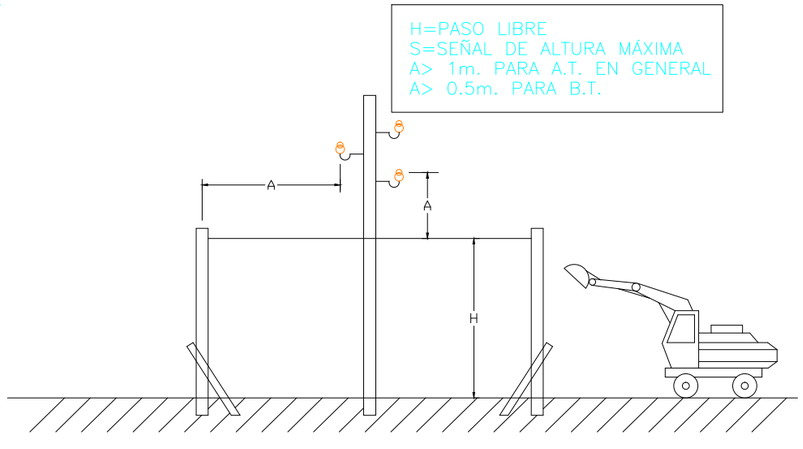

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: S/E	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: SEGURIDAD Y SALUD	REV 1 / FECHA AGOSTO 2023 / PLANO Nº A4 / DOCUMENTO DWG PLANTA DE SEGURIDAD Y SALUD 2 / HOJA 2 DE 3

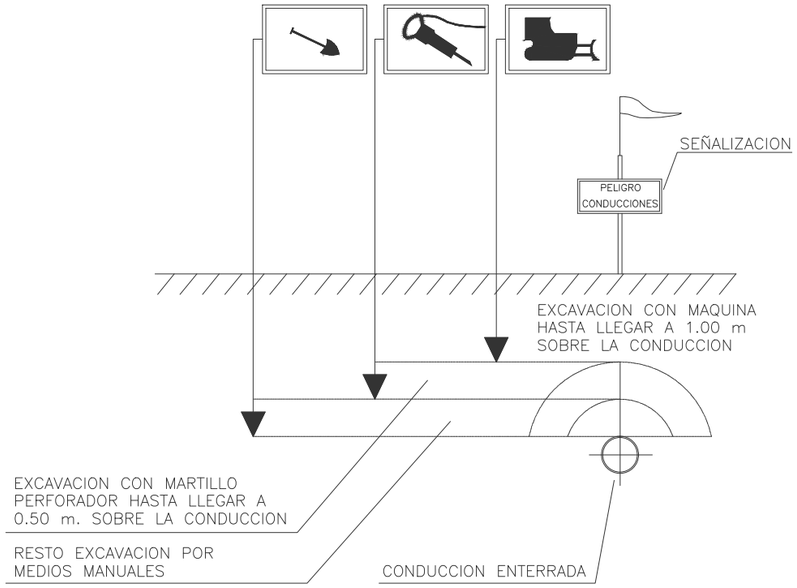


DISTANCIAS DE SEGURIDAD EN TRABAJOS
SOBRE INSTALACIONES SUBTERRANEAS

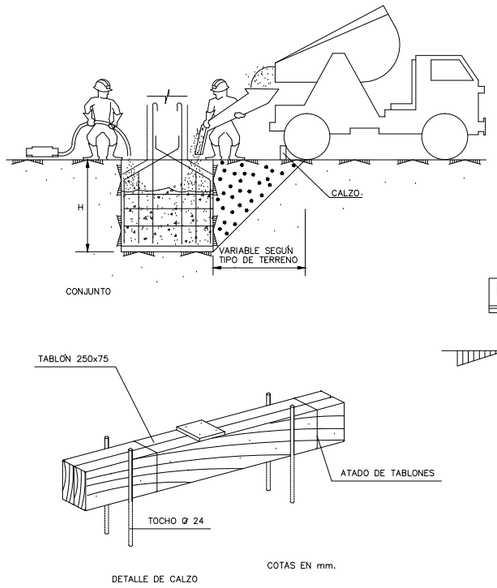

DETALLE DE CALZO

a= DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD
BAJA TENSION a ⩾ 1 m.
ALTA TENSION a ⩾ 3 m hasta 57.000 V
a > 5 m más de 57.000 V

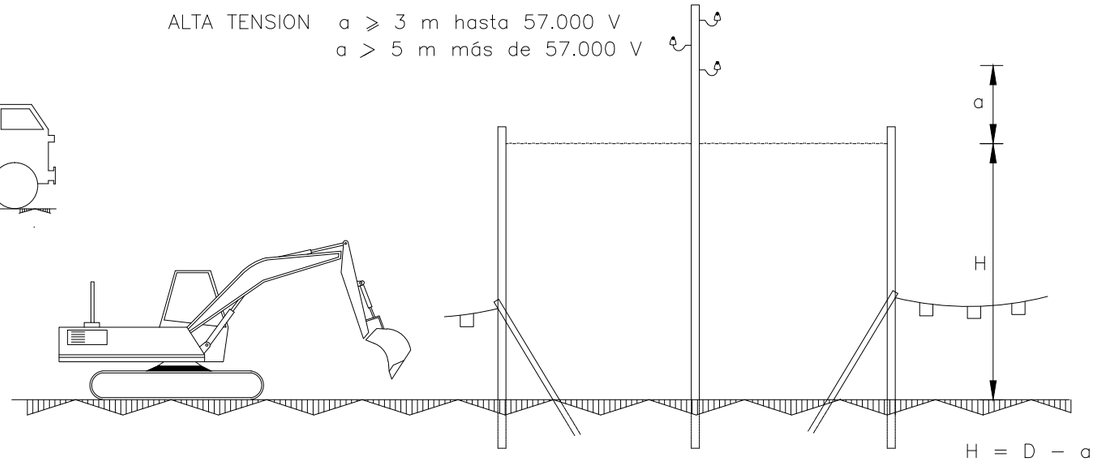


ALZADO LATERAL

D= Altura minima de la linea al suelo
a= Distancia minima de seguridad
H= Altura libre


PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

PROTECCIÓN ZANJAS

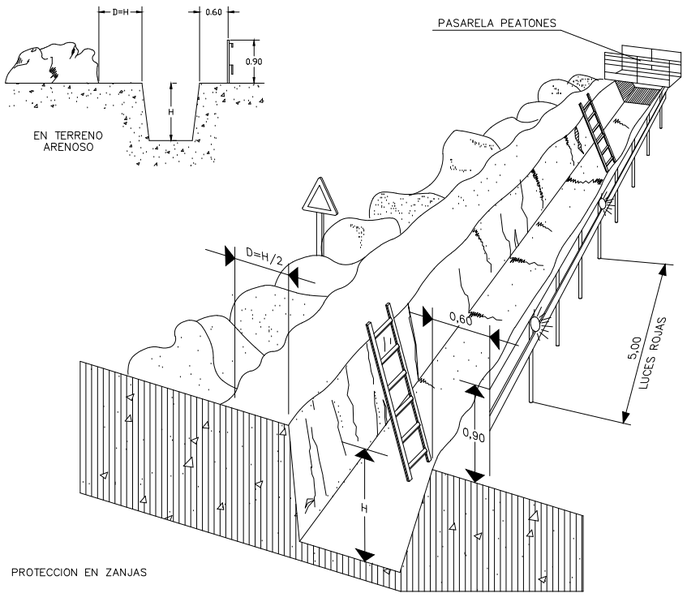


PROTECCION EN ZANJAS

DETALLE PASARELA

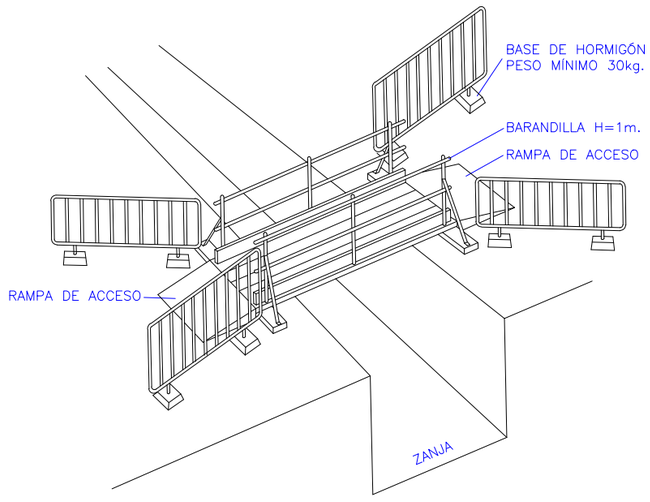

- EL ANCHO MÍNIMO DE LA PASARELA SERÁ DE 60cm. SI ES PARA EL PERSONAL DE OBRA Y DE 1.20 LOS RESTANTES.
- LAS PROTECCIONES DEBERAN PERMANECER MIENTRAS EXISTA ALGUN RIESGO O PELIGRO DE ACCIDENTE. LA ESTRUCTURA DE LA PASARELA SE CALCULARA SEGUN EL ANCHO DE ZANJA Y LA CARGA PREVISIBLE.

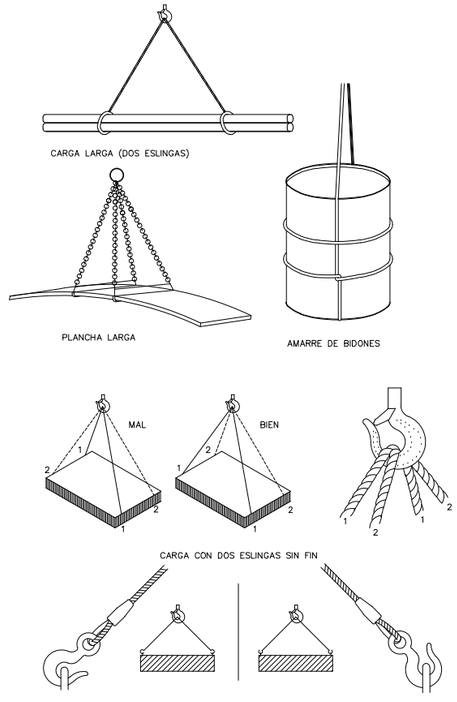

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: S/E	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: SEGURIDAD Y SALUD	REV 1 · FECHA AGOSTO 2023 · PLANO Nº A2 DOCUMENTO DWG PLANTA DE SEGURIDAD Y SALUD 2.3 · HOJA 3 DE 3

PLIEGO

ÍNDICE

1.- OBJETIVOS 1
2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA 1
2.1.- CONDICIONES GENERALES. 1
2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 3
2.3.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y USO, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES. 3
3.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 12
3.1.- CONDICIONES GENERALES. 12
3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS. 12
3.3.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA. 13
4.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA. 14
4.1.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO. 14
4.2.- NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES. 14
4.3.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 14
4.4.- SEÑALIZACIÓN VIAL. 15
4.5.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA. 16
4.6.- NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES. 16
4.7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL. 16
5.- DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS. 18
6.- SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 19
7.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA. 20
8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS. 22
9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA. 23
9.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS. 23
9.2.- ACOMETIDAS. 23
10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA. 24
11.- ORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES. 25
12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 26
13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 27
14.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA. 29
15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 29
16.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 30
17.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN. 31
18.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 32
19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 11 RD 1627/97). 32
20.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN. 34
21.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS. 34
22.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 35
23.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 36
24.- VALORACIÓN. 36
25.- SANCIONES ECONÓMICAS A IMPONER POR LA PROPIEDAD HACIA EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD APROBADO. 36
26.- PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 37

1.- OBJETIVOS.

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de Seguridad y Salud

2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.

3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su sistema de construcción de esta obra.

4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido.

5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud

6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.

7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su administración.

8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2.- NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

2.1.- CONDICIONES GENERALES.

En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra cumplan todos ellos con las siguientes condiciones generales:

1º La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente aprobada.

2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos de ejecución de obra.

3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra.

4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.

5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud, o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de seguridad y salud que llegue a aprobarse.

6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.

7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados.

8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual.

9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje.

Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud**.**

10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.

11º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante la Propiedad de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.

12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud es preferible al uso de equipos de protección individual, para defenderse de idéntico riesgo, en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.

13º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud En caso de fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra.

2.2.- CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS.

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y retirarlas.

El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.

2.3.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y USO, JUNTO CON LAS NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES.

a) Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.

Anclajes.

Fabricados en acero corrugado de 10 mm de diámetro, doblado en frío.

Disposición en obra.

Suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones de prevención que surjan.

b) Andamio metálico tubular apoyado

Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados.

Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por el fabricante.

El contratista principal es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante.

En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar.

c) Barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas.

CALIDAD: El material a emplear y sus componentes, será nuevo, a estrenar.

Cazoletas de sustentación.

Fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester.

Pies derechos.

Los soportes serán pies derechos comercializados, de acero de 4.5 cm., de diámetro, por hinca mediante tetón a un cajetín especial de PVC, ubicado en el zuncho antes de hormigonar el forjado o losa.

Barandilla.

La barandilla se formará por fragmentos tubulares de acero de 5 cm., de diámetro, pintado contra la corrosión.
Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, esta se lograra mediante el atado con alambre.

Señalización.

Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, pasamanos y barra intermedia, se suministrarán a la obra pintados en anillos alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar la protección e identificar de "seguridad" sus materiales.

Rodapié.

El rodapié será de madera de pino de 15.0X3.0 cm. de escuadría, idénticamente señalizada mediante pintura a franjas alternativas, en colores amarillo y negro, para evitar, además, su uso para otros menesteres.

Dimensiones.

Altura de la barra pasamanos: alternativamente 1m.; 0,90 m.; 1m.; 0,90 m.; etc., medida sobre la superficie que soporta la barandilla.
Altura barra intermedia: alternativamente y en correspondencia con la de mayor y menor altura de pasamanos 0,60 m.; 0,55 m.; 0,60 m.; 0,55 m.; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la barandilla.
Rodapié de 20 cm., de altura, con longitud 3.40 m., y escuadría 15.0X3.0.

Normas de obligado cumplimiento para el montaje y uso de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas.

1º Recibir la cuerda a la que se deben amarrar los cinturones de seguridad, de los montadores de barandillas.

2º Replantear correctamente las cazoletas especiales de PVC, para recibir el tetón del pie derecho en la armadura perimetral de los forjados o losas. Comprobar la corrección y verticalidad corregir los errores y hormigonar.

3º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre el lugar de montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en su lugar de hinca, una vez destapadas las cazoletas en las que se deben introducir.

4º Recibir sobre el lugar del montaje, ordenadamente y en bateas emplintadas, los tubos que conforman los pasamanos, barra intermedia y el rodapié de madera.

5º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los tres elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, barra intermedia y pasamanos.

Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla.

6º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo.

7º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán para estas tareas.

8º Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite toda su eliminación lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa.

Normas para los montadores de las barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas.

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

- El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de barandillas tubulares, no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido calculados para su función.

- No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le suministran.

- Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

- Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída.

- Replantee, transporte e instale en el zuncho del forjado, las cazoletas de sustentación de los pies derechos. Compruebe que quedaron en su lugar lo más verticales posible. Hormigonar.

- Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, mientras instala las barandillas. Extreme sus precauciones.

- Transporte a hombro todos los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.

- Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y cuero para su manejo.
- Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de hormigonar.
- Reciba el resto de los componentes por este orden:
  1º El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el borde del forjado o losa.
  2º La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.
  3º Por último, monte el pasamanos.
- Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún componente.
- Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual:
  - Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
  - Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
  - Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
  - Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
  - Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los accidentes de caída durante estas maniobras.
- Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE. que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

d) Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

Cuerdas.

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12.0 mm., y certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a 400 kg., emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas certificadas "N" por AENOR.

Lazos de amarre.

Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero.

Sustitución de cuerdas.

Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad, serán sustituidas de inmediato cuando:

1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %.
2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.
3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.
4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso.

e) Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa

CALIDAD: Nuevas a estrenar.

Cuerdas.

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm.

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa.

Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de un cuerda de guía.
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de guía.

f) Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento

Escalera.

Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante.

Material de fabricación.

Aluminio anonizado.

Normas de utilización.

Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual suministrado por el fabricante.

g) Extintores de incendios

CALIDAD: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las características de la obra a construir.

- Vestuario y aseo del personal de la obra.
- Comedor del personal de la obra.
- Local de primeros auxilios.
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
- Almacenes con productos o materiales inflamables.
- Cuadro general eléctrico.
- Cuadros de máquinas fijas de obra.
- Almacenes de material y talleres.
- Acopios especiales con riesgo de incendio.
- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios.

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa especializada.

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios.

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción previstos.

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR".

3º Al lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda.

h) Guindola telescópica sobre brazo hidráulico autodesplazable

Deberá cumplir con todos los controles que establece la normativa vigente, adecuándose a las necesidades de los trabajos para los que se le requiera.

i) Interruptores diferenciales de 30 mili amperios

CALIDAD: Nuevos, a estrenar

Tipo de mecanismo.

Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado; instalado en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Instalación.

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra.

Mantenimiento.

Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos con el fin de eliminarlos.

j) Conexiones eléctricas de seguridad

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

k) Interruptor diferencial de 300 mili amperios, calibrado selectivo

CALIDAD: Nuevos, a estrenar.

Descripción técnica.

Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza; especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de toma de tierra de la obra.

Instalación.
En los cuadros secundarios de conexión para fuerza.

Mantenimiento.

Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería.

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. En caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas.

l) Conexiones eléctricas de seguridad

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto.

m) Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte.

CALIDAD: Nuevas, a estrenar.

Manta.

Manta ignífuga comercializada para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. De forma rectangular.

Instalación.

En la vertical de todos los tajos de soldaduras o de oxicorte para evitar el riesgo de quemaduras al resto de los trabajadores o el riesgo de incendio de materias inflamables próximas.

Los que deben utilizarlas.

- Todos los soldadores en altura.
- Todos los operarios de oxicorte en altura.

n) Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

Dimensiones y montaje.

La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje de acuerdo a las zonas que se tengan que cubrir en obra.

Tapa de madera.

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadría 15.0X5.0 cm., unida mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero.

Instalación.

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su dimensión + 10 cm., de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de huecos horizontales con tapas de madera.

1º Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón.

En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios.

2º Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión.

3º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo.

4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes.

5º La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta.

6º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar, hasta alcanzar 1m. de altura, el cerramiento definitivo.

o) Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que deba salvarse.

Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra huella.

CALIDAD: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.

El material a emplear.

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; se contruirá mediante tablones unidos entre si.

Modo de construcción.

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una mejor inmovilización.

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de redondos de acero corrugado de 12.0 mm., de diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos.

Anclajes.

Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 12.0 mm., y una longitud de 0.20 m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo.

Barandillas.

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización.

Pasamanos, formado por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 4.50 mm.

Barra intermedia, formada por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 4.50 mm.

Rodapié construido mediante madera de pino con una longitud de 3.40 m., y una escuadría de15.0X3.0 cm.

Pintura.

Todos los componentes estarán pintados a franjas amarillas y negras alternativas de señalización.

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección.

p) Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica

Características técnicas.

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar.

Estarán formados por los siguientes elementos:

- Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad.
- Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible.
- Toma corrientes por clavija estanca de intemperie.

Normas de seguridad de obligado cumplimiento.

Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona.

Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de transformadores de seguridad a 24 voltios.

Responsabilidad.

El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de obra cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas.

q) Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento)

La red de toma de tierra estará formada por picas incadas en la tierra con recubrimiento de cobre, longitud dos metros (2m.), diámetro 20 mm. y conexión de cobre amarillo verde de 16 mm^2.

Se colocará verticalmente en un hoyo de 2 m., de profundidad como mínimo, se rodeará con sulfato sódico y carbón vegetal o de cok, y se acabará de tapar con tierra sacada regando durante y después abundantemente, admitiéndose cualquier otro procedimiento sancionado por la práctica y debidamente aprobado por el Director de la Obra.

r) Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios, (1500 W.)

Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos.

Norma de obligado cumplimiento.

La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas herramienta que deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, encharcadas y asimilables), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico para ello.

Esta norma será cumplida por todos los operarios de la obra, independientemente de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como autónomos.

3.- CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

3.1.- CONDICIONES GENERALES.

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:

1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.

2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.

De acuerdo a indicaciones expresas de la Dirección del proyecto de Construcción, se aplicará en este estudio de Seguridad y Salud Laboral y siguientes, el artículo 17 de la ley 31/1995, del 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que dice: " El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios".

En cumplimiento con este artículo, lo considerado como elementos básicos de protección individual (buzos de trabajo, cascos, guantes, botas, etc,...,) no se incluirán en el presupuesto de Seguridad y Salud.

3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS.

A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos.

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, en coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el Manual para Estudios Básicos y Planes Básicos de Seguridad y salud Construcción del INSHT.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos.

3º La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado justificada en los cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la memoria de este plan de seguridad y salud, según el siguiente desglose expresado a continuación.

3.3.- CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA.

Estos cálculos responden al número de máxima contratación según el plan de ejecución de obra de este plan de Seguridad y Salud; en él quedan englobadas todas las personas que intervienen en el proceso de construcción de la obra, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación.

La variación del número de trabajadores que se observa, con respecto a la previsión contenida en el estudio de seguridad y salud, está justificada por:

- La aplicación de la tecnología de construcción que nos es propia.
- Nuestro plan de ejecución de obra.
- Nuestra política de contratación de personal.
- Los documentos que contienen nuestra oferta económica.

Todos ellos motivos suficientes de justificación, según se nos reconoce en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de edificación y obras públicas.

4.- SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.

4.1.- SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO.

Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.

Descripción técnica

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria.

4.2.- NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES.

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos que deberán ser presentados por el Jefe de la Obra, de acuerdo a las necesidades de desvíos de tráfico y en base a los planos de fases de construcción que se adjuntan en este estudio, a la Dirección de la Obra quién aprobará o modificará la ubicación de las señales y el balizamiento de tal forma que las condiciones de seguridad tanto para los peatones como para el tráfico sean óptimas y se produzcan las menores molestias posibles.

2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los trabajadores.

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización.

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice su eficacia.

4.3.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física.

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Jefe de Obra, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.

Avise al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo.

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual:

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra.

4.4.- SEÑALIZACIÓN VIAL.

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU"., que no se reproducen por economía documental.

En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.

ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de Seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los obreros por irrupción de vehículos en la obra.

4.5.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA.

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.

Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" -Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de Seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la señalización vial, su reiteración es innecesaria.

4.6.- NORMAS PARA EL MONTAJE DE LAS SEÑALES.

1º No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo temporal para la circulación.

2º Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se instalarán sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada.

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de señalización vial.

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.

6º En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga la Jefatura Provincial de Carreteras a lo largo de la realización de la obra y por su especialización, los de la Guardia Civil de Tráfico.

4.7.- NORMAS DE SEGURIDAD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS MONTADORES DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL.

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes de carretera en el tramo de la obra.

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.

Avise al Encargado de Seguridad para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado "CE".

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo general, con la vía abierta al tráfico rodado. Que los conductores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección individual:

- Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
- Sombrero de paja o gorra de visera, si no existen otros riesgos para la cabeza
- Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 100x100.
- Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
- Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones.
- Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si debe instalar señales junto a cortados del terreno, sobre terraplenes o sobre banquetas para vías, impida su caída accidental y no sufra usted lesiones.
- Chaleco reflectante, para que usted sea siempre visible incluso en la oscuridad.

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la Seguridad y Salud de esta obra.

5.- DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS.

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

- Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
- Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.
- Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado.

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones.

Portalámparas estancos con rejilla anti impactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad.

6.- SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

La autoría del estudio de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista adjudicatario en su plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos:

1º Respecto a la protección colectiva:

- **A.** El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.
- **B.** La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.
- **C.** No puede ser sustituida por equipos de protección individual.
- **D.** No aumentará los costos económicos previstos.
- **E.** No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
- **F.** No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de Seguridad y Salud.
- **G.** Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

2º Respecto a los equipos de protección individual:

- **A.** Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.
- **B.** No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad.

3º Respecto a otros asuntos:

- **A.** El plan de Seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en este estudio de Seguridad y Salud.
- **B.** El plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de Seguridad y Salud.

7.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA.

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos procedentes.

La relación de normativa que a continuación se presenta no pretende ser exhaustiva, se trata únicamente de recoger la normativa legal vigente en el momento de la edición de este documento, que sea de aplicación y del mayor interés para la realización de los trabajos objeto del contrato al que se adjunta este Estudio de Seguridad y Salud. En caso de que la normativa aquí citada haya sido derogada, se aplicará la normativa vigente en el momento de ejecución de la obra.

- *Decreto del 28/11/69 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.*
- *Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto (B.O.E. del 18 de Noviembre de 2002). Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.*
- *Ley 8/1980 de 20 de marzo. Estatuto de los Trabajadores.*
- *Real Decreto 3275/1982 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, y las Instrucciones Técnicas Complementarias.*
- *Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio. Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.*
- *Real Decreto 39/1995, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención.*
- *Real Decreto 1215/1997....relativo a la utilización pro los trabajadores de los equipos de trabajo.*
- *Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).*
- *Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97).*
- *Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1.998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98).*
- *Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo [exc. Contrucción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1.997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).*

- *Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1.997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).*
- *Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1.997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).*
- *Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1.997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97).*
- *Cualquier otra disposición sobre la materia actualmente en vigor o que se promulgue durante la vigencia de este documento.*

Junto a éstas, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma precaria y a veces bastante dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:

- *Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente apenas el capítulo 6 del título II).*
- *Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera 2.*
- *Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92).*
- *Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89).*
- *Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.*

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, a saber:

- *Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92).*
- *Real Decreto 474/1.988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88).*
- *Real Decreto 1495/1.986, po el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1.989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1.991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación al primero.*
- *O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referentes a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).*
- *Real Decreto 1435/1.992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).*
- *Real Decreto 2291/1.985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias, en lo que queden vigentes tras la norma anterior.*

- *Decreto 2413/1973, de 20 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E 09-10-73) e Instrucción técnicas complementarias.*
- *Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas De Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68).*
- *Real Decreto 245/1.989 sobre determinación y limitación de la potencia acústico admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89)7 y Real Decreto 71/1.992, por el que se amplia el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo.*
- *Real Decreto 2114/1.978, por el que se aprueba el Reglamenteo de Explosivos (B.O.E. 07-09-78).*
- *Real Decreto 1389/1.997, por el que se establecen disposicones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras.(B.O.E. 07-10-97).*

8.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS.

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen.

9.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA.

9.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON MÓDULOS PREFABRICADOS COMERCIALIZADOS METÁLICOS.

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación.

Materiales.

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.

A.- Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".

B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual; tipo BALAT o similar, conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple.

C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.

Instalaciones.

A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".

B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.

TABLA 9.1 RATIOS EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES PROVSIONALES.			
Superficie de comedor:	2 m^2 / Trabajador	Nº bancos 5 personas:	15 trab: 5 = 3 bancos.
Nº de retretes:	1 ud / 25 trabajadores	Nº calentadores elec.	1 ud / 10 trabajadores
Nº de lavabos:	1 ud / 10 trabajadores	Nº mesas tipo parque:	1 ud / 10 trabajadores
Nº de duchas:	1 ud / 10 trabajadores	Nº calienta comidas:	1 ud / 25 trabajadores
Nº armarios taquilla:	1 ud / Trabajador	Nº piletas friegaplatos:	1 ud / 25 trabajadores
Nº frigoríficos:	1 ud / 25 trabajadores		

9.2.- ACOMETIDAS.

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos servicios. El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior.

10.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA.

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio.

2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de Seguridad y Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo teórico.

3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96

4º En este estudio de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista adjudicatario, respetará en su plan de Seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización.

10.1. **EXTINTORES DE INCENDIOS.**

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental.

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:

- Vestuario y aseo del personal de la obra.
- Comedor del personal de la obra.
- Local de primeros auxilios.
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o subcontratada.
- Almacenes con productos o materiales inflamables.
- Cuadro general eléctrico.
- Cuadros de máquinas fijas de obra.
- Dobladora mecánica de ferralla.
- Hormigonera eléctrica (pastelera)
- Almacenes de material y talleres.
- Acopios especiales con riesgo de incendio.

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.

Mantenimiento de los extintores de incendios:

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad.

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS
En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.

11.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES.

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.

Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.

Cronograma formativo.

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de Seguridad y Salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:

A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de Seguridad y Salud, una vez convertido en plan de Seguridad y Salud aprobado.

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de Seguridad y Salud:

1º El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y salud, las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".

2º El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.

12.- MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo:

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario.

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas.

5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados.

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados **nº1º** y **2º** del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud: **normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.**

13.- ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.

Acciones a seguir.

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso.

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de Seguridad y Salud" los siguientes principios de socorro:

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de Seguridad y Salud" que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.

5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de Seguridad y Salud" que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de Seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario.

6º El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:	
Nombre del centro asistencial:	**Complejo Hospitalario de Navarra**
Teléfono contacto:	**848. 42 22 22**
Nombre del centro asistencial:	**Clínica Universidad de Navarra**
Teléfono contacto:	**948 25 54 00**
Nombre del centro asistencial:	**Centro Salud Sangüesa**
Teléfono contacto:	**948.87.14.43**
Teléfono de ambulancias/emergencias:	**112**

7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja DIN A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados.

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.



Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral

El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. **A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.**
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. **A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.**
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales. **Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.**

Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral.

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de Seguridad y Salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

Maletín botiquín de primeros auxilios.

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables.

Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía documental.

14.- CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA.

El Contratista adjudicatario, suministrará en su plan de Seguridad y Salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de Seguridad y Salud.

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección individual.

Si el Contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de Seguridad y Salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación posterior en ella.

15.- CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de Seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos:

1. **Número del parte.**
2. **Identificación del Contratista principal.**
3. **Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.**
4. **Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.**
5. **Oficio o empleo que desempeña.**
6. **Categoría profesional.**
7. **Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.**
8. **Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.**
9. **Firma y sello de la empresa principal.**

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

16.- PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN.

Encargado de Seguridad y Salud.

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad que será contratado por el Contratista adjudicatario de la obra.

Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad.

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de Seguridad y Salud y con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud.

Funciones del Encargado de Seguridad en la obra.

La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este estudio de Seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra.

Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad.

1º Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.

4º Dirigirá y coordinará la cuadrilla de Seguridad y Salud.

5º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual.

6º Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que tome las decisiones oportunas.

7º Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra, si los trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención de riesgos.

Cuadrilla de seguridad.

Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes.

17.- NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN.

1º Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas.

2º El plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y Salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.

Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra.
Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello del Constructor adjudicatario:

3º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

18.- NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.

1º El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha: **Nombre del interesado que queda autorizado:** **Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello:** **Lista de máquinas que puede usar:** **Firmas: El interesado. El jefe de obra.** **Sello de constructor adjudicatario.**

2º Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

19.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD (ARTÍCULO 11 RD 1627/97).

1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra.

2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de seguridad cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre, por la que se establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los documentos de este estudio de Seguridad y Salud para la presente obra, requisito sin el cual no podrá ser aprobado.

3º Incorporar al plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, incluyendo desglosadamente las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz.

4º Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.

5º Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus actividades

6º Para iniciarse los trabajos deberá estar aprobado el Estudio de Seguridad y Salud, no pudiendo haber variación del importe total.

7º Trasmitir la prevención contenida en el plan de Seguridad y Salud aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas.

8º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz.

9º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.

10º Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos.

11º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de Seguridad y Salud aprobado, en el apartado: **"acciones a seguir en caso de accidente laboral"**.

12º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral".

13º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y Salud.

14º Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.

15º Incluir en el plan de Seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado cumplimiento en la obra.

En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo comunicará por escrito a la autoría de este estudio de Seguridad y Salud con el fin de que pueda orientarle en el método a seguir para su composición.

16º Componer en el plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la aprobación del plan de Seguridad y Salud.

17º Componer en el plan de Seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud.

18º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas.

20.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN.

Las condiciones técnicas que deberán cumplir los medios de prevención individual, colectiva, la señalización y el balizamiento durante el mantenimiento posterior de lo construido, deberán ajustarse a lo descrito en el Real Decreto del 24 de Octubre de 1997, NUM. 1627/1997 y en el Pliego de Condiciones Técnicas y particulares del Estudio de Seguridad y Salud Laboral del presente Proyecto.

21.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS.

- Normas de obligado cumplimiento, clasificados por actividades de obra.
- Normas de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la obra.
- Normas de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la obra.
- Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la obra.
- Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra.

22.- EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

El plan de Seguridad y Salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de Seguridad y Salud no podrá ser otorgada:

1º Cumplirá las especificaciones de los Reales Decretos 1.627/1.997 de 24 de octubre. El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir el Plan de Seguridad y Salud sus Normas de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no podrá ser aprobado. Deberá confeccionarlo antes de la firma del acta de replanteo, siendo requisito indispensable el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.

2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de Seguridad y Salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de Seguridad y Salud. Para ello tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este estudio de Seguridad y Salud**.**

3º Suministrará planos de calidad técnica y planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor comprensión.

4º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de Seguridad y Salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia nunca se aceptarán como substitutivos de ellos.

5º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento que no se ajuste a lo especificado en los apartados anteriores.

6º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano del plan de Seguridad y Salud.

7º El nombre de la obra que previene aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín identificativo de cada plano.

8º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre continuo.

9º Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.

23.- LIBRO DE INCIDENCIAS.

Lo suministrará a la obra el Promotor según el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre (Artículo 13).

En él solo se anotarán, por las personas autorizadas legalmente para ello, los incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de Seguridad y Salud aprobado.

El Coordinador en materia de seguridad y salud está legalmente obligado a tenerlo a disposición de: Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de Seguridad y Salud en el Trabajo.

24.- VALORACIÓN.

Sólo serán objeto las unidades de protección colectiva o especial indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud de este Proyecto y las aprobadas en el Plan de Seguridad y Salud que sea aprobado para la obra, así como lo relativo a las protecciones individuales, el equipamiento y vestuario del personal, la disposición y mantenimiento de las instalaciones médicas y de higiene y bienestar (botiquín, comedores, letrinas, etc.).

El resto de elementos y medios de seguridad y salud se consideran costos indirectos de la obra, estando incluida su valoración en la parte proporcional de cada precio unitario, no siendo por tanto objeto de abono independiente. En concreto serán a cargo del Contratista, los costes de los servicios de prevención, vigilancia y comité de Seguridad y Salud, así como de las reuniones formativas e informativas.

25.- SANCIONES ECONÓMICAS A IMPONER POR LA PROPIEDAD HACIA EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO, POR INCUMPLIMIENTOS DEL CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD APROBADO.

Queda a juicio del Director de la Obra las sanciones económicas que creyere más oportunas encaminadas al fiel cumplimiento del estudio, plan de seguridad y normativa vigente de seguridad laboral.

26.- PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a las labores del Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está dispuesta a prestarle todo su apoyo técnico si él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitada a sus reuniones con voz pero sin voto.

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan de seguridad y salud.

Tajonar, Agosto 2023

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA.**
ICCP, Colegiado nº19.233.

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

PRESUPUESTO

EUNATE
Compañia de Ingeniería, S.L.
Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ªplanta
31192 Tajonar (NAVARRA)
Tfno.: (+34) 948 29 02 37
eunate@eunateing.com

P R E S U P U E S T O

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

1 INSTALACIONES

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*0*	3,000	m	Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 6,00x2,44x2,30 m. de 14,60 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	140,00	420,00
2	*0*	3,000	m	Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,00x1,80x2,30 m. de 5,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.	140,00	420,00
3	*0*	1,000	ud	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, totalmente terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.	106,00	106,00
4	*0*	1,000	ud	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM/15/B/40, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.	160,00	160,00
5	*0*	1,000	ud	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.	120,00	120,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
6	*0*	1,000	ud	Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI BT 039.	80,00	80,00
7	*0*	1,000	ud	Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 15 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.	125,00	125,00
8	*0*	1,000	ud	Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.	60,00	60,00
9	*0*	1,000	ud	Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.	60,00	60,00
				Total Cap. 1		**1.551,00**

2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*0*	6,000	ud	Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	2,24	13,44
2	*0*	6,000	ud	Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	1,79	10,74
3	*0*	6,000	ud	Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	2,40	14,40
4	*0*	6,000	ud	Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	1,40	8,40
5	*0*	20,000	ud	Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	2,53	50,60
6	*0*	6,000	ud	Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	2,01	12,06
7	*0*	6,000	ud	Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	2,23	13,38
8	*0*	12,000	ud	Juego de tapones antiruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.	1,11	13,32
9	*0*	6,000	ud	Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	8,20	49,20
10	*0*	6,000	ud	Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	6,71	40,26
11	*0*	6,000	ud	Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	2,61	15,66
12	*0*	6,000	ud	Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	1,12	6,72
13	*0*	6,000	ud	Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	6,71	40,26
14	*0*	6,000	ud	Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.	6,70	40,20
				Total Cap. 2		**328,64**

3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*0*	2,000	Ud	Escalera manual portátil de aluminio para acceso a zanja.	18,00	36,00
2	*0*	2,000	Ud	Pórtico para limitación de altura bajo lineas eléctricas, teléfonicas, etc. Compuesto por dos perfiles verticales y cable horizontal con banderolas.	120,00	240,00
3	*0*	240,000	Ml	Balizamiento a base de cinta de polietileno bicolor,colocada sobre redondos de acero hincados al suelo, de 16 mm. de diámetro, incluso colocación, mantenimiento, reposición y retirada.	0,35	84,00
4	*0*	110,000	Ml	Protección y señalización, a base de balizamiento con malla de polietileno de 1 m. de altura, incluso colocación, elementos de sujección, mantenimiento, reposición y retirada.	2,80	308,00
5	*0*	2,000	Ud	Pasarela de vehículos sobre zanja de hasta 3,00 m.de ancho, con plataforma de chapa metálica estriada de 15/20 mm. de espesor y 3 m. de anchura de paso, incluso preparación de los apoyos, anclajes, vallas laterales de 1 m. de altura a modo de barandilla, colocación y mantenimiento.	140,00	280,00
6	*0*	10,000	Ud	Pasarela de peatones sobre zanja y/o acceso a viviendas de hasta 0,80 m.de ancho, con plataforma de chapa metálica estriada de 15/20 mm. de espesor y 3 m. de anchura de paso, incluso preparación de los apoyos, anclajes, vallas laterales de 1 m. de altura a modo de barandilla, colocación y mantenimiento.	110,00	1.100,00
7	*0*	14,000	Ud	Valla autónoma metálica de 2.50 m de longitud para contención de peatones, incluso traslados, mantenimiento y traslados.	12,00	168,00
8	*0*	100,000	Ml	Cerramiento formado por valla metálica galvanizada, de 2 m. de altura normalizada en módulos de 3m., p/p de soportes prefabricados de hormigón, sujecciones, incluso montajes y desmontajes durante la obra.	8,50	850,00
9	*0*	1,000	ud	Partida de abono para señalistas en desvios provisionales, salidas ctra, mantenimiento y limpieza de señalización y de la obra, etc. durante toda la obra	1.200,00	1.200,00
				Total Cap. 3		**4.266,00**

4 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*0*	2,000	Ud	Señal de "prohibido paso a los peatones"; fabricada en material plástico; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño grande.	7,21	14,42
2	*0*	2,000	Ud	Señal de "protección obigatoria de las manos",fabricadas en material plástico ; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.	7,21	14,42
3	*0*	2,000	Ud	Señal de "protección obligatoria de la cabeza"; fabricada en material plástico; según las características descritas en el R.D., 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición y retirada. Tamaño mediano.	7,21	14,42
4	*0*	2,000	Ud	Señal de "dirección de socorro", fabricada en material plástico, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación, cambios de posición retirada. Tamaño mediano.	7,21	14,42
5	*0*	2,000	Ud	Señal de "equipo de primeros auxilios", fabricada en material plástico ahesivo, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P, de suministro, instalación y retirada. Tamaño mediano.	7,21	14,42
6	*0*	2,000	Ud	Señal de "localización de primeros auxilios", fabricada en material plástico, con fondo de contraste de color verde y marco y simbología en color blanco, según el R.D. 485/1997. Incluso P.P., de suministro, instalación y retirada.Tamaño mediano.	7,21	14,42
7	*0*	4,000	ud	Señal metálica triangular avisadora de "peligro obras"; tipo TP-18, con fondo de contraste de color amarillo y simbología en colores roja y negro, TAMAÑO MEDIANO. Incluso P.P., de soporte pie derecho metálico, fijación, mantenimiento y retirada.	50,00	200,00
8	*0*	4,000	Ud	Señal metálica circular de "velocidad máxima permitida"; tipo TR-301, con fondo de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro, de 120 cm., de diámetro. Incluso P.P., de pie derecho metálico de sustentación, tornillería, cimentación, instalación, mantenimiento y retirada.	62,00	248,00
9	*0*	4,000	Ud	Señal metálica circular de "prohibido adelantar"; tipo TR-305, con fondo de contraste de color amarillo y simbología de colores rojo y negro, de 120 cm., de diámetro. Incluso P.P., de pie derecho metálico de sustentación, tornillería, cimentación, instalación, mantenimiento y retirada.	62,00	248,00
10	*0*	4,000	Ud	Panel metálico reflectante direccional alto, tipo TB-1; incluso P.P., de soportes metálicos, fijación, traslados, mantenimiento y retirada.	150,00	600,00
11	*0*	6,000	m2	Cartel indicador de chapa metálica galvanizada y pintura reflectante, p/p de postes, elementos de sujeción, mantenimiento y retirada.	37,00	222,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
12	*0*	10,000	Ud	Cono de balizamiento, incluso traslados, reposiciones, limpieza y mantenimiento	9,02	90,20
13	*0*	4,000	Ud	Baliza luminosa autonóma intermitente, incluso reposiciones, traslados, limpieza y mantenimiento.	53,40	213,60
				Total Cap. 4		**1.908,32**

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

	Descripción	Importe
1	INSTALACIONES	1.551,00
2	PROTECCIONES INDIVIDUALES	328,64
3	PROTECCIONES COLECTIVAS	4.266,00
4	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	1.908,32
		8.053,96

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL			**8.053,96**
10,00	% GASTOS GENERALES		805,40
6,00	% BENEFICIO INDUSTRIAL		483,24
		SUMA	**9.342,60**
21,00	% IVA		1.961,95
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION			**11.304,55**

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

ONCE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTS.

Tajonar, 10 de Agosto de 2023

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP



Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado Nº 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS



Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado Nº 8.644

Anejo nº6

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDs)

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN. 2
2.- AMBITO DE APLICACIÓN. 4
3.- OBJETIVOS. 7
3.1.- PREVENCIÓN 7
3.2.- REUTILIZACIÓN 8
3.3.- VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN. 11
4.- DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE RESIDUOS. 11
4.1.- SEGÚN SU PROCEDENCIA. 11
4.2.- SEGÚN SU NATURALEZA. 12
5.- TIPOS DE OPERACIONES A REALIZAR. 13
6.- FUNCIONES A EJERCER POR LOS PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 19
6.1.- JEFE DE OBRA. 19
6.2.- ENCARGADO GENERAL DE LA OBRA. 19
6.3.- PERSONAL DE LA OBRA. 21
7.- PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN. 22
7.1.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 23
7.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR 23
8.- CANTIDAD Y NATURALEZA DE LOS RCDs 25
9.- INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RCDs. 27
10.- GESTORES DE RESIDUOS EN LAS CERCANÍAS DE LA OBRA. 28
11.- OPERACIONES BÁSICAS A CONTEMPLAR. 29
12.- COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 31

1.-INTRODUCCIÓN.

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, publicado en el B.O.E. el 13 de Febrero de 2008, por el cual se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, el productor de residuos de construcción y demolición (figura asimilable entre otras al promotor de la obra) deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá como mínimo:

- ⇨ La estimación de la cantidad de residuos (en TN o m^3) que se van a producir, clasificados según su naturaleza y tipología, según normativa europea (listado según Orden MAM/304/2002).
- ⇨ Las medidas de minimización de residuos y de prevención a tener en cuenta en la obra.
- ⇨ Las instalaciones previstas para el almacenamiento (ubicación y número de contenedores, etc.), manejo y demás operaciones de gestión, incluidas las medidas de separación de residuos en obra.
- ⇨ Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
- ⇨ Una valoración del coste previsto para la gestión correcta de los residuos de construcción.
- ⇨ En este decreto también se establece la necesidad del poseedor de residuos de construcción y demolición (figura asimilable entre otras al contratista de la obra) de entregar a la propiedad un plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
- ⇨ En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos debe estructurarse según las etapas y objetivos siguientes:
  - En primer lugar, se debe establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a originar en cada etapa de la obra y en el derribo. Este objetivo se puede cumplir tomando en consideración la experiencia del constructor o de la empresa de derribo, si ya ha aplicado alguna vez criterios de clasificación, lo cual no suele ser frecuente. En caso contrario, por defecto, proponemos los valores procedentes de un estudio realizado por un técnico competente. Puede ocurrir, sin embargo, que en algunos casos los valores no se ajusten a los métodos, medios, etc., de la empresa constructora o de derribo. Por este motivo, a partir de ahora, las empresas deben adoptar el compromiso de registrar los residuos que producen, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven, para que en próximas obras ya puedan aplicar datos propios.
  - A continuación, hay que informarse acerca de los gestores de residuos que se encuentran en el entorno próximo a la obra: es necesario conocer las características (condiciones de admisión, distancia y tasas) de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los centros de clasificación, etc. para poder definir un escenario externo de gestión.
  - A partir del cruce de ambas fuentes de información -la cantidad y tipología de los residuos y el escenario formado por los gestores externos- se podrá determinar en cada momento de la obra o del derribo los elementos de gestión interna necesarios (cantidad y características de los contenedores, depósitos para fluidos contaminantes, etc.). Presumiblemente, estas acciones reducirán el coste de la gestión de los residuos.
  - Una vez conocidos los costes de la manipulación de los residuos en obra, de los alquileres de contenedores, del transporte y de las tasas de depósito de los residuos para cada una de las etapas de la obra, se debe determinar -por etapas y en su conjunto- el coste final de la gestión de los residuos de una obra o un derribo determinados.

En la comunidad foral el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, publicado en el B.O.E. el 13 de Febrero de 2008 se complementó y desarrollo con el Decreto Foral 23/2011 de 28 de Marzo, en virtud de las competencias reconocidas para el desarrollo autonómico previsto en el RD 105/2008.

El objetivo principal del RD23/2011 era:

a) Establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, (en adelante RCDs) con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de valorización y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción.

b) Establecer las fianzas exigibles por parte de las Administraciones Públicas a los productores, poseedores y/o gestores de residuos de construcción y demolición, para garantizar su correcta gestión.

c) Concretar cuál es la cantidad mínima de RCDs a los que se les exige una gestión específica diferenciada de la que se aplica a las pequeñas cantidades de este tipo de residuos y que, en su caso, puedan tener la consideración de residuos sólidos urbanos.

d) Establecer los requisitos técnicos mínimos de las plantas de tratamiento de RCDs para garantizar su adecuada gestión.

2.-AMBITO DE APLICACIÓN.

Desde un punto de vista conceptual, residuo de construcción y demolición (RCD) es cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de "residuo" incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y demolición.

El concepto de obra de construcción y demolición, a los efectos del presente Plan, abarca las actividades consistentes en la construcción, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, u otro análogo de ingeniería civil.

También debe entenderse como obra, o al menos como parte integrante de una obra, la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, dragados, sondeos, prospecciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, pero excluyéndose aquellas 395actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. Es decir, se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales como:

- plantas de machaqueo,
- plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento,
- plantas de prefabricados de hormigón,
- plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
- talleres de fabricación de encofrados,
- talleres de elaboración de ferralla,
- almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y
- plantas de tratamiento de RCDs de la obra.

Si bien desde el punto de vista conceptual la definición de RCD abarca a cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, el ámbito de aplicación del presente Plan se restringe a los residuos que caigan dentro de la definición de RCD, con excepción de:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas.

b) Los residuos que se generen en obras de construcción y/o demolición regulados por una legislación específica, cuando no estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición. Es el caso, por ejemplo, de los residuos de aceites industriales usados, de los residuos peligrosos en general, de los residuos de envases, de los neumáticos fuera de uso, de las pilas y baterías o de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

c) Los residuos regulados por la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. En el caso de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se generan en las actividades de excavación en obra, el motivo de la exclusión es que pueden y deben ser reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta, o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, con lo que el potencial impacto ambiental negativo de dichos residuos puede evitarse con una adecuada planificación de las obras. Por otra parte, si bien es cierto que estos residuos suponen hoy día en España un volumen enorme, sería imposible establecer unas previsiones fiables sobre su generación a medio y largo plazo.

En cuanto a los residuos regulados por otra legislación específica, se excluyen pues son objeto de otros planes del PNIR, significativamente el plan nacional de residuos peligrosos (Anexo nº 2 del PNIR) y el plan de residuos industriales no peligrosos (Anexo nº 12 del PNIR).396

Los residuos objeto del II PNRCD aparecen codificados en la Lista Europea de Residuos, aprobada por Orden MAM/304/2002 (BOE nº 43, de 19-02-2002), básicamente, en el capítulo 17 (Residuos de la construcción y demolición). Dicho capítulo se divide en:

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.

17 01 01	Hormigón.
17 01 02	Ladrillos.
17 01 03	Tejas y materiales cerámicos.
17 01 06*	Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plástico.

17 02 01	Madera.
17 02 02	Vidrio.
17 02 03	Plástico.
17 02 04*	Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.

17 03 01*	Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01.
17 03 03*	Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 01	Cobre, bronce, latón.
17 04 02	Aluminio.
17 04 03	Plomo.
17 04 04	Zinc.
17 04 05	Hierro y acero.
17 04 06	Estaño.
17 04 07	Metales mezclados.
17 04 09*	Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10*	Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17.04.10.

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.

17 05 03*	Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
17 05 04	Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03.
17 05 05	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
17 05 07*	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07.

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.

17 06 01*	Materiales de aislamiento que contienen amianto.
17 06 03*	Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
17 06 04	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.
17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto.

17 08 Materiales de construcción a partir de yeso.

17 08 01*	Materiales de construcción a partir de sustancias peligrosas.
17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con ir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.

17 09 Otros residuos de construcción y demolición.

17 09 01*	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
17 09 02*	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].
17 09 03*	Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas.
17 09 04	Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Los residuos que aparecen con un * asterisco se consideran RESIDUOS PELIGROSOS de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE.

3.-OBJETIVOS.

Los objetivos de toda gestión de residuos deben ser la prevención de la producción de residuos para mejorar su gestión y el fomento, por este orden, de su reutilización, reciclado y otras formas de valorización.

El Plan de Gestión de Residuos -PGR- debe basarse en recomendaciones de un principio de jerarquía que podríamos equipararlo a la regla de las 3 erres.

- **3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar**

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, planificar en cada fase del proceso la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

3.1.- PREVENCIÓN

- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.

  Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

  La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero.

  En particular debe evitarse la mezcla de tierras y piedras sobrantes no contaminadas, que impidan su posterior reutilización.

- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.

  Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

- Disponer de un directorio de las empresas gestoras y transportistas de residuos autorizadas por la comunidad autónoma.

- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

3.2.- REUTILIZACIÓN

- El objetivo es incorporar los RCD al proceso constructivo sin tratamiento físico químico.
- En el caso de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se generan en las actividades de excavación en obra, pueden y deben ser reutilizadas:

  En la misma obra, cuando el proyecto o la dirección de obra así lo autoricen

  En el proyecto se contempla el relleno de zanjas con materiales procedentes de la excavación.

  En una obra distinta: el contratista deberá indicar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización en otras obras en las que sea adjudicatario.

  En una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, cuando el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado.

  En caso que sean reutilizadas en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
- En el caso de las tierras superficiales (tierra vegetal), estas se acopiarán y preservarán para su restitución como capa final, según establece el pliego de prescripciones técnicas particulares.
- El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización de estos materiales.


Tal y como se había expuesto el Plan de Gestión de Residuos -PGR- debe basarse en recomendaciones de un principio de jerarquía que podríamos equipararlo a la regla de las 3 erres.

3R = Reducir + Reutilizar + Reciclar

Sin embargo, este principio sólo es viable si se realiza una separación y recogida selectiva. Veamos cuales son las ventajas de llevarla a cabo:

- Mediante la separación y recogida selectiva se reduce el volumen aparente de los residuos generados al disminuir los espacios huecos del contenedor.
- Se contribuye a dar una imagen de orden y de control general en la obra.
- Solamente mediante la separación y recogida selectiva se puede llevar a cabo una gestión responsable de los residuos peligrosos. Recordemos que si un residuo peligroso contamina al resto de residuos, el conjunto debe gestionarse como peligroso.

No siempre es técnicamente posible ni económicamente viable ejecutar cada una o varias de las actuaciones de las 3R (Reducir, Reutilizar, Reciclar). En cada caso elegiremos la o las más apropiadas. Para facilitar la adopción de estas decisiones, proponemos seguir esta breve secuencia de cuestiones que, de forma simple, nos ayudará a determinar la decisión más beneficiosa.

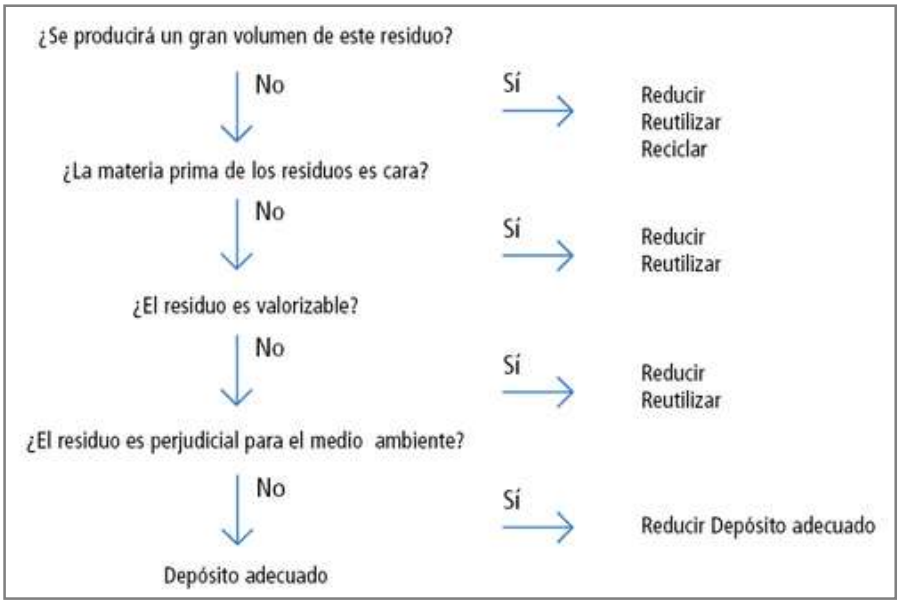

El problema puede complicarse hasta el punto de que para encontrar su solución es conveniente incorporar otros criterios específicos. Algunos de ellos están relacionados con los siguientes aspectos:

- La posibilidad de reducir el transporte de materiales y, por lo tanto, el consumo de energía, la polución y el coste.
- El impacto ambiental de la transformación necesaria para el reciclaje.
- La viabilidad de la operación mediante algún trato económico diferente, como, por ejemplo.

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los residuos, éstos tienen que estar separados. Técnicamente es imposible reciclar residuos mezclados, pues tienen propiedades físicas y químicas diferentes, e incluso puede verse afectada la maquinaria empleada en el proceso de valorización.

Conocer los principales residuos[1]		
Inertes - Pétreos	**No peligrosos**	**Peligrosos**
		
Escombro limpio ladrillos tejas azulejos hormigón endurecido mortero endurecido	**Metal** armaduras de acero y restos de estructuras metálicas perfiles para montar el cartón-yeso paneles de encofrado en mal estado **Madera** restos de corte restos de encofrado palets	**Envases y restos de** aceites, lubricantes, líquidos de freno, combustibles desencofrantes anticongelantes y líquidos para el curado de hormigón adhesivos aerosoles y agentes espumantes betunes con alquitrán de hulla decapantes, imprimaciones, disolventes y detergentes madera tratada con productos tóxicos

Conocer los principales residuos[1]		
Inertes - Pétreos	**No peligrosos**	**Peligrosos**
		
	Papel y cartón sacos de cemento, de yeso, de arena y cal cajas de cartón **Plástico** lonas y cintas de protección no reutilizables conductos y canalizaciones marcos de ventanas desmantelamiento de persianas **Otros** cartón-yeso[2] vidrio[3]	pinturas y barnices silicona y otros productos de sellado tubos fluorescentes pilas y baterías que contienen plomo, níquel, cadmio o mercurio productos que contienen PCB materiales de aislamiento que pueden contener sustancias peligrosas trapos, brochas y otros útiles de obra contaminados con productos peligrosos restos del desmantelamiento de bajantes, cubiertas y tabiques pluviales que contienen fibras de amianto restos del desmantelamiento de materiales de aislamiento, pavimentos, falsos techos, etc., que contienen fibras de amianto

1 Los pictogramas utilizados para designar a los diferentes tipos de residuos pueden descargarse de la página web de la Agencia de Residuos de Cataluña www.arc-cat.net. En caso de separación selectiva de los residuos "no peligrosos", recomendamos descargar el pictograma adecuado.

2 Los derivados del yeso, como ocurre con los paneles de cartón-yeso, a pesar de estar formados mayoritariamente por un material pétreo, no son considerados como residuos inertes y deben gestionarse como un "no peligroso". Consultar con la autoridad autonómica competente en materia de residuos el tipo de gestión recomendada para los sobrantes de cartón-yeso (en Cataluña no se admiten en los vertederos de tierras y escombros y deben dirigirse a centrales de transferencia o a vertederos de residuos no peligrosos).

3 El vidrio es un material inerte, no obstante atendiendo a la tradición de reciclaje de este tipo de material se recomienda gestionarlo separadamente del material pétreo y destinarlo al reciclaje para la fabricación de nuevos productos de vidrio.

Alternativas de gestión de los residuos en función del material

Cada uno de los diversos residuos que se originan en la construcción y demolición puede ser sometido a alguna de las diferentes alternativas de gestión que hemos expuesto anteriormente: unos materiales admiten varias, y para otros sólo es recomendable una.

A continuación presentamos un breve recorrido sobre estos materiales y sus alternativas de gestión.

TIERRA SUPERFICIAL Y DE EXCAVACIÓN	Reutilizar en la formación de paisajes Reutilizar como relleno en la misma obra
ASFALTO	Reciclar como asfalto Reciclar como masa de relleno

HORMIGÓN	Reciclar como grava en hormigones Reciclar como grava suelta en firmes de carreteras o para rellenar agujeros Reciclar como granulado drenante para rellenos, jardines, etc.
OBRA DE FÁBRICA Y PEQUEÑOS ELEMENTOS	Reutilizar los pequeños elementos (tejas, bloques, etc.) Reciclar como grava en subbases de firmes, rellenos, etc.
METALES	Reutilizar Reciclar en nuevos productos
MADERA DE CONSTRUCCIÓN	Reutilizar para andamios y vallados Reciclar para tableros de aglomerado
ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS	Reutilizar
EMBALAJES	Reutilizar los *palletes* como tarimas o tableros auxiliares para la construcción de la obra Reciclar en nuevos embalajes o productos
ACEITES, PINTURAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	Reutilizar en la propia obra hasta finalizar el contenido del recipiente

3.3.- VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN

Está prohibido el depósito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a algún tratamiento previo

4.-DETERMINACIÓN DE LAS CLASES DE RESIDUOS.

4.1.- SEGÚN SU PROCEDENCIA.

- **De derribo.**

  Son los materiales y productos de construcción que se originan como resultado de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y derribo de edificios y de instalaciones.

  También deben ser considerados aquí los residuos parciales, originados por los trabajos de reparación o de rehabilitación. En conjunto, los residuos de derribo son los que tienen mayor volumen y peso en el total de residuos generados por la actividad constructora.

- **De construcción**

  Son los que se originan en el proceso de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación.

  Su origen es diverso: los hay que provienen de la propia acción de construir, originados por los materiales sobrantes: hormigones, morteros, cerámicas, etc. Otros provienen de los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc. Sus características de forma y de material son variadas. En este apartado también situaríamos la parte de residuos de rehabilitación correspondientes a la fase de construcción.

- **De excavación**

  Son resultado de los trabajos de excavación, en general previos a la construcción.

  La composición de estos residuos es menos variable que la de los dos grupos anteriores. Tienen una composición más homogénea y son de naturaleza pétrea: arcillas, arenas, piedras, hormigones y obra de fábrica de los cimientos de la edificación existente.

  Se podría dar el caso que estos materiales estuvieran contaminados por materiales tóxicos procedentes de procesos industriales desarrollados en el propio solar o en emplazamientos adyacentes.

4.2.- SEGÚN SU NATURALEZA.

- **Residuo inerte**.

  Son los que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas, de los suelos y del aire.

  En general están constituidos por elementos minerales estables o inertes, en el sentido de que no son corrosivos, irritantes, inflamables, tóxicos, reactivos, etc. En definitiva, son plenamente compatibles con el medio ambiente. Los principales materiales que forman los residuos de construcción son de origen pétreo, y, por lo tanto, inertes. Pueden ser reutilizados en la propia obra o reciclados en centrales recicladoras de áridos mediante un sencillo proceso mecánico de machaqueo.

- **Residuo banal o no especial**.

  Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos.

  Esta característica los diferencia claramente de los residuos inertes y de los que son potencialmente peligrosos, porque determina sus posibilidades de reciclaje. De hecho, se reciclan en instalaciones industriales juntamente con otros residuos y pueden ser utilizados nuevamente formando parte de materiales específicos de la construcción o de otros productos de la industria en general.

- **Residuo especial**.

  Existen residuos de construcción que están formados por materiales que tienen determinadas características que los hacen potencialmente peligrosos y que pueden ser considerados como residuos industriales especiales.

  Son potencialmente peligrosos los residuos que contienen substancias inflamables, tóxicas, corrosivas, irritantes, cancerígenas o que provocan reacciones nocivas en contacto con otros materiales. Estos residuos requieren un tratamiento especial con el fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada.

5.-TIPOS DE OPERACIONES A REALIZAR.

Operaciones in situ.

Son operaciones de deconstrucción y de separación y recogida selectiva de los residuos en el mismo lugar donde se producen.

Estas operaciones consiguen mejorar las posibilidades de valorización de los residuos, ya que facilitan el reciclaje o reutilización posterior. También se muestran imprescindibles cuando se deben separar residuos potencialmente peligrosos para su tratamiento específico.

Separación y recogida selectiva.

Son acciones que tienen por objetivo disponer de residuos de composición homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial.

El Real Decreto establece en el Artículo 5 apartado nº4 que los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando de forma individualizada para cada una de las fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón:	80 tn
Ladrillos, tejas y cerámicas:	40 tn
Metal:	2 tn
Vidrio:	1 tn
Plástico:	0,5 tn
Papel y cartón:	0,5 tn

El objetivo común de estas acciones es facilitar la valorización de los residuos. Para conseguir un mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea, sobre todo exentos de materiales potencialmente peligrosos. Por esta razón deben ser separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido. Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los elementos de construcción que sean reutilizables.

En consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las posibilidades de valorización escogidas en el Plan de gestión.

Si la gestión de los residuos en la obra empieza por una clara separación de los mismos -preferiblemente en zonas con espacio suficiente-, resultará más fácil identificar las áreas y etapas del proceso que generan mayor cantidad de residuos. Con esa identificación se facilita el circuito de transporte interior de los residuos y se racionaliza el proceso, de manera que tienden a reducirse los residuos originados.

No se trata solamente de reducir los residuos pétreos, que son los mayoritarios de la construcción; también se deben separar aquéllos que se producen en pequeñas cantidades y son fácilmente valorizables. El ejemplo más claro son todos los productos que contienen metales, fácilmente valorizables mediante el reciclado.

Desconstrucción.

Es un conjunto de operaciones coordinadas de recuperación de residuos de derribo con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.

La desconstrucción no tiene un único modelo de definición. En realidad, admite diversos modelos y grados de intensidad en cada una de las operaciones. Éstos vendrán determinados por las características materiales de la construcción objeto de desconstrucción y por el incremento del coste del derribo a fin de que éste sea más selectivo.

También por la repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el coste final del producto. Este coste ha de poder competir en el mercado con el de un material equivalente pero nuevo.

En definitiva, para conseguir un material reciclado de calidad aceptable y aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el proceso de demolición de un edificio es indisociable de la separación selectiva y de la desconstrucción.

Almacenaje y contenedores.

Las ventajas de las que nos podemos beneficiar mediante esa forma de selección son de diversa índole. Una, por ejemplo, es la reducción del volumen que ocupan: la mezcla compacta de residuos en forma de bolo (por ejemplo, los pétreos) con otros de formas alargadas (las tablas típicas de la madera) producen huecos que desaprovechan el espacio del contenedor y, en consecuencia, encarecen la gestión. Si además tenemos en cuenta los diferentes valores de los costes de vertido en el vertedero (en función de su densidad), comprobaremos que esa mezcla de residuos ligeros y pesados dificulta el reciclado y encarece la deposición e incluso el transporte.

Si se realiza una separación selectiva de los residuos en diferentes tipos, es necesario que cada uno de ellos sea depositado en un contenedor específico. Por ejemplo: en el caso de los plásticos y cartones, debemos utilizar un sistema de deposición capaz de reducir el volumen de los mismos ya que de otro modo únicamente estamos almacenando y transportando aire. Asimismo será necesario que en los contenedores figuren claramente especificados los materiales que debe alojar cada uno de ellos.

Residuos tan comunes como aceites, pinturas, baterías, etc. deben ser separados de los residuos inertes. Si se mezclan entre ellos, los residuos inertes quedarán contaminados (nuevamente, el factor económico actúa como acción disuasoria, porque la deposición de los residuos especiales es más cara que la del resto de residuos).

Transporte de residuos.

El transporte y la recogida de los residuos se a de ajustar a unos criterios sencillos. En primer lugar, es necesario describir en un formulario los residuos que van a ser transportados y vertidos, con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final. Este documento, además, ayuda a planificar la disposición de residuos en el futuro.

Los contenedores de almacenaje han de estar claramente designados, tal como nos hemos referido al tratar la gestión, pues si la identificación es errónea, los residuos se pueden mezclar y resultar contaminados. Es más difícil deshacerse de esos residuos contaminados -que son, además, un peligro potencial- que de los que solamente contienen materiales inertes.

En este mismo sentido, durante el transporte también se debe velar por mantener los residuos especiales (filtros y latas de aceites, baterías, pinturas y disolventes, aditivos, etc.) separados de los residuos inertes.

Los materiales sobrantes deben transferirse siempre a un transportista autorizado, inscrito en el registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es preciso solicitarle la documentación que lo acredita, y, llegado el caso, comprobarla en el registro de la Administración.

Maquinaria en el manejo de los residuos.

Para decidir qué tipo de maquinaria será necesaria para la manipulación de los residuos, debemos prever qué cantidad de ellos se originarán por semana, el lugar donde se almacenarán, cuáles van a ser reciclados o reutilizados y qué otros residuos no previstos inicialmente se pueden generar. Una vez definidas esas previsiones, podremos seleccionar qué medios utilizaremos.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser clasificados en los tipos siguientes:

- Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden descomponerse (por ejemplo, los del comedor de la obra) o bien para aquéllos que deben tener un tratamiento específico (por ejemplo, los especiales). Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente etiquetados.
- Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m^3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.
- Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m^3 a 30 m^3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz.
- Compactadores para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra.
- Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.
- Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica.

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Para la presente obra se tendrán en cuenta las siguientes operaciones in situ para la revalorización y reutilización de los RCDS. Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

	OPERACIÓN PREVISTA
X	Previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos cercanos (acondicionamiento de parcelas, rellenos y terraplenado, etc.).
X	No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a gestor autorizado
	Opciones de valorización indicadas en el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE

MITAD NORTE

La mayor parte de los RCDS de la presente obra corresponden a excedentes de demolición de la calzada (asfalto) y aceras (baldosa hidráulica sobre solera hormigón, bordillo calzada), excedentes del cajeo de la mejora de explanada y paquete de firme de estas superficies y excedentes de excavación de zanja para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como en mejor medida de los servicios.

Tanto en los trabajos de cajeado como de renovación de redes también se producirán ciertas cantidades de demolición de registros, conducciones de hormigón (HMØ500-600mm, PE (DNØ32-40mm), FN (tapas 40x40cm,60x60cm, DN600mm, conducciones FNØ300-200 y FNØ100mm, piecerío y valvulería) etc. de las redes y servicios existentes en la actualidad.

Como en toda obra de urbanización, en las nuevas partidas de ejecución se producirán pequeñas cantidades de subproductos de las obras, como restos de hormigones (sobrantes, limpieza de pasteras y cubas, etc.), madera (encofrados de registros in situ, apuntalamientos, replanteo, etc.), ferralla y otros metales (en los elementos anteriormente mencionados, retirada señalización vertical actual, etc.) así como pérdidas de otros materiales usados durante las obras (tuberías de PVC, FN, PE, etc.). También existirán mermas y sobrantes de losas prefabricadas de hormigón en las aceras, prefabricados de hormigón (acometidas domiciliarias, registros visitables, etc.).

Para la gestión de estos Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) tenemos diferentes opciones de gestión según su naturaleza y cantidad.

El excedente de demolición del pavimento de MBC en calzada, debido a su naturaleza, deberá ser retirado a gestor autorizado.

El excedente de demolición de prefabricados de hormigón en aceras (baldosa y bordillo prefabricado de hormigón) y presoleras de hormigón in situ debería a priori retirarse a gestor autorizado, ya que su volumen es reducido, pero en combinación con el adoquín de calzada de la mitad sur puede valorarse su machaqueo en obra para uso del ayuntamiento en obras propias, adecuación y mejora de caminos, etc.

En el caso de excedente de excavación de cajeos de firme y excavación de zanja de redes y servicios, para la capa superior puede esperarse material granular o de encachado de calidad, para el cual debe considerarse, además de la retirada a gestor autorizado, el acopio del material para su reutilización en la propia obra o en futuras actuaciones del ayuntamiento, según la calidad y humedad que presente los mismos, así como su grado de contaminación con finos. Para la capa inferior es previsible un material de peor calidad, con mayor grado de humedad o mayor contaminación, por lo que en este caso deberá ser retirado a gesto autorizado.

Los excedentes de demolición de registros y conducciones existentes de hormigón, PVC, PE, FN, etc. dado su estado y naturaleza, deberán ser retirados a gestor autorizado.

Los restos de podas puntuales y arbolado en su caso, deberán ser retirados a gestor autorizado o triturados in situ en las zonas ajardinadas arboladas junto al Paseo de la Almadía.

Los excedentes generados en las mermas y pérdidas de las nuevas partidas de conducciones, así como restos metálicos y de madera en la ejecución de encofrados, ferralla, apuntalamientos, replanteos, etc., en determinadas ocasiones pueden ser aprovechadas en otras obras por parte del contratista, no generando RCDs, pero en otros casos las mermas suponen material no aprovechable por lo que es necesaria su retirada a vertedero autorizado.

Por el volumen de las actuaciones no siempre se superan los límites necesarios para una recogida selectiva, pero dado que los tipos de residuos son reducidos y se producen de manera separada se procederá en la medida de lo posible durante las obras a la recogida selectiva de los mismos.

MITAD SUR

No están previstas actuaciones en la mitad Sur de c/Juan de Berrueta (futura fase de renovación de calzada)

DESTINO PREVISTO PARA LOS RCDS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES "IN SITU".

Los RCD se valorizan mediante el reciclado en una instalación autorizada. El poseedor estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado por la administración.

La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra.

Además, deberá consignarse la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los RCD por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La eliminación del rechazo (material tratado no apto para su reutilización o reciclaje) se produce por depósito en un vertedero autorizado. Está prohibido el depósito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a algún tratamiento previo.

Se indican a continuación las características y el tratamiento estándar por tipo de residuos.

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN		**Tratamiento**	**Destino**
17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Sin tratamiento esp.	Restauración / Vertedero
RCD: NATURALEZA NO PETREA		**Tratamiento**	**Destino**
1. Asfalto			
17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01	Reciclado	Planta de reciclaje RCD
2. Madera			
17 02 01	Madera	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
3. Metales			
17 04 05	Hierro y Acero	Reciclado	
17 04 06	Metales mezclados	Reciclado	
17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
4. Papel			
20 01 01	Papel	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
5. Plástico			
17 02 03	Plástico	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
RCD: NATURALEZ PETREA		**Tratamiento**	**Destino**
1. Arena Grava y otros áridos			
01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	Reciclado	Planta de reciclaje RCD
2. Hormigón			
17 01 01	Hormigón	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RCD
RCD: OTROS		**Tratamiento**	**Destino**
1. Basuras			
20 02 01	Residuos biodegradables	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RSU
2. Potencialmente peligrosos			
15 01 11	Aerosoles vacíos	Depósito/Tratamiento	Gestor autorizado RPs
15 01 10	Envases contaminados	Depósito/Tratamiento	Gestor autorizado RPs

6.-FUNCIONES A EJERCER POR LOS PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

6.1.- JEFE DE OBRA.

- Ejercer de supervisor del correcto cumplimento de las acciones que se indican en el PGR.
- Consultar a los diferentes valorizadores y gestores las condiciones de aceptación del residuo antes de realizar cualquier operación de clasificación.
- Respetar el escenario de separación selectiva indicado en el Plan de Gestión de
- Residuos. O bien, realizar una clasificación de residuos más exigente que la especificada en el documento anterior, siempre que existan opciones viables de reciclaje.
- Señalizar convenientemente los contenedores para evitar confusiones en el tipo de residuo que pueden admitir.
- Realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo (peligrosos o no) de los residuos que se van a generar para poder ajustar a la realidad las previsiones de estimación.
- Realizar un seguimiento documental de albaranes, justificantes, etc., que permita la trazabilidad del residuo.
- Contratar siempre con gestores y transportistas autorizados.
- Respetar las medidas de protección y seguridad en la gestión de los residuos peligrosos.

6.2.- ENCARGADO GENERAL DE LA OBRA.

Asegurar que todos los que intervienen en la obra conocen sus obligaciones en relación con los residuos y que cumplen las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica.

Se deben dar a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que intervienen en la gestión de los residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes dictadas por la dirección técnica de la obra. No obstante, la acción del encargado no debe limitarse solamente a transmitir esa información, sino que además debe velar por el estricto cumplimiento de la misma.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir el uso de recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados.

Hay que explicar a los que intervienen en la obra las ventajas medioambientales de una buena práctica, esto es, una práctica que reduzca los recursos utilizados y los residuos generados. Nos consta que esta sensibilización es uno de los motores más eficaces para lograr una construcción sostenible.

Por lo demás, la gestión de los residuos de la obra es un objetivo abierto a las aportaciones de cuantos trabajan en ella, razón por la cual conviene fomentar una participación activa –en forma de propuestas o sugerencias de mejoras por parte de todos ellos-, más allá de la simple acción pasiva del cumplimiento de las normas y órdenes dictadas.

Incentivar las aplicaciones en la propia obra de los residuos que genera.

Los residuos que se originan en la obra, si son reutilizados en la propia obra, no son considerados como residuos que se deban gestionar. Así pues, la manera más eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar las aplicaciones en la propia obra, ya sea mediante rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, bases de soleras, etc.

La dirección técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de estas aplicaciones no previstas en el proyecto, porque pueden suponer variaciones en las prestaciones de las soluciones constructivas.

Se debe prever una zona protegida para el acopio de materiales, a resguardo de acciones que pudieran inutilizarlos.

En el solar donde se construirá, será necesario reservar un espacio para el almacenaje de los materiales que llegan a la obra. Ese espacio estará situado de manera que quede resguardado del tráfico de la obra y otros trabajos que puedan estropear los materiales; se trata de impedir que su rotura los convierta en residuos antes ser utilizados.

En este sentido es conveniente proteger los contenedores, sacos, etc., del mal uso que los particulares pueden hacer de ellos, sobre todo durante los fines de semana. Se debe impedir que esos contenedores se llenen de mobiliario viejo y otros residuos porque, así mezclados, los de la obra serán de difícil gestión.

Disponer los contenedores más adecuados para cada tipo de residuos.

En la obra se producen residuos de diferente naturaleza, de manera que las posibilidades de gestión son diferentes: centrales recicladoras, vertederos y la propia reutilización en obra.

En definitiva, no solamente se trata de realizar una separación selectiva de los residuos, sino también un almacenaje selectivo de los residuos, según su naturaleza.

Controlar el movimiento de los residuos de forma que no queden restos descontrolados.

Los residuos sobrantes de ejecución se producen en la obra de forma dispersa. En efecto, los residuos se generan allá donde se ejecutan los trabajos y, por lo tanto, deben ser transportados hasta su lugar de almacenaje.

Ese recorrido ha de ser planificado para que se produzcan las menores pérdidas posibles, pues los residuos vertidos de forma descontrolada acaban, innecesariamente mezclados, en el vertedero.

Siempre que sea posible, los materiales y productos que llegan a la obra deben ser desembalados en un lugar previamente definido, muy próximo a la zona de acopio de residuos clasificados. De esta forma el residuo se originará en el mismo lugar donde se almacenará selectivamente.

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros y resulten contaminados.

Es necesario impedir que los residuos se mezclen entre ellos, pues la mezcla de ciertos residuos líquidos y otros que contienen materia orgánica puede dar origen a que los demás resulten contaminados. La facilidad con que se vierten residuos líquidos los hace particularmente peligrosos.

Evitar la producción de polvo debida a la falta de previsión de una buena práctica con los materiales que llegan a la obra en forma de polvo.

Hay materiales, como los cementos, yesos y cales que llegan a la obra en forma de polvo. Una manipulación poco cuidadosa de los mismos produce polvo que, en determinadas concentraciones en el aire, puede afectar a la salud laboral del personal de la obra.

Llevar un registro de cada contenedor que sale de la obra.

El control de los residuos que se producen en la obra empieza por la caracterización de ellos y acaba con su comprobación al salir de la obra. En este sentido es indispensable que se lleve un control de la naturaleza y las cantidades de residuos que se producen en ella, es decir, de todos aquellos residuos que no se reutilizan en la propia obra. Asimismo, es importante conocer qué se va hacer con esos residuos (por ejemplo, adónde van a parar las tierras sobrantes de la excavación previa a la obra).

Controlar el consumo de agua y de energía eléctrica.

El agua y la energía también son recursos que forman parte de la obra. Sin ellos no podríamos ejecutarla y, por lo tanto, su consumo es susceptible de ser minimizado.

6.3.- PERSONAL DE LA OBRA.

Se deben cumplir las normas y órdenes dictadas por la dirección de la obra para el control de los residuos.

En cada obra se deberán cumplir atentamente las normas generales relativas a la gestión de los residuos que en ella se originan. Sin embargo, y puesto que cada obra tiene unas características propias, cada una de ellas deberá cumplir las órdenes y criterios particulares establecidos por la dirección técnica.

Todos los que intervienen en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, deben participar activamente para mejorar la gestión de los residuos.

El personal de la obra no se debe limitar al cumplimiento de las normas y órdenes establecidas por la dirección técnica, sino que también debe pensar en el modo en que la gestión de los residuos puede resultar más eficaz. Estas sugerencias deberán ser comunicadas al encargado de la obra con el fin de que puedan incorporarse al proceso general.

La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que éstos se originan.

La manera más eficaz de reducir los residuos es establecer un control desde el momento mismo en que se producen. En efecto, se debe conseguir que estén sin control el menor tiempo posible, es decir, fuera de los recipientes preparados para su almacenamiento: De este modo se logra que no se mezclen con otros, y se evita el consiguiente incremento de los costes de gestión que significaría su separación.

Los residuos se deberán emplazar en contenedores, sacos o depósitos adecuados.

Los residuos se deben emplazar en recipientes preparados a tal efecto, de manera que no queden fuera de ellos, ni tampoco haya peligro de que se mezclen unos con otros. En ambos casos, el resultado de la falta de cuidado en su deposición originará residuos de difícil gestión, que probablemente acabarán en el vertedero.

Los recipientes contenedores de residuos deben transportarse cubiertos.

Los recipientes -ya sean contenedores, sacos, barriles o la caja del camión que transporta los residuos- deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de un vertido descontrolado, aunque sea de pequeñas cantidades (que son difícilmente gestionables).

Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el derroche de materiales en la puesta en obra.

Cuando una partida de obra se ejecuta en exceso, se malgastan materiales y energía, y se originan más residuos. También de forma indirecta se agrava el problema: por ejemplo, si se ejecuta una excavación de mayor volumen del previsto, en la ejecución de la cimentación se originará un exceso de volumen de tierras, que habrá que eliminar. Además, en el relleno de la excavación se tendrá que utilizar hormigón o balasto que no hubiera sido necesario.

7.-PLIEGO DE CONDICIONES Y NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El Plan Integrado de Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma de Navarra contempla la generación de 545.000 toneladas/año de RCDs, cantidad que incluye un 30 por 100 de las tierras de excavación (porcentaje del total de tierras que se deposita en vertedero). El volumen anual de inertes depositados es de 279.000 toneladas/año. En esta Comunidad Autónoma existe una empresa ("REAM, Sociedad Limitada"), creada por los profesionales del sector, que recupera zonas degradadas por el vertido de RCDs con apoyo de la propia Comunidad Autónoma.

DECRETO FORAL 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002; Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002)

Junto a lo establecido por esta normativa de referencia se tendrá en cuenta la normativa existente con anterioridad al decreto o que se mantenga en vigencia.

La normativa medioambiental referida a las actividades de construcción y demolición se estructura de la siguiente manera:

- Tratados y convenios internacionales.
- Directivas de la Unión Europea.
- Legislación de la Administración del estado.
- Legislación de las Administraciones autonómicas.
- Ordenanzas Municipales.

Es importante que todas estas normativas y disposiciones legales sean conocidas por los responsables de la obra y que se integren en los diferentes procedimientos técnicos de las empresas. Así pues, conviene que, en la propia obra o en la empresa, exista un lugar específico donde la dirección técnica o cualquier miembro de la plantilla de obra pueda consultar dicha legislación.

Asimismo, el Plan de Gestión Integral de Residuos del Gobierno de Navarra establece es su apartado, 3.1.4.1. Escombros, tierras y restos de demolición, las siguientes consideraciones.

Los materiales procedentes de los derribos de edificios, los escombros y las tierras de excavación, suponen volúmenes muy considerables de residuos. A pesar de que, estrictamente, tienen un origen industrial, su asimilación a residuo urbano provoca distorsiones fuertes en los vertederos municipales, cuya capacidad se ve limitada. La tendencia al alza de la tasa de vertido en ellos hace desistir muchas veces a los productores que buscan la solución más fácil y barata, el vertido incontrolado, aunque ambientalmente sea problemática.

La producción anual media en Navarra de este tipo de residuos se calcula en 545.000 Tm/año. En esta cantidad quedan incluidas las tierras procedentes de excavaciones, de las que se considera que no más de un 30% se destinan finalmente al depósito. La producción anual media de inertes a depositar se calcula en 279.000 Tm/año, distribuida según la tabla 8.

En el momento actual el destino mayoritario de estos materiales son escombreras o vertederos, de los cuales solo una pequeña parte están legalizadas. Así, el inventario de escombreras recientemente realizado en 1998 arroja una cantidad de 927 escombreras en activo. En muchas ocasiones, sobre todo con tierras de excavación y de construcción de infraestructuras, se recurre a la ocupación temporal de terrenos, frecuentemente con una perspectiva de mejora agrícola.

Para promover todas las acciones y actividades relacionadas con la gestión de escombros y materiales de excavación se constituyó en 1994, una sociedad mercantil, denominada Recuperación Ambiental SL (REAM), compuesta por las Asociaciones del sector, ANECOP, ACP y AGERENA.

Esta empresa, que no tiene beneficio industrial, ha suscrito un Convenio con el Departamento de Medio Ambiente para colaborar en la recuperación de zonas degradadas mediante la aportación selectiva y prioritaria de escombros y tierras y la posterior adecuación y revegetación de los terrenos. El Gobierno de Navarra se hace cargo del diferencial del costo que supone esta acción respecto al de un vertido convencional a una distancia razonable. Los productores adquieren unos tickets con los cuales pueden acceder al vertido.

7.1.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El poseedor de los residuos presentará ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

7.2.- OBLIGACIONES DEL POSEEDOR

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, el poseedor los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación, si él no pudiera por falta de espacio, puede ser realizada por el Gestor final, debiendo obtener igualmente por parte del mismo un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

Facilitará la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Informará a la Dirección de la Obra acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

No sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

8.- CANTIDAD Y NATURALEZA DE LOS RCDs

Tal y como se ha expuesto en el punto 5, podemos esperar los siguientes tipos de residuos en cada una de las zonas de actuación:

MITAD NORTE

La mayor parte de los RCDS de la presente obra corresponden a excedentes de demolición de la calzada (asfalto) y aceras (baldosa hidráulica sobre solera hormigón, bordillo calzada), excedentes del cajeo de la mejora de explanada y paquete de firme de estas superficies y excedentes de excavación de zanja para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como en mejor medida de los servicios.

Tanto en los trabajos de cajeado como de renovación de redes también se producirán ciertas cantidades de demolición de registros, conducciones de hormigón (HMØ500-600mm, PE (DNØ32-40mm), FN (tapas 40x40cm,60x60cm, DN600mm, conducciones FNØ300-200 y FNØ100mm, piecerío y valvulería) etc. de las redes y servicios existentes en la actualidad.

Como en toda obra de urbanización, en las nuevas partidas de ejecución se producirán pequeñas cantidades de subproductos de las obras, como restos de hormigones (sobrantes, limpieza de pasteras y cubas, etc.), madera (encofrados de registros in situ, apuntalamientos, replanteo, etc.), ferralla y otros metales (en los elementos anteriormente mencionados, retirada señalización vertical actual, etc.) así como pérdidas de otros materiales usados durante las obras (tuberías de PVC, FN, PE, etc.). También existirán mermas y sobrantes de losas prefabricadas de hormigón en las aceras, prefabricados de hormigón (acometidas domiciliarias, registros visitables, etc.).

Para la gestión de estos Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) tenemos diferentes opciones de gestión según su naturaleza y cantidad.

El excedente de demolición del pavimento de MBC en calzada, debido a su naturaleza, deberá ser retirado a gestor autorizado. El excedente de demolición de prefabricados de hormigón en aceras (baldosa y bordillo prefabricado de hormigón) y presoleras de hormigón in situ debería a priori retirarse a gestor autorizado, ya que su volumen es reducido, pero en combinación con el adoquín de calzada de la mitad sur puede valorarse su machaqueo en obra para uso del ayuntamiento en obras propias, adecuación y mejora de caminos, etc.

En el caso de excedente de excavación de cajeos de firme y excavación de zanja de redes y servicios, para la capa superior puede esperarse material granular o de encachado de calidad, para el cual debe considerarse, además de la retirada a gestor autorizado, el acopio del material para su reutilización en la propia obra o en futuras actuaciones del ayuntamiento, según la calidad y humedad que presente los mismos, así como su grado de contaminación con finos. Para la capa inferior es previsible un material de peor calidad, con mayor grado de humedad o mayor contaminación, por lo que en este caso deberá ser retirado a gesto autorizado.

Los excedentes de demolición de registros y conducciones existentes de hormigón, PVC, PE, FN, etc. dado su estado y naturaleza, deberán ser retirados a gestor autorizado.

Los restos de podas puntuales y arbolado en su caso, deberán ser retirados a gestor autorizado o triturados in situ en las zonas ajardinadas arboladas junto al Paseo de la Almadía.

Los excedentes generados en las mermas y pérdidas de las nuevas partidas de conducciones, así como restos metálicos y de madera en la ejecución de encofrados, ferralla, apuntalamientos, replanteos, etc., en determinadas ocasiones pueden ser aprovechadas en otras obras por parte del contratista, no generando RCDs, pero en otros casos las mermas suponen material no aprovechable por lo que es necesaria su retirada a vertedero autorizado.

Por el volumen de las actuaciones no siempre se superan los límites necesarios para una recogida selectiva, pero dado que los tipos de residuos son reducidos y se producen de manera separada se procederá en la medida de lo posible durante las obras a la recogida selectiva de los mismos.

MITAD SUR

No están previstas actuaciones en la mitad Sur de c/Juan de Berrueta (futura fase de renovación de calzada)

Se adjunta a continuación la lista y cantidad de RCDs previstos para el presente proyecto:

CUADRO RESUMEN DE RCDs					
COD.	**CONCEPTO**	**MED. BRUTA**		**MED. RCDs**	
17.05.04	**Excedente de Excavación**	**2,346.34**	**m^3**	**4,026.27**	**tn**
	Excedente excavacion	**998.24**	**m^3**	**1,796.83**	**tn**
	Excedente demolición/cajeado	**362.40**	**m^3**	**652.32**	**tn**
	Demolición/escarificado	**985.70**	**m^3**	**1,577.12**	**tn**
17.01.01	**Hormigones**	**59.78**	**m^3**	**0.93**	**tn**
	Densidad	2.40	tn/m^3		
	Tamaño cuba media	10.00	m^3		
	Volumen de limpieza	0.07	m^3/cuba	**< 10**	**tn**
17.01.01	**Prefabricados hormigón**			**0.48**	**tn**
	Tub. Prefabricada HA ø1000-ø1200		**ml**	**0.00**	**kg**
	Tub. Prefabricada HA ø600-ø800	**0.00**	**ml**	**0.00**	**kg**
	Perdidas consideradas	100.00	%		
	Bordillo prefabricado hormigón		**ml**	**0.00**	**kg**
	Perdidas consideradas	5.00	%		
17.01.03	**Adoquines /baldosas/encintados**	**302.50**	m2	**476.44**	**kg**
	Perdidas consideradas	5.00	%		
17.02.03	**Derivados bituminosos**			**0.15**	**tn**
	PVC			0.14	Tn
	Corrugado ø110-160mm	**743.20**	**ml**	**26.83**	**Kg**
	PVC/PE liso teja ø110/315	**320.00**	**ml**	**115.52**	**Kg**
	PVC/PE liso teja ø400/800		ml	0.00	Kg
	Peso teorico (PVC 250mm /400mm)	7.22	Kg/ml	18.31	Kg/ml
	Perdidas consideradas	5.00	%		
17.02.03	**PE**			**0.01**	**tn**
	PEø50mm-90mm	**51.00**	ml	**7.50**	Kg
	PEø110mm-160mm		ml	**0.00**	Kg
	Peso teorico (PE 90mm /160mm)	2.94	Kg/ml	3.78	Kg/ml
	Perdidas consideradas	5.00	%		
17.04.05	**Metales**			**0.46**	**tn**
	FN/Ferralla y/o tramex	**837.20**	kg	**0.04**	tn
	Perdidas consideradas	5.00	%		
	Conducción de FN80-150mm	**23.00**	ml	**31.63**	**kg**
	Conducción de FN150-300mm	**130.00**	ml	390.00	kg
	Peso teórico (150mm / 300mm)	27.50	kg/ml	60.00	Kg/ml
	Perdidas consideradas (F. / C.)	5.00	%	5.00	%
17.02.01	**Restos madera/encofrado**	**38.40**	m2	**0.17**	**tn**
	Perdidas consideradas	10.00	%		

9.- INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RCDs.

En base a los circuitos y circulaciones expuestas en el punto 3.3, se ha propuesto como punto de acopio principal y zona de trasvase de bañeras a dumper de obra la explanada y sobreanchos existentes en la conexión de Paseo de la Almadía con la Plaza San Salvador, que ya se ha utilizado en otras ocasiones (zona de acopio OP1 en fig 9.1). Para las operaciones de asfaltado, si se considera más adecuado (o incluso como acopio principal, si así se estima), puede hacerse el trasvase en el parking de conexión de Paseo Cantolagua con Paseo de la Almadía (zonas de acopio OP2 en Fig 9.1).

La implantación de las instalaciones de obra, así como de las instalaciones de Seguridad y Salud y área de gestión de RCDs, se situarían prioritariamente asociadas a la zona de acopio del Paseo de la Almadía con Plaza San Salvador. Podrán derivarse, previo consenso con los servicios municipales y por motivos de operatividad, parte de estas instalaciones a la Plaza Santo Domingo, por su situación central y más cercana a las obras, o a la propia Plaza San Salvador.

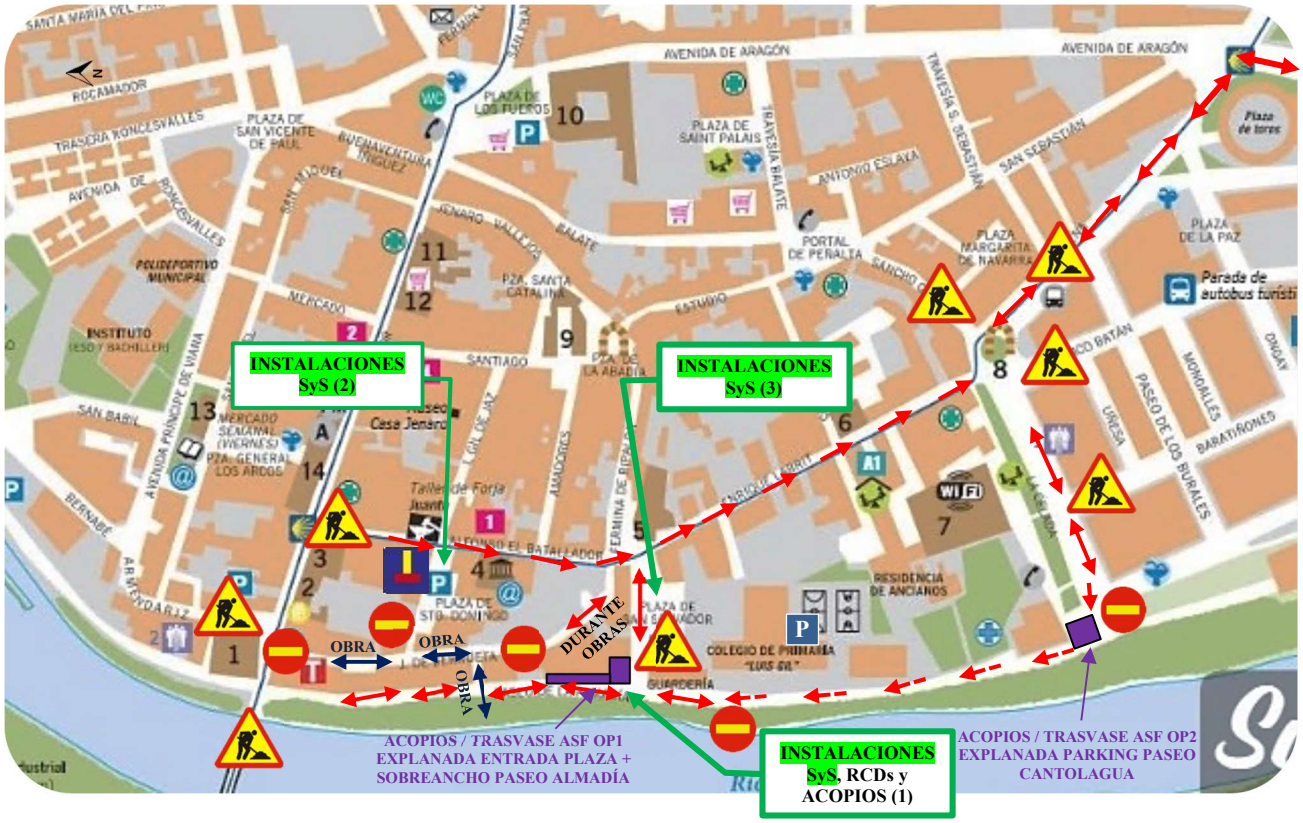


Fig 9.1: Principales circuitos accesos y zonas prioritarias ubicación instalaciones de obra, seguridad y salud, acopios y gestión RCDs

10.-GESTORES DE RESIDUOS EN LAS CERCANÍAS DE LA OBRA.

Los gestores de RCDs en Navarra se desglosan a continuación, estableciéndose la distancia de los principales gestores al lugar de las obras. Se incluye la estimación de ubicación de puntos de vertido adicionales para restos de excavación y demolición.

Nº	GESTORES	UBICACIÓN		PROCESOS VALORIZACIÓN (R)				PROCESOS ELIMINACIÓN (D)
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	CENTRO DE TRANSFERENCIA (R13)	TRATAMIENTO PREVIO (R12)	TRATAMIIENTO FINAL (R5)		VERTEDERO (D5) Poblaciones aisladas
						Instalaciones fijas	Planta móvil	
1	CONTENEDORES IRUÑA, S.L.	Arazuri	CENDEA DE OLZA	X	X			
2	CONTENEDORES IRUÑA, S.L.	Muruarte de Reta	TIEBAS	X		X		
3	CONTENA RECUPERACIÓN, S.L.	Biurrun	BIURRUN-OLCOZ			X		
4	TRANSPORTES Y GESTION DE CONTENEDORES, S.L.	Cintruénigo	CINTRUÉNIGO		X			
5	CONTENEDORES JOKIN S.L.	Tajonar	ARANGUREN	X	X			
6	CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI S.L.	Beriáin	BERIÁIN	X	X			
7	GRUAS CONTAINERS SANBE, S.L.	Pamplona	PAMPLONA		X			
8	RECICLAJES DEL EBRO, S.L.	San Adrián	SAN ADRIÁN			X		
9	EXC. Y TRANSPORTES HERMANOS AZANZA, S.L.	Astráin	CIZUR			X		
10	ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA	Aberin	ABERIN	X		X		
11	CONTENEDORES MADORRAN, S.L.	Tudela	TUDELA	X	X			
12	GREGORIO MARTINEZ, S.A.	Mendavia	MENDAVIA			X		
13	TRANSTXAKAIN S.L.	Lesaka	LESAKA	X	X			
14	ATE & COMPACTADOS	Fontellas	FONTELLAS	X	X	X		
15	JAVIER RUIZ RUIZ y NATALIA CUBERO GOMARA	Cascante	CASCANTE	X	X			
16	CONTENEDORES Y TRANSPORTES GABIRONDO	Iturmendi	ITURMENDI	X	X			
17	ARIDOS RECICLADOS DE NAVARRA, S.L.	Estella	ESTELLA	X	X	X		
18	CONSTRUCCIONES Y DESMONTES RIBERA NAVARRA						X	
19	SERVICIOS Y SUMINISTROS SAHER, S.L.	Tafalla	TAFALLA	X	X			
20	AYUNTAMIENTO DE GALLUÉS	Gallués	GALLUÉS					X

Datos actualizados a 2013 para gestores de RCDs excepto materiales naturales excavados, que se expoene en tabla siguiente.

Nº	GESTORES	UBICACIÓN		PROCESOS VALORIZACIÓN (R) MATERIALES NATURALES EXCAVADOS EXCLUSIVAMENTE		PROCESOS ELIMINACION (D)	
		LOCALIDAD	MUNICIPIO	RESTAURACIÓN (R10)	ACONDICIONAMIENTO y RELLENO (R5)	VERTEDERO INERTES (D5) MATERIALES NATURALES EXCAVADOS EXCLUSIVAMENTE	VERTEDERO RNP (D5)
1	CONTENEDORES IRUÑA, S.L.	Muruarte de Reta	TIEBAS			X	
2	RECUPERACIÓN AMBIENTAL, S.L.	Esparza de Galar	GALAR			X	
3	CONTENA RECUPERACIÓN, S.L.	Biurrun	BIURRUN-OLCOZ			X	
4	RECIVILLA, S.L.U.	Villatuerta	VILLATUERTA			X	
5	EXCAVACIONES ANGULO, S.L.	Viana	VIANA			X	
6	RECICLAJES DEL EBRO, S.L.	San Adrián	SAN ADRIÁN			X	
7	DIONISIO RUIZ, S.L.	Viana	VIANA				X
8	VERTEDERO DE GÓNGORA (MANCOMUNIDAD DE PAMPLONA)	Góngora	ARANGUREN				X
9	VERTEDERO DE ARBIZU (MANCOMUNIDAD DE SAKANA)	Arbizu	ARBIZU				X
10	VERTEDERO DE CÁRCAR (MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA)	Cárcar	CÁRCAR				X
11	VERTEDERO EL CULEBRETE (MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA)	Tudela	TUDELA				X
12	GAROCEX, S.L.	Falces	FALCES	X			
13	OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L.	Ayegui	ESTELLA	X			
14	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.			X	X		
15	CONSTRUCCION Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ARIAN, S.A.			X	X		

Datos actualizados a 2013 para gestores de RCDs de materiales naturales excavados.

TABLA 61: SOLUCION PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RCD EN NAVARRA

Distancia a plantas / Tipo obra o cantidad de RCD	< 30 Km..	> 30 Km..
Obras domiciliarias o RCD < 50 Kg.	Recogida a través de los contenedores municipales de residuos urbanos	
Obras de escasa entidad o RCD 50- 4.000 Kg.	Traslado desde la obra hasta planta de tratamiento en contenedores de 3-5 m^3	Depósito en puntos de recogida municipales a través de contenedores de 12 m^3 y traslado hasta planta de tratamiento
Obras en general o RCD > 4.000 Kg.	Recogida en obra en contenedores de 12 m^2 y traslado hasta plantas de tratamiento	
Poblaciones aisladas	----	Estudio en cada caso de la solución más adecuada

OBRAS	VERTEDERO AUTORIZADO	DISTANCIA
SANGÜESA	**Esparza de Galar (REAM)**	**54 km**
SANGÜESA	Tiebas	46 km

11.-OPERACIONES BÁSICAS A CONTEMPLAR.

Se aplicará lo expuesto en objetivos y tipos de operaciones a realizar del Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

Se deberá garantizar para los residuos principales las siguientes actuaciones, en función de se superen las cantidades mínimas establecidas por normativa o que se considere adecuado realizarlo para cantidades menores:

Excedente de Tierra Vegetal

Se estudiará la posibilidad de aumentar la utilización de la tierra vegetal dentro de la obra, mediante caballones de tierra vegetal, jardinería, etc.

Se habilitará un acopio adecuado a para la tierra vegetal a lo largo de la obra, con delimitación física respecto al resto de materiales o residuos de construcción o excedentes de obra.

La tierra vegetal se gestionará de manera que se le dé salida a otras obras, tratamientos medioambientales o empresas de jardinería.

La ubicación del lugar de acopio será tal que permita almacenar el material por un tiempo superior a la ejecución de la obra, de manera que pueda controlarse la retirada progresiva del material.

Se habilitarán para ello puntos de acceso y carga adecuados, cunetas en tierras o sistemas adecuados para la evacuación de pluviales y cartel informativo con el tipo de material y teléfonos de contacto del gestor de dicho material, de manera que se controle y facilite

Excedente de Tierra Vegetal

Se habilitará un acopio adecuado a para el excedente de tierras a lo largo de la obra, con delimitación física respecto al resto de materiales o residuos de construcción o excedentes de obra.

La tierra se gestionará de manera que se le de salida a otras obras, tratamientos medioambientales y en último caso a vertedero de R.C.D.

La ubicación del lugar de acopio será tal que permita almacenar el material por un tiempo superior a la ejecución de la obra, de manera que pueda controlarse la retirada progresiva del material.

Se habilitarán para ello puntos de acceso y carga adecuados, cunetas en tierras o sistemas adecuados para la evacuación de pluviales y cartel informativo con el tipo de material y teléfonos de contacto del gestor de dicho material, de manera que se controle y facilite la retirada del residuo.

Hormigones

Se habilitará un foso de vertido y limpieza de cubas de hormigón y de restos de amasadas.

Se habilitarán para ello puntos de acceso adecuados, cunetas en tierras o sistemas adecuados para la evacuación de pluviales y cartel informativo de manera que se controle las operaciones de limpieza.

Se complementará con cartel informativo a la entrada de la obra indicando la existencia de este punto de vertido y la prohibición de realizar operaciones de limpieza o vaciado de las cubas en cualquier otro punto de la obra.

El foso se limpiará al menos una vez al mes, mediante picado mecánico de los restos de hormigón, que se utilizarán como material de relleno o pedraplén en la propia obra o en otras del entorno, y en último caso su retirada a vertedero de RCDs.

PVC, PE y plásticos

Se habilitará un acopio diferenciado adecuado para el acopio de materiales de PVC y PE que facilita disponer un espacio adyacente al acopio de estos materiales para almacenar los restos y desechos que se producen a lo largo de la ejecución.

Con ello se pretende reducir los restos generando mediante la ubicación conjunta de material de uso y restos que pueden ser aprovechados en momentos puntuales de la obra.

Se habilitará estas zonas con delimitación física respecto al resto de materiales o residuos de construcción o excedentes de obra y se dispondrá un contenedor de 6m3 para la recogida de los residuos.

Los residuos de material que no puedan emplearse en otras obras se llevarán a vertedero autorizado para este tipo de materiales.

Ferralla y elementos de fundición

Se habilitará un acopio diferenciado adecuado para el acopio de materiales de madera, que facilite disponer un espacio adyacente al acopio de estos materiales para almacenar los restos y desechos que se producen a lo largo de la ejecución.

Con ello se pretende reducir los restos generando mediante la ubicación conjunta de material de uso y restos que pueden ser aprovechados en momentos puntuales de la obra.

Se habilitará estas zonas con delimitación física respecto al resto de materiales o residuos de construcción o excedentes de obra y se dispondrá un contenedor de 3m3 para la recogida de los residuos.

Los residuos de material que no puedan emplearse en otras obras se llevarán a vertedero autorizado para este tipo de materiales (plantas de compostaje, incineración, etc.).

Se habilitará un punto agua para las labores de limpieza de las cubas y de garrafas de aditivos de hormigón.

Demolición de viviendas y prefabricados

Los restos de demolición de viviendas se acopiarán, tras una separación inicial tras la demolición, en un acopio diferenciado adecuado para el acopio de materiales de demolición de hormigón, ladrillo, cerámico, etc procedentes de la demolición.

El acopio para estos residuos se habilitará junto a los acopios de prefabricados de hormigón, para facilitar la retirada al mismos de los restos de cortes y roturas de los elementos prefabricados.

Los restos de hormigón, ladrillo, etc. se macharán mediante medios mecánicos para su empleo como material de relleno o pedraplén en relleno de la propia obra o en otras exteriores. En último caso se retirará a vertedero autorizado de RCDs.

Aditivos, aceites, etc.

Se habilitará un acopio diferenciado adecuado para el acopio de materiales de aditivos, aceites, etc , que facilite disponer un espacio adyacente al acopio de los envases de estos materiales. Se dispondrá de dos depósitos de recogida de aceites para motor e hidráulico utilizados en el caso de que se realicen labores de mantenimiento en la propia obra o binen se gestionará de manera adecuada el almacenamiento o retirada de los mismos.

Las labores de lavado de garrafas de aditivos de hormigón para su empleo con aceites o gasolinas se realizarán en el foso de limpieza de las cubas de hormigón.

Se habilitará estas zonas con delimitación física respecto al resto de materiales o residuos de construcción o excedentes de obra y se dispondrá un contenedor de 3m3 para la recogida de los residuos.

Los residuos de material que no puedan emplearse en otras obras se llevarán a vertedero autorizado para este tipo de materiales (plantas de compostaje, incineración, etc.).

La gestión de los residuos contemplados en este apartado, entre los que pueden generarse residuos considerados peligrosos se realizarán a través de gestores autorizados.

12.-COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.

El coste de la gestión de los RCDs generados en la ejecución de la obra se encuentra incluido dentro del presupuesto general de las obras en sus correspondientes capítulos, desglosado en los conceptos calculados y expuestos en el presente documento.

Tajonar, Agosto de 2023

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA.**
ICCP, Colegiado nº19.233.

Eunate Compañía de Ingeniería, S.L.

Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

PRESUPUESTO

1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 **33.132,54** **mk** **Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros**
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición	1,000	(669,40+302,50)*0.22*1.15*50	12.294,535
Cajeado	1,000	(220+142.4)*1.15*50	20.838,000
		Total ...	**33.132,54**

2 **416,76** **m3** **Tasa en concepto de gestión de tierras y rocas**
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Cajeado	1,150	220,000			253,000
	1,150	142,400			163,760
				Total ..	**416,76**

3 **971,90** **m3** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición	1,000	(669,40+302,50)	971,900
	0,000		0,000
		Total ...	**971,90**

4 **3,00** **t** **Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)**
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

5 **10,00** **t** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 **57.398,80** **mk** **Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros**
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Exc. Zanja todo	1,000	998,24*1.15*50	57.398,800
		Total ...	**57.398,80**

2 **1.147,98** **m3** **Tasa en concepto de gestión de tierras y rocas**
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Exc. Zanja todo	1,150	998,240			1.147,976
				Total ..	**1.147,98**

3 **13,80** **m3** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición conexión	1,000	12*1.15	13,800
	0,000		0,000
		Total ...	**13,80**

4 **2,00** **t** **Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)**
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

5 **10,00** **t** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*55*	33.132,54	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	0,12	3.975,90
2	*57*	416,76	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).	4,00	1.667,04
3	*58*	971,90	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	6,50	6.317,35
4	*56*	3,00	t	Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.	90,00	270,00
5	*59*	10,00	t	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.	20,00	200,00

Total Cap. 1.2.6 **12.430,29**

1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS


Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*55*	57.398,80	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	0,12	6.887,86
2	*57*	1.147,98	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).	4,00	4.591,92
3	*58*	13,80	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	6,50	89,70
4	*56*	2,00	t	Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.	90,00	180,00
5	*59*	10,00	t	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.	20,00	200,00

Total Cap. 1.1.3 **11.949,48**

PLANOS


SITUACIÓN

ESCALA 1/700.000

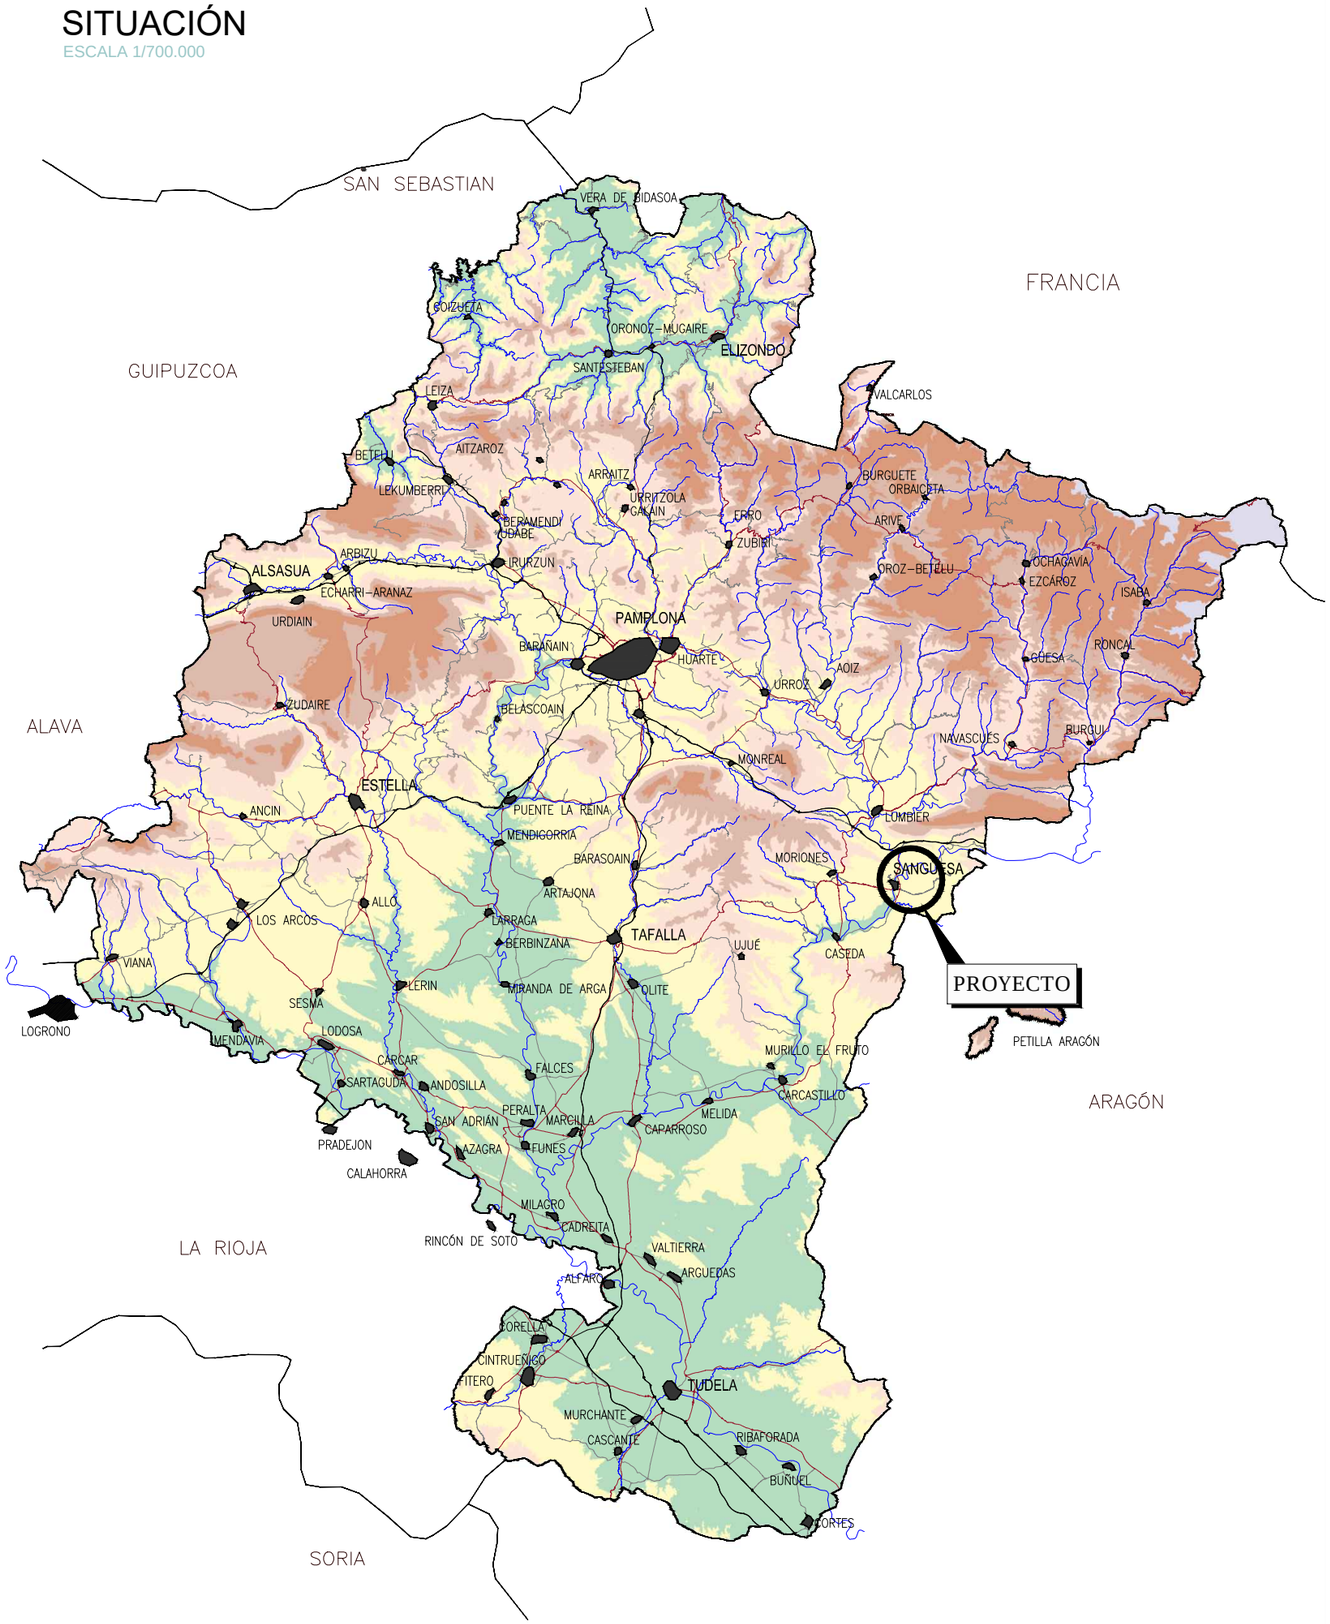

LOCALIZACIÓN

ESCALA 1/125.000

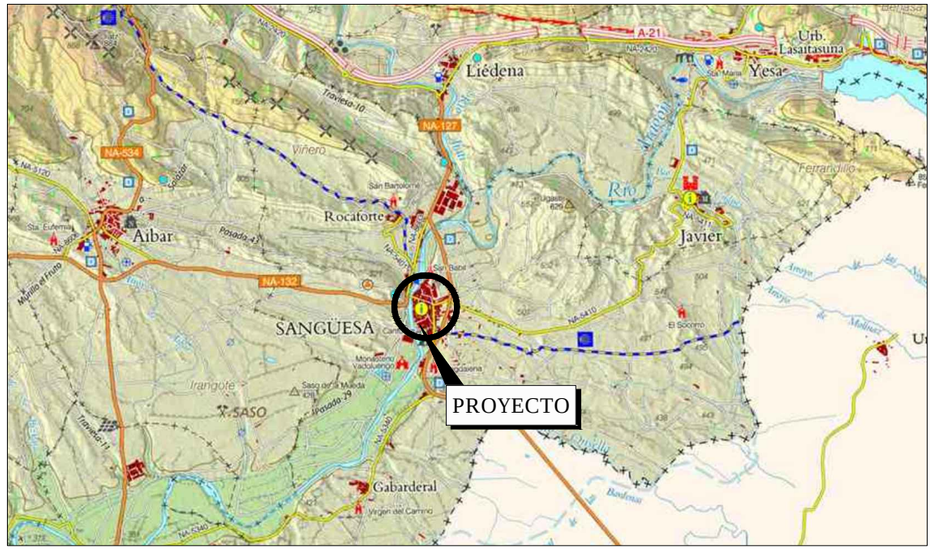

ÍNDICE DE PLANOS

1.- SITUACIÓN E ÍNDICE ____ 1

2.- EMPLAZAMIENTO ____ 1

3.- TOPOGRAFIA ____ 1

4.- SITUACIÓN EXISTENTE ____ 1

5.- REDES PROYECTADA ____ 2

5.1- PLANTA (1)

5.2- LONGITUDINALES (1)

6.- SERVICIOS PROYECTADA ____ 1

7.- PAVIMENTACIÓN PROYECTADA ____ 4

7.1- PLANTA Y SECCIONES (2)

7.2- LONGITUDINALES (1)

7.3- TRANSVERSALES (1)

8.- DETALLES ____ 3

TOTAL PLANOS 14

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.


ESCALAS:
1/700.000
1/125.000

PROYECTO:
RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

DESIGNACION DEL PLANO:
SITUACIÓN E ÍNDICE

REV
FECHA 24/08/2023 AGOSTO 2023
DOCUMENTO DWG 1. SITEMP

PLANO Nº 1
HOJA 1 DE 1

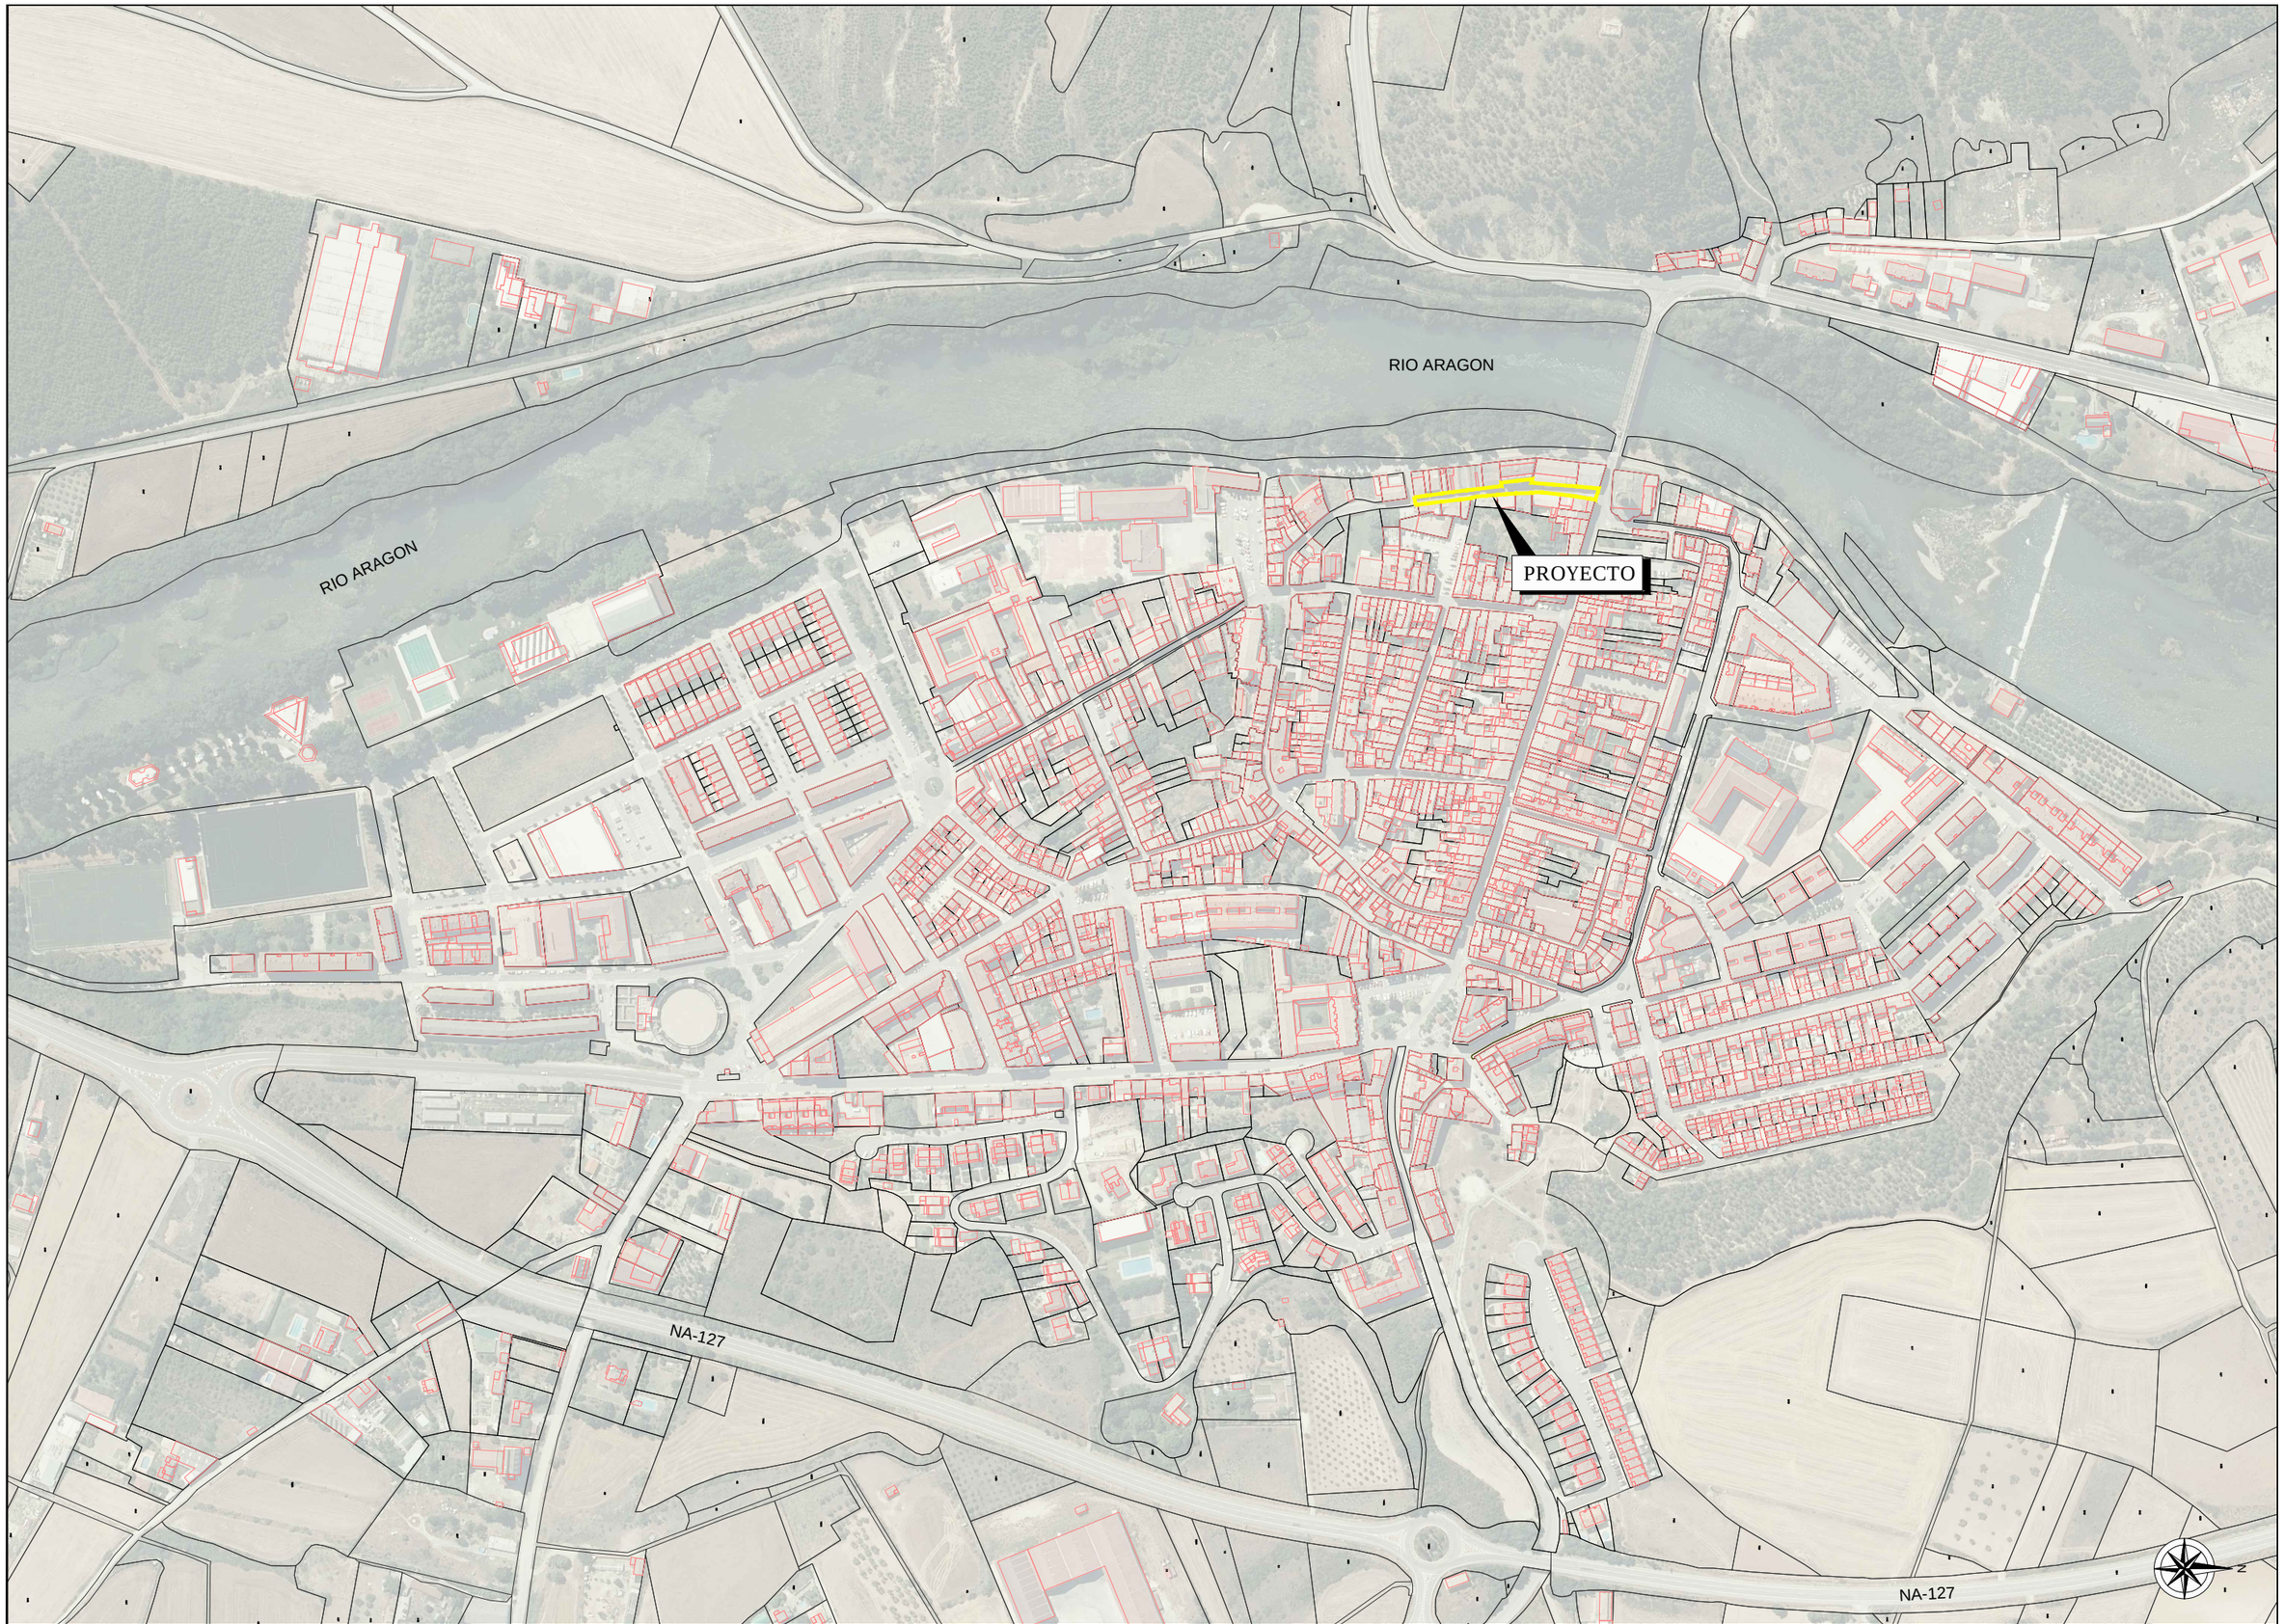

AYUNTAMIENTO
SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE
Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS:
1:4000


PROYECTO:
RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

DESIGNACION DEL PLANO:
2. EMPLAZAMIENTO

REV	FECHA	PLANO Nº
24/08/2023	AGOSTO 2023	2
DOCUMENTO DWG		HOJA 1 DE 1
1_EMPLAZAMIENTO		



AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: 1:250	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: TOPOGRAFIA	REV 24/08/2023 · FECHA AGOSTO 2023 · PLANO Nº 3 DOCUMENTO DWG 1.TOPOGRAFIA · HOJA 1 DE 1

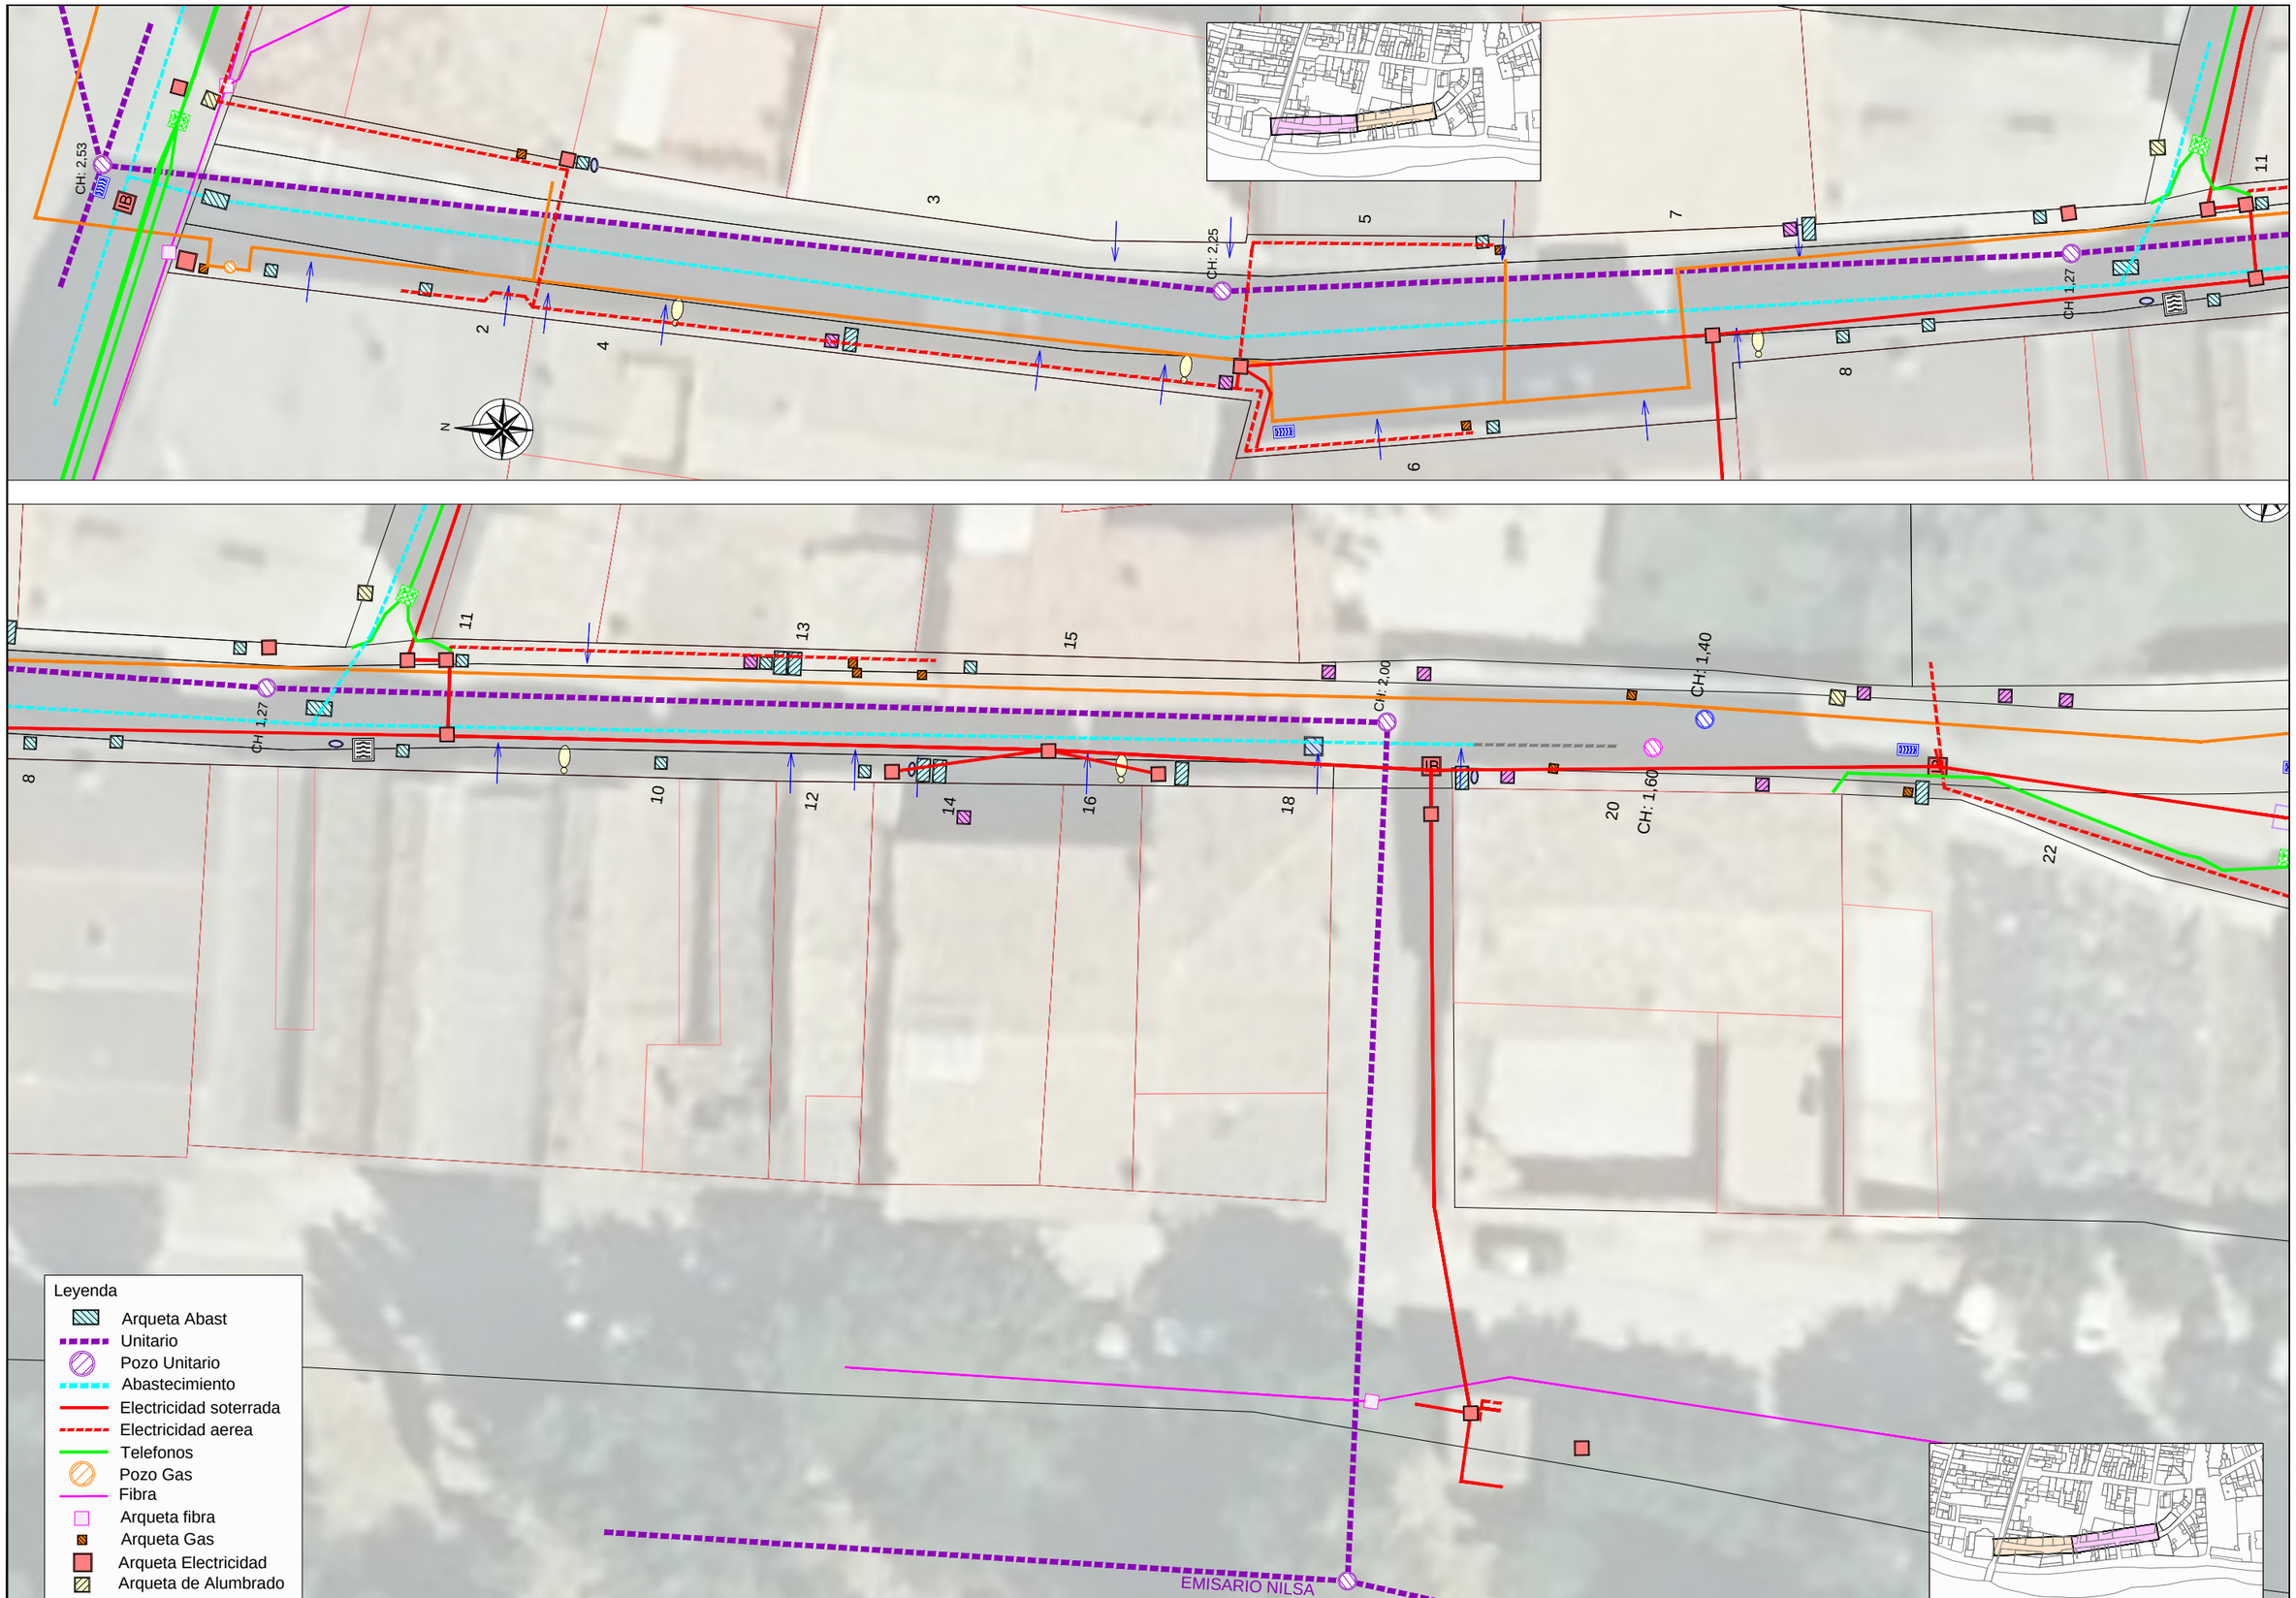

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233


EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS: 1:250

PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA


DESIGNACION DEL PLANO: SITUACIÓN EXISTENTE

REV	FECHA	PLANO Nº
25/08/2023	AGOSTO 2023	4
DOCUMENTO DWG: 4.EXISTENTE		HOJA 1 DE 1

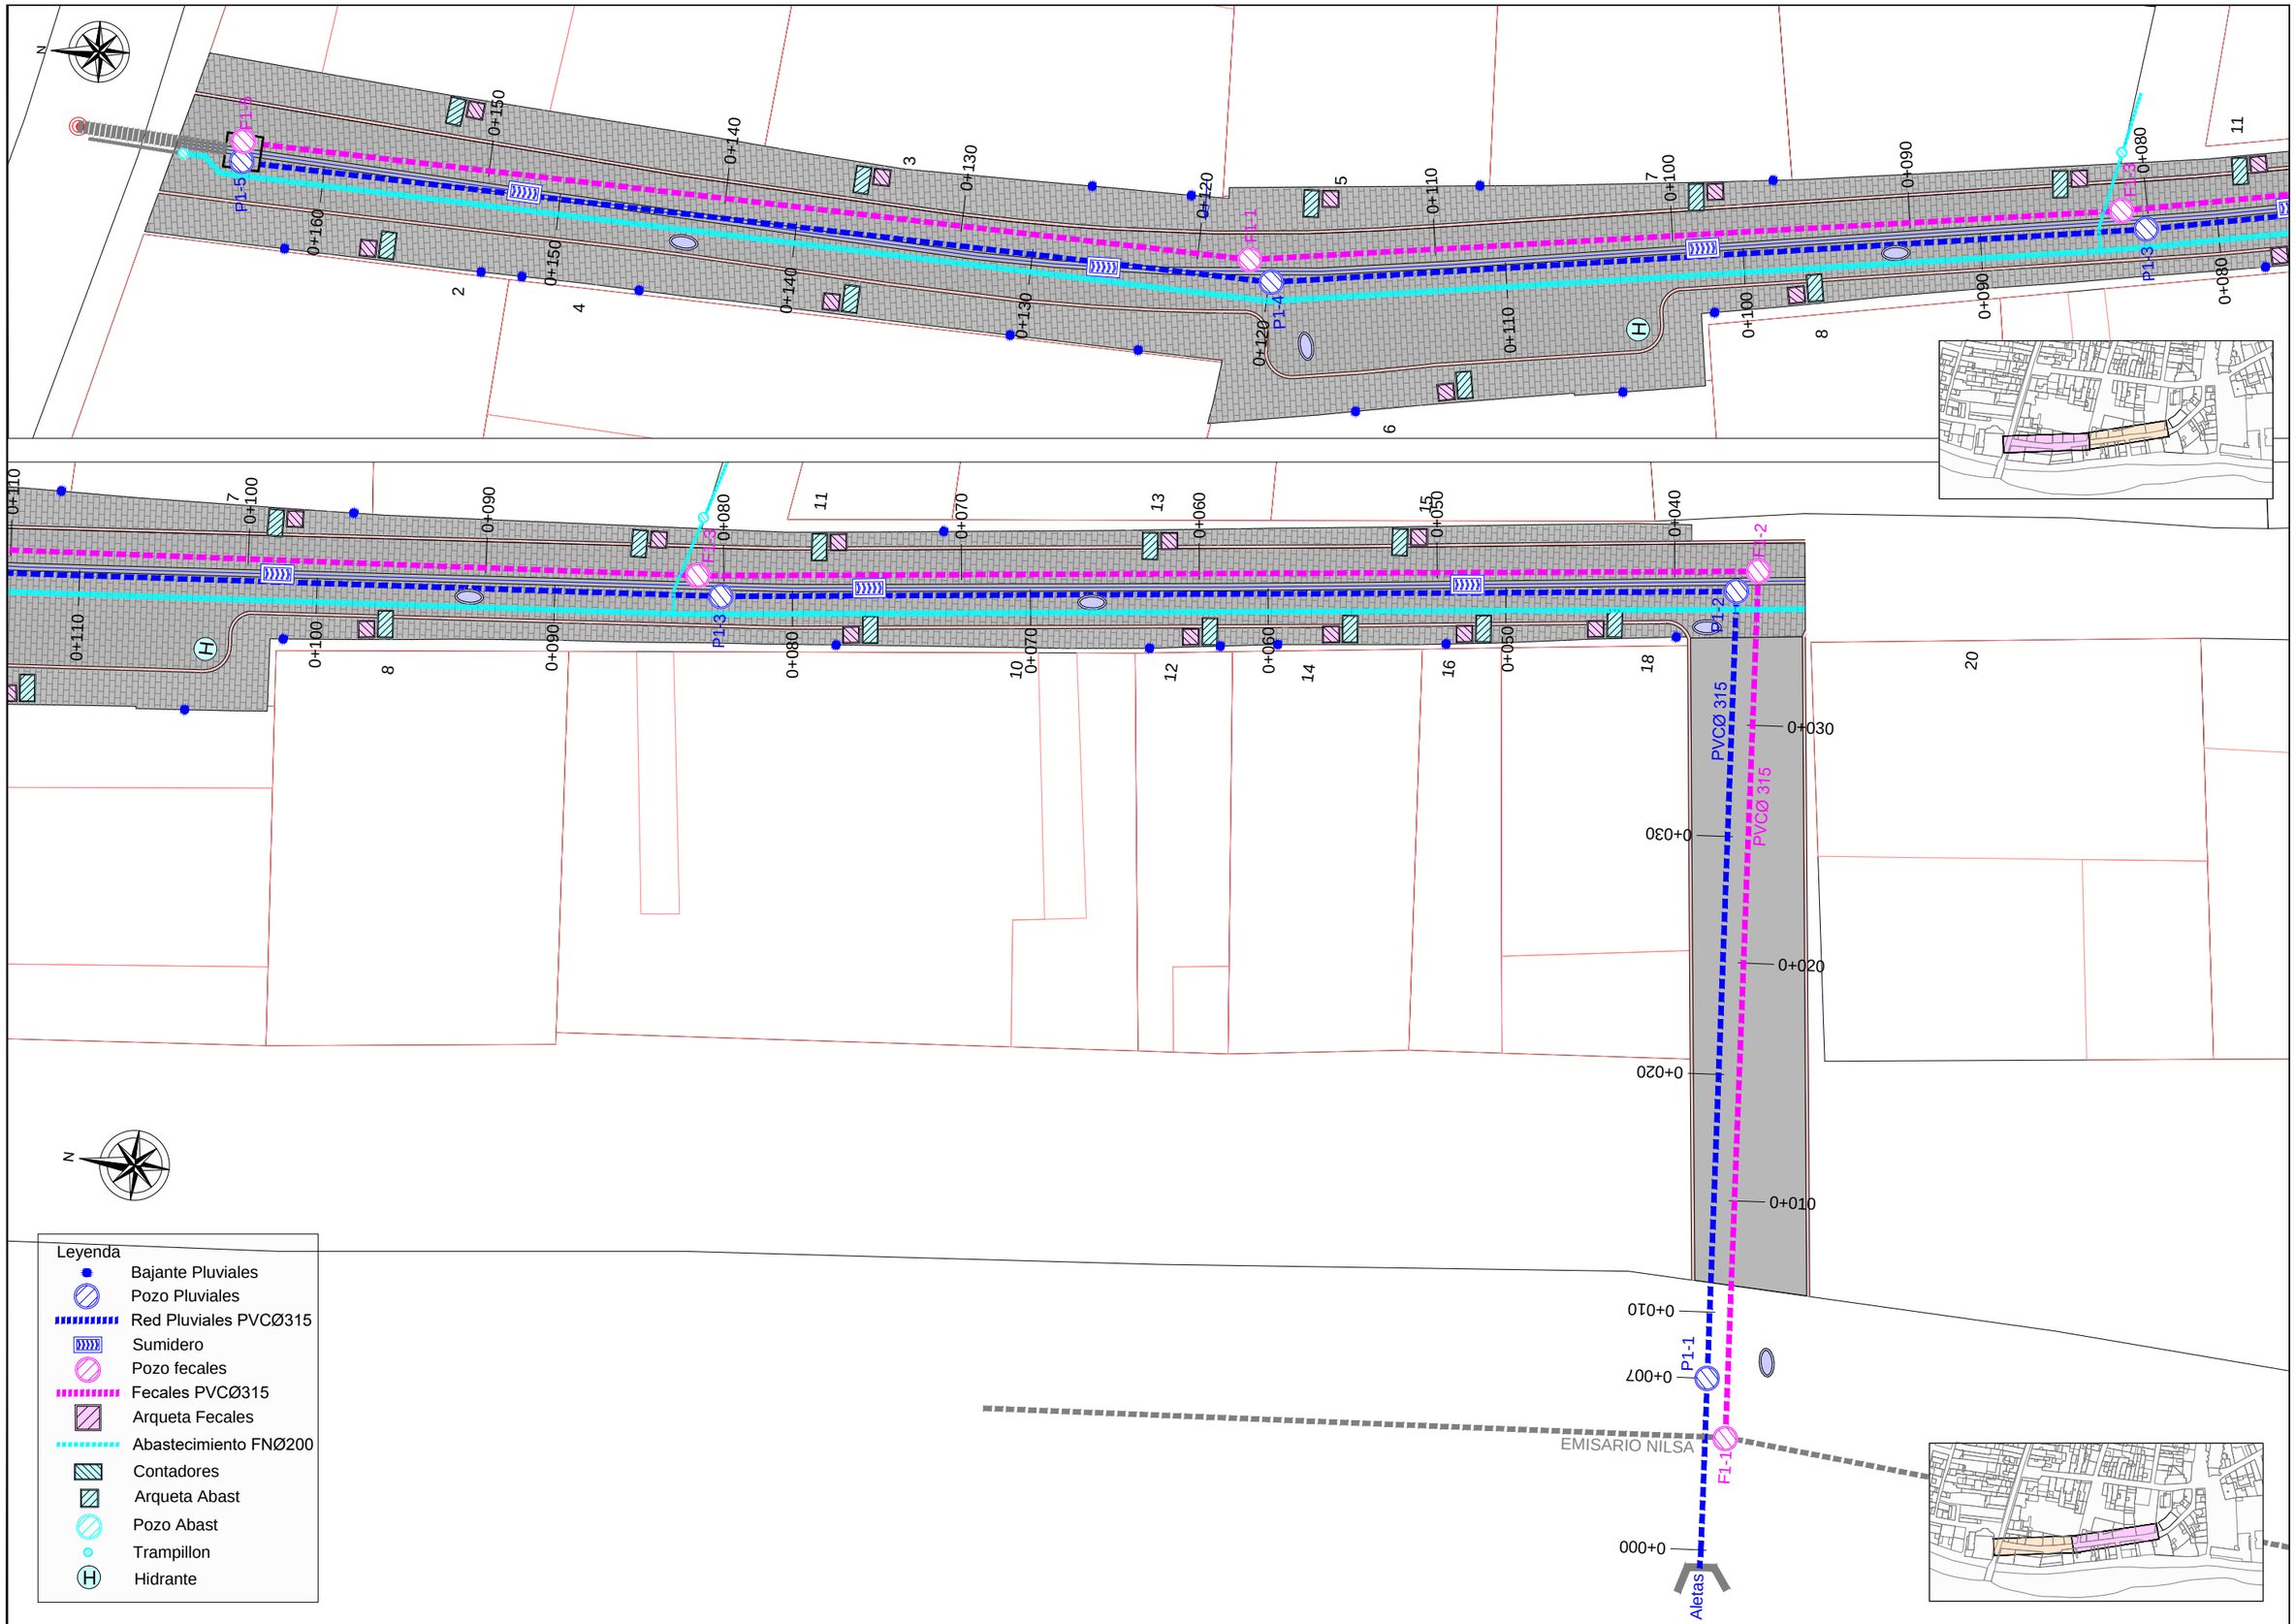


AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: 1:250 1:500	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: 5. REDES PROYECTADAS 5.1 PLANTA	REV 30/08/2023 · FECHA AGOSTO 2023 · PLANO Nº 5.1 DOCUMENTO DWG 5.1 REDES PROYECTADAS · HOJA 1 DE 2






LONGITUDINAL FECALES

RAMAL FEC 1

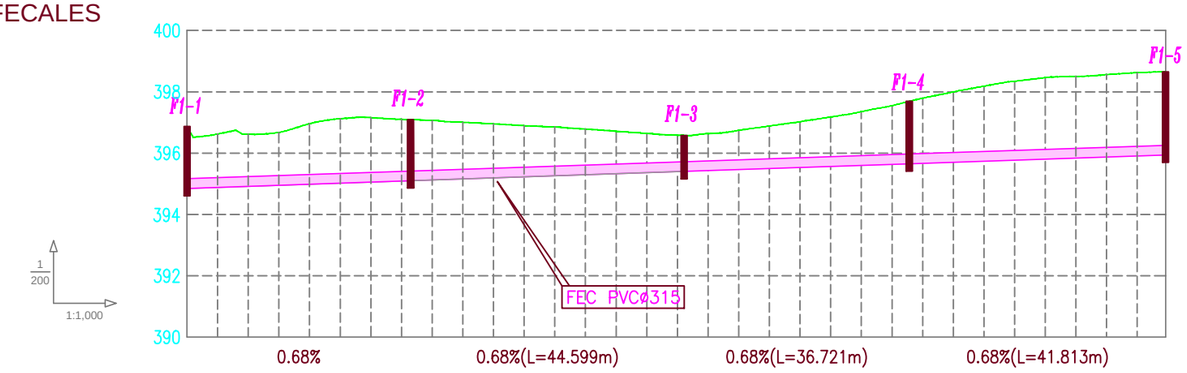

| | | |

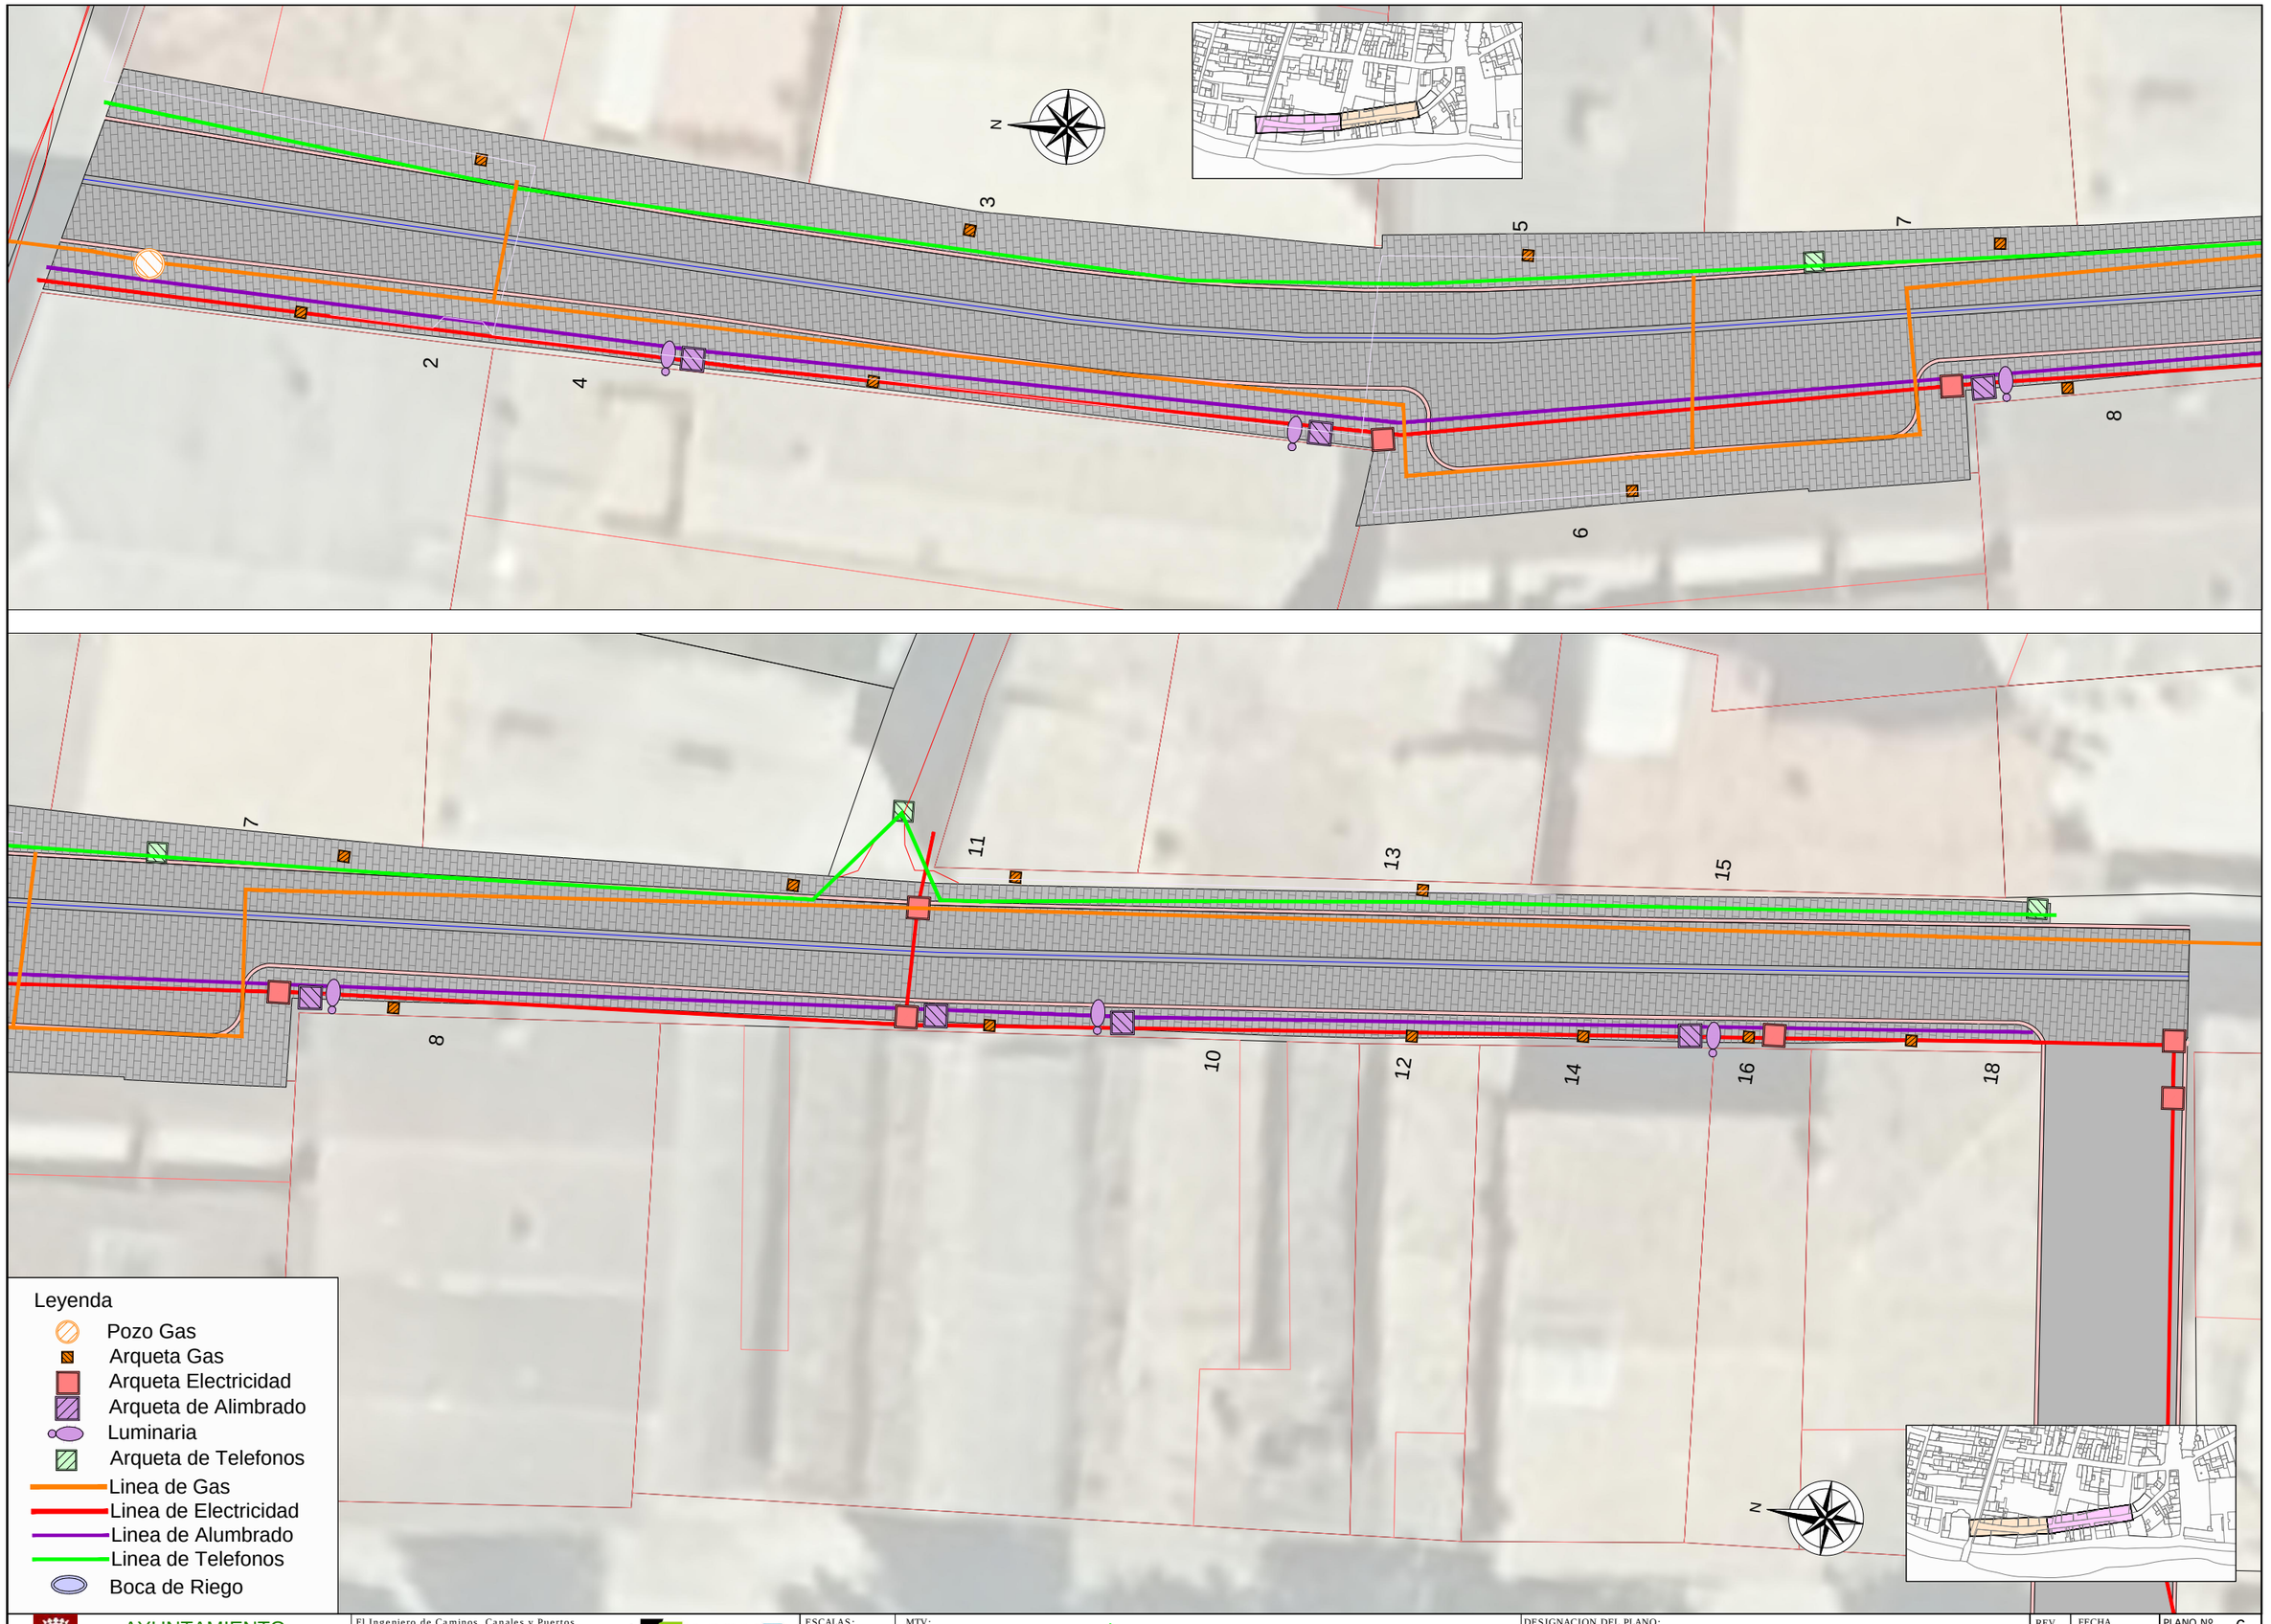

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE
Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS: 1:200

MTV: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

DESIGNACION DEL PLANO: 6. SERVICIOS PROYECTADOS

REV 23/08/2023 | FECHA JUNIO 2022

DOCUMENTO DWG 6. SERVICIOS


PLANO Nº 6


HOJA 1 DE 1



AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: 1:350	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA	DESIGNACION DEL PLANO: 6. PAVIMENTACIÓN 6.1 PLANTA Y SECCIONES	REV 30/08/2023 · FECHA AGOSTO 2023 · PLANO Nº 6.1 DOCUMENTO DWG 7.1 PAVIMENTACIÓN PROYECTADA_PLANTA HOJA 1 DE 2


SECCIÓN EJECUTADA A–A”

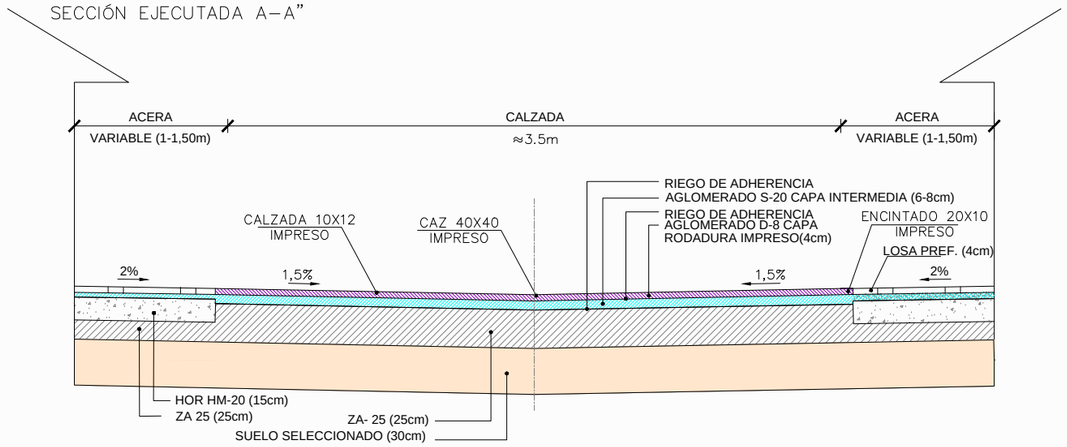

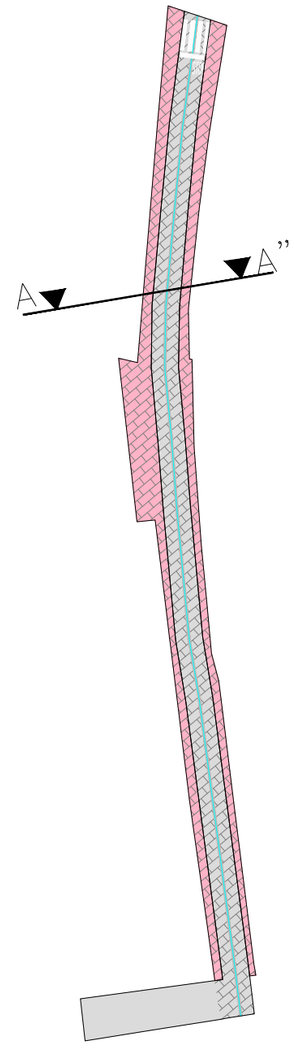

ZANJA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO

ESCALA 1/40

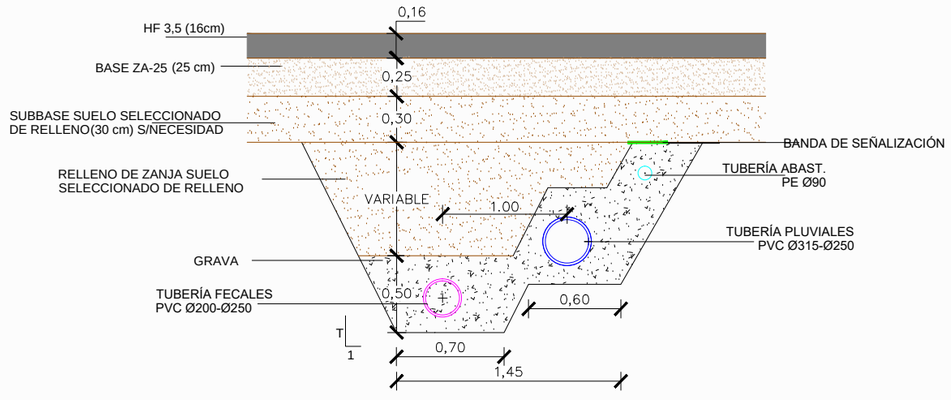

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS: 1:40

PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA


DESIGNACION DEL PLANO: 6. PAVIMENTACIÓN
6.1 PLANTA Y SECCIONES

REV	FECHA	PLANO Nº
30/08/2023	AGOSTO 2023	6.1

DOCUMENTO DWG: 7.1 PAVIMENTACIÓN PROYECTADA_PLANTA


HOJA 2 DE 2

LONGITUDINAL VIAL
EJE 1 PASEO ASMADIA

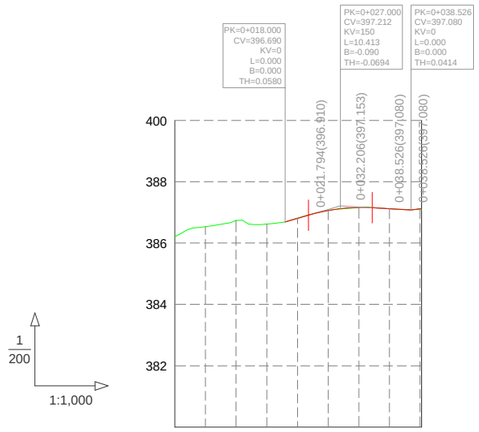

DISTANCIA	0.000	5.000	10.000	15.000	18.000	20.000	25.000	27.000	30.000	35.000	38.526
COTA TERRENO	396.207	396.537	396.739	396.617	396.690	396.814	397.065	397.115	397.162	397.120	397.091
COTA HIDRÁULICA					396.690	396.806	397.062	397.122	397.162	397.121	397.080
COTA ROJA					0.000	0.008	0.003	0.007	0.000	0.001	0.011


LONGITUDINAL VIAL
EJE 1 JUAN DE BERRUETA

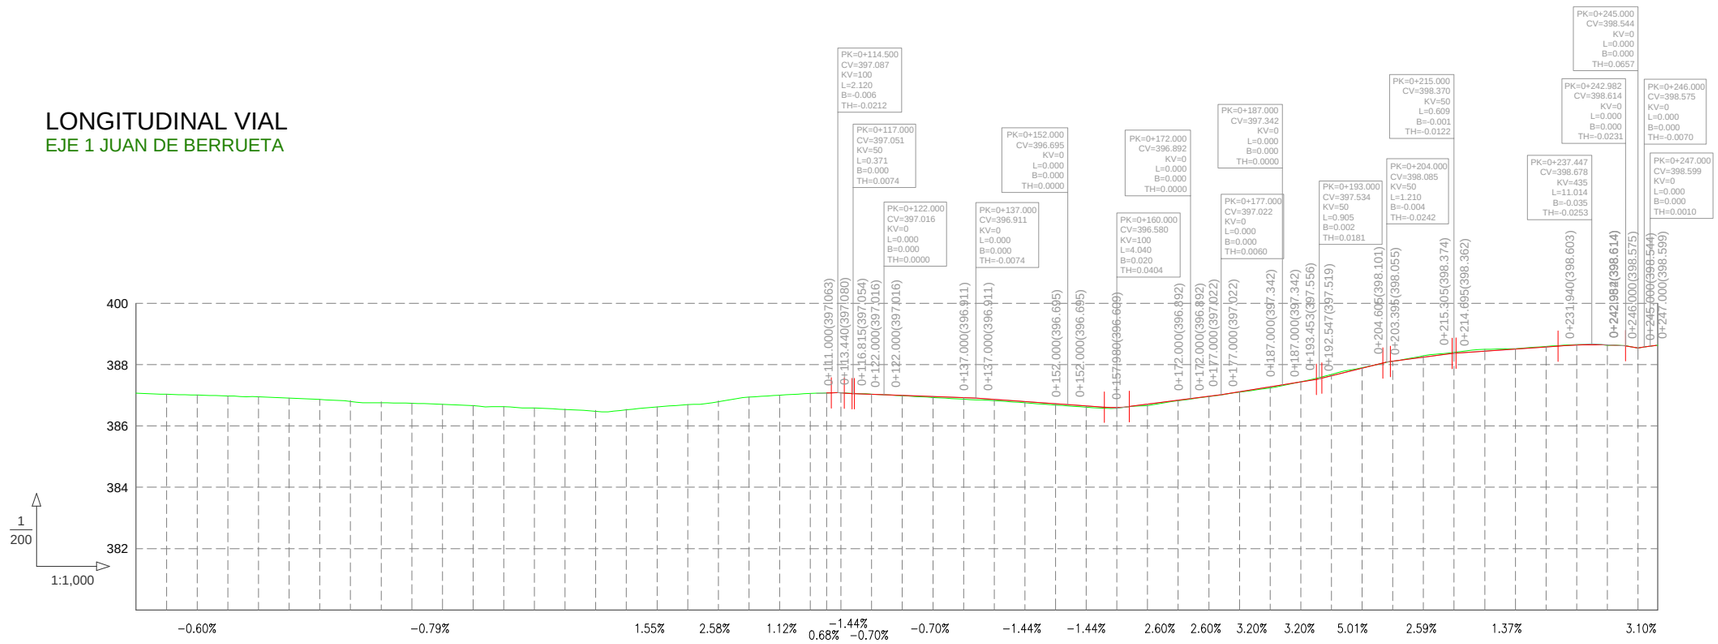


DISTANCIA	0.000	0.004	0.001	0.002	0.007	0.000	0.004	0.027	0.035	0.007	0.005	0.008	0.002	0.004	0.015	0.033	0.041	0.016	0.000	0.001	0.038	0.003	0.005	0.005	0.006	0.007	0.000	0.013	0.033	0.054	0.060	0.045	0.043	0.043	0.043	0.025	0.045	0.021	0.018	0.012	0.017	0.018	0.038	0.029	0.004	0.039	0.044	0.012	0.003	0.045	0.031	0.060	0.010	0.016	0.015	0.011	0.010	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
COTA TERRENO	397.065	397.031	397.006	396.977	396.952	396.906	396.862	396.800	396.752	396.740	396.703	396.660	396.631	396.585	396.535	396.477 396.461	396.525	396.619	396.697	396.787	396.923 396.941	397.001	397.054	397.064	397.057	397.037	397.016	396.982	396.927	396.871	396.851	396.823	396.753	396.681	396.652	396.609	396.575	396.665	396.819	396.874	396.958	397.005	397.100	397.240	397.313	397.442	397.575	397.678	397.897	398.081	398.285	398.400	398.499	398.517	398.592	398.649	398.654	398.629	398.614	398.544	398.599	398.624
COTA HIDRÁULICA	397.065	397.035	397.005	396.975	396.945	396.906	396.866	396.827	396.787	396.747	396.708	396.668	396.629	396.589	396.550	396.510 396.502	396.541	396.619	396.698	396.825	396.940	396.996	397.053	397.064	397.051	397.030	397.016	396.995	396.960	396.925	396.911	396.868	396.796	396.724	396.695	396.652	396.600	396.710	396.840	396.892	396.970	397.022	397.118	397.278	397.342	397.438	397.536	397.634	397.885	398.081	398.240	398.369	398.439	398.507	398.576	398.634	398.643	398.639	398.614	398.544	398.599	398.624
COTA ROJA	0.000	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000	70.000	75.000 77.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000	110.000	114.600 117.000	120.000 122.000	125.000	130.000	135.000 137.000	140.000	145.000	150.000 152.000	155.000	160.000	165.000	170.000 172.000	175.000 177.000	180.000	185.000 187.000	190.000	193.000 195.000	200.000	204.000 205.000	210.000	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000 237.447	240.000	242.982 245.000	246.000 247.000	248.000								

AYUNTAMIENTO ARAKIL CONCEJO ETXARREN	El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Autor del proyecto: Iñigo Encinas Guaza Colegiado Nº 19.233	EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.	ESCALAS: H:1:1000 V:1:200	PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN FASE 1 (NORTE) DE ETXARREN (VALLE DE ARAKIL)	DESIGNACION DEL PLANO: 7. PAVIMENTACIÓN PROYECTADA 7.2 LONGITUDINALES	REV 24/08/2023 FECHA AGOSTO 2023 DOCUMENTO DWG 7.2 PAVIMENTACIÓN PROYECTADA.DWG	PLANO Nº 7.2 HOJA 1 DE 2


TRANSVERSALES VIAL
EJE JUAN DE BERRUETA




PK=0+145.000 D=1.54 CR=396.796




PK=0+180.000 D=2.85 CR=397.118




PK=0+215.000 D=2.39 CR=398.369




PK=0+140.000 D=1.53 CR=396.868




PK=0+175.000 D=1.85 CR=396.970




PK=0+210.000 D=2.46 CR=398.240




PK=0+135.000 D=1.51 CR=396.925




PK=0+170.000 D=1.77 CR=396.840




PK=0+205.000 D=2.18 CR=398.111




PK=0+130.000 D=1.58 CR=396.960




PK=0+165.000 D=1.67 CR=396.710




PK=0+200.000 D=2.37 CR=397.885




PK=0+245.000 D=3.07 CR=398.544




PK=0+240.000 D=2.73 CR=398.639




PK=0+235.000 D=2.72 CR=398.634




PK=0+125.000 D=1.65 CR=396.995




PK=0+160.000 D=1.65 CR=396.600




PK=0+195.000 D=3.57 CR=397.634




PK=0+230.000 D=2.54 CR=398.576




PK=0+120.000 D=1.69 CR=397.030




PK=0+155.000 D=1.55 CR=396.652




PK=0+190.000 D=3.18 CR=397.438




PK=0+225.000 D=2.39 CR=398.507




PK=0+115.000 D=1.46 CR=397.078



PK=0+150.000 D=1.56 CR=396.724




PK=0+185.000 D=2.82 CR=397.278




PK=0+220.000 D=2.61 CR=398.439


TRANSVERSALES VIAL
EJE PASEO ASMADIA




PK=0+040.264 D=1.46




PK=0+040.000 D=1.59



PK=0+035.000 D=1.68



PK=0+030.000 D=1.60



PK=0+025.000 D=1.57



PK=0+020.000 D=1.68

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS: 1:500


PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

DESIGNACION DEL PLANO: 7. PAVIMENTACIÓN PROYECTADA
7.3 TRANSVERSALES


REV 24/08/2023 | FECHA AGOSTO 2023 | PLANO Nº 7.3

DOCUMENTO DWG 7.3 PAVIMENTACIÓN PROYECTADA TRANSV | HOJA 1 DE 1


POZOS DE REGISTRO
DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADO
ESCALA 1/40

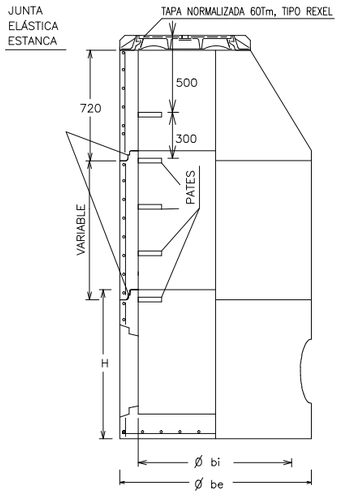

ELEMENTOS
CONO




MODULOS DE ALTURA VARIABLE
ENTRE 250–1000mm.




COTAS ORIENTATIVAS EN MM.				
ø bi	1000	1200		1500
ø be	1240	1520	1600	2100
H	1025	1200	1355	1700
e	120	160	200	300

BASE POZO DE REGISTRO



MÓDULO CÓNICO


SECCIÓN A-A




JUNTA ENTRE MODULOS



PLANTA




DETALLE
DE ANCLAJE
DE TAPA




COTAS ORIENTATIVAS EN MM.			
Ø bi	1000	1200	1500
Ø be	1240	1520	2100
e	120	160	300


MÓDULO CILÍNDRICO

SECCIÓN A-A






SECCION A-A'



PLANTA




JUNTA ENTRE MÓDULOS



COTAS ORIENTATIVAS EN MM.			
0 bi	1000	1200	1500
0 be	1240	1520	2100
e	120	160	300

SECCION B-B'




CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGÓN


ELEMENTO	MATERIALES						EJECUCIÓN
	HORMIGÓN			ACERO			
	TIPO	CONTROL	Y	TIPO	CONTROL	Y	CONTROL
HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN	HM–15	NORMAL	1.50	–	–	–	NORMAL
HORMIGÓN DE ELEMENTOS	HM–20	NORMAL	1.50	–	–	–	NORMAL
	HA–25	NORMAL	1.50	B500S	NORMAL	1.15	NORMAL
LOSAS	HA–25	NORMAL	1.50	B500S	NORMAL	1.15	NORMAL

MÓDULO BASE
JUNTA ELASTICA CON TUBO


PLANTA

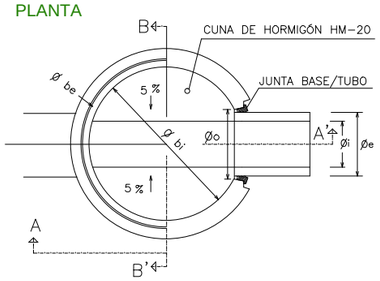


DETALLE D




DETALLE PATE
ESCALA 1/10

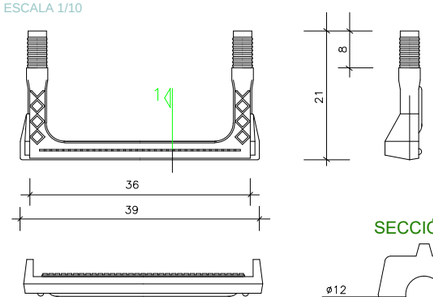


SECCIÓN 1




COLOCACIÓN

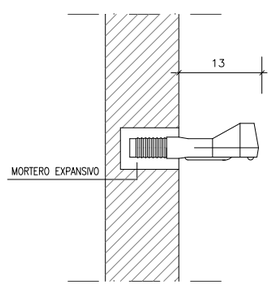



ALZADO
ESCALA 1/50




SECCIÓN
ESCALA 1/50

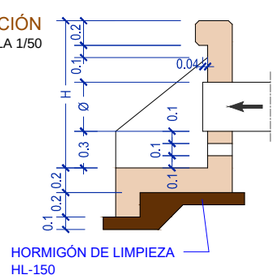


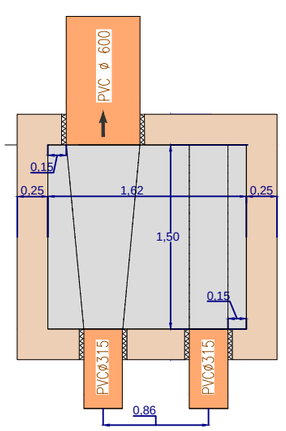

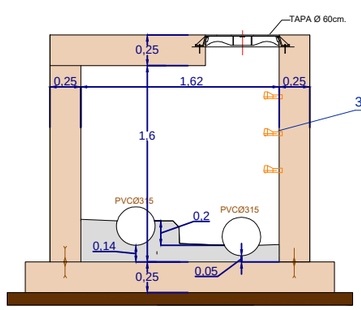


REMATE SUPERIOR POZO
RECRECIDO
ESCALA 1/10

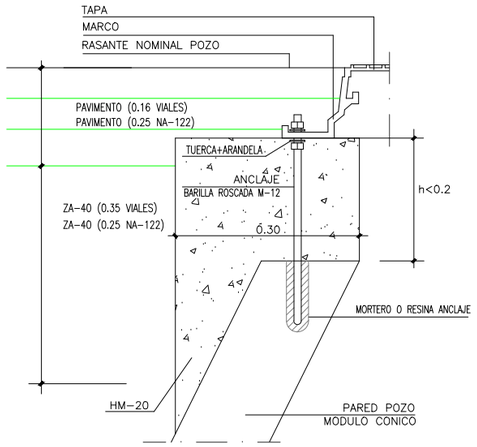




REMATE SUPERIOR POZO
EN CAMPO
ESCALA 1/10

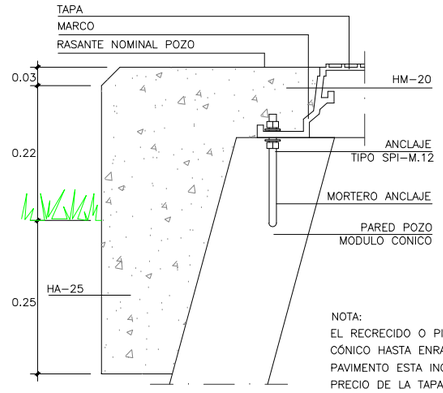


NOTA:
EL RECRECIDO O PICADO DEL MODULO CÓNICO HASTA ENRASARLO CON EL PAVIMENTO ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE LA TAPA DE REGISTRO

EN PAVIMENTO

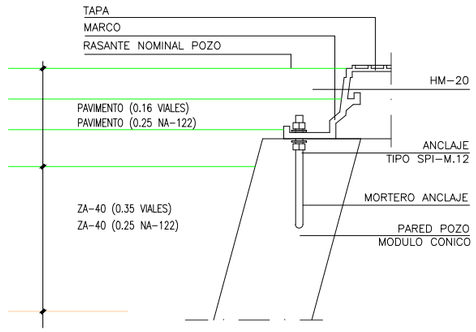


SUMIDERO TIPO EBRO
ESCALA 1/20


SECCIÓN

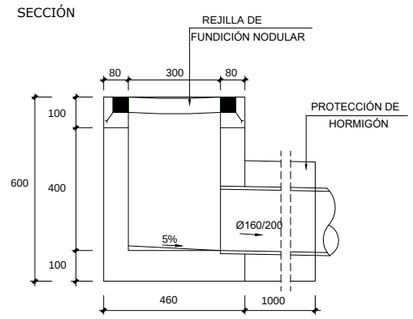


PLANTA

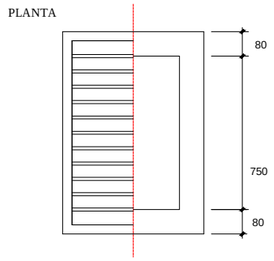

CONEXIÓN DE BAJANTES DE TEJADOS A ZONA PAVIMENTACIÓN DE CALZADA
ESCALA S/N

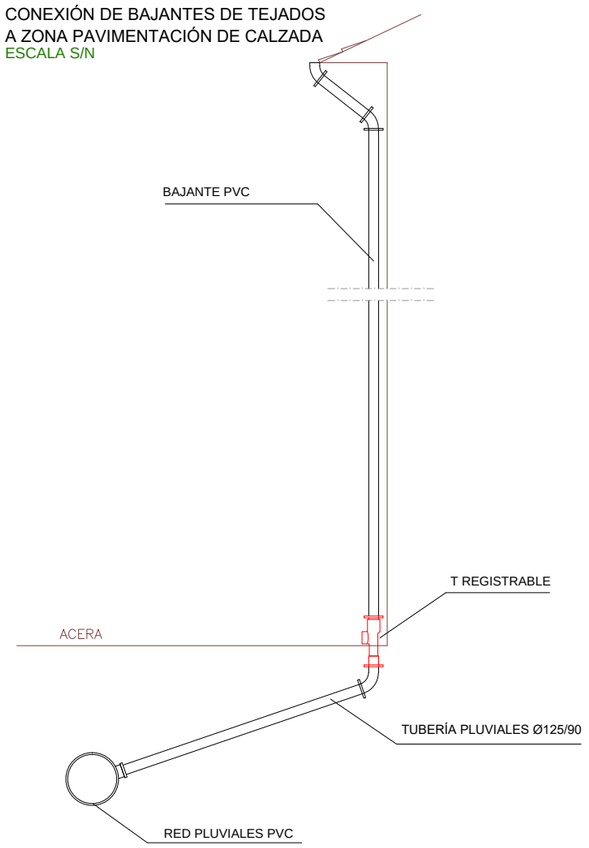


ACOMETIDA SANEAMIENTO
S/E

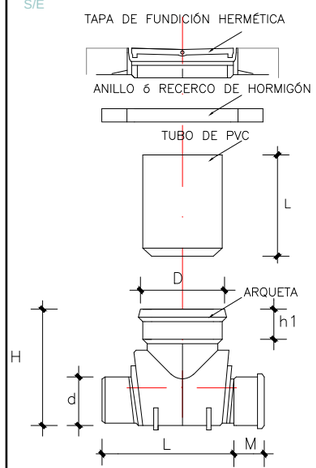


D(mm)	d(mm)	H(mm)	L(mm)	M(mm)	B(mm)	h1(mm)
400	160	383	499	100	461	165
400	200	423	516	116	461	165
400	250	623	720	130	461	150
400	315	630	699	138	461	150
400	400	639	682	150	461	150

ENMARCADO DE TAPAS
ESCALA 1/25

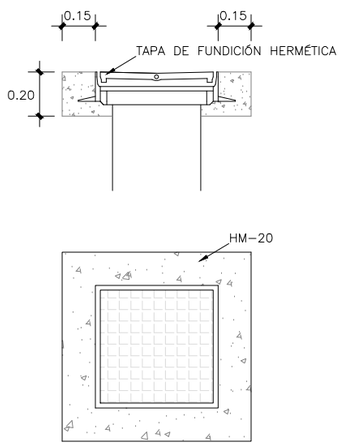


REGILLA CÓNCAVA CLASE C 250
CARGA DE ROTURA > 25.000daN (25t)
S/N ESCALA

SECCIÓN




PLANTA




DIMENSIONES (mm)					
CxC	A	B	O	H	h
400	422	462	351	40	27
600	624	664	549	40	27

ZANJA DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
ESCALA 1/50

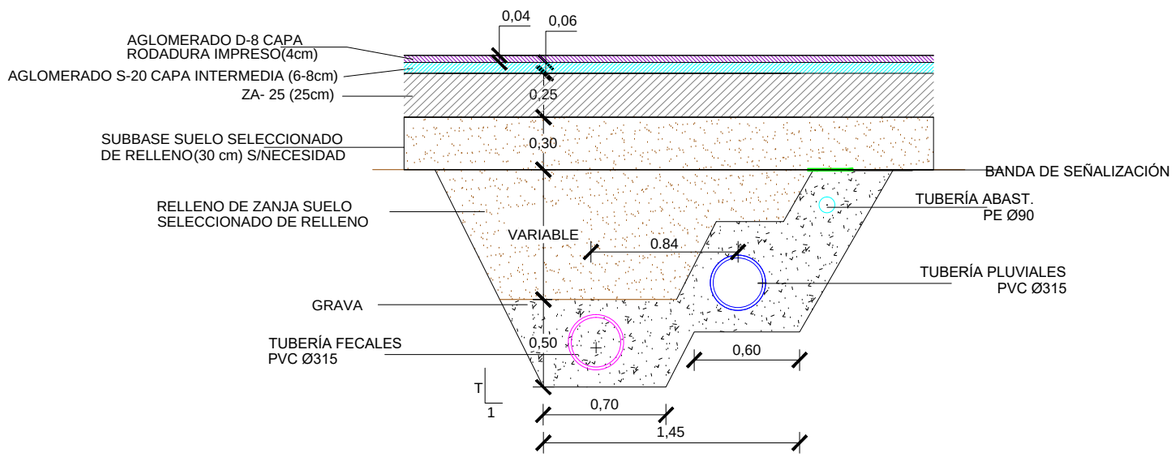

EJECUCION DE LOS ANCLAJES HORIZONTALES EN TUBERIAS



- PARA EQUILIBRAR LAS FUERZAS DE EMPUJE LOS ANCLAJES (DADOS DE HORMIGON) DEBEN SER COLOCADOS EN:
  - LOS CAMBIOS DE DIRECCION (codos) O DE DN (conos de reduccion).
  - LAS DERIVACIONES (TES).
  - LOS EXTREMOS DE LA CANALIZACION (bridas ciegas)
- LOS VALORES DE LAS FUERZAS DE EMPUJE PARA UNA PRESIÓN DE PRUEBA DE 1 BAR SE INDICAN EN LA TABLA SIGUIENTE


DN	Empuje F EN daN				
	Tes y Bridas Ciegas	Codo 1/4	Codo 1/8	Codo 1/16	Codo 1/32
60	47	66	36	18	9
65	53	75	40	21	10
80	75	107	58	29	15
100	109	155	84	43	21
125	163	230	125	63	32
150	227	321	174	89	44
200	387	547	296	151	76
250	590	834	451	230	116
300	835	1180	639	326	164
350	1122	–	859	438	220
400	1445	–	1106	564	283
450	1809	–	1385	706	355
500	2223	–	1701	867	436
600	3167	–	2324	1236	621
700	4278	–	3274	1669	839
800	5568	–	4262	2173	1092
900	7014	–	5368	2737	1375
1000	8626	–	6602	3366	1691
1100	10450	–	7964	4060	2040
1200	12370	–	9468	4827	2425
1400	16787	–	12848	6550	3291
1500	19236	–	14723	7506	3771
1600	21851	–	16724	8526	4284
1800	27612	–	21133	10773	5413

DIMENSIONADO DE CONTRARRESTOS (PRESION DE LA RED 6Kg/cm.)


	ø	100	150	200	250	300
CODO 90°	A	0.25	0.40	0.60	0.70	0.80
	B	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
	C	0.30	0.30	0.40	0.50	0.60
	D	0.05	0.07	0.10	0.10	0.10
	E	0.13	0.15	0.15	0.20	0.25
CODO 45°	A	0.20	0.25	0.35	0.40	0.45
	B	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
	C	0.30	0.30	0.40	0.50	0.60
	D	0.05	0.07	0.10	0.10	0.10
	E	0.13	0.15	0.15	0.20	0.25
CODO 22° 30'	A	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25
	B	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50
	C	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40
	D	0.05	0.07	0.10	0.10	0.10
	E	0.13	0.15	0.15	0.20	0.25

- TENSION TRANSMITIDA AL TERRENO 1.5 Kg/cm.
- TODAS LAS UNIONES QUEDARAN LIBRES
- EL HORMIGON PARA CONTRARRESTOS SERA Hc=150 Kg/cm

PLANTA




SECCION




ARQUETA DE REGISTRO PARA UN HIDRANTE PARA INCENDIOS

ESCALA 1/25

SECCIÓN

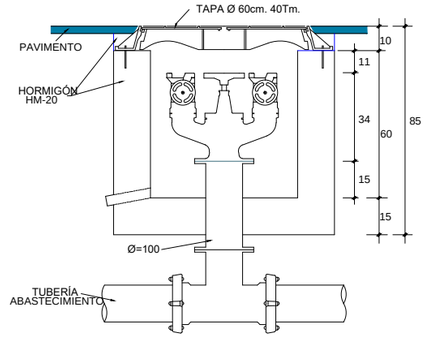


PLANTA

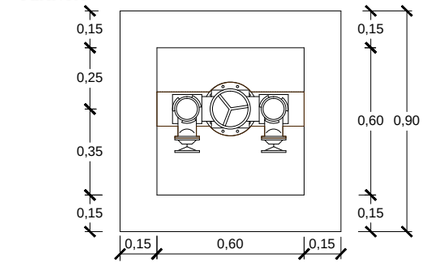


VÁLVULA DE COMPUERTA (EURO 20)

ESCALA 1/25




O TIPOS 21y23 DN	NUMERO DE VUELTAS PARA EL CIERRE	L1	h1	D	a	s	t
		mm	mm	mm	mm	mm	mm
65	13	270	245	185	19	17.3	34
100	20	300	317.5	220	19	19.3	38

REGISTRO DE LLAVE EURO-20

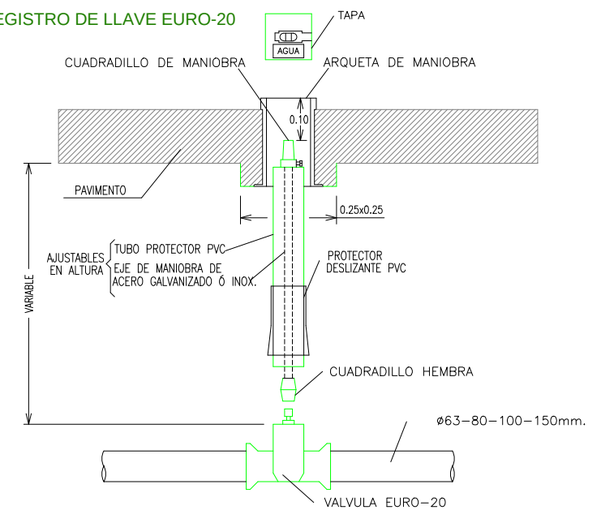


DETALLES DE ABASTECIMIENTO

BOCA DE RIEGO DE Ø40mm.

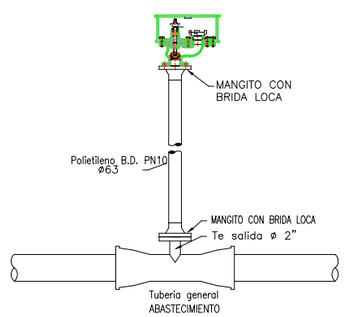


DETALLE PARTE SUPERIOR




ACOMETIDAS TIPO D≤50 CON CONTADOR EXTERIOR Ø<25 EN CAJA DE FUNDICIÓN


TAPA




SECCIÓN ALZADO

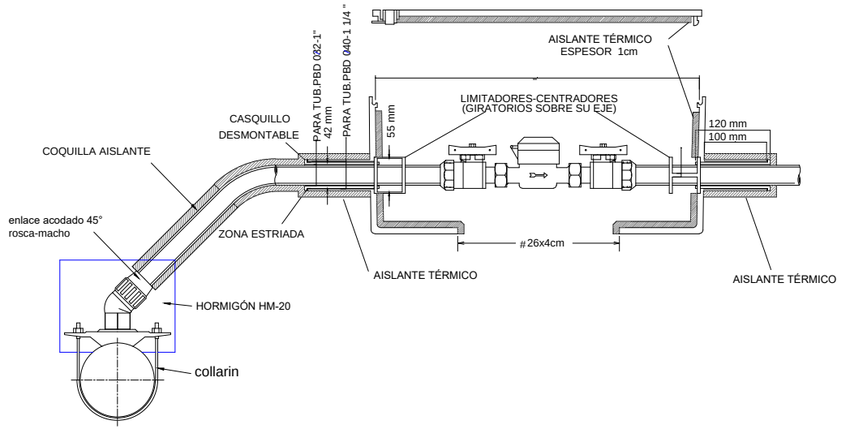

SECCIÓN PLANTA



DESPIECE

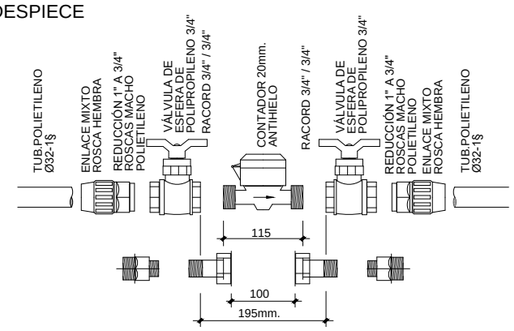

NOTA.- Deberán eliminarse los labios de los racores, para facilitar su desmontaje posterior, colocando doble junta de goma.

CUADRO DE CONTROLES MINIMOS DEL HORMIGÓN

ELEMENTO	MATERIALES						EJECUCIÓN
	HORMIGÓN			ACERO			
	TIPO	CONTROL	Y	TIPO	CONTROL	Y	CONTROL
HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN	HM–15	NORMAL	1.50	–	–	–	NORMAL
HORMIGÓN DE ELEMENTOS	HM–20	NORMAL	1.50	–	–	–	NORMAL
	HA–25	NORMAL	1.50	B500S	NORMAL	1.15	NORMAL
LOSAS	HA–25	NORMAL	1.50	B500S	NORMAL	1.15	NORMAL

AYUNTAMIENTO SANGÜESA/ZANGOZA

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Autor del proyecto:
Iñigo Encinas Guaza
Colegiado Nº 19.233

EUNATE Compañía de Ingeniería S.L.

ESCALAS: VARIAS

PROYECTO: RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

DESIGNACION DEL PLANO: DETALLES

REV	FECHA	PLANO Nº
3	AGOSTO 2023	8
DOCUMENTO DWG: 8.DETALLES		HOJA 3 DE 3

PLIEGO

1.- CONDICIONES GENERALES ..... Página 15

100.- **DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

100.1.- DEFINICIÓN.
100.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
100.3.- OTRAS INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES.

101.- **DISPOSICIONES GENERALES.**

101.1.- ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
101.2.- REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN.
101.3.- FUNCIONES DEL DIRECTOR.
101.4.- PERSONAL DEL CONTRATISTA.
101.5.- LIBRO DE CONTROL DE OBRA Y REUNIONES.
101.6.- LIBRO DE INCIDENCIAS.
101.7.- SUBCONTRATISTA.

102.- **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.**

102.1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
102.2.- PLANOS.
102.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.
102.4.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.

103.- **INICIACIÓN DE LAS OBRAS.**

103.1.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.
103.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.
103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.
103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

104.- **DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.**

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS.
104.2.- EQUIPOS Y MAQUINARÍA.
104.3.- ENSAYOS.
104.4.- MATERIALES.
104.5.- ACOPIOS.
104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS.
104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
104.8.- CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.
104.9.- SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES.
104.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
104.11.- MODIFICACIONES DE OBRA.

1.- CONDICIONES GENERALES. (Continuación)

105.- **RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA.**

105.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS.
105.2.- OBJETOS ENCONTRADOS.
105.3.- EVITACION DE CONTAMINACIONES.
105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS.
105.5.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.
105.6.- VERTEDEROS, PRÉSTAMOS Y CANTERAS.
105.7.- TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.
105.8.- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA.

106.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

106.1.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS.
106.2.- ABONO DE LAS OBRAS.
106.3.- OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.
106.4.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
106.5.- REVISIÓN DE PRECIOS.

2.- MATERIALES BÁSICOS ..... Página 44

202.- **CEMENTOS.**

202.1.- DEFINICIÓN
202.2.- CONDICIONES GENERALES
202.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
202.4.- SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN
202.5.- CONTROL DE CALIDAD
202.6.- MEDICIÓN Y ABONO
202.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
202.8.- NORMAS REFERENCIADAS

211.- **BETUNES ASFÁLTICOS.**

211.1.- DEFINICIÓN
211.2.- CONDICIONES GENERALES
211.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
211.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
211.5.- CONTROL DE CALIDAD
211.6.- MEDICIÓN Y ABONO
211.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
211.8.- NORMAS REFERENCIADAS

213.- **EMULSIONES BITUMINOSAS.**

213.1.- DEFINICIÓN
213.2.- CONDICIONES GENERALES
213.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
213.4.- RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN
213.5.- CONTROL DE CALIDAD
213.6.- MEDICIÓN Y ABONO
213.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
213.8.- NORMAS REFERENCIADAS

240.- **BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL.**

240.1.- DEFINICIÓN
240.2.- MATERIALES
240.3.- SUMINISTRO
240.4.- ALMACENAMIENTO
240.5.- RECEPCIÓN
240.6.- MEDICIÓN Y ABONO
240.7.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD
240.8.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 240.

3.- CAPÍTULOS DE UNIDADES DE OBRA.

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS ..... Página 62

300.- **DESBROCE DEL TERRENO.**

300.1.- DEFINICIÓN.
300.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
300.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

302.- **ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN.**

302.1.- DEFINCIÓN.
302.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

303.- **ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE.**

303.1.- DEFINICIÓN.
303.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
303.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

320.- **EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.**

320.1.- DEFINICIÓN.
320.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
320.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
320.4.- MEDICIÓN Y ABONO.

321.- **EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.**

321.1.- DEFINICIÓN.
321.2.- CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.
321.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
321.4.- EXCESOS INEVITABLES.
321.5.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS.
321.6.- MEDICIÓN Y ABONO.

332.- **RELLENOS LOCALIZADOS.**

332.1.- DEFINICIÓN.
332.2.- ZONAS DE LOS RELLENOS.
332.3.- MATERIALES.
332.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
332.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
332.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
332.7.- MEDICIÓN Y ABONO.
332.8.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 332.

Movimiento de tierras. (Continuación).

338.- **RELLENO DE ZANJAS.**

338.1.- MATERIALES PARA RELLENOS.
338.2.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
338.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

340.- **TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.**

340.1.- DEFINICIÓN.
340.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
340.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO.
340.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
340.5.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 340.

421.- **RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE.**

421.1.- DEFINICIÓN.
421.2.- MATERIALES.
421.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
421.4.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
421.5.- MEDICIÓN Y ABONO.
421.6.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 421.

3.2.- DRENAJE SUPERFICIAL ..... Página 91

400.- **CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA.**

400.1.- DEFINICIÓN.
400.2.- MATERIALES.
400.3.- EJECUCIÓN.
400.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
400.5.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 400.

410.- **ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.**

410.1.- DEFINICIONES.
410.2.- FORMA Y DIMENSIONES.
410.3.- MATERIALES.
410.4.- EJECUCIÓN.
410.5.- MEDICIÓN Y ABONO.
410.6.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 410.

411.- **IMBORNALES Y SUMIDEROS.**

411.1.- DEFINICIONES.
411.2.- FORMA Y DIMENSIONES.
411.3.- MATERIALES.
411.4.- EJECUCIÓN.
411.5.- MEDICIÓN Y ABONO.
411.6.- NORMAS DE REFERENCIA.

413.- **COLECTORES, CAÑOS Y PASOS SALVACUNETAS (ACCESOS A FINCAS).**

413.1.- DEFINICIÓN.
413.2.- MATERIALES.
413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
413.4.- MEDICIÓN Y ABONO.

420.- **ZANJAS DRENANTES.**

420.1.- DEFINICIÓN.
420.2.- MATERIALES.
420.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
420.4.- MEDICIÓN Y ABONO.
420.5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.
420.6.- NORMAS DE REFERENCIA.
420.5.- MEDICIÓN Y ABONO.

422.- **GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPARACIÓN Y FILTRO.**

422.1.- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN.
422.2.- MATERIALES.
422.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
422.4.- LIMITACIONES DE EJECUCIÓN.
422.5.- CONTROL DE CALIDAD.
422.6.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.3.- HORMIGONES ..... Página 113

600.- **ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO.**

600.1.- DEFINICIÓN.
600.2.- MATERIALES.
600.3.- FORMA Y DIMENSIONES.
600.4.- DOBLADO.
600.5.- COLOCACION.
600.6.- CONTROL DE CALIDAD.
600.7.- MEDICIÓN Y ABONO.

610.- **HORMIGONES.**

610.1.- DEFINICIÓN.
610.2.- MATERIALES.
610.3.- TIPOS DE HORMIGON Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD.
610.4.- DOSIFICACION DEL HORMIGON.
610.5.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO.
610.6.- EJECUCIÓN.
610.7.- CONTROL DE CALIDAD.
610.8.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
610.9.- RECEPCIÓN.
610.10.- MEDICIÓN Y ABONO.
610.11.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.
610.12.- NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 610.

680.- **ENCOFRADOS Y MOLDES.**

680.1.- DEFINICIÓN.
680.2.- EJECUCIÓN.
680.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.4.- SANEAMIENTO ..... Página 129

3.4.1.- TUBOS.

902.- **TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO, CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA.**

903.- **PRUEBAS DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.**

904.- **JUNTAS ELÁSTICAS DE UNIÓN ENTRE TUBOS DE HORMIGÓN.**

905.- **PIEZAS PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS.**

906.- **TUBERÍAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO.**

907.- **PIEZAS DE P.V.C. PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO.**

3.4.2.- PIEZAS.

920.- **REGISTROS PREFABRICADOS.**

920.1.- CRITERIOS DE PROYECTO.
920.2.- ELEMENTOS QUE COMPONEN EL REGISTRO.

921.- **REGISTROS Y OBRAS DE FÁBRICA "IN SITU".**

922.- **JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ENTRE POZO O ARQUETA Y TUBOS.**

923.- **ELEMENTOS PASAMUROS**

923.1.- ELEMENTOS PASAMUROS DE P.V.C.

924.- **MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO.**

925.- **PATES TREPADORES.**

3.5.- ABASTECIMIENTO ..... Página 144

3.5.1.- TUBOS.

940.- **TUBOS PARA LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.**

941.- **TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR.**

942.- **TUBOS PAD.**

942.1.- ESPECIFICACIONES.
942.2.- MARCA DE CALIDAD.
942.3.- TIPO DE JUNTA.
942.4.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.5.2.- PIEZAS.

951.- **VÁLVULAS.**

951.1.- VÁLVULA COMPUERTA.
951.2.- VÁLVULAS DE ESFERA.

955.- **HIDRANTES.**

956.- **BOCAS DE RIEGO.**

957.- **COLLARIN.**

962.- **ANCLAJES DE TUBERÍAS EN CÁMARAS DE LLAVES Y ARQUETAS.**

3.6.- FIRMES ..... Página 154

510.- **ZAHORRAS.**

510.1.- DEFINICIÓN.
510.2.- MATERIALES.
510.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.
510.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
510.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
510.6.- TRAMO DE PRUEBA.
510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
510.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
510.9.- CONTROL DE CALIDAD.
510.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE.
510.11.- MEDICIÓN Y ABONO.
510.12.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.
510.13.- NORMAS DE REFERENCIA EN ESTE ARTÍCULO.

530.- **RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.**

530.1.- DEFINICIÓN.
530.2- MATERIALES.
530.3.- DOTACION DE LOS MATERIALES.
530.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
530.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
530.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
530.7.- CONTROL DE CALIDAD.
530.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
530.9.- MEDICIÓN Y ABONO.
530.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO

531.- **RIEGO DE ADHERENCIA.**

531.1.- DEFINICIÓN.
531.2.- MATERIALES.
531.3.- DOTACION DEL LIGANTE.
531.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
531.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
531.6.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
531.7.- CONTROL DE CALIDAD.
531.8.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
531.9.- MEDICIÓN Y ABONO.
531.10.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.
531.11.- NORMAS REFERIDAS A ESTE ARTÍCULO.

Firmes. (Continuación).

542.- **MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.**

542.1.- DEFINICIÓN.
542.2.- MATERIALES.
542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.
542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
542.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
542.6.- TRAMOS DE PRUEBA
542.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.
542.8.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.
542.9.- CONTROL DE CALIDAD.
542.10.- CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.
542.11.- MEDICIÓN Y ABONO.
542.12.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.
542.13.- NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO.

550.- **PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN.**

550.1.- PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN.
550.2.- FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN.
550.3.- PUESTA EN OBRA.
550.4.- ACABADO.
550.5.- TEXTURA SUPERFICIAL.
550.6.- PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO Y CURADO.
550.7.- CURADO CON PRODUCTOS FILMÓGENOS.
550.8.- CURADO MEDIANTE MEMBRANAS IMPERMEABLES.
550.9.- PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO.
550.10.- EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS.
550.11.- SELLADO DE LAS JUNTAS.
550.12.- TOLERANCIAS DEL PAVIMENTO.
550.13.- APERTURA AL TRÁFICO.
550.14.- MEDICIÓN Y ABONO.

560.- **ADOQUÍN.**

560.1.- CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS ADOQUINES DE HORMIGÓN.
560.2.- OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO.
560.3.- SUBBASE.
560.4.- BASE.
560.5.- BORDES DE CONFINAMIENTO.
560.6.- CAPA DE ARENA.
560.7.- COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y SELLADO DEL PAVIMENTO DE ADOQUINES.

Firmes. (Continuación).

561.- **CENEFAS DE ADOQUÍN.**

570.- **BORDILLOS.**

570.1.- DEFINICIÓN.
570.2.- MATERIALES.
570.2.1.- Bordillo de hormigón.
570.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
570.4.- FORMA Y DIMENSIONES.
570.5.- CALIDAD.
570.6.- ABSORCIÓN DE AGUA.
570.7.- MEDICIÓN Y ABONO.

572.- **PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN ACERAS.**

572.1.- SOLADOS DE BALDOSA HIDRAULICA.
572.2.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.7.- INSTALACIONES …… Página 203

3.7.1.- **TUBOS PARA ALUMBRADO Y FUERZAS ELÉCTRICAS.**

3.7.1.1.- DEFINICIÓN.
3.7.1.2.- MATERIALES Y EJECUCIÓN.
3.7.1.3.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.7.2.- **ARQUETAS DE ALUMBRADO.**

3.7.2.1.- DEFINICIÓN.
3.7.2.2.- MEDICIÓN Y ABONO.

3.7.3.- **INSTALACIONES TELEFÓNICAS.**

3.7.3.1.- NORMAS DE TELEFÓNICA A CONSIDERAR.
3.7.3.2.- MATERIALES.
3.7.3.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
3.7.3.4.- MEDICIÓN Y ABONO.

850.- **CÁMARAS Y REGISTROS PARA TELEFONÍA.**

3.8.- VARIOS ..... Página 210

997.- **UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.**

997.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

998.- **CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN.**

998.1.- DEFINICIÓN.
998.2.- EJECUCIÓN.
998.3.- ABONO.

999.- **PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.**

1.- CONDICIONES GENERALES.

100.- DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

100.1.- DEFINICIÓN.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene como objeto definir las condiciones singulares que complementan, concretan o modifican las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (PG3), aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976, del Ministerio de Obras Públicas y sus modificaciones sucesivamente aprobadas.

Los documentos mencionados, incluyen igualmente la descripción general y localización de las obras, condiciones exigidas a los materiales, requisitos para la ejecución, medición y abono de las diversas unidades del proyecto, y todas las que constituyen las directrices que ha de seguir el Contratista adjudicatario de las obras.

En este Pliego se seguirá la misma numeración que tiene el PG3 y también las mismas definiciones y nomenclatura adoptada en éste último, excepto en los casos en que de manera explícita se exprese en el presente Pliego.

El Pliego de Condiciones, junto con los planos del proyecto o sus posteriores modificaciones, define todos los requisitos técnicos de la obra y constituyen la norma y guía que ha de seguirse para la correcta ejecución y buen fin de los trabajos y especialmente regulan:

a) Características que han de reunir los materiales a emplear.

b) Indicación de la procedencia de los materiales naturales que se han juzgado oportunos.

c) Los ensayos a que deben someterse los materiales a emplear para comprobar su idoneidad de acuerdo a las condiciones que deben de cumplir.

d) Las normas de elaboración de las distintas unidades.

e) Instalaciones que hayan de elegirse.

f) Precauciones a adoptar durante la ejecución.

g) Normas de medición y valoración de las distintas unidades de obras y las de abono de las partidas alzadas.

h) Plazo de garantía.

i) Normas y pruebas positivas para las recepciones.

Caso de contener el presente Pliego alguna cláusula económica que contravenga las del Pliego de Cláusulas Administrativas, prevalecerán las de este último sobre el primero.

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente en este Pliego, se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones Técnicas en vigor que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que, sobre el particular, señale el Director de las Obras.

Las actas de reuniones prevalecerán sobre todos los demás documentos. Los Planos y Pliego de Condiciones tienen prevalencia sobre los Pliegos, Normas o Instrucciones Generales. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio de la Dirección de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Adjudicatario, deberán reflejarse obligatoriamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.

100.2.- **ÁMBITO DE APLICACIÓN.**

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras del proyecto de "RENOVACIÓN DE REDES Y PAVIMENTACIÓN EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA" además de las prescripciones establecidas en el PG3, debiendo prevalecer las de este Pliego sobre las del PG3.

En cumplimiento de lo establecido en el párrafo 2 del apartado 100.2 del PG-3, se hace constar que el texto vigente para este proyecto del citado Pliego, es el aprobado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el 6 de Febrero de 1.976, publicado por la Secretaría General Técnica con efecto legal según Orden Ministerial de 2 de Julio de 1976, y sus modificaciones sucesivamente aprobadas por la O.M. y en las Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras que se indican a continuación.

Orden Circular 292/86T, de Mayo de 1.986, que fija unos requisitos adicionales para los artículos siguientes 278 (Pinturas a emplear en marcas viales) y 700 (Marcas viales). Esta Orden ES DEROGADA en la **OC 325/97 T**.

Orden Ministerial de 31 de Julio de 1.986 por la que se aprueba la instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme en autovías, REVISA los artículos 500 (Zahorras naturales) y 501 (Zahorras artificiales) y CREA los artículos nuevos 516 (Hormigón compactado) y 517 (Hormigón magro).

Estos artículos están incluidos como anexos a la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías.

LA DEROGACIÓN de esta Orden Ministerial (31 de Julio de 1.986), el 23/05/1989, fecha en la que se aprueba la **Instrucción 6.1 y 6.2-IC** sobre secciones de firmes, es aplicable a la Instrucción en si, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos.

Orden Ministerial de 21 de Enero de 1.988, posteriormente modificada parcialmente por Orden Ministerial de 8 de Mayo de 1.989, que REVISA los artículos siguientes: 210 (Alquitranes), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados), 213 (Emulsiones bituminosas), 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 243 (Alambres para hormigón pretensado), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado) y 248 (Accesorios para hormigón pretensado). Además CREA el nuevo artículo 214 (Betunes fluxados). Esta Orden Ministerial "**oficializa**" las modificaciones realizadas por la **Orden Circular 293/86 T y por la Orden Circular 295/87 T.**

Orden Circular 294/87T, de 23 de Diciembre de 1.987, sobre riegos con ligantes hidrocarbonados, que REVISA los siguientes artículos: 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 533 (Tratamientos superficiales). Además CREA el nuevo artículo 532 (Riegos de curado), y suprime los artículos 533 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes viscosos) y 534 (Macadam bituminoso por penetración con ligantes fluidos). Esta Orden ES DEROGADA en la **Orden Circular 5/2001.**

Orden Circular 297/88T, de 29 de Marzo de 1.988, sobre estabilización de suelos "in situ" y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados que REVISA los siguientes artículos 510 (Suelos estabilizados "in situ" con cal) y 540 (Tratamientos superficiales con lechada bituminosa). Suprime el artículo 511 (Suelos estabilizados con productos bituminosos), CREA los nuevos artículos 511 (Suelos estabilizados "in situ" con cemento), y recoge parte del artículo 512 (Suelos estabilizados con cemento) y 533 (Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla). Esta Orden ES DEROGADA en la **Orden Circular 5/2001.**

Orden Ministerial de 8-5-89. MODIFICA parcialmente, con inclusión de nuevos párrafos, los artículos 210 (Alquitranes), 211 (Betunes asfálticos), 212 (Betunes fluidificados) y 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados).

Orden Ministerial de 28 de Septiembre de 1.989, que REVISA el artículo 104, (Desarrollo y control de las obras).

Orden Circular 299/89T, de 23 de Febrero de 1.989, que REVISA el artículo 542 (Mezclas bituminosas en caliente). Es DEROGADA por la **Orden Circular 5/2001.**

Orden Circular 311/90C y E, de 20 de Marzo de 1.990, que REVISA el artículo 550 (Pavimentos de hormigón vibrado), y ES DEROGADA por la **Orden Circular 5/2001.**

O.C. 322/97 "Ligantes bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor" (24-2-97). CREA los nuevos artículos 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros), 216 (Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros) y 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequeño espesor). Es DEROGADA en la **O.C. 5/2001**.

O.C. 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes (30-12-97). SUPRIME los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 700 (Marcas viales) que se integran en el nuevo artículo 700 (Marcas viales). REVISA el artículo 701 (Señales y carteles verticales de circulación, que con anterioridad se denominaba "Señales de circulación"). CREA los nuevos artículos 702 (Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad).

O.M. de 27-12-99. (BOE 22-1-00). REVISA los artículos 202 (Cementos), 211 (Betunes asfálticos), 213 (Emulsiones bituminosas) y 214 (Betunes fluxados). DEROGA los artículos 200 (Cal aérea), 201 (Cal hidráulica) y 210 (Alquitranes). CREA los nuevos artículos 200 (Cales para estabilización de suelos), 212 (Betunes fluidificados para riegos de imprimación (aunque no se especifica en la orden ministerial entendemos que este artículo DEROGA el hasta el momento vigente artículo 212 "Betunes fluidificados")), 215 (Betunes asfálticos modificados con polímeros) y 216 (Emulsiones asfálticos modificados con polímeros).

O.M. de 28-12-99 (BOE 28-1-00). DEROGA los artículos 278 (Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas), 279 (Pinturas para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de circulación), 289 (Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas) y 701 (Señales de circulación). REVISA el artículo 700 (Marcas viales). CREA los nuevos artículos 701 (Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes), 702 (Captafaros retrorreflectantes), 703 (Elementos de balizamiento retrorreflectantes) y 704 (Barreras de seguridad). Esta Orden Ministerial "**oficializa**" las modificaciones realizadas por la **O.C. 325/97 T**.

O.C. 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes. REVISA los siguientes artículos 300 (Desbroce del terreno), 301 (Demoliciones), 302 (Escarificación y compactación), 303 (Escarificación y compactación del firme existente), 304 (Prueba con supercompactador), 320 (Excavación de la explanación y préstamos), 321 (Excavación en zanjas y pozos), 322 (Excavación especial de taludes en roca), 330 (Terraplenes), 331 (Pedraplenes), 332 (Rellenos localizados), 340 (Terminación y refino de la explanada), 341 (Refino de taludes), 400 (Cunetas de hormigón ejecutadas en obra), 401 (Cunetas prefabricadas), 410 (Arquetas y pozos de registro), 411 (Imbornales y sumideros), 412 (Tubos de acero corrugado y galvanizado), 420 (Zanjas drenantes), 421 (Rellenos localizados de material filtrante), 658 (Escollera de piedras sueltas), 659 (Fábrica de gaviones), 670 (Cimentaciones por pilotes hincados a percusión), 671 (Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ), 672 (Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ), 673 (Tablestacados metálicos) y 674 (Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado). CREA los nuevos artículos 290 (Geotextiles), 333 (Rellenos todo uno), 422 (Geotextiles como elemento de filtro y drenaje), 675 (Anclajes), 676 (Inyecciones) y 677 (Jet grouting).

O.C. 5/2001 Sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (esta Orden se modificó muy ligeramente por la O.C. 5bis/02 y por la O.C. 10bis/02). REVISA los siguientes artículos 530 (Riegos de imprimación), 531 (Riegos de adherencia), 532 (Riegos de curado), 540 (Lechadas bituminosas), 542 (Mezclas bituminosas en caliente), 543 (Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura) y 550 (Pavimentos de hormigón vibrado).

O.M. de 13-2-02 (BOE 6-3-02). DEROGA los artículos 240 (Barras lisas para hormigón armado), 241 (Barras corrugadas para hormigón armado), 242 (Mallas electrosoldadas), 244 (Torzales para hormigón pretensado), 245 (Cordones para hormigón pretensado), 246 (Cables para hormigón pretensado), 247 (Barras para hormigón pretensado), 250 (Acero laminado para estructuras metálicas), 251 (Acero laminado resistente a la corrosión para estructuras metálicas), 252 (Acero forjado), 253 (Acero moldeado), 254 (Aceros inoxidables para aparatos de apoyo), 260 (Bronce a emplear en apoyos), 261 (Plomo a emplear en juntas y apoyos), 281 (Aireantes a emplear en hormigones), 283 (Plastificantes a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido) y 620 (Productos laminados para estructuras metálicas). REVISA los artículos 243 (Alambres para hormigón pretensado), 248 (Accesorios para hormigón pretensado), 280 (Agua a emplear en morteros y hormigones), 285 (Productos filmógenos de curado) y 610 (Hormigones). CREAN los nuevos artículos 240 (Barras corrugadas para hormigón estructural), 241 (Mallas electrosoldadas), 242 (Armaduras básicas electrosoldadas en celosía), 244 (Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado), 245 (Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado), 246 (Tendones para hormigón pretensado), 247 (Barras de pretensado), 281 (Aditivos a emplear en morteros y hormigones), 283 (Adiciones a emplear en hormigones), 287 (Poliestireno expandido para empleo en estructuras), 610A (Hormigones de alta resistencia) y 620 (Perfiles y chapas de acero laminado en caliente, para estructuras metálicas).

Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo. (Corrección de erratas BOE 26/11/02). MODIFICA los artículos: 300 "Desbroce del terreno", 301 "Demoliciones", 302 "Escarificación y compactación", 303 "Escarificación y compactación del firme existente", 304 "Prueba con supercompactador", 320 "Excavación de la explanación y préstamos", 321 "Excavación en zanjas y pozos", 322 "Excavación especial de taludes en roca", 330 "Terraplenes", 331 "Pedraplenes", 332 "Rellenos localizados", 340 "Terminación y refino de la explanada", 341 "Refino de taludes", 410 "Arquetas y pozos de registro", 411 "Imbornales y sumideros", 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado", 658 "Escollera de piedras sueltas", 659 "Fábrica de gaviones", 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión", 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"", 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas "in situ"" y 673 "Tablestacados metálicos". SE INTRODUCEN los artículos: 290 "Geotextiles", 333 "Rellenos todo-uno", 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas prefabricadas", 420 "Zanjas drenantes", 421 "Rellenos localizados de material drenante", 422 "Geotextiles como elemento de separación y filtro", 675 "Anclajes", 676 "Inyecciones" y 677 "Jet grouting". SE DEROGAN los artículos: 400 "Cunetas y acequias de hormigón ejecutadas en obra", 401 "Cunetas y acequias prefabricadas de hormigón", 420 "Drenes subterráneos", 421 "Rellenos localizados de material filtrante" y 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado". Esta Orden Ministerial "**oficializa**" las modificaciones realizadas por la **O.C. 326/00**.

O.C. 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (modificada ligeramente por la O.C. 10bis/02) APRUEBA los artículos:

- 510 (zahorras) en sustitución de los artículos 500 (zahorras naturales) y 501 (zahorras artificiales);
- 512 (suelos estabilizados "in situ") en sustitución de los artículos 510 (suelos estabilizados "in situ" con cal) y 511 (suelos estabilizados "in situ" con cemento);
- 513 (materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)) en sustitución de los artículos 512 (suelos estabilizados con cemento) y 513 (gravacemento);
- 551 (hormigón magro vibrado) en sustitución del artículo 517 (hormigón magro).

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo. (Corrección de erratas BOE 25/5/04). MODIFICA los artículos: 510 "Zahorras", 512 "Suelos estabilizados in situ", 513 "Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento)", 530 "Riegos de imprimación", 531 "Riegos de adherencia", 532 "Riegos de curado", 540 "Lechadas bituminosas", 542 "Mezclas bituminosas en caliente", 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura", 550 "Pavimentos de hormigón" y 551 "Hormigón magro vibrado". Esta Orden Ministerial "**oficializa**" las modificaciones realizadas por las **O.C. 5/01 y O.C. 10/02.**

Norma UNE-EN 13108 que entró en vigor en marzo de 2008 aprobada por el Comité Europeo de Normalización y de obligado cumplimiento. Esta norma específica los requisitos para Mezclas Bituminosas en Caliente (MCB).

O.C. 24/208 Sobre Mezclas Bituminosas en Caliente. MODIFICA los artículos 542 (mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso) y 543 (mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas), publicados por el FOM/891/2004, adaptándose a la serie de normas armonizadas UNE-en 13108.

100.3.- **OTRAS INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES**

Serán de aplicación, además, en su caso, como supletorias, complementarias de las contenidas en este Pliego, las disposiciones que a continuación se relacionan, en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes **PG3**, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976.
- **Instrucción 3.1-IC/93 "Trazado"**. OM DEL 27/12/1.999.
- **Modificación** de la **Instrucción 3.1-IC/93 "Trazado"** aprobada por OM de 13/09/2.001.
- **Instrucción 5.1-IC**. **"Drenaje"** aprobada por O.M. de 24 de Junio de 1.965. Parcialmente derogada en los epígrafes y figuras relativas a drenaje superficial y cuantas disposiciones de igual o inferior rango de opongan a lo establecido en la OM del 14/05/1.990 que aprueba la Instrucción 5.2-IC.
- **Instrucción 5.2-IC**. **"Drenaje superficial"** aprobada por O.M. de 14 de Mayo de 1.990.
- **OC 17/03** sobre las recomendaciones para el Proyecto y Construcción del **Drenaje Subterráneo** en obra de carretera.
- Norma de Carreteras **8.1-IC "Señalización vertical"**, OM 28/12/1.999.
- Norma de Carreteras **8.2-IC "Marcas Viales"**, OM 16/07/1.987.
- Norma de Carreteras **8.3-IC "Señalización de Obras"**, OM 31/08/1.987.
- **Reglamento General de Circulación** aprobado por el **RD 1428/03.**
- **Señalización móvil** de obras (1.997).
- **OC 301/89T** sobre **señalización de obras**. (27/04/1.989).
- **OC 15/2003** sobre la señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras (**Remate de obras**). 13/10/2003.
- **OC 309/60 C y E** sobre **hitos de arista**. (15/01/1.990). También habrá que tener en cuenta las normas UNE relativas a este tema.
- **Ley Foral 11/86**, 10 de octubre, de Defensa de las carreteras de Navarra.
- OM de 23/05/1.989, por la que se aprueba la Instrucción **6.1. y 6.2-IC** de la Dirección General de Carreteras sobre **secciones de firme**.
- FOM/3460/2003, 28/11, por la que se aprueba la norma **6.1-IC** sobre **secciones de firme** de la Instrucción de Carreteras.

- FOM/3459/03, 28/11, aprobación de la Instrucción **6.3-IC** sobre la **rehabilitación de firmes**.

- **Orden Circular 10/02** sobre secciones de firme y capas estructurales de firme.

- **OM** relativa a las acciones que se han de considerar en el proyecto de Puentes de Carreteras **(IAP**). 12/02/1.998.

- **OM/1951/2005** de 10/06 sobre las inspecciones técnicas en los puentes de ferrocarril (**ITPF-05**)

- Norma de Construcción Sismorresistente (**NCSE-02**). 27/09/02.

- Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de **puentes de ferrocarril** (25/06/1.975).

- **OC 11/02** sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y construcción de **puentes con elementos prefabricados de hormigón estructural**. (27/11/02).

- **Código Estructural**, aprobado por Real Decreto 470/2021 que deroga a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

- **RD 1797/2003**. Instrucción para la **recepción de cementos** (**RC-16).**

- **OM 19/11/1998** por la que se aprueba la instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de **obras subterráneas para el transporte terrestre (IOS-98)**.

- **Directiva 2005/54/CE** del Parlamento Europeo y del Consejo de 29/04/2004 sobre **requisitos mínimos de seguridad para túneles** de la Transeuropea de Carreteras.

- **Real Decreto 1955/2000**, de 1 de diciembre Regulación de las actividades de transporte, distribución, canalización, suministro y procedimiento de autorización de **instalaciones de energía eléctrica**.

- **Decreto 3151/1968**, de 28 de noviembre. Reglamento Técnico de **Líneas aéreas de alta tensión**.

- **Decreto 3275/1982**, de 12 de noviembre. Reglamento sobre Condiciones técnicas y garantías de **seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación**, y las Instrucciones Técnicas complementarias según Orden Ministerial de 18 de octubre de 1984.

- **Real Decreto 842/2002**, de 2 de agosto (B.O.E. del 18 de septiembre de 2002). Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normalización nacional (Normas UNE), Recomendaciones UNESA y Normas de la empresa distribuidora de energía.

- **Decreto Foral 129/1991**, de 4 de abril. Normas de carácter técnico para las **instalaciones eléctricas** con objeto de **proteger a la avifauna**.

- **Decreto Foral 229/1993**, de 19 de julio. **Estudios sobre afecciones medioambientales** de los planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural.

- **Ley Foral 5/1998**, de 27 de abril. **Protección** y gestión de la **fauna** silvestre y sus hábitats.

- **RD 614/01**, de 08 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y **seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico**.

- **Real Decreto 1627/1997**, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de **seguridad y salud en las obras de construcción**.

- **Real Decreto 39/97**, de 17 de enero, por el que se aprueba el **reglamento de los servicios de prevención**.

- **Real Decreto 773/97**, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de **seguridad y salud** relativas a la utilización por los trabajadores de **equipos de protección individual.**

- **Real Decreto 1215/97**, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de **seguridad y salud** para la utilización por los trabajadores de los **equipos de trabajo.**

- **Ley 54/03** de reforma del marco normativo de la **prevención de riesgos laborales**. Esta ley se estructura en dos capítulos:

    - El primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
    - El segundo incluye las modificaciones que se introducen en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/00, de 4 de agosto.

- **Orden Ministerial de 20-Sep-86** por la que se establece el modelo de **Libro de Incidencias** correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un **Estudio de Seguridad y Salud**.

- Normas UNE de Ensayos de laboratorio.

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa, T:H.M-73, del Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento.

- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado.

- **Real Decreto Legislativo 2/00**, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la **ley de contratos de las administraciones publicas.**

- **Ley Foral 5/1999**, de 16 de marzo, de modificación de la Ley Foral 10/1998, de 16 de junio, de **Contratos de las Administraciones Publicas de Navarra**, sobre diversos conceptos en materia de requisitos para contratar con la Administración.

Aunque no han sido mencionadas en este Pliego, el Contratista queda obligado al cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones, Recomendaciones, Ordenanzas y demás disposiciones oficiales de toda índole promulgadas o que se puedan promulgar durante las obras por la Administración Central, Autónoma o Local, Compañía Eléctrica, Telefónica, Compañía distribuida de Gas, etc., que tenga aplicación durante los trabajos a ejecutar a juicio de la Dirección de las Obras, resolviendo ésta cualquier posible discrepancia entre ellas.

Está asimismo obligado al cumplimiento de la Legislación vigente relativa a la Reglamentación del Trabajo, calendario laboral, aprendices, salarios mínimos, seguros sociales, accidentes y Convenio Colectivo para las industrias de la Construcción y Obras Públicas de la Provincia y al cumplimiento de toda la legislación vigente sobre protección a la Industria Nacional y fomento del consumo de artículos nacionales. Ni la Propiedad ni la Dirección Facultativa tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación a que diese lugar la Contrata por la violación de los referidos preceptos.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego, o, en su defecto, del PG3, y los de otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la más exigente.

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa de la Dirección de las obras.

101.- **DISPOSICIONES GENERALES.**

101.1.- **ADSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se aplicará lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas elaborado para esta obra por la Propiedad.

101.2.- **REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD.**

a) Director de las Obras.

El Director de las Obras será responsable de la inspección y vigilancia de su ejecución, y asumirá la representación de la Propiedad frente al Contratista.

b) Coordinador de Seguridad de las Obras.

Será aceptado por la Propiedad, de acuerdo con el R.D. 1627/97.

101.3.- **FUNCIONES DEL DIRECTOR**

El Director de Obra será el representante de la Propiedad ante el Contratista, siendo de su competencia todas y cada una de las expresadas en el apartado 101.3 del PG-3.

Las órdenes del Ingeniero de obra deberán ser aceptadas por el Contratista como emanadas directamente de la Propiedad, el cual podrá exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas, con arreglo a las normas habituales.

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección de Obra, crea oportuna el Contratista, deberá ser formulada por escrito, dentro del plazo de quince (15) días después de dictada la orden.

El Ingeniero Director de Obra decidirá sobre la interpretación de los planos y de las condiciones de este Pliego, y será el único autorizado a modificarlos.

El Ingeniero Director de Obra, o su representante, tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el contratista le prestará la información y ayuda necesarias para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se podrá ordenar la remonición y sustitución, a expensas del Contratista, de toda la obra hecha o de todos los materiales usados, sin la supervisión o inspección del Ingeniero Director de la Obra o su representante.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

101.4.- **PERSONAL DEL CONTRATISTA.**

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas Administrativas elaborado para esta obra por la Propiedad.

101.5.- **LIBRO DE CONTROL DE OBRA Y REUNIONES.**

101.5.1.- **Libro de Control de Obra.**

En la oficina de obra del Contratista, existirá también un Libro de Control de Obra facilitado por la Dirección Facultativa y que estará en todo momento a la disposición de ambos.

La Dirección Facultativa utilizará ese Libro para dar por escrito las órdenes que estime oportunas, así como para el control de la obra.

El Contratista deberá utilizarlo haciendo las anotaciones correspondientes en los siguientes casos:

a) Para pedir aclaraciones sobre cualquier duda surgida de la interpretación del Proyecto.

b) Para solicitar la introducción de variaciones en obra respecto a los materiales o soluciones previstas.

c) Cada vez que se prevea una variación en el presupuesto contratado.

En los casos b) y c) deberá presentar aparte, por escrito la valoración detallada de la variación del presupuesto. Esta deberá ser aprobada por escrito, por la Propiedad y por la Dirección Facultativa. Cualquier modificación efectuada sin haberse cumplido este trámite será bajo la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario.

Cada vez que se solicite el libro se firmara expresando la hora y fecha en que se hace la anotación.

El libro constará de un número impreso de hojas por triplicado. El original quedará siempre en el libro, mientras que las copias serán recogidas por la Dirección Facultativa y el Adjudicatario en cada visita.

Cualquier intento de manipulación fraudulenta del libro de control será causa suficiente de rescisión de contrato.

En caso de que el Jefe de Obra se negase a dar su "enterado" o "conforme" a alguna orden transcrita al libro por la Dirección de Obra, no será causa de su invalidez, pudiendo la Dirección de Obra recabar la presencia de testigos.

101.5.2.- **Reuniones.**

Será de aplicación las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Técnico Administrativas de la Propiedad.

Las Actas levantadas en las reuniones indicadas en el párrafo anterior tendrían prevalencia sobre el libro de órdenes.

101.6.- **LIBRO DE INCIDENCIAS.**

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3.

101.7.- **SUBCONTRATISTA.**

Es la persona física o jurídica que asume contractualmente, ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y autorización previos de la Dirección de las obras.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberán formularse por escrito, con antelación suficiente y aportando los datos necesarios sobre esta cesión, así como sobre la organización que pretende llevarla a cabo.

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual.

El Contratista deberá aportar los impresos TC2 de todas las personas que trabajen en la obra, sea de su propia empresa o subcontratas, indicando en ese caso a qué empresa ya autorizada pertenece.

No podrá trabajar en la obra ninguna persona que no haya sido facilitado el impreso anterior, so pena de sanción grave.

102.- **DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

102.1.- **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.**

Será de aplicación lo indicado en el Artículo 102.1 del PG-3.

102.2.- **PLANOS.**

Será de aplicación lo indicado en el Artículo 102.2 del PG-3.

Se entiende por Planos los del contrato y los que oficialmente entregue el Director de Obra al Contratista, y las modificaciones a los mismos, para la ejecución de la obra, así como los dibujos, croquis e instrucciones complementarias que para, mejor definición de las obras a realizar entregue el Director de Obra al Contratista.

También se considerarán "planos" aquellos que el Contratista proponga y sobre los que recaiga la aprobación expresa del Director de Obra.

Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos, sin que el Contratista pueda introducir ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director de Obra.

No tendrán carácter ejecutivo ni contractual los planos de información que aparezcan en la documentación del proyecto y que no tengan la calificación de planos del contrato y asimismo cuantos dibujos o informes técnicos que hayan sido facilitados al Contratista, para una mejor compresión de la obra a realizar, con un carácter puramente informativo.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.

102.3.- **CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES**

Lo mencionado en uno cualquiera de los documentos de la Memoria, Pliego de Condiciones, Presupuesto y Planos del Proyecto y omitido en los otros, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en todos los documentos.

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los documentos que le hayan sido facilitados y deberá poner en conocimiento de la Dirección Facultativa todas las dudas, errores, omisiones, discrepancias y contradicciones que observe en los documentos que forman el Proyecto, en un plazo que como máximo finalizará al mes de la firma del Acta de Replanteo, o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que pudiera dar lugar a posibles modificaciones del Proyecto. En caso de contradicciones entre los documentos del Proyecto el orden de prioridad entre ellos es el siguiente: 1.Pliego de Condiciones, 2.- Planos, 3.-Presupuesto y 4.- Memoria y anexos.

Las omisiones en planos u otros documentos del proyecto o las descripciones erróneas de los detalles o unidades de obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el Proyecto.

El presente Pliego de Condiciones, se aplicará también a las obras que por sus características secundarias pudieran no haberse previsto y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las proyectadas.

102.4.- **DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA.**

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Propiedad entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo.

102.4.1.- **Documentos contractuales.**

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:

- Planos
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.)
- Cuadros de Precios
- Presupuestos parciales
- Presupuesto total

102.4.2.- **Documentos informativos**

Los datos sobre sondeos y reconocimientos geotécnicos, procedencia de materiales, informes geológicos, ensayos, condiciones locales, diagramas de movimiento de tierras, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas y en general todos lo que figuran habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran; y en consecuencia deben aceptarse solamente como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente por sus propios medios.

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.

103.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

103.1.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

Será de aplicación las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Técnico Administrativas elaborado por la Propiedad.

103.2.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

Será de aplicación las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Técnico Administrativas elaborado por la Propiedad.

103.3.- PROGRAMA DE TRABAJOS.

Será de aplicación las condiciones establecidas en el Pliego de Cláusulas Técnico Administrativas elaborado por la Propiedad.

En su defecto será de aplicación el artículo 103.3 del PG3 que textualmente indica:

> Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 128 y 129 del RGC y en la Cláusula 27 del PCAG.
>
> El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, bien expresamente, por citación de Instrucción de carácter general dictada al amparo del Artículo 74 del RGC, o mediante referencia al Programa que con carácter informativo figure en el Proyecto aprobado, fijará el método a emplear, tales como diagrama de barras, Pert, C. P. M. o análogos, y grado de desarrollo, especificando los grupos de unidades de obra que constituyen cada una de las actividades, los tramos en que deben dividirse las obras, y la relación de obras, como túneles, grandes viaductos y análogas, que exigen un programa específico.
>
> El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.

103.4.- ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

El Director de Obra dará la orden de iniciación de los trabajos cuando estime conveniente, teniendo en cuenta la situación de los trabajos de replanteo que incumben al Contratista y la elaboración del Programa de Trabajos, así como la disponibilidad de los terrenos necesarios para iniciar la obra definitiva de acuerdo con el programa de trabajos aprobado.

En las bases de concurso se establecerá la fecha de iniciación del plazo de ejecución.

Así mismo será de aplicación el artículo 103.4 del PG3.

104.- **DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS.**

104.1.- **REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS.**

El Director de las obras aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las obras, y suministrara al contratista toda la información de que disponga para que aquellos puedan ser realizados.

104.2.- **EQUIPOS Y MAQUINARÍA.**

Se estará a lo dispuesto en el artículo 104.2 del PG-3 con las siguientes especificaciones:

a) Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la administración, previo informe del Director de las obras.

104.3.- **ENSAYOS.**

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en los pliegos de prescripciones técnicas o citados en la normativa técnica de carácter general que resultare aplicable.

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el presente pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en España de otra forma. Se tendrán en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas.

Si una partida fuere identificable, y el contratista presentare una hoja de ensayos, suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos.

El límite máximo fijado en los pliegos de cláusulas administrativas para el importe de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del contratista no será de aplicación a los necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al contratista.

104.4.- **MATERIALES.**

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares no exigiera una determinada procedencia, el contratista notificara al Director de las obras con suficiente antelación la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que por el Director de las obras puedan ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de dicha idoneidad.

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes de las que se contienen en el presente pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan estas.

Si el pliego de prescripciones técnicas particulares fijase la procedencia de unos materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia a favor de estos.
Si el contratista obtuviera de terrenos de titularidad publica productos minerales en cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos, sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse.

El Director de las obras autorizara al contratista el uso de los materiales procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenara los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el contratista tendrá derecho al abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento.

104.5.- **ACOPIOS.**

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa del Director de las obras.

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran sus quince centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos: Las cargas se colocaran adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación.

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando se autorice un cambio de procedencia.

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural Estado.

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de los acopios serán de cuenta del contratista.

104.6.- **TRABAJOS NOCTURNOS.**

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse solamente en las unidades de obra que el indique. El contratista deberá instalar equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto Estado mientras duren los trabajos.

104.7.- **TRABAJOS DEFECTUOSOS.**

El pliego de prescripciones técnicas particulares deberá, en su caso, expresar los limites dentro de los que se ejercerá la Facultad del Director de las obras de proponer a la administración la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el contratista quedara obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las unidades defectuosas, por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

El Director de las obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido.

104.8.- **CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE DESVIOS.**

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados.

Salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares dispusiera otra cosa, se entenderá incluido en el precio de los desvíos previstos en el contrato el abono de los gastos de su conservación. Lo mismo ocurrirá con los tramos de obra cuya utilización haya sido asimismo prevista.

104.9.- **SEÑALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS E INSTALACIONES.**

El contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada Tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del contratista.

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los coloco, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que origino su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se cumpliera lo anterior la administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al contratista, quien no podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos.

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de otros organismos públicos, el contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan estos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en ejercicio de las Facultades inspectoras que sean de su competencia.

104.10.- PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

104.10.1.- Drenaje.

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservaran y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes.

104.10.2.- Heladas.

Cuando se teman heladas, el contratista protegerá todas las zonas de las obras que pudieran ser perjudicadas por ellas. Las partes dañadas se levantaran y reconstruirán a su costa, de acuerdo con el presente pliego.

104.10.3.- Incendios.

El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios, y a las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.

En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se pudieran producir.

104.10.4.- Uso de explosivos.

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes en la materia y por las instrucciones complementarias que figuren en el pliego de prescripciones técnicas particulares, o que se dicten por el Director de las obras.

Los almacenes de explosivos deberán estar claramente identificados, y estar situados a más de trescientos metros (300 m.) De la carretera o de cualquier construcción.

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso de las descargas con antelación suficiente para evitar accidentes. La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada laboral, o durante los descansos del personal de la obra en la zona afectada por las voladuras, no permitiéndose la circulación de personas ni vehículos dentro del radio de acción de estas, desde cinco minutos (5 min.) Antes de prender fuego a las mechas hasta después que hayan estallado todos los barrenos.

Se usara preferentemente mando eléctrico a distancia, comprobando previamente que no sean posibles explosiones incontroladas debidas a instalaciones o líneas eléctricas próximas.

En todo caso se emplearan mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunir las condiciones adecuadas a la responsabilidad que corresponde a estas operaciones.

El contratista suministrara y colocara las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con explosivos. Su emplazamiento y Estado de conservación deberán garantizar su perfecta visibilidad en todo momento.

En todo caso, el contratista cuidara especialmente de no poner en peligro vidas ni propiedades, y será responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos.

104.11.- **MODIFICACIONES DE OBRA.**

Cuando el Director de las obra ordenase, en caso de emergencia, la realización de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los cuadros de precio del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las circunstancias de que tal emergencia no fuere imputable al contratista ni consecuencia de fuerza mayor, este formulara las observaciones que estimase oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las obras, si lo estimase conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos.

105.- **RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA**.

105.1.- **DAÑOS Y PERJUICIOS.**

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 134 del RGC.

En relación con las excepciones que el citado Artículo prevé sobre indemnizaciones a terceros, la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.

105.2.- **OBJETOS ENCONTRADOS.**

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG.

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista.

105.3.- **EVITACION DE CONTAMINACIONES.**

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza.

105.4.- **PERMISOS Y LICENCIAS.**

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 131 del RGC y en la Cláusula 20 del PCAG.

105.5.- **REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS.**

Todos los trámites necesarios para la reposición de los servicios afectados, tales como líneas eléctricas, líneas telegráficas y telefónicas, conducciones de gas, conducciones de agua potable, redes de saneamiento, caminos, cursos de agua, acequias, etc. serán gestionables por el Contratista, que también llevará a cabo, por cuenta de la Propiedad, al tener que estar incluido en el proyecto, la realización de las obras correspondientes a esas reposiciones, salvo en el caso de que las obras sean ejecutadas por la propia entidad afectada. El Contratista asume la total y exclusiva responsabilidad de los retrasos que pudieran originarse por los motivos señalados en este apartado.

105.6.- **VERTEDEROS, PRÉSTAMOS Y CANTERAS.**

La ubicación, disposición y forma de utilización de los vertederos, préstamos y canteras que el Contratista requiera para la ejecución de las obras, deberán ser previamente aprobadas por el Director de Obra, quien impondrá en cada caso las condiciones que estime convenientes atendiendo, entre otras consideraciones, a la estética del paisaje y no afección al entorno.

Los gastos de explotación y arreglo final, así como todas las obras de acceso y evacuación de las aguas, nivelación, ataluzado y plantación o siembra en su caso, de acuerdo con los condicionantes impuestos por la Dirección de Obra, serán de cuenta y riesgo del Contratista.

La localización de vertederos o préstamos o cualquier otra modificación, será objeto de la realización de un *proyecto de explotación y recuperación* por parte del Contratista, que deberá contar con la aprobación de la Dirección facultativa y deberá *tramitarse previamente* a su utilización en el Dpto. de Medio Ambiente, vía Ayuntamiento afectado, de acuerdo con el Decreto Foral 229/93 de 19 de julio. Todos los gastos y el Presupuesto de este proyecto alternativo correrán a cargo de la Contrata.

105.7.- **TERMINACIÓN Y LIMPIEZA DE LA OBRA.**

El Contratista realizará cuantas labores de terminación, demolición y retirada de instalaciones fijas, materiales, acopios sobrantes y limpieza final de la obra objeto del contrato, para que ésta presente buen aspecto a juicio del Director de Obra, no siendo de abono estas labores de terminación y limpieza salvo las que expresamente figuren valoradas en los Presupuestos del Proyecto.

105.8.- **DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATISTA.**

105.8.1 – **Durante la ejecución de la obra**.

A) PLANOS DE TALLER, MONTAJE Y CONSTRUCCIÓN

El Adjudicatario está obligado a presentar los planos de taller, montaje y construcción de las instalaciones que vayan a realizar antes de iniciarlas. Se entienden como planos de montaje los que sean necesarios para que los operarios puedan realizar perfectamente la instalación con ellos, así como los esquemas eléctricos o hidráulicos necesarios para definir las instalaciones y equipos.

Estos planos comprenderán vistas en planta y secciones verticales completas, así como los detalles que sean necesarios para definir algunos puntos o cruzamientos especialmente complicados.

Los planos se dibujarán a escala adecuada y convenientemente dimensionados. Se presentarán a la Dirección Facultativa cuatro copias: para la Propiedad, para la obra, para el Adjudicatario y para la Dirección Facultativa.

Cualquier trabajo realizado por el Adjudicatario que haya sido hecho sin la aprobación del plano de montaje por la Dirección Facultativa, será responsabilidad del Adjudicatario, estando obligado a demoler a su costa lo que la Dirección Facultativa considere inadecuado para el resto de la obra.

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de paralizar las correspondientes unidades de obra para las cuales no se hubiera presentado plano de montaje. De la demora que de ello se derive será responsable únicamente el Adjudicatario.

B) VALORACIONES O ESTIMACIONES DE COSTOS

El Adjudicatario, a petición de la Dirección Facultativa, deberá presentar estimaciones económicas que permitan, durante el transcurso de la obra, tener un conocimiento detallado de lo que supondrá el coste final y total de las obras proyectadas con las modificaciones que se hayan ido introduciendo o que se prevean que vaya a ser necesario introducir.

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de no conformar las certificaciones de obra en tanto que el Adjudicatario no presente las anteriores valoraciones.

105.8.2.- **Al finalizar la obra.**

COLECCIÓN COMPLETA DE PLANOS de la obra realmente ejecutada, que incluirá:

- Planos generales (en coordenadas UTM) de planta y secciones con el estado real y final de la obra, incluyendo coordenadas UTM de puntos singulares, viales, límites de todas las parcelas y situación de todas las acometidas a parcelas, así como definición de zonas con rellenos en parcelas.
- Planos de estado final de todas las instalaciones con coordenadas UTM de registros y pozos.
- La ingeniería de detalle e identificará todos y cada uno de los elementos que componen la obra y sus instalaciones.
- Permisos de enganche y funcionamiento expedidos por los distintos Organismos Competentes, así como la conformidad de las compañías suministradoras a las instalaciones realizadas.

INFORMACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA de todos los materiales y equipos empleados indicando fabricante, marca, modelo y características de funcionamiento y la dirección del fabricante y/o suministrador. Esta información es independiente de la suministrada antes de la obra.

- Planos de las instalaciones existentes afectadas por las obras.
- MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de los equipos y sistemas instalados que incluirá:
- Instrucciones concretas de manejo y maniobra de la instalación.
- Instrucciones sobre las medidas de seguridad previstas.
- Instrucciones sobre las operaciones de conservación a realizar sobre los elementos más importantes de la instalación: Filtros, bombas, ventiladores, aparatos de regulación, detallando su frecuencia.
- Instrucciones sobre las operaciones mínimas de mantenimiento para el conjunto de la instalación.
- LISTA CON LA RELACIÓN DE REPUESTOS que considere deben existir en el almacén de mantenimiento.
- Cualquier otra documentación que la Dirección de Obra considere necesaria para el perfecto conocimiento de las instalaciones y su mantenimiento por parte de la Propiedad.
- Toda la documentación se presentará por cuadruplicado.
- Los planos se presentarán también en soporte magnético AUTOCAD y los documentos en formato DOC.

No se realizará la recepción provisional de las obras, hasta que el contratista no haya presentado la citada documentación.

106.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

106.1.- **MEDICIÓN DE LAS OBRAS.**

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá situar, en los puntos que designe el Director, las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso requeridas; su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes.

106.2.- **ABONO DE LAS OBRAS.**

106.2.1.- **Certificaciones.**

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de certificaciones expedidas por el Director de Obra en la forma establecida por la Propiedad.

106.2.2.- **Precios unitarios.**

Los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios del Contrato para cada unidad de obra, cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego.

Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por:

- La ordenación de tráfico y señalización de las obras.
- La reparación de los daños inevitables causados por el tráfico.
- La conservación durante el plazo de garantía.

Los precios indicados en letra en el Cuadro de Precios nº1, con la rebaja que resulte de la licitación son los que sirven de base al Contrato y el Contratista no puede reclamar que se introduzca modificación alguna en ellos bajo ningún pretexto de error u omisión.

Los precios indicados en el Cuadro de Precios nº2, con la rebaja que resulte de la licitación se aplicará única y exclusivamente en los casos que sea necesario abonar unidades de obra incompletas, cuando por rescisión u otra causa no llegue a terminarse lo contratado, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en dicho Cuadro.

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios nº2, no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los precios señalados en letra en el cuadro de precios nº1.

106.2.3.- **Acopios.**

No se abonarán los acopios.

106.2.4.- **Homologación y aceptación por empresas suministradoras de recursos.**

Todas las infraestructuras que se vayan a entregar a las diferentes empresas de servicios (abastecimiento, agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, gas.. etc) deberán ser aceptadas por todas las compañías antes de la recepción provisional.

106.3.- **OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.**

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 106.3 del PG-3.

Además de los gastos señalados en el referido Artículo y de los señalados explícitamente en otros apartados del presente Pliego, el Contratista vendrá obligado a soportar a su cargo los siguientes gastos:

a) Los correspondientes a ensayos de los materiales y unidades de obra a emplear en la ejecución de las obras.

b) Los correspondientes al replanteo de las obras.

c) Todos los gastos de Control de Calidad serán a cuenta del Contratista.

d) Las protecciones individuales e instalaciones de obra (casetas, vestuarios, etc…) están incluidas en las unidades de obra. Sólo será de abono la señalización y protecciones colectivas.

106.4.- **PRECIOS CONTRADICTORIOS.**

Si ocurriese algún caso por el cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente manera:

- El adjudicatario formulará por escrito bajo firma el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la nueva unidad. En la justificación del nuevo precio de la unidad, el Contratista deberá utilizar, siempre que sea posible, los precios unitarios existentes en el Proyecto, independientemente de la medición prevista en el Proyecto para dicha unidad.

- La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.

- Si ambos son coincidentes o se llega a un acuerdo entre las partes sobre las discrepancias existentes, se firmará el acta de aprobación del precio contradictorio. Si no fuera posible conciliar el precio, la Dirección de Obra propondrá a la Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, pudiendo ser la aprobación del precio exigido por el adjudicatario o la segregación de dicha actividad para ser ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.

La fijación del precio contradictorio deberá realizarse al comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle la Dirección de Obra y a concluirla a satisfacción de la misma.

106.5.- **REVISIÓN DE PRECIOS.**

No existe revisión de precios.

2.- MATERIALES BÁSICOS.

202.- CEMENTOS.

202.1.- DEFINICIÓN.

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua.

202.2.- CONDICIONES GENERALES.

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las siguientes normas:

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicará el tipo, clase resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos a emplear en cada unidad de obra.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995 y posteriormente por Real Decreto 542/2020), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9.

202.3.- TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y provistos de sistemas de filtros.

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados Celsius (70ºC), y si se realizara a mano, no excederá del mayor de los dos límites siguientes:

- Cuarenta grados Celsius (40ºC)
- Temperatura ambiente más cinco grados Celsius (5ºC).

Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, realizándose esta determinación según la UNE 80 114.

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo indicado al respecto en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y de transporte.

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes de las exigidas en este artículo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya.

202.4.- **SUMINISTRO E IDENTIFICACIÓN.**

202.4.1.- **Suministro.**

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 del vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya.

202.4.2.- **Identificación.**

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en el apartado 9.b) del vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información:

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según la UNE 80 403.
- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución.

202.5.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras. Se comprobará la temperatura del cemento a su llegada a obra.

202.5.1.- **Control de recepción**

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 202.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en suministros continuos o cuasicontinuos, o cada uno de los suministros, en suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra para ensayos de contraste que se conservará al menos durante cien (100) días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomará una tercera muestra para éste.

La recepción del cemento se realizará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 10 del vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)" o normativa que la sustituya.

202.5.2.- **Control adicional.**

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, se realizarán obligatoriamente los mismos ensayos indicados anteriormente como de recepción.

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones que hubieran podido formarse El Director de las Obras definirá los lotes de control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo período de fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la unidad de obra de la que forme parte.

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de almacenamiento del cemento.

202.5.3.- Criterios de aceptación o rechazo.

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el presente artículo.

202.6.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

Los acopios no se abonarán.

202.7.- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

202.8.- **NORMAS REFERENCIADAS.**

- UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de cemento).
- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar.
- UNE 80 305 Cementos blancos.
- UNE. 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación.
- UNE 80 307 Cementos para usos especiales.
- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio.
- UNE 80 403 Cementos: Evaluación de la conformidad.

211.- **BETUNES ASFÁLTICOS.**

211.1.- **DEFINICIÓN.**

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

211.2.- **CONDICIONES GENERALES.**

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá de la letra B seguida de dos números (indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) separados por una barra inclinada a la derecha (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en la tabla 211.1 del PG3.

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.1 del PG3.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

211.3.- **TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.**

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios situados en puntos de fácil acceso.

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1 del PG3.

211.4.- **RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN.**

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la tabla 211.1 del PG3.

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.

- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.
- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo.

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:

- Referencia del albarán de la cisterna.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.
- Valores de penetración según la NLT-124, del índice de penetración, según la NLT-181, y del punto de fragilidad Fraass, según la NLT-182.

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir, además, los siguientes datos:

- La curva de peso específico en función de la temperatura.
- La temperatura máxima de calentamiento.
- Los valores del resto de las características especificadas en la tabla 211.1 del PG3, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete (7) días.

211.5.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 211.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

211.5.1.- **Control de recepción de las cisternas.**

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas.

211.5.2.- **Control a la entrada del mezclador.**

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 211.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas (100 t) o fracción diaria de betún asfáltico. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía.

211.5.3.- **Control adicional.**

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de betún asfáltico, y cuando lo especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características especificadas en la tabla 211.1 del PG3.

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en la tabla 211.1 del PG3.

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de penetración, índice de penetración y punto de fragilidad Fraass.

211.5.4.- **Criterios de aceptaci6n o rechazo.**

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla 211.1 del PG3.

211.6.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la que forme parte.

En acopios, el betún asfáltico se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.

211.7.- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

211.8.- **NORMAS REFERENCIADAS.**

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.
- NLT-122 Densidad y densidad relativa de los materiales bituminosos.
- NLT-123 Agua en los materiales bituminosos.
- NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.
- NLT-125 Punto de reblandecimiento anillo y bola de los materiales bituminosos.
- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.
- NLT-127 Puntos de inflamación y combustión de los materiales bituminosos (aparato Cleveland, vaso abierto).
- NLT-130 Solubilidad de los materiales bituminosos en disolventes orgánicos.
- NLT-181 Índice de penetración de los betunes asfálticos.
- NLT-182 Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.
- NLT-185 Efecto del calor y del aire sobre los materiales bituminosos en película fina.

213.- **EMULSIONES BITUMINOSAS.**

213.1.- **DEFINICIÓN.**

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.

213.2.- **CONDICIONES GENERALES.**

Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún asfáltico -de los definidos en el artículo 211 del presente Pliego- agua, emulsionantes y, en su caso, fluidificantes.
Las emulsiones bituminosas deberán presentar un aspecto homogéneo y una adecuada dispersión del betún en la fase acuosa.

A efectos de aplicación de este artículo, la denominación del tipo de emulsión bituminosa se compondrá de las letras EA o EC, representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación (aniónico o catiónico), seguidas de la letra R, M, L o I, según su tipo de rotura (rápida, media o lenta) o que se trate de una emulsión especial para riegos de imprimación, y, en algunos casos, de un guion (-) y el número 1, 2 ó 3, indicador de su contenido de betún residual y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones bituminosas con una menor o mayor penetración en el residuo por destilación, especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados en las tablas 213.1 y 213.2.

De acuerdo con su denominación, las características de las emulsiones bituminosas deberán cumplir las especificaciones de la tabla 213.1 o 213.2.

Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificación de mezcla con cemento podrán ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobación de su idoneidad para el uso a que se destinen. Los valores límite para la adhesividad y envuelta, así como los métodos de determinarlos serán los que se especifiquen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

213.3.- **TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.**

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá las medidas a tomar para el cumplimiento de la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad laboral, almacenamiento y transporte.

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del bidón, tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime conveniente, de entre las indicadas en las tablas 213.1 y 213.2.

213.3.1.- **En bidones.**

Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas y su sistema de cierre será hermético.

Se evitará la utilización, para emulsiones bituminosas aniónicas, de bidones que hubiesen contenido emulsiones bituminosas catiónicas y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados por el fabricante.

Los bidones con emulsión bituminosa se almacenarán en instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, fuegos o llamas.

213.3.2.- **En cisternas.**

Las emulsiones bituminosas se podrán transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros líquidos, siempre que antes de su carga estén completamente limpias. Las cisternas dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

La emulsión bituminosa transportada en cisternas se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil acceso. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de muestras.

Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas empleadas para el transporte de emulsión bituminosa estarán dotadas de medios neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas.

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsión bituminosa, desde la cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo.

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará siempre por tubería directa.

213.4.- **RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN.**

Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsión bituminosa que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas 213.1 ó 213.2.

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía de calidad.

El albarán contendrá explícitamente los siguientes datos:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora.
- Fecha de fabricación y de suministro.
- Identificación del vehículo que lo transporta.
- Cantidad que se suministra.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.
- Nombre y dirección del comprador y del destino.
- Referencia del pedido.
- En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo.

La hoja de características contendrá explícitamente, al menos:

- Referencia del albarán de la remesa.
- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de emulsión bituminosa suministrado, de acuerdo con la denominación especificada en el presente artículo.
- Resultados de los ensayos de carga de las partículas, según la norma NLT-194, viscosidad Saybolt Furol, según la norma NLT-138, contenido de agua, según la norma NLT-137, y tamizado, según la norma NLT-142.

A juicio del Director de las Obras se podrán exigir los valores del resto de las características especificadas en las tablas 213.1 ó 213.2, que deberán ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a diez (10) días.

213.5.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo indicado en el apartado 213.7 del presente artículo, los criterios descritos a continuación para realizar el control de recepción de las cisternas y bidones, no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

213.5.1.- **Control de recepción.**

213.5.1.1.- SUMINISTRO EN BIDONES.

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionará uno al azar, del cual se tomarán dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) según la NLT-121, sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de partículas, según la NLT-194.
- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.
- Contenido de agua, según la NLT-137.
- Tamizado, según la NLT-142.

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de los bidones.

213.5.1.2.- SUMINISTRO EN CISTERNAS.

De cada cisterna de emulsión bituminosa que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de partículas, según la NLT-194.
- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138
- Contenido de agua, según la NLT-137
- Tamizado, según la NLT-142.

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro criterio para el control de recepción de las cisternas.

213.5.2.- **Control en el momento de empleo.**

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 213.5.4 del presente artículo, en bloque, a la cantidad de treinta toneladas (30 t) o fracción diaria de emulsión bituminosa, excepto en el caso de emulsiones empleadas en riegos de adherencia, imprimación y curado, en cuyo caso se considerará como lote la fracción semanal. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), según la NLT-121, a la salida del tanque de almacenamiento.

Sobre una de las muestras se realizarán los siguientes ensayos:

- Carga de partículas, según la NLT-194.
- Viscosidad Saybolt Furol, según la NLT-138.
- Contenido de agua, según la NLT-137.
- Tamizado, según la NLT-142.

Y la otra se conservará durante, al menos, quince (15) días para realizar ensayos de contraste si fueran necesarios.

213.5.3.- **Control adicional.**

Una (1) vez cada mes y como mínimo tres (3) veces, durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición de emulsión bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características reseñadas en las tablas 213.1 y 213.2.

Si la emulsión bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior a quince (15) días, antes de su empleo, se realizarán, como mínimo, sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del depósito de almacenamiento, el ensayo de tamizado, según la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de betún asfáltico residual según la norma NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta característica, se procederá a su homogeneización y realización de nuevos ensayos, o a su retirada.

En condiciones atmosféricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podrá disminuir el plazo de quince (15) días, anteriormente indicado, para la comprobación de las condiciones de almacenamiento de la emulsión bituminosa.

Además de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, se llevarán a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características que estime necesarias, de entre las especificadas en las tablas 213.1 y213.2.

Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de ensayos u organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetirán innecesariamente los mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuestión deberán ofrecer unas garantías razonables y satisfactorias en cuanto a su cualificación técnica y profesional y a su independencia (por ejemplo, según la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentación de dicha hoja de ensayos no afectará en ningún caso a la realización ineludible de los ensayos de carga de las partículas, viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado.

213.5.4.- **Criterios de aceptación o rechazo.**

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2.

213.6.- MEDICIÓN Y ABONO.

La medición y abono de la emulsión bituminosa se realizará según lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la que forme parte.

En acopios, la emulsión bituminosa se abonará por toneladas (t) realmente acopiadas.

213.7.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

213.8.- **NORMAS REFERENCIADAS.**

- NLT-121 Toma de muestras de los materiales bituminosos.
- NLT-124 Penetración de los materiales bituminosos.
- NLT-126 Ductilidad de los materiales bituminosos.
- NLT-130 Solubilidad en disolventes orgánicos de los materiales bituminosos.
- NLT-137 Agua en las emulsiones bituminosas.
- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.
- NLT-139 Residuo por destilación de las emulsiones bituminosas.
- NLT-140 Sedimentación de las emulsiones bituminosas.
- NLT-141 Estabilidad de las emulsiones bituminosas aniónicas (método de demulsibilidad con cloruro cálcico).
- NLT-142 Tamizado de las emulsiones bituminosas.
- NLT-144 Estabilidad de las emulsiones bituminosas (método de la mezcla con cemento).
- NLT-194 Carga de las partículas de las emulsiones bituminosas.

240.- **BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGON ESTRUCTURAL.**

240.1.- **DEFINICIÓN.**

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia al hormigón.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente:

- 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068.

240.2.- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones indicadas en el artículo 34.2 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definirá el tipo o tipos de acero correspondientes a estos productos de acuerdo con la UNE 36 068 y UNE 36 065.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 34.2 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

240.3.- **SUMINISTRO.**

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el artículo 49 del vigente " Código Estructural " o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. Cada partida de acero se suministrará acompañado de la correspondiente hoja de suministro, que deberán incluir su designación.

240.4.- **ALMACENAMIENTO.**

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 49 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

240.5.- **RECEPCIÓN.**

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el Artículo 49 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el Artículo 59 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

240.6.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada.

240.7.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

240.8.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 240.**

- UNE 36 065 Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.
- UNE 36 068 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.

3.- CAPÍTULOS DE UNIDADES DE OBRA.

3.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

300.- **DESBROCE DEL TERRENO.**

300.1.- **DEFINICIÓN.**

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras.

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes:

- Remoción de los materiales objeto de desbroce.
- Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo.

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras.

300.2.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

300.2.1.- **Remoción de los materiales de desbroce.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o definidas durante la obra.

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas existentes.

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras de suelo.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las instrucciones del Director de las Obras.

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a longitud inferior a tres metros (3 m).

Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

300.2.2.- **Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce.**

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado.

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los lugares que señale el Director de las Obras.

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias apreciables de agua.

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los terrenos afectados.

300.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación.

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios para el vertido del material procedente del desbroce.

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo.

302.- **ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN.**

302.1.- **DEFINCIÓN.**

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra.

302.2.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas.

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

302.2.1.- **Escarificación.**

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras.

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno.

302.2.2.- **Compactación.**

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el artículo 330, "Terraplenes" del este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de obra de que se trate.

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de Obra.

302.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En este último caso se abonará por metros cuadrados (m^2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir varios precios en caso de preverse zonas con tratamientos diferentes.

303.- **ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL FIRME EXISTENTE.**

303.1.- **DEFINICIÓN.**

Consiste en la disgregación del firme existente, efectuada por medios mecánicos, eventual retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida.

No se considerarán incluidos en esta unidad las operaciones de demolición del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo constituyen.

303.2.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

303.2.1.- **Escarificación.**

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o que, en su defecto, señale el Director de las Obras.

Los equipos de maquinaria para la escarificación deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por el Director de las Obras.

303.2.2.- **Retirada de productos.**

Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras.

303.2.3.- **Adición de nuevos materiales y compactación.**

El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la capa inmediata del nuevo firme.

Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra correspondiente contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Los equipos de compactación y el grado de compactación serán los adecuados al material escarificado.

303.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Salvo que figure expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida en la unidad correspondiente de firme o explanación.

En el caso de que la unidad figure expresamente en el Cuadro de Precios, ésta deberá abonarse por metros cuadrados (m^2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.

320.- **EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN Y PRÉSTAMOS.**

320.1.- **DEFINICIÓN.**

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos, previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de los productos removidos al depósito o lugar de empleo.

Se incluyen en esta unidad la ampliación de las trincheras, la mejora de taludes en los desmontes, y la excavación adicional en suelos inadecuados, ordenadas por el Director de las Obras.

Se denominan "préstamos previstos" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos indicados en el Proyecto o dispuestos por la Administración, en los que el Contratista queda exento de la obligación y responsabilidad de obtener la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones. Se denominan "préstamos autorizados" aquellos que proceden de las excavaciones de préstamos seleccionados por el Contratista y autorizados por el Director de las Obras, siendo responsabilidad del Contratista la obtención de la autorización legal, contratos y permisos, para tales excavaciones.

320.2.- **CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.**

En el Proyecto se indicará, explícitamente, si la excavación ha de ser "clasificada" o "no clasificada".

En el caso de excavación clasificada, se considerarán los tipos siguientes:

- Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de este Pliego, o, en su defecto, del PG3, y en consecuencia, a efectos de medición y abono, la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan de ser excavados utilizando explosivos. Este carácter estará definido por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto por el Director de las Obras.
- Excavación en terreno de tránsito: Comprenderá la correspondiente a los materiales formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que no siendo necesario, para su excavación, el empleo de explosivos sea precisa la utilización de escarificadores profundos y pesados. La calificación de terreno de tránsito estará definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en función de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas en el terreno, o bien por otros procedimientos contrastables durante la ejecución de la obra, o en su defecto, por el Director de las Obras.
- Excavación en tierra: Comprenderá la correspondiente a todos los materiales no incluidos en los apartados anteriores.

Si se utiliza el sistema de "excavación clasificada", el Contratista determinará durante la ejecución, y notificará por escrito, para su aprobación, al Director de las Obras, las unidades que corresponden a excavaciones en roca, excavación en terreno de tránsito y excavación en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios definidos por la D.F.

320.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

320.3.1.- **Generalidades.**

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. El Contratista deberá comunicar con suficiente antelación al Director de las Obras el comienzo de cualquier excavación, y el sistema de ejecución previsto, para obtener la aprobación del mismo.

A este efecto no se deberá acudir al uso de sistemas de excavación que no correspondan a los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variación pretendida pudiera dañar excesivamente el terreno.

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán, en cualquier caso, las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En especial, se atenderá a las características tectónico-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos:

- Inestabilidad de taludes en roca o de bloques de la misma,
- debida a voladuras inadecuadas,
- deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación,
- encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras,
- taludes provisionales excesivos,

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

320.3.2.- **Drenaje.**

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos, y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca erosión en los taludes.

320.3.3.- **Tierra vegetal.**

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto, se señale en el Proyecto y con lo que especifique el Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extensión y profundidad que debe ser retirada. Se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de las Obras o indique el Proyecto.

La tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. La retirada, acopio y disposición de la tierra vegetal se realizará cumpliendo las prescripciones del apartado 300.2.2 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, y el lugar de acopio deberá ser aprobado por el Director de las Obras.

320.3.4.- Empleo de los productos de excavación.

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo, en su defecto, se estará a lo que, al respecto, disponga el Director de las Obras.

En el caso de excavación por voladura en roca, el procedimiento de ejecución, deberá proporcionar un material adecuado al destino definitivo del mismo, no siendo de abono las operaciones de ajuste de la granulometría del material resultante, salvo que dichas operaciones se encuentren incluidas en otra unidad de obra.

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización del Director de las Obras.

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en cualquier otro uso que señale el Director de las Obras.

Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada, en zonas de desmonte en tierra, deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.

El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así está definido en el Proyecto o lo autoriza el Director de las Obras, debiéndose cumplir las mismas condiciones de acabado superficial que el relleno sin ampliar.

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las Obras.

320.3.5.- **Excavación en roca.**

Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada de la carretera. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o la cimentación de la futura explanada presente cavidades, el Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, con la aprobación del Director de las Obras.

Se cuidará especialmente la subrasante que se establezca en los desmontes en roca debiendo ésta presentar una superficie que permita un perfecto drenaje sin encharcamientos, y en los casos en que por efecto de la voladura se generen zonas sin desagüe se deberán eliminar éstas mediante la aplicación de hormigón de saneo que genere la superficie de la subrasante de acuerdo con los planos establecidos para las mismas y con las tolerancias previstas en el Proyecto, no siendo estas operaciones de abono.

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca, en la formación de pedraplenes, se seguirán además las prescripciones del artículo 331, "Pedraplenes", de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

Cuando interese de manera especial que las superficies de los taludes excavados presenten una buena terminación y se requiera, por tanto, realizar las operaciones precisas para tal fin, se seguirán las prescripciones del artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

El Director de las Obras podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos o dañinos, aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños ocasionados como consecuencia de tales trabajos.

320.3.6.- **Préstamos y caballeros.**

Si se hubiese previsto o se estimase necesaria, durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al Director de las Obras, con suficiente antelación, la apertura de los citados préstamos, a fin de que se pueda medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no alterado y, en el caso de préstamos autorizados, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede.

No se tomarán préstamos en la zona de apoyo de la obra, ni se sustituirán los terrenos de apoyo de la obra por materiales admisibles de peores características o que empeoren la capacidad portante de la superficie de apoyo.

Se tomarán perfiles, con cotas y mediciones, de la superficie de la zona de préstamo después del desbroce y, asimismo, después de la excavación.

El Contratista no excavará más allá de las dimensiones y cotas establecidas.

Los préstamos deberán excavarse disponiendo las oportunas medidas de drenaje que impidan que se pueda acumular agua en ellos. El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que el Director de las Obras ordene al respecto.

Los taludes de los préstamos deberán ser estables, y una vez terminada su explotación, se acondicionarán de forma que no dañen el aspecto general del paisaje. No deberán ser visibles desde la carretera terminada, ni desde cualquier otro punto con especial impacto paisajístico negativo, debiéndose cumplir la normativa existente respecto a su posible impacto ambiental.

Los caballeros, o depósitos de tierra, que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y un grado de estabilidad que evite cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que, al efecto, señale el Director de las Obras, se cuidará de evitar sus arrastres hacia la carretera o las obras de desagüe, y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones de la carretera.

El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.

Cuando tras la excavación de la explanación aparezca suelo inadecuado en los taludes o en la explanada, el Director de las Obras podrá requerir del Contratista que retire esos materiales y los sustituya por material de relleno apropiado. Antes y después de la excavación y de la colocación de este relleno se tomarán perfiles transversales.

320.3.7.- **Taludes.**

La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la decompresión prematura o excesiva de su pie e impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. En el caso que la excavación del talud sea definitiva y se realice mediante perforación y voladura de roca, se cumplirá lo dispuesto en el artículo 322, "Excavación especial de taludes en roca" de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

Las zanjas que, de acuerdo con el Proyecto, deban ser ejecutadas en el pie del talud, se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material de relleno se compactará cuidadosamente. Asimismo se tendrá especial cuidado en limitar la longitud de la zanja abierta al mismo tiempo, a efectos de disminuir los efectos antes citados.

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., dichos trabajos deberán realizarse tan pronto como la excavación del talud lo permita.

Se procurará dar un aspecto a las superficies finales de los taludes, tanto si se recubren con tierra vegetal como si no, que armonice en lo posible con el paisaje natural existente. En el caso de emplear gunita, se le añadirán colorantes a efectos de que su acabado armonice con el terreno circundante.

La transición de desmonte a terraplén se realizará de forma gradual, ajustando y suavizando las pendientes, y adoptándose las medidas de drenaje necesarias para evitar aporte de agua a la base del terraplén.

En el caso de que los taludes presenten desperfectos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones complementarias ordenadas por el Director de las Obras. Si dichos desperfectos son imputables a ejecución inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones del Director de las Obras, el Contratista será responsable de los daños y sobrecostes ocasionados.

320.3.8.- **Contactos entre desmontes y terraplenes.**

Se cuidarán especialmente estas zonas de contacto en las que la excavación se ampliará hasta que la coronación del terraplén penetre en ella en toda su sección, no admitiéndose secciones en las que el apoyo de la coronación del terraplén y el fondo de excavación estén en planos distintos.

En estos contactos se estudiarán especialmente en el Proyecto el drenaje de estas zonas y se contemplarán las medidas necesarias para evitar su inundación o saturación de agua.

320.3.10.- Tolerancia geométrica de terminación de las obras.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se definirán las tolerancias del acabado o, en su defecto, serán definidos por el Director de las Obras. Con la precisión que se considere admisible en función de los medios previstos para la ejecución de las obras y en base a los mismos serán fijados al menos las siguientes tolerancias:

- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), entre los planos o superficies de los taludes previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando fijada la zona en la que el talud sería admisible y en la que sería rechazado debiendo volver el Contratista a reperfilar el mismo.
- Tolerancia máxima admisible, expresada en centímetros (cm), en la desviación sobre los planos o superficies de la explanación entre los previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la zona en la que la superficie de la explanación sería admisible y en la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.
- Tolerancia máxima admisible en pendientes y fondos de cunetas, así como de su situación en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y los realmente construidos, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.
- Tolerancia máxima en drenajes, tanto en cuanto a pendiente y fondos de los mismos como en planta, expresada en centímetros (cm), sobre los planos previstos en el Proyecto y lo realmente construido, quedando definida la obra admisible y la que sería rechazada debiendo el Contratista proceder a su rectificación de acuerdo con lo que para ello ordene el Director de las Obras.

Todo tipo de operaciones de rectificación por incumplimiento de tolerancias no será de abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

320.4.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m^3) medidos sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos.

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros, el pago de cánones de ocupación, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la completa ejecución de la unidad.

Los préstamos no se medirán en origen, ya que su ubicación se deducirá de los correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro de Precios número 1 del Proyecto para este concepto. De no ser así, esta excavación se considerará incluida dentro de la unidad de terraplén.

Las medidas especiales para la protección superficial del talud se medirán y abonarán siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas.

No serán de abono los excesos de excavación sobre las secciones definidas en el Proyecto, o las ordenes escritas del Director de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección ordenada o proyectada.

El Director de las Obras podrá obligar al Contratista a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono.

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de las Obras.

321.- **EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS.**

321.1.- **DEFINICIÓN.**

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.

321.2.- **CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES.**

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320, "Excavación de la explanación y préstamos" de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

321.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

321.3.1.- **Principios generales.**

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el Director de las Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las Obras.

Para la excavación de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el apartado 320.3.3 de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación u obra de que se trate.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

321.3.2.- **Entibación.**

En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El Director de las Obras podrá autorizar tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente.

321.3.3.- **Drenaje.**

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares, necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construcción propuestos.

321.3.4.- **Taludes.**

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos.

321.3.5.- **Limpieza del fondo.**

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.

321.3.6.- **Empleo de los productos de excavación.**

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.4 de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

321.3.7.- **Caballeros.**

Serán aplicables las prescripciones del apartado 320.3.6 de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

321.4.- **EXCESOS INEVITABLES.**

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras.

321.5.- **TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS.**

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono independiente.

321.6.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m^3) deducidos a partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye, salvo especificación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las entibaciones, agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

332.- **RELLENOS LOCALIZADOS.**

332.1.- **DEFINICIÓN.**

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

En la dirección longitudinal de la calzada soportada, los rellenos localizados de trasdós de obra de fábrica, "cuñas de transición", tendrán una longitud mínima de al menos diez metros (10 m) desde el trasdós de la obra de fábrica. Caso de existir losa de transición, dicha longitud mínima habrá de ser además superior a dos (2) veces la dimensión de la losa en la referida dirección longitudinal. A partir de dicha dimensión mínima, la transición entre el relleno localizado y el relleno normal tendrá, siempre en la dirección longitudinal de la calzada soportada, una pendiente máxima de un medio (1V:2H).

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante" de este Pliego o, en su defecto, del PG3 y que se realizarán de acuerdo a este último.

332.2.- **ZONAS DE LOS RELLENOS.**

En los rellenos localizados que formen parte de la infraestructura de la carretera se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes, según el apartado 330.2 de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

332.3.- **MATERIALES.**

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR según UNE 103502, correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea superior a diez (10) y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

332.4.- **EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS.**

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego o, en su defecto, del PG3, del Proyecto y las indicaciones del Director de las Obras.

332.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

332.5.1.- **Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados.**

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de conseguir su unión con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoción sea necesaria, es del mismo tipo que el nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director de las Obras decidirá si dicho material debe transportarse a vertedero.

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras.
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización.

332.5.2.- **Extensión y compactación.**

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm).

Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y compactación.

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de las Obras.

Salvo que el Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días (7 d) desde la terminación de la fábrica contigua, salvo indicación del Proyecto o autorización del Director de las Obras y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras.

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará simultáneamente a dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.

Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente por el Contratista.

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas contiguas del relleno.

332.5.3.- **Relleno de zanjas para instalación de tuberías.**

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto.
La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, en su defecto, será establecida por el Director de las Obras.

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director de las Obras.

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del relleno de la zanja.

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501.

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, según UNE 103501.

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes, este objetivo habrá de alcanzarse si es posible. En caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos anteriores de este Pliego o, en su defecto, del PG3.

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación.
Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de las Obras, una solución alternativa sin sobrecoste adicional.

332.6.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior *a dos grados Celsius (2º C); debiendo* suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación.

332.7.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m^3) medidos sobre los planos de perfiles transversales.

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo especificación en contra.

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado, salvo especificación en contra del Proyecto.

332.8.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 332.**

- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Próctor modificado.
- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.

338.- **RELLENOS DE ZANJAS.**

338.1.- **MATERIALES PARA RELLENOS.**

En las zanjas situadas en la calzada, el relleno se realizará mediante Suelo Seleccionado con CBR >20 compactada al 95% del Próctor Modificado. Si en algún caso no pudiera realizarse una buena compactación por tener que cerrar inmediatamente la zanja por necesidades del tráfico, se rellenará con material tipo gravillín, procedente de cantera.

En las zanjas situadas en zonas verdes, el relleno será Suelo Adecuado.

Asimismo, como materiales de asiento, apoyo y protección de tuberías, se emplearán los materiales siguientes:

- **Gravillín**, en apoyo y cubrición de colectores de tuberías de hormigón, en los casos en que la tubería esté situada fuera de la calzada (zonas verdes).

- **Hormigón HM-15,** en apoyo y cubrición de tuberías de hormigón, situadas en zonas de calzada, y en apoyo y cubrición hasta riñones en tuberías de hormigón (obras de fábrica).

Si la parte superior de dichas tuberías (obras de fábrica con tubo de hormigón) se encuentra a menos de 1 metro de la rasante, la tubería se cubrirá con una losa de hormigón.

El hormigón cumplirá las especificaciones del artículo correspondiente a Hormigones.

Antes de colocar la tubería se realizará una presolera con HM-15, al objeto de conseguir la rasante indicada en el Proyecto.

338.2.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 2ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución, debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

338.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

El relleno de zanjas se abonará por aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios, según las respectivas definiciones a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos en la excavación, estando obligado no obstante el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.

Si el Contratista, al excavar las zanjas, dadas las características del terreno, no pudiera mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en el plano de Secciones-Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su VºBº o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también serán de aplicación los precios anteriores a los volúmenes resultantes.

En los precios citados están incluidas todas las operaciones necesarias para la realización de estas unidades de obra, así como los materiales necesarios, su transporte y colocación.

Las unidades de relleno y apoyo para tuberías son las siguientes:

- M^3. Gravillín en asiento y cubrición de tuberías.
- M^3. Relleno de zanjas con zahorra artificial.
- M^3. Relleno de zanjas con Suelo Seleccionado.
- M^3. Relleno de zanjas con Suelo Adecuado.

Rellenos de tierras.

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.

La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos, según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detallan en los planos las diferentes clases de relleno.

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber tenido que efectuar acopios intermedios.

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados.

- Ensayos

La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de compactación, que deberán realizarse por un Laboratorio homologado. El coste de estos ensayos de control sistemático será a cargo del Contratista. No se autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección Facultativa.

Los ensayos de PM, Próctor Modificado, se realizarán según la Norma NL Tg 108/72.

El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las pruebas correspondientes.

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la conducción durante el periodo de garantía, deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan producirse.

Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del Pg-3.

340.- **TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA.**

340.1.- **DEFINICIÓN.**

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la explanada.

340.2.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura.

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores.

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben las condiciones de calidad y características geométricas de ésta.

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

340.3.- **TOLERANCIAS DE ACABADO.**

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas.

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego.

340.4.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso.

340.5.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 340.**

- NLT 334. Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros estática o rodante.

421.- **RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE.**

421.1.- **DEFINICIÓN.**

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en zanjas, trasdoses de obras de fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria pesada.

421.2.- **MATERIALES.**

Se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

421.2.1.- **Condiciones generales.**

Los materiales drenantes a emplear en rellenos localizados serán áridos naturales, o bien áridos procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales. En todo caso estarán exentos de arcilla, margas y otros materiales extraños.

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.

421.2.2.- **Composición granulométrica.**

El tamaño máximo no será, en ningún caso, superior a setenta y seis milímetros (76 mm), y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el 5 %.

Siendo F_x el tamaño superior al del x %, en peso, del material filtrante, y d_x el tamaño superior al del x %, en peso, del terreno a drenar, se deberán cumplir las siguientes condiciones de filtro:

- (a) $F_{15} / d_{85} < 5$;
- *(b)* $F_{15} / d_{15} > 5$;
- *(c)* $F_{50} / d_{50} < 25$;

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte ($F_{60} / F_{10} < 20$).

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material drenante situado junto a los tubos o mechinales deberá cumplir las condiciones siguientes:

- Si se utilizan tubos perforados: F_{85} / (diámetro del orificio) > 1
- Si se utilizan tubos con juntas abiertas: F_{85} / (apertura de la junta) > 1,2
- Si se utilizan tubos de hormigón poroso: F_{85} / (d_{15} del árido del tubo) > 0,2
- Si se drena por mechinales: F_{85} / (diámetro del mechinal) > 1

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos límites, podrá recurrirse a filtros granulares compuestos por varias capas, una de las cuales, la de material más grueso, se colocará junto al sistema de evacuación, y cumplirá las condiciones de filtro respecto a la siguiente, considerada como terreno, ésta, a su vez, las cumplirá respecto de la siguiente, y así, sucesivamente, hasta llegar al relleno o terreno natural..

Se podrá asimismo recurrir al empleo de filtros geotextiles, según lo expuesto en el artículo 422, "Geotextiles como elemento de separación y filtro" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

Cuando el terreno natural esté constituido por materiales con gravas y bolos a efectos de cumplimiento de las condiciones anteriores se atenderá, únicamente, a la curva granulométrica de la fracción del mismo inferior a veinticinco milímetros (25 mm).

Si el terreno natural está constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material drenante deberá cumplir, además de las condiciones de filtro generales, la siguiente:

- $F_{15} < 1$ mm

Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homogéneo, sin vetas de arena fina o de limo, las condiciones de filtro a) y b) serán sustituidas por la siguiente:

- $0{,}1\ mm < F_{15} < 0{,}4\ mm$

En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Tamaño máximo del árido comprendido entre veinte milímetros (20 mm) y ochenta milímetros (80 mm).
- Coeficiente de uniformidad menor de cuatro (F60 / F10 < 4).

421.2.3.- **Plasticidad.**

El material drenante será no plástico, y su equivalente de arena determinado según UNE EN 933-8 será superior a treinta (EA>30).

421.2.4.- **Calidad.**

El coeficiente de desgaste de los materiales de origen pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles, según UNE EN 1097-2, será inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de escorias deberán ser aptos para su empleo en obras de hormigón. Los materiales de otra naturaleza deberán poseer una estabilidad química y mecánica suficiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto y en este pliego.

421.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

421.3.1.- **Acopios.**

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales.

Se eliminarán de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Durante el transporte y posterior manipulación hasta su puesta en obra definitiva, se evitará toda segregación por tamaños y la contaminación por materiales extraños.

421.3.2.- **Preparación de la superficie de asiento.**

Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

421.3.3.- **Ejecución de las tongadas. Extensión y compactación.**

Los materiales del relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga, en todo su espesor, el grado de compactación exigido. En general y salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se usarán tongadas de veinte centímetros (20 cm). Cuando una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometría, se adoptarán las medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separación.

El relleno de trasdós de obras de fábrica se realizará de modo que no se ponga en peligro la integridad y estabilidad de las mismas, según propuesta, por escrito y razonada, del Contratista y aceptada por el Director de las Obras.

Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar la segregación durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptarán las medidas necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma. En general y salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras se compactarán las tongadas hasta alcanzar un índice de densidad superior al ochenta por ciento (80 %) y en ningún caso dicho grado de compactación será inferior al mayor de los que posean los terrenos o materiales adyacentes situados a su mismo nivel.

Cuando se trata de rellenos localizados en torno a tuberías y hasta una altura de treinta centímetros (30 cm) por debajo de la generatriz superior de la tubería, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el tamaño máximo de las partículas no será superior a dos centímetros (2 cm), las tongadas serán de diez centímetros (10 cm) y se compactarán hasta un índice de densidad no inferior al setenta y cinco por ciento (75 %). Se prestará especial cuidado durante la compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de tongada y la potencia de la maquinaria de compactación.

En todo caso los medios de compactación serán los adecuados para no producir finos adicionales por trituración del material, y en todo caso deberán ser sometidos a la aprobación del Director de las Obras.

421.3.4.- **Protección del relleno.**

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación.

También se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua.

Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones.

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja.

421.4.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

Los rellenos localizados de material drenante se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero grados Celsius (0 ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera posible, deberán ser corregidas mediante la eliminación o sustitución del espesor afectado por el paso del tráfico.

421.5.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Las distintas zonas de rellenos localizados de material drenante, no incluidos en otra unidad de obra como por ejemplo "Zanjas drenantes", se abonarán por metros cúbicos (m^3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con el Proyecto y las órdenes escritas del Director de las Obras, medidos sobre los planos de perfiles transversales, no siendo de pago las demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de obra, etc.

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación.

El relleno con material impermeable de la parte superior de la zanja, se abonará como relleno localizado, según lo indicado en el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

421.6.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 421**.

- UNE EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
- UNE EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.

3.2.- DRENAJE SUPERFICIAL

400.- CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA.

400.1.- DEFINICIÓN.

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado.

La forma, dimensiones, tipo y demás características, se ajustaran a lo que figure en la Norma 5.2-IC de Drenaje Superficial y en el Proyecto.

400.2.- MATERIALES.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

400.2.1.- Hormigón.

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por las vigentes:

- Código Estructural.
- Instrucción para la Recepción de Cementos.
- Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho días (28 d).

400.2.2.- Otros materiales.

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo especificado en el Proyecto.

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate.

400.3.- **EJECUCIÓN.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

400.3.1.- **Preparación del lecho de asiento.**

A partir de la superficie natural del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del lecho de asiento.

La excavación se realizará, en lo posible, de aguas abajo hacia aguas arriba y, en cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca retenciones de agua ni encharcamientos.

Cuando el terreno natural en el que se realice la excavación no cumpla la condición de suelo tolerable, podrá ser necesario, a juicio del Director de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 330, "Terraplenes" de este Pliego o, en su defecto, del PG3, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y compactada.

Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la puesta en obra del hormigón, y en ningún caso será superior a ocho días (8 d).

400.3.2.- **Hormigonado.**

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Código Estructural, el artículo 630, "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3, y con las condiciones que exija el Proyecto.

Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros (15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.

Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán superiores a diez milímetros (10 mm), *ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal*.

Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no permitiéndose el relleno con mortero de cemento.

400.3.3.- **Juntas.**

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.

Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las juntas selladas.

Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).

Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.

400.4.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno.

Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento.

400.5.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 400.**

- NLT 334 Medida de la irregularidad superficial de un pavimento mediante la regla de tres metros, estática o rodante.

410.- **ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.**

410.1.- **DEFINICIONES.**

Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y posterior entrega a un desagüe.

El material constituyente podrá ser hormigón, materiales cerámicos, piezas prefabricadas o cualquier otro previsto en el Proyecto o aprobado por el Director de las Obras. Normalmente estará cubierta por una tapa o rejilla.

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad.

410.2.- **FORMA Y DIMENSIONES.**

La forma y dimensiones de las arquetas y de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto.

Las dimensiones mínimas interiores serán de ochenta centímetros por cuarenta centímetros (80 cm x 40 cm) para profundidades menores a un metro y medio (1,5 m). Para profundidades superiores, estos elementos serán visitables, con dimensión mínima interior de un metro (1 m) y dimensión mínima de tapa o rejilla de sesenta centímetros (60 cm).

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

Tanto las arquetas como los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables, proscribiéndose las arquetas no registrables.

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.

410.3.- **MATERIALES.**

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de las arquetas y de los pozos de registro cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:

- Hormigón:
  - Código Estructural.
  - Instrucción para la Recepción de Cementos.
  - Artículos 610 "Hormigones" y 630: "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.
  - Los hormigones de limpieza y relleno deberán tener una resistencia característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d)
- Fábrica de ladrillo:
  - Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.
  - Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción.
  - Los ladrillos a emplear serán macizos.
- Bloques de hormigón:
  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción.
- Piezas prefabricadas de hormigón:
  - Código Estructural.
  - Resistencia característica mínima a compresión: veinticinco megapascales (25 MPa), a veintiocho días (28 d).
  - El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.
- Fundición para tapas y cercos:
  - UNE EN 1561 y UNE EN 1563.

410.4.- **EJECUCIÓN.**

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto.

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno circundante sobre ella o a su interior.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.

En el caso que el Proyecto lo considere necesario se realizará una prueba de estanqueidad.

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, de acuerdo con el artículo 332, "Rellenos localizados" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3, o con hormigón, según se indique en el Proyecto.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

410.5.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Las arquetas y los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la unidad de obra completa y terminada incluyendo excavación, relleno del trasdós, elementos complementarios (tapa, cerco, pates, etc.).

410.6.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 410.**

- UNE EN 1561 Fundición. Fundición gris.
- UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

411.- **IMBORNALES Y SUMIDEROS.**

411.1.- **DEFINICIONES.**

Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier construcción.

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical.

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida.

411.2.- **FORMA Y DIMENSIONES.**

La forma y dimensiones de los imbornales y de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en el Proyecto.

El orificio de entrada del agua deberá poseer la longitud suficiente para asegurar su capacidad de desagüe, especialmente en los sumideros. Los imbornales deberán tener una depresión a la entrada que asegure la circulación del agua hacia su interior.

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser fácilmente limpiables.

Los sumideros situados en la plataforma no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene adecuadamente.

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico.

411.3.- **MATERIALES.**

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los imbornales cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que afecten a dichos materiales, así como en los artículos correspondientes de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el R.D. 1328/95 y posteriormente en el R.D. 542/2020), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:

- Hormigón:
  - Código Estructural.
  - Instrucción para la Recepción de Cementos.
  - Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.
  - Los hormigones de limpieza y relleno deben tener una resistencia característica mínima a compresión de doce megapascales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d).
- Fábrica de ladrillo:
  - Artículo 657, "Fábricas de ladrillo" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.
  - Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción.
  - Los ladrillos a emplear serán macizos.
- Bloques de hormigón:
  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción.
- Piezas prefabricadas de hormigón:
  - Código Estructural.
  - El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas aquellas piezas que presenten defectos.
- Fundición para rejillas y cercos:
  - UNE EN 1563.

411.4.- **EJECUCIÓN.**

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos correspondientes de este Pliego para la puesta en obra de los materiales previstos.

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto.

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior.

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de estanqueidad.

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

411.5.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Los sumideros e imbornales se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra.

Salvo indicación del Proyecto en contra, el precio incluirá la embocadura, la rejilla y la arqueta receptora. La arqueta receptora incluye, la obra de fábrica de solera, paredes y techo, el enfoscado y bruñido interior, en su caso, la tapa y su cerco y el remate alrededor de éste y en definitiva todos los elementos constitutivos de la misma, así como la excavación correspondiente.

411.6.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 411.**

- UNE EN 124 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
- UNE EN 1563 Fundición. Fundición de grafito esferoidal.

413.- COLECTORES, CAÑOS Y PASOS SALVACUNETAS DE HORMIGÓN. (ACCESOS A FINCAS).

413.1.- DEFINICIÓN.

Se incluyen en este Artículo todos los conductos realizados con tubos de hormigón, cualquiera que sea la finalidad del conducto aunque generalmente correspondan a obras de drenaje transversal o longitudinal y paso de servicios afectados.

413.2.- MATERIALES.

Se utilizarán tubos de hormigón, prefabricados mediante centrifugación, con junta de campana y enchufe, de la serie C, con un valor mínimo de la carga de aplastamiento de nueve mil kilopondios por metro cuadrado (9.000 Kp/m^2), siendo en masa para diámetros iguales o inferiores a seiscientos milímetros (600 mm) y armados para diámetros superiores.

413.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos e instrucciones de la Dirección de Obra, empleándose tubos cuya calidad y procedencia hayan sido previamente aprobados por el Director de Obra.

Cuando exista cuneta consistirán en:

- Reperfilado de la zona de la cuneta para que quepan el tubo, el hormigón de refuerzo y los muretes de cierre.
- Colocación de la solera de los tubos.
- Colocación y rejuntado de los tubos de hormigón prefabricado.
- Hormigonado del recubrimiento de los tubos.
- Hormigonado de los muretes de cierre.
- Revestimiento de la cuneta en la zona de paso.

413.4.- MEDICIÓN Y ABONO.

Los conductos y tuberías realizados con tubos de hormigón se abonarán por metros lineales (m) del conducto realmente ejecutado de acuerdo con los planos, a los precios correspondientes del Cuadro de Precios.

En este precio están incluidos todos los materiales y operaciones hasta la total terminación de la unidad de obra, de acuerdo con la sección tipo definida en los planos, así como su conservación y limpieza hasta la recepción de la Obra. Están incluidos las uniones, piezas especiales, juntas y empalmes y demás operaciones. Asimismo están incluidos la excavación o relleno de las zanjas, que no sea de abono independiente, el hormigón de la cama de asiento y de cubrición del conducto y el relleno de material filtrante si lo hubiere.

Las boquillas y aletas tipificadas en el Proyecto para los caños, se abonarán a los precios correspondientes, de acuerdo con el diámetro del caño a colocar, por unidad de boquilla construida, incluida la excavación necesaria.

Los pasos salvacunetas especificados en el Proyecto, se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de precios, de acuerdo con el diámetro del tubo a colocar, por metro lineal de paso construido, incluida la excavación necesaria, el hormigón de asiento y protección y la parte proporcional de la embocadura de hormigón.

Las bajantes escalonadas consideradas en el Proyecto se abonarán al precio correspondiente, por metro lineal construido, incluida la excavación necesaria, juntas y anclajes de hormigón armado, así como la cama de hormigón bajo la bajante.

420.- **ZANJAS DRENANTES.**

420.1.- **DEFINICIÓN.**

Consisten en zanjas rellenas de material drenante, adecuadamente compactado, en el fondo de las cuales generalmente se disponen tubos drenantes, (perforados, de material poroso, o con juntas abiertas), y que, normalmente tras un relleno localizado de tierras, se aíslan de las aguas superficiales por una capa impermeable que sella su parte superior.

A veces se omiten los tubos de drenaje, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena de material drenante, constituyendo un dren ciego o dren francés. En estos drenes el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.

Cuando exista peligro de migración del suelo, que rodea la zanja hacia el interior de la misma, se deberá disponer de un filtro normalmente geotextil, protegiendo el material drenante.

Su ejecución incluye normalmente las operaciones siguientes:

- Excavación.
- Ejecución del lecho de asiento de la tubería y, en su caso, disposición del filtro geotextil.
- Colocación de la tubería.
- Colocación y compactación del material drenante.
- Relleno de tierras de la parte superior de la zanja, en su caso.
- Impermeabilización de la parte superior de la zanja.

420.2.- **MATERIALES.**

En este apartado se detallan las condiciones a cumplir por los tubos y el material drenante que constituye esta unidad. Con relación al resto de materiales auxiliares, tales como filtro geotextil, relleno de tierras de la parte superior de la zanja e impermeabilización de la misma, se estará a lo dispuesto en este Pliego, y a lo indicado en el Proyecto.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

420.2.1.- **Tubos.**

420.2.1.1.- CONDICIONES GENERALES.

Los tubos a emplear en zanjas drenantes podrán ser de hormigón en masa o armado, policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad o cualquier otro material sancionado por la experiencia. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto definirá en cada caso, el tipo de material y sus características.

En el caso de utilizarse tubos de hormigón en masa poroso, tendrán una capacidad de filtración mínima de ochenta y cinco litros por segundo por cada metro cuadrado de superficie exterior y cada bar de carga hidrostática (85 $l/s \cdot m^2 \cdot bar$). El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras especificará sus restantes características.

En todo caso, los tubos utilizados serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y deformaciones.

420.2.1.2.- RESISTENCIA MECÁNICA.

El Director de las Obras podrá exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime necesarias. Serán de aplicación con carácter general el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular las siguientes normas:

- Hormigón en masa o armado: UNE 127010 EX..
- Policloruro de vinilo: UNE EN 1401-1.
- Polietileno de alta densidad: UNE 53365.

420.2.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES.

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en zanjas drenantes, así como sus correspondientes perforaciones y juntas, serán las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, las que señale el Director de las Obras.

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les corresponda en los codos o piezas especiales.

La superficie interior será razonablemente lisa, y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de desagüe.

Se atenderá con carácter general a las características geométricas y tolerancias recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y con carácter particular a lo recogido en la normativa específica reseñada en el apartado 420.2.1.2 de este artículo.

420.2.2.- **Material drenante.**

Se estará a lo dispuesto en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

El material drenante deberá cumplir, en la zona de contacto con el terreno o con el material de relleno de la parte superior de la zanja, las condiciones de filtro para evitar su contaminación. Si no fuera posible o conveniente cumplir esta condición se deberá envolver el material drenante con un filtro geotextil.

420.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

420.3.1.- **Excavación.**

Las excavaciones necesarias para la ejecución de esta unidad se realizarán de acuerdo con el artículo 321, "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

No se depositará el material procedente de la excavación en la zona de afección de cursos de agua. Asimismo, no se acopiará el material excavado a menos de sesenta centímetros (60 cm) del borde de la excavación.

420.3.2.- **Ejecución del lecho de asiento de la tubería.**

Una vez abierta la zanja de drenaje, si se observase que su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos deberá ser también impermeable.

En todo caso, el lecho de asiento se compactará, si fuese necesario, hasta conseguir una base de apoyo firme en toda la longitud de la zanja y tendrá la debida pendiente, nunca inferior al cero con cinco por ciento (0,5%), salvo indicación en contra del Proyecto.

420.3.3.- **Colocación de la tubería.**

La colocación de la tubería no deberá iniciarse sin la previa autorización del Director de las Obras. Obtenida ésta, los tubos se tenderán en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

El tratamiento de las juntas y uniones de la tubería se ejecutará de acuerdo con el Proyecto, y las instrucciones del Director de las Obras.

420.3.4.- **Colocación del material drenante.**

Si la tubería se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenará, a uno y otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utilizó en su ejecución hasta llegar a cinco centímetros (5 cm) por debajo del nivel más bajo de las perforaciones, en caso de que se empleen tubos perforados, o hasta la altura que marque el Proyecto si se usan tubos con juntas abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitará estrictamente al lecho de asiento.

A partir de las alturas indicadas, se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras.

En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tubería la zanja se rellenará con material drenante. En el caso de una tubería de juntas abiertas dichas juntas deberán cerrarse en la zona de contacto con su lecho de asiento.

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante", de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.

En los casos en los que la subbase sea de menor permeabilidad que los filtros, se pospondrá la ejecución de las zanjas hasta después de refinada la subbase.

420.4.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Las zanjas drenantes se abonarán por metros (m) del tipo correspondiente, realmente ejecutadas, medidos en el terreno.

El precio incluye la ejecución de la zanja, su ubicación, preparación de la superficie, entibación y agotamiento en su caso, ejecución del lecho de asiento, suministro y colocación de la tubería, relleno de material drenante, compactación del material drenante, relleno de tierras en la parte superior de la zanja, impermeabilización de la zanja, lámina geotextil si la hubiera, ejecución de las juntas y todas las demás operaciones y medios necesarios para la completa y correcta ejecución de la unidad.

420.5.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias establecidas en este artículo podrá ser otorgado por los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

El alcance de la certificación en este caso, estará limitado a los materiales para los que tales Organismos posean la correspondiente acreditación.

Si los productos, a los que se refiere este artículo, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas que se exigen en este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté reconocido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

420.6.- **NORMAS DE REFERENCIA**.

- UNE 53365 Plásticos. Tubos de polietileno de alta densidad para uniones soldadas, usados para canalizaciones subterráneas, enterradas o no, empleadas para la evacuación y desagües. Características y métodos de ensayo.

- UNE 127010 EX Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión.

- UNE EN 1401-1 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U). Parte 1: especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

422.- GEOTEXTILES COMO ELEMENTOS DE SEPRACIÓN Y FILTRO.

422.1.- DEFINICIÓN Y CAMPO DE APLICACIÓN.

Son objeto de este artículo las aplicaciones de geotextiles, materiales definidos en el artículo 290, "Geotextiles" de este pliego o, en su defecto, del PG3, utilizados en obras de carretera con las funciones siguientes:

- a) Función separadora entre capas de diferente granulometría.
- b) Función de filtro en sistemas de drenaje.

422.2.- MATERIALES.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

El proyectista, o en su defecto el Director de las Obras, fijará las especificaciones adicionales a las indicadas en este artículo que deben cumplir los geotextiles que se utilicen en cada unidad de obra.

Los geotextiles estarán sometidos, en todo caso, a las prescripciones indicadas en el artículo 290, "Geotextiles" de este pliego o, en su defecto, del PG3, además por supuesto, de las indicadas en este artículo.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

422.2.1.- Criterios mecánicos.

Se define el parámetro "e", indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil hasta su rotura, como:

$$e(kN/m) = R_T(kN/m) \cdot e_r$$

donde:

- R_T = Resistencia a tracción (kN/m).
- e_r = Deformación unitaria en rotura (tanto por uno).

medidas conforme a UNE EN ISO 10319.

Se establecen unos grupos de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil según se indica en la tabla adjunta:

Grupo	e(kN/m) (valor mínimo)	R_T(kN/m) (valor mínimo)	R_{PD}(mm) (valor máximo)	Función del geotextil
0	6,4	16	20	Separación
1	4,8	12	25	
2	3,2	8	30	
3	2,4	6	35	
0	2,7	9	30	Filtro
1	2,1	7	35	
2	1,5	5	40	
3	1,2	4	45	

donde:

- R_T = Resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la dirección principal (de fabricación o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.
- R_{pd} = Resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. $e = R_T \cdot e_r$ anteriormente definido.

En función del tipo de tráfico de la carretera y del tipo de apoyo del geotextil se determina el grupo de requisitos resistentes mínimos a exigir al geotextil, de la siguiente forma:

- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 3 cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
  - El tráfico de la vía es de categoría T3 o inferior según la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de firme.
  - La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al 5% o superior a 85.º sexagesimales (geotextil como filtro en zanjas).
  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a cincuenta megapascales (E_{v2} > 50 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.
- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 2 cuando no siendo de aplicación al grupo de requisitos 3, se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
  - El tráfico de la vía es de categoría T2 o inferior.
  - La superficie de apoyo del geotextil tiene una inclinación inferior al 10% o superior a 75.º sexagesimales.
  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a treinta megapascales (Ev2 > 30 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.

- Se podrá utilizar el grupo de requisitos 1 cuando no siendo de aplicación el grupo de requisitos 2 se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
  - El tráfico de la vía es de categoría T1 o inferior.
  - El terreno sobre el que se apoya el geotextil tiene un módulo en el segundo ciclo del ensayo de placa de carga según NLT 357 superior a quince megapascales (Ev2 > 15 MPa), en condiciones de humedad y densidad representativas de su estado final en la obra.

- Se podrá utilizar, salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el grupo de requisitos 0 cuando no sean de aplicación ninguno de los grupos anteriores.

En todo caso se exige además que:

- La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de una vez y media (1,5) la resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma.
- La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del alargamiento en rotura sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma.

En todo lo anterior los valores indicados serán los exigidos en obra en los términos indicados en el artículo 290, "Geotextiles" de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

En particular, cuando se tome como referencia el catálogo por fabricante, los valores anteriores deberán ser mejorados por los valores de catálogo corregidos de su tolerancia y podrán ser comprobados mediante los procedimientos indicados en el mencionado artículo.

En todo caso el Proyecto o el Director de las Obras podrán especificar valores más exigentes que los hasta aquí establecidos si entienden que la obra, los materiales o los modos de ejecución así lo aconsejan. Podrá incluso exigir valores relativos a otros parámetros tales como resistencia al punzonamiento estático (CBR), según UNE EN ISO 12236 u otros que considere de interés.

Para la determinación de dichos requisitos los aspectos más importantes a tener en cuenta serán:

- Material sobre el que se asienta el geotextil, definido por:
  - Capacidad de soporte (Ev2 en placa de carga, CBR, etc.).
  - Heterogeneidad del material (granulometría, angulosidad, etc.).
  - Espesor de las capas superiores.

- Características del material que se dispone sobre el geotextil:
  - Granulometría y peso unitario.
  - Angulosidad.
  - Posibilidad de cortar o punzonar el geotextil.
  - Horizontalidad o inclinación de la superficie de apoyo.

- Cargas que actuarán sobre el geotextil:
  - En la fase de construcción:
    - Vertido.
    - Extendido.
    - Tráfico de obra (tipo de tráfico y maquinaria).
  - En la fase de explotación:
    - Proximidad a la superficie del firme.
    - Presiones actuantes sobre el geotextil.
    - Tipo e intensidad del control y vigilancia de la colocación del geotextil.

- Riesgo derivado de un mal funcionamiento del geotextil sobre la obra:
  - Coste de reparación.
  - Coste para el usuario.

422.2.2.- **Criterio de retención.**

La apertura eficaz de poros ($O_{90,W}$) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá cumplir las siguientes condiciones:

- $O_{90,W} > 0{,}05$ mm
- $O_{90,W} < 0{,}20$ mm
- $O_{90,W} < d_{90}$
- si $d_{40} < 0{,}06$ mm ; $O_{90,W} < 10 \cdot d_{50}$
- si $d_{40} \geq 0{,}06$ mm ; $O_{90,W} < 5 \cdot (d_{10} \cdot d_{60})^{1/2}$

siendo:

d_x = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger.

El Proyecto o el Director de las Obras podrán indicar condiciones más restrictivas si así lo consideran conveniente.

422.2.3.- **Criterio hidráulico.**

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad K_g), según UNE EN ISO 11058 respecto a la permeabilidad del material menos permeable (K_s) será la indicada a continuación, salvo indicación en contra del Proyecto o del Director de las Obras:

- a) Flujo unidireccional laminar: $K_g > 10\ K_s$
- b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): $K_g > 100\ K_s$

422.2.4.- **Criterio de durabilidad.**

En caso de utilización del geotextil en ambientes que puedan considerarse agresivos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, definirán el tipo de ensayo de durabilidad a realizar de entre los indicados en el apartado 290.2.1.3 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, así como el porcentaje de resistencia remanente respecto a la nominal que el geotextil debe mantener después de ser sometido al ensayo de durabilidad correspondiente.

En cuanto a la pérdida de características por su exposición a la intemperie se estará a lo indicado en el apartado 290.4 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

422.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

422.3.1.- **Colocación como capa separadora.**

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras.

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas.

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de las Obras, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos milímetros (200 mm).

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al solape de las capas de geotextil.

422.3.2.- **Colocación como filtro en sistema de drenaje.**

La colocación del geotextil se realizará empleando los medios auxiliares que autorice el Director de las Obras, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales.

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas.

El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra.

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin dañar el geotextil.

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc.

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas.

422.4.- **LIMITACIONES DE EJECUCIÓN.**

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 ºC.

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes.

422.5.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290, "Geotextiles" de este Pliego o, en su defecto, del PG3, comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 422.2 de este artículo, así como todas aquellas características que el Proyecto o en su defecto el Director de las Obras, pudiesen indicar.

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE ENV ISO 10722-1.

422.6.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Los geotextiles que se empleen con funciones separadoras o de filtro, se medirán y abonarán por metro cuadrado (m^2) de superficie recubierta o envuelta, quedando incluidos en este precio los solapes indicados en el Proyecto.

Se considerarán, asimismo, incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o grapado que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil, según determinen el Proyecto y el Director de las Obras.

El precio por metro cuadrado (m^2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra.

3.3.- HORMIGONES

600.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO.

600.1.- DEFINICIÓN.

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está sometido.

600.2.- MATERIALES.

Ver Artículo 240, "Barras lisas para hormigón armado".

Ver Artículo 241, "Barras corrugadas para hormigón armado".

Ver Artículo 242, "Mallas electrosoldadas".

600.3.- FORMA Y DIMENSIONES.

La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección superiores al cinco por Ciento (5 %).

600.4.- DOBLADO.

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la Tabla 600.1, siendo f_{ck} la resistencia característica del hormigón y f_y el límite elástico del acero, en kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm^2).

TABLA 600.1

	f_{ck}	125	150	175	200	225	250	300	>350
f_y									
2.200		6 Ø	5 Ø	5 Ø	5 Ø	5 Ø	5 Ø	5 Ø	5 Ø
4.200		10 Ø*	10 Ø	8 Ø	7 Ø	7 Ø	6 Ø	5 Ø	5 Ø
4.600		10 Ø*	11 Ø	9 Ø	8 Ø	7 Ø	7 Ø	6 Ø	5 Ø
5.000		10 Ø*	12 Ø	10 Ø	9 Ø	8 Ø	7 Ø	6 Ø	5 Ø

(*) SE LIMITA, EN EL CALCULO, EL VALOR DE F_Y , A 3 750 KP/CM^2.

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la Tabla 600.1 con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de fisuración.

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C).

En el caso del acero tipo AE22L, se admitirá el doblado en caliente, cuidando de no alcanzar la temperatura correspondiente al rojo cereza oscuro, aproximadamente ochocientos grados centígrados (800º C), y dejando luego enfriar lentamente las barras calentadas.

600.5.- **COLOCACION.**

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

La distancia horizontal libre entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:

- Un centímetro (1 cm).
- El diámetro de la mayor.
- Los seis quintos (6/5) del tamaño tal que el ochenta y cinco por ciento (85 %) del árido total sea inferior a ese tamaño.

La distancia vertical entre dos barras consecutivas, salvo que estén en contacto, será igual o superior al mayor de los dos valores siguientes:

- Un centímetro (1 cm).
- Setenta y cinco centésimas (0,75) del diámetro de la mayor.

En forjadas, vigas y elementos similares, se podrán colocar dos barras de la armadura principal en contacto, una sobre otra, siempre que sean corrugadas.

En soportes y otros elementos verticales, se podrán colocar dos o tres barras de la armadura principal en contacto, siempre que sean corrugadas.

La distancia libre entre cualquier punto de la superficie de una barra de armadura y el paramento más próximo de la pieza, será igual o superior al diámetro de dicha barra.

En las estructuras no expuestas a ambientes agresivos dicha distancia será además igual o superior a:

- Un centímetro (1 cm), si los paramentos de la pieza van a ir protegidos.
- Dos centímetros (2 cm), si los paramentos de la pieza van a estar expuestos a la intemperie, a condensaciones o en contacto permanente con el agua.
- Dos centímetros (2 cm) en las partes curvas de las barras.

Los empalmes y solapes deberán venir expresamente indicados en los Planos, o en caso contrario se dispondrán de acuerdo con las órdenes del Director de las Obras.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación por escrito de las armaduras colocadas.

600.6.- **CONTROL DE CALIDAD.**

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la instrucción EH-73. Los niveles de control de calidad, de acuerdo con lo previsto en la citada Instrucción, serán los indicados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la zona inferior derecha de cada Plano.

600.7.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos.

Salvo indicación expresa del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el del kilogramo (kg) de armadura.

610.- **HORMIGONES.**

610.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya, así como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo.

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo dispuesto en los correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales.

610.2.- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95 y posteriormente en el R.D. 542/2020), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/166 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los siguientes artículos de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, del PG3:

- Artículo 212, Cementos.
- Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.
- Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.
- Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 30 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las especificaciones recogidas en la citada Instrucción.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos previstos en el artículo 56 del vigente " Código Estructural " o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado.

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por el Director de las Obras.

El Contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en este artículo, así como de todas aquéllas que pudieran establecerse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

610.3.- **TIPOS DE HORMIGON Y DISTINTIVOS DE LA CALIDAD.**

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, cuando sea necesario, las características especiales que deba reunir el hormigón, así como las garantías y datos que deba aportar el Contratista antes de comenzar su utilización.

610.4.- **DOSIFICACION DEL HORMIGON.**

La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas (diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, dimensiones de las piezas, etc).

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad establecida en el artículo 43 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

610.5.- **ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO.**

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las Obras haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y característicos.

La fórmula de trabajo constará al menos:

- Tipificación del hormigón.
- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla.
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (Kg/m^3).
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua.
- Dosificación de adiciones.
- Dosificación de aditivos.
- Tipo y clase de cemento.
- Consistencia de la mezcla.
- Proceso de mezclado y amasado.

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.
- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla.
- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.
- Cambio en el tamaño máximo del árido.
- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido fino.
- Variación del procedimiento de puesta en obra.

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo justificación especial.

Salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indique otro procedimiento, la consistencia se determinará con cono de Abrams según la norma UNE EN 12350-2. Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias serán los indicados en el apartado 33.5 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

610.6.- **EJECUCIÓN.**

610.6.1.- **Fabricación y transporte del hormigón.**

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del artículo 51.4 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en obra.

610.6.2.- **Entrega del hormigón.**

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o fase de un elemento estructural.

Se cumplirán las prescripciones indicadas en el apartado 51.4 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

610.6.3.- **Vertido del hormigón.**

Se cumplirán las prescripciones del artículo 52.1 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la vigente "Código Estructural " o normativa que la sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura.

El Director de las Obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva.
Asimismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el Contratista deberán ser aprobados por el Director de las Obras antes de su utilización.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de vertido sobre armaduras o encofrados.

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados en los planos.

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada descarga sea superior aun quinto de metro cúbico (0,2 m^3), que se elimine todo rebote excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras.

En el caso de hormigón pretensado, no se verterá el hormigón directamente sobre las vainas para evitar su posible desplazamiento. Si se trata de hormigonar una dovela sobre un carro de avance o un tramo continuo sobre una cimbra autoportante, se seguirá un proceso de vertido tal que se inicie el hormigonado por el extremo más alejado del elemento previamente hormigonado, y de este modo se hayan producido la mayor parte de las deformaciones del carro o autocimbra en el momento en que se hormigone la junta.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado.

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado.

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los elementos verticales haya asentado definitivamente.

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, sin contar los mampuestos.

610.6.4.- **Compactación del hormigón.**

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 52.4 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará los casos y elementos en los cuales se permitirá la compactación por apisonado o picado.

El Director de las Obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las tongadas de hormigón, así como la secuencia, distancia y forma de introducción y retirada de los vibradores.

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie.

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida.

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores.

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s).

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma que la aguja no toque las armaduras.

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista.

En el caso del hormigón pretensado la compactación se efectuará siempre mediante vibrado. Se pondrá el máximo cuidado en que los vibradores no toquen las vainas para evitar su desplazamiento o su rotura y consiguiente obstrucción. Durante el vertido y compactado del hormigón alrededor de los anclajes, deberá cuidarse de que la compactación sea eficaz, para que no se formen huecos ni coqueras y todos los elementos del anclaje queden bien recubiertos y protegidos.

610.6.5.- **Hormigonado en condiciones especiales.**

610.6.5.1.- HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 52.3.1 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede descender por debajo de los cero grados Celsius (0 °C). A estos efectos, el hecho de que la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a cuatro grados Celsius (4 °C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el límite prescrito será alcanzado en el citado plazo.

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3 °C) cuando se trate de elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1°C), la de la masa dé hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5 °C), y no se vierta el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0 °C).

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento portland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5 °C); y, además, la temperatura de la superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5 °C).

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director de las Obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.

En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las Obras, se hormigone en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40 °C), añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de grumos.

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las resistencias alcanzadas adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director de las Obras.

610.6.5.2.- HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 52.3.2 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

Los sistemas propuestos por el Contratista para reducir la temperatura de la masa de hormigón deberán ser aprobados el Director de las Obras previamente a su utilización.

610.6.5.3.- HORMIGONADO EN TIEMPO LLUVIOSO.

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá, toldos u otros medios que protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigón fresco.

El Director de las Obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de tiempo lluvioso. Asimismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no existe garantía de que el proceso se realice correctamente.

610.6.6.- **Juntas.**

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al hormigonado.

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que no aparezcan en los Planos.

Se cumplirán las prescripciones del artículo 52.4 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de la junta presenta una mala orientación, se demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección apropiada.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan hormigonar correctamente.

Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido suelto y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la compactación en las proximidades de la junta.

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del Director de las Obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el tratamiento de las mismas.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará, en su caso, de forma expresa, los casos y elementos en los que se permitirá el empleo de otras técnicas para la ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los métodos tradicionales.

610.6.7.- **Curado del hormigón.**

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que, al efecto, fije el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto, el que resulte de aplicar las indicaciones del artículo 52.5 del vigente "Código Estructural " o normativa que la sustituya.

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón.

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 $l/m^2/h$).

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius (40 °C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d).

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, momento en el cual se comenzará a curar el hormigón.

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados Celsius (75 °C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte grados Celsius por hora (20°C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de acuerdo con el tipo de cemento utilizado.

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas en el artículo 285 de este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o, en su defecto, del PG3, "Productos filmógenos de curado".

La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u otro material, salvo que! se demuestre que el producto de curado no perjudica la adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de adherencia.

El Director de las Obras autorizará en su caso la utilización de técnicas especiales de curado, que se aplicarán de acuerda a las normas de buena práctica de dichas técnicas.

El Director de las Obras dará la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como el procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este apartado.

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las Obras podrá exigir la colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado.

610.7.- **CONTROL DE CALIDAD.**

No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este artículo.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se indicarán expresamente los niveles de control de calidad de los elementos de hormigón, los cuales se reflejarán además en cada Plano. Asimismo, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se establecerá un Plan de Control de la ejecución en el que figuren los lotes en que queda dividida la obra, indicando para cada uno de ellos los distintos aspectos que serán objeto de control.

610.8.- **ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.**

610.8.1.- **Tolerancias.**

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecerá un sistema de tolerancias, así como las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos.

A falta de indicaciones concretas para algunas desviaciones específicas, el Director de las Obras podrá fijar los límites admisibles correspondientes.

610.8.2.- **Reparacion de defectos.**

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al Director de las Obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible.

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

610.9.- **RECEPCIÓN.**

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.

610.10.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m^3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas.

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y acabado.

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá definir otras unidades de medición y abono distintas del metro cúbico (m^3) de hormigón que aparece en el articulado, tales como metro (m) de viga, metro cuadrado (m^2) de losa, etc, en cuyo caso el hormigón se medirá y abonará de acuerdo con dichas unidades.

610.11.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

A efectos del. reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

610.12.- **NORMAS DE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 610.**

UNE 88 313 Ensayos de hormigón. Medida de la consistencia del hormigón fresco. Método del cono de Abrams.

680.- **ENCOFRADOS Y MOLDES.**

Se cumplirán las prescripciones del artículo 48 del vigente "Código Estructural" o normativa que la sustituya.

680.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón.

Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación.

680.2.- **EJECUCIÓN.**

La ejecución incluye las operaciones siguientes:

- Construcción y montaje.
- Desencofrado.

680.2.1.- **Construcción y montaje.**

Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanción, a juicio del Director de las obras.

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su período de endurecimiento; así como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm).

La superficie encofrante que estará en contacto directo con el hormigón, tanto en los encofrados como en los moldes, deberá ser capaz de mantener las características necesarias para que los elementos de hormigón estructural reproduzcan adecuadamente la geometría prevista para ellos en el proyecto, así como para dotar a las caras vistas de dichos elementos de la textura y la uniformidad especificada, en su caso, en dicho proyecto.

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera concavidad en el intradós.

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, serán cuidadosamente rectificados y limpiados.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podrá autorizar, sin embargo, la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas.

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquéllos no presenten defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de más de cinco milímetros (5 mm) de altura.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón; y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigón; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado; para lo cual se podrá autorizar el empleo de una selladura adecuada.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Director la aprobación escrita del encofrado realizado.

En el caso de obras de hormigón pretensado, se pondrá especial cuidado en la rigidez de los encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente normales a los anclajes. Se comprobará que los encofrados y moldes las deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribución de cargas, que se origina durante el tesado de las armaduras y la transmisión del esfuerzo de pretensado al hormigón. Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los elementos que en ellos se construyan.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m), y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

Los encofrados perdidos deberán tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su interior lechada de cemento. Habrán de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se pondrá especial cuidado en evitar su flotación en el interior de la masa de hormigón fresco.
En el caso de prefabricación de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y arriostrados entre sí, para impedir movimientos relativos durante la fabricación, que pudiesen modificar los recubrimientos de las armaduras activas, y consiguientemente las características resistentes de las piezas en ellos fabricadas.

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos casos será necesario prever respiraderos.

Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcción, como es el caso de un tablero continuo construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma se hará

mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras pasivas y de las vainas de pretensado.

En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a consecuencia de los cuales sus características geométricas hayan variado respecto a las primitivas, no podrán forzarse para hacerles recuperar su forma correcta.

Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deberán estar aprobados por el Director. Como norma general, se emplearán barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. En su aplicación deberá evitarse que escurran por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deberán impedir la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, en especial cuando se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para trabajar solidariamente.

680.2.2.- **Desencofrado.**

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podrá efectuarse a los tres días (3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no deberán retirarse antes de los siete días (7 d), con las mismas salvedades apuntadas anteriormente.

El Director podrá reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos días (2 d) o a cuatro días (4 d), cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido.

El desencofrado deberá realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormigón, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

En el caso de obras de hormigón pretensado. se seguirán además las siguientes prescripciones:

Antes de la operación de tesado se retirarán los costeros de los encofrados y, en general, cualquier elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que actúen los esfuerzos de pretensado con el mínimo de coacciones.

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del paramento.

680.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m^2) de superficie de hormigón medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

3.4.- SANEAMIENTO

3.4.1.- TUBOS.

902.- TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO, CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA.

Los tubos de hormigón armado para colectores cumplirán como mínimo las especificaciones de la norma ASTM C76M-88 para el tipo y clase de tubería definidas en proyecto.

Se realizarán con cemento antiselenitoso.

Para el cálculo de la carga equivalente a unas determinadas condiciones reales de trabajo se adopta el método americano definido en el "Concrete pipe Hand book", definiéndose la clase de la tubería para soportar la carga que provoque como máximo una fisura de 0'25 mm.

Las cargas de figuración y rotura serán las establecidas en la citada Norma, según el siguiente detalle: **Clase**	**Carga fisuración t/m²**	**Carga rotura t/m²**
II	5,0	7,5
III	6,5	10,0
IV	10,0	15,0
V	14,0	17,5

Las tolerancias de dimensiones de los tubos (diámetro, longitud, espesor, etc.) y tolerancias en la situación de las armaduras serán las indicadas en la Norma ASTM C76M-88 y se adoptarán los criterios de aceptación o rechazo en ella establecidos.

Los tubos se deberán unir mediante juntas elásticas que aseguren la estanqueidad tanto a la presión exterior que pueda producirse por atascos como a la exterior que originen las aguas freáticas. Deberán permitir igualmente una cierta desviación angular.

El detalle del Proyecto de la junta, tanto en lo que respecta a los extremos de los tubos como a la goma, se considera que es un cometido del fabricante, si bien la Administración exigirá garantías que aseguren el correcto funcionamiento de la tubería.

En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente:

- Que se asegure la estanqueidad.

- Que se mantengan las características de estanqueidad, sin que el peso del tubo produzca deformaciones que la puedan alterar.

- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que estará sometida.

- Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas e industriales, debiendo facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles.

- Los tubos serán de la longitud que estime conveniente el fabricante, si bien se considera conveniente adoptar un valor máximo de 3 m.. y un mínimo de 2 m.

- Se exigirá una total estanqueidad, no admitiendo tubos en los que se produzcan goteos. En caso de que el sistema de fabricación pueda dar lugar a porosidades que impliquen goteos en la zona de la campana y que ello se haya puesto de manifiesto en las pruebas de estanqueidad, la Administración podrá exigir que el interior de la campana y la longitud que se precise sea pintada con una pintura epoxi que se adhiera al hormigón y pueda conseguir la estanqueidad. Esta pintura también podrá ser exigida para mejorar las condiciones de asiento de la goma cuando el sistema de fabricación implique que se produzcan irregularidades en la zona de apoyo de la goma, que den lugar a faltas de estanqueidad en el ensayo de presión.

903.- **PRUEBAS DE LOS TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO.**

Los tubos de hormigón fabricados según las especificaciones mínimas indicadas en apartados anteriores deberán cumplir las condiciones establecidas en la Norma ASTM C76M-88, para tubos de hormigón armado y la C14M-81 para tubos de hormigón en masa, según el detalle siguiente:

Pruebas de resistencia a cargas ovalizantes.

R1M Para tubo de hormigón en masa, prueba no destructiva sometiendo el tubo al 80% de la carga de rotura.

R2M Para tubo de hormigón en masa, prueba destructiva sometiendo el tubo a una carga tal que produzca la rotura.

R1A Para tubo de hormigón armado, no se debe producir fisuración o en todo caso la anchura de las fisuras deberá ser menor de 0'25 mm. para la carga en el ensayo de tres aristas, indicada para cada clase de tubo en la Norma ASTM.

R2A No se debe producir la rotura de la carga indicada para cada clase de tubo en la Norma ASTM, realizándose el ensayo según lo indicado en la Norma ASTM C497-81.

Prueba de presión hidráulica ó de Estanqueidad (E)

Las pruebas de presión hidráulica tienen por objeto comprobar la estanqueidad de los tubos y de las uniones.

Se mantendrá una presión de 1kg/cm^2 durante un tiempo de 20 minutos, no debiendo producirse goteos ni a través de las juntas ni a través de las paredes del tubo. Se admitirán manchas de humedad siempre que no den lugar a goteos. Este tiempo de 20 minutos puede irse reduciendo en función de los resultados obtenidos, hasta llegar a un mínimo de 3 minutos.

Prueba de absorción.

Se realizarán pruebas de absorción de hormigón de las paredes del tubo según el Método A de la Norma C497M-81 siendo el máximo admisible del 6% del peso en seco, en vez del 9% admitido en la Norma ASTM C76M-88. Las pruebas se realizarán con varias probetas del tubo, que se elegirán de modo que sean representativas de partes del tubo que, por razones de fabricación, puedan ser diferentes y en cualquier caso una del cuerpo y otra de la zona de la campana.

Criterios de aceptación o rechazo.

Serán rechazados todos aquellos tubos en los que puedan apreciarse directamente defectos de:

- Fisuras de anchura igual o superior a 0'25 mm. en una longitud superior a 10 cm.
- Dimensiones con desviaciones superiores a las tolerancias admitidas.
- Daños producidos por golpes u otras causas que puedan poner en peligro la estanqueidad o reducir la resistencia.
- Defectos que indiquen deficiencias de dosificación o amasado, o vibrado del hormigón.
- Con los tubos que no presenten defectos visibles se prepararán lotes para la recepción efectuándose un control estadístico en base a muestras aleatorias en las que se efectuarán los ensayos R1M ó R2M, R1A. R2A, E y AA según el caso, descritos en el apartado anterior.

El número de tubos a ensayar será :

ENSAYO	NOMENCLATURA	MUESTRA	MINIMO
Fisuración Controlada	R1A	2 por ciento	1
Rotura Armado	R2A	1 por mil	-
80 % Rotura Masa	R1M	--	-
Rotura Masa	R2M	5 por mil	1
Estanqueidad	E	5 por ciento	3
Posición Armad.	AA	2 por mil	1

Debiendo para recibir el lote, ser satisfactorios todos los ensayos. En caso de que alguno no lo sea se repetirá el ensayo con dos nuevos tubos del mismo lote. Se recibirá el lote si todos estos nuevos ensayo son correctos, de no serlo se rechazará el lote.

Si los resultados de los ensayos de resistencia R1A ó R1M y de presión hidráulica P no fuesen satisfactorios, el fabricante podrá proponer a la Dirección Facultativa la prueba de todos los tubos aceptándose individualmente aquéllos que alcancen resultados correctos. La Dirección Facultativa, a la vista de las circunstancias del caso, decidirá si las pruebas se refieren a los ensayos de resistencia, de presión o a ambos.

En caso de que en la prueba de presión se produzcan goteos que pueda pensarse se solucionen con una adecuada pintura interior, el fabricante podrá proponer realizarla a su costa y repetir las pruebas de presión que si, en estas condiciones dan resultados favorables, pueden implicar la exigencia de pintar todos los tubos sin que ellos de lugar a aumento de precio.

De los tubos que se hayan sometido a rotura y de aquéllos que no puedan ser admisibles para su utilización se efectuarán ensayos de absorción A.

Los resultados de la absorción deben ser satisfactorios en todas las muestras.

En caso de que los resultados sean correctos se entenderá que el sistema de fabricación es adecuado y podrá iniciarse la producción de los tubos contratados.

En caso de que algún o algunos tubos no alcancen los resultados exigidos en una o varias de las pruebas, la Dirección de obra resolverá, a su juicio, si procede repetir el ensayo con otro lote o rescindir la contratación con pérdida de la fianza. Si se repitiesen los ensayos y el resultado fuese desfavorable se desechará ese material.

Los ensayos se realizarán en algún laboratorio especializado elegido por la Dirección de obra, siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes, pero se deducirán de las certificaciones los gastos ocasionados por los ensayos de lotes que no hayan sido aceptados, o los producidos por la repetición de muestras ensayadas.

Medios para las pruebas de los tubos y gastos ocasionados.

El fabricante deberá tener instalados los medios para la realización de las pruebas, y concretamente:

- Prensa para rotura de tubos de ensayo de tres aristas.
- Prensa para prueba de tubos a presión o sistema de llenado de lotes de tubos con un caudal mínimo que asegure el llenado de 50 tubos en un tiempo máximo de una hora.

Los ensayos de absorción serán realizados en algún laboratorio especializado elegido por la Dirección de obra, siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes.

El Contratista avisará a la Dirección Facultativa cuando vaya a recibir el primer lote, para que sea dado el Visto Bueno.

904.- JUNTAS ELÁSTICAS DE UNIÓN ENTRE TUBOS DE HORMIGÓN.

En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente:

- Que se asegure la estanqueidad.
- Que se mantengan las características de estanqueidad, sin que el peso del tubo produzca deformaciones que puedan alterarla.
- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que estará sometida.
- Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas o mezcla de domésticas e industriales, debiendo facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles.

A estos efectos se exigirán los siguientes resultados mínimos basados en lo indicado en la Norma ASTM C443 y en los criterios establecidos por la región de Lieja y que son los siguientes:

- Carga de rotura mínima …….....	85 kg/cm^2.
- Alargamiento mínimo rotura …….....	350%.
- Dureza Shore A …….....	Entre 40 y 50.
- Compresión Set max., en % de la deformación realizada …….....	15%.

Envejecimiento acelerado:

- Pérdida máx. de tensión de rotura …….....	15%
- Reduc. máx. de alargamiento en rotura ……	20%
- Absorción máx. de agua en peso …….....	10%
- Resistencia al ozono …….....	Sin ataque según método ASTM-D-1149

Resistencia a los hidrocarburos:

- Pérdida máx. de tensión de rotura ……	15%
- Reducción máx. de alarg. en rotura ..……....	15%

PRUEBAS DE LAS JUNTAS

- *G.G. Prueba de las juntas de goma*.

Previamente a la fabricación en serie de las gomas se realizarán los ensayos necesarios para tener la seguridad de que la composición de la mezcla y el sistema de fabricación aseguran los resultados exigidos.

Las técnicas de ensayo serán:

Carga de alargamiento de rotura	ASTM D 412
Dureza	ASTM D 2240 con excepción de la sec.5
Compresión Set	ASTM D 395
Envejecimiento acelerado	ASTM D 573 con pruebas de 96 horas a 70º C
Absorción de agua	ASTM D 471
Resistencia al ozono-Método A de	ASTM D 1171
Resistencia a los Hidrocarburos	Las probetas para los ensayos de rotura deberán estar sumergidas durante 72 horas en aceite ASTM III a 20º.
Estructura interior	Se seccionará longitudinalmente la junta en dos mitades, comprobándose que no existen poros ni rechupes.

- *El proyecto de las gomas GP*

Se comprobará mediante las pruebas de presión de los tubos, observando que sean fáciles de introducir y que aseguren y mantengan las condiciones de estanqueidad.

- *Criterios de aceptación y rechazo de las gomas*.

Estas se comprobarán en lotes correspondientes a la misma fabricación. La Dirección Facultativa efectuará los ensayos pertinentes en Laboratorios especializados sobre un 2% del número de unidades del lote, exigiéndose que todos los ensayos (como mínimo los indicados en la Norma ASTM C443) sean satisfactorios. En caso de que algún resultado no sea correcto se repetirá con dos nuevas unidades, por cada valor defectuoso, aceptándose el lote únicamente si todos los nuevos ensayos son satisfactorios.

La composición de las gomas deberá asegurar que se consigan todos los valores indicados en el apartado correspondiente que tienen el carácter de mínimos.

Las dimensiones serán las propuestas por el fabricante y aceptadas por la Dirección Facultativa, estableciéndose para ellas las tolerancias admitidas en la Norma ASTM C443 y en los criterios establecidos para abastecimiento por la Administración.

Para la recepción de las gomas la Dirección Facultativa decidirá el tamaño de los lotes, ensayándose el 1% con un mínimo de 2 muestras, rechazándose el lote si alguna de ellas no alcanza los mínimos exigidos. El lote rechazado quedará a disposición de la Administración hasta la terminación de la recepción del suministro, en cuyo momento se devolverá al concursante. Si a juicio de la Dirección Facultativa pudiera estimarse que una o las dos juntas seleccionadas para las pruebas no fueran representativas del lote se repetirá el ensayo, rechazándose si en una o en las dos no se alcanzan todos los valores mínimos exigidos.

905.- **PIEZAS PARA SUSTITUCIÓN DE TUBOS.**

Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o durante el servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en:

- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso.
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso.
- Manguito para unión de los dos extremos lisos.

Los medios tubos, una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos lindantes, quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito.

El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que se consiga la estanqueidad al atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular o acero inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se aprisionen contra los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8.

906.- **TUBERÍAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO.**

Los tubos de P.V.C. serán según la norma UNE EN 1401-SN4 de la serie 5 (color teja) y el fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad.

Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m. y el sistema de unión entre ellos será de campana y junta de goma.

A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se comprobarán los parámetros que se detallan a continuación, indicando los valores exigidos en la citada Norma ASTM D1784 y los métodos de ensayo correspondientes.

PARÁMETRO	VALOR EXIGIDO	NORMA ENSAYO
Resistencia al impacto	34'7 J/m	ASTM-D256, Método A
Tensión mínima de tracción	48'3 Mpa	ASTM-D638 con probetas tipo I
Temperatura de deformación	70	AS TM-D648

Estos ensayos serán realizados en un laboratorio aceptado por la Dirección de obra.

Las gomas de unión entre tubos deberán cumplir las mismas características que las exigidas para los tubos de hormigón.

907.- **PIEZAS DE P.V.C. PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO.**

Cuando así se exija en Planos o Memoria, deberán colocarse piezas especiales de P.V.C. o de Polipropileno en las conducciones de saneamiento.

Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas. En cualquier caso serán de la Serie 5, color teja, y salvo disposición en contra serán fundidas en una sola pieza.

En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura, deberán ser admitidas y aprobadas por la Dirección de Obra. Todas las piezas serán de los diámetros exigidos en planos, así como sus ángulos correspondientes, y contarán con las embocaduras y junta de goma necesarias.

Para las piezas abrazaderas de acometidas, éstas deberán contar con la plancha de goma y flejes de apriete que garanticen su estanqueidad con la tubería principal, o bien con la cola de unión que sustituya al sistema anterior cuando sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá exactitud entre el diámetro exterior del tubo a acometer y el interior de la pieza de abrazadera.

3.4.2.- PIEZAS.

920.- REGISTROS PREFABRICADOS.

920.1.- CRITERIOS DEL PROYECTO.

Los registros se fabricarán en base a los siguientes criterios de diseño :

- Se ajustarán a la Norma ASTM C478 en cuanto a criterios generales (espesores, cuantías, resistencia y dosificación de cemento etc.).
- Los condicionamientos impuestos por la utilización de gomas para la unión con los tubos (diámetro interior del registro y del agujero, espesores de pared del registro, etc).
- Utilización de gomas que aseguren la estanqueidad entre los diferentes elementos de cada registro.

920.2.- ELEMENTOS QUE COMPONEN EL REGISTRO.

Estarán constituidos por los siguientes elementos:

A. MÓDULO BASE

Tendrán diámetros interiores de 1000, 1200 y 1500 mm según correspondan a tuberías hasta 400, 500 a 700 y 800 respectivamente.

La unión con los tubos se realizará colocando una goma entre el tubo y el agujero que al efecto se ha previsto en la fabricación del registro. La situación de los agujeros, en cada registro, se ajustará a los datos del replanteo de modo que todos los tubos, tanto de colectores como de acometidas se conecten a los registros con este sistema. La definición de los agujeros deberá tener una desviación máxima de 5 Q sobre la definición del replanteo.

El hormigón empleado en la fabricación de los módulos base tendrá una dosificación mínima de 350 Kg. de cemento por metro cúbico de hormigón. Su resistencia característica será superior a 280 Kg/cm^2 y su absorción inferior al 6 %. Deberá realizarse un sistema de curado que evite totalmente la formación de fisuras.

Los módulos base estarán armados con las armaduras reflejadas en los planos y que corresponden a los especificados en la Norma ASTM C 478. EL acero utilizado podrá ser AEH-400 o AEH- 500. La posición de las armaduras deberá cuidarse de modo que el recubrimiento mínimo sea de 25 mm.

Para asegurar la estanqueidad en la unión de los tubos con el módulo base se dispondrá una goma Forsheda 910 o similar. Deberá ser de caucho sintético SBR de dureza 40 + 5º IHR ajustada a la norma DIN 4060. El diámetro del agujero se proyectará de modo que al introducirse el tubo la goma se comprima lo suficiente para asegurar la estanqueidad. Al definir las dimensiones deberá atenerse a las especificaciones del fabricante de gomas.

La superficie cilíndrica de asiento de la goma deberá tener la longitud suficiente para el apoyo de está. Para ello, de ser necesario, se podrá modificar la superficie cilíndrica exterior del registro.

La terminación superior del módulo tendrá la forma y dimensiones adecuadas para la colocación de una goma Forsheda 114 o similar. Deberá ser de caucho sintético SER de dureza 40 + 5º IHR ajustada a la Norma DIN 4060. A fin de facilitar el deslizamiento durante la colocación deberá tener el correspondiente lubricante.

El manejo de los módulos base deberá realizarse con sirgas de nylon o, en caso de ser de acero, colocadas exteriormente, de modo que no se dañen los asientos de las gomas.

El precio de los módulos base incluye la fabricación, suministro, transporte y colocación, así como la preparación del asiento en el terreno. También incluye la ejecución de las cunas que aseguren la continuidad hidráulica y la parte proporcional de pruebas. En los registros de diámetro ~ 1500 incluye la losa de transición a 1000. En todos los casos incluye el Suministro de todas las gomas necesarias para la conexión a los tubos que inciden así como la precisa para la unión con el módulo superior.

B. MODULOS INTERMEDIOS

Serán de 30, 60 y 90 cm de altura. Su diámetro interior será de ~ 1000 y 1200 mm. Tendrán las terminaciones adecuadas para la colocación, arriba y abajo de las gomas Forsheda 114 indicadas para los módulos base. Se fabricarán con los mismos criterios de armaduras, cuantías, dosificación, resistencia etc establecidos para los módulos base. Su manejo se realizará con los mismos sistemas que los módulos base.

El precio de cada módulo intermedio incluye el suministro de la goma de conexión con el elemento superior. También incluye la fabricación, transporte, descargas, colocación y parte proporcional de pruebas.

El precio será por metro lineal.

C. CONOS

Serán excéntricos de modo que exista una generatriz vertical en toda la altura del registro. Serán de dimensiones 1000/600 y 1200/600. En su fabricación, transporte y montaje serán de aplicación las especificaciones establecidas para los módulos base. La parte inferior estará fabricada de modo que se conecten con el módulo inferior utilizando una junta Forsheda 114. La parte superior será plana de modo que sobre ella se disponga el marco de la tapa de fundición.

El precio incluye la fabricación, transporte, descarga, colocación así como el recrecido que pueda necesitarse para que la tapa quede situada en la cota precisa de la calzada o acera, y será por unidad.

D. LOSAS

En caso de no caber el cono, se incluirá una losa prefabricada que se medirá por unidad totalmente colocada.

E. PRUEBAS EN OBRA

Se realizará una inspección visual rechazándose todos los elementos que tengan daños en los asientos de las gomas, salvo que el contratista los repare con resinas que tengan la aceptación de la Dirección..

Igualmente se rechazarán los elementos en los que las armaduras no tengan los recubrimientos exigidos.

Se realizarán pruebas de estanqueidad de la red de colectores bien por tramos completos o bien por registros unitarios, no admitiéndose , en este último caso, ninguna perdida de agua en un tiempo de 15 minutos.

921.- **REGISTROS Y OBRAS DE FÁBRICA "IN SITU"**.

Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los planos para cada uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los materiales que los componen.

Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos de acero o módulos de pozo, éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de elementos.

Las juntas de los tubos con estas obras de fábrica en que por sus características no sea posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el hueco existente entre el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo de primera calidad y marca acreditada. El hueco a rellenar con dicho mortero será de tres centímetros (3 cm.) de espesor a todo lo largo y ancho del perímetro de unión. Cuando la tubería sea de abastecimiento se efectuará un sellado exterior e interior a base de mastic bituminoso en todo el perímetro de la junta.

922.- **JUNTAS DE ESTANQUEIDAD ENTRE POZO O ARQUETA Y TUBOS.**

Las uniones del registro con los tubos deberán ser estancos, definiéndose los dos modelos siguientes:

- De gran elasticidad, ajustada a la Norma ASTM C923-79, que deberá permitir desviaciones de al menos 7 grados manteniendo las condiciones de estanqueidad. Constará de un elemento cónico que se presionará contra la pared del registro con un aro de aluminio o acero inoxidable AISI 304 con articulaciones que aseguren la posición definitiva y con una abrazadera de acero inoxidable AISI-304 que presione la goma contra el tubo. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Propiedad, que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto.

- De pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros superiores a 500 mm. y de 4 grados en inferiores. Constará de una pieza de goma con la superficie exterior lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de modo suficiente para que consiga estanqueidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Propiedad que exigirá justificación de experiencia satisfactorias del modelo propuesta. La utilización de un tipo u otro será decidida por el Ingeniero Director a la vista de las condiciones de apoyo.

923.- **ELEMENTOS PASAMUROS DE P.V.C. PARA TUBERÍA DE SANEAMIENTO.**

Son manguitos de P.V.C. con un bulbo perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanqueidad con el tubo que en él se embute y sirve, simultáneamente, de resalto del pasamuros. El exterior de este manguito debe presentar una superficie claramente rugosa y granular. Su procedencia será de casa acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Módulos cilíndricos y cónicos. Cumplirán lo preceptuado en la normativa de la Mancomunidad que corresponda.

El precio va incluido en los precios de Tubos y Pozos de Registro.

924.- **MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO.**

Los marcos y tapas de registro serán en todo caso como de fundición nodular, y de las dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

Las tapas serán abatibles, tipo REXEL.

Para accesos a registros y arquetas se utilizarán tapas circulares de paso libre 600 mm, y que cumplan las características del tipo D400 según la Norma EN124, es decir que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 40 Ts., y deberán ser articulados.

Los marcos deberán tener un mínimo de 4 taladros para facilitar un anclaje a la boca del cono de pozo.

925.- **PATES TREPADORES.**

Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, serán los homologados por la mancomunidad de aguas de gestión en la zona, admitiéndose de Polipropileno reforzado, Aluminio con taco de polipropileno, o Fundición nodular con revestimiento epoxídico.

La colocación de los pates trapadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso la Dirección de Obra.

En el caso de utilizarse pates de fundición, éstos se introducirán en un orificio más holgado y se anclarán mediante la utilización de resinas epoxídicas o morteros de ligera expansión.

Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como horizontalmente dentro del pozo de registro.

La separación entre pates será de 30 cm, colocando el primero de ellos a 50 cm del acceso al pozo de registro.

La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate.

Las pruebas a someter a los pates colocados serán las siguientes:

- Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en los registros.
- La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 400 kg no permitiéndose arracamientos ni movimientos de éstos.
- La presión vertical mínima a la que se someterán será de 200 kg, no permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores.
- Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está incluido en los precios de colocación.

3.5.- ABASTECIMIENTO

3.5.1.-TUBOS.

940.- **TUBOS PARA LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.**

Para todo lo relacionado con los tubos para la red de abastecimiento de agua se estará a lo que dispone el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del Ministerio de Obras Públicas (B.O.E. del 2 y 3 de Octubre de 1.974).

941.- **TUBOS DE FUNDICIÓN NODULAR.**

a) Marcado.

Todos los tubos llevarán las siguientes marcas distintivas, realizadas, por cualquier procedimiento que aseguren su procedencia:

1ª- Marca de fábrica.

2ª- Diámetro interior en milímetros.

3ª- Presión de timbraje en atmósferas (se entiende por presión de timbraje la marcada como de prueba por el fabricante).

b) Pruebas de fábrica y control de fabricación.

El suministro de los tubos será controlado por la Administración, durante el periodo de su fabricación, por lo que podrá nombrar a un agente delegado que asista durante este período a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos, de acuerdo con sus características comprobándose dimensiones y pesos.

c) Entrega y Transporte.

Los tubos que hayan sufrido averías durante el transporte o presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazados. La Administración tendrá además la facultad de ordenar en cualquier momento la repetición en obra de las pruebas realizadas en fábrica; el Contratista, avisado por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas y los resultados obtenidos anularán los de la primera. En este caso, los tubos marcados como defectuosos, deberán ser retirados de obra por el Contratista y sustituidos por otros que reúnan condiciones, en los plazos señalados por la Dirección de la obra.

Cuando un tubo no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si una de estas pruebas también falla, se rechazará el lote ensayado.

Los tubos que se van a utilizar para la red de abastecimiento serán en general de fundición nodular.

Serán de aplicación las especificaciones aprobadas por la mancomunidad de agua de la zona, relativo a Redes de Abastecimiento, y en este caso concreto sobre **Tuberías de fundición nodular.**

Especificaciones.

Tubería de fundición nodular, fabricada según Norma ISO 2531, revestida interiormente con mortero de cemento según Norma ISO 4179 y tratamiento exterior con una capa metálica de cinc de aluminio y otra exterior tapaporos epoxi azul. Longitud útil de la tubería: 6 m.

La tubería que se usa para saneamiento deberá poseer un revestimiento exterior de zinc metálico recubierto de pintura epoxi. Los accesorios estarán revestidos de epoxi rojo. La cantidad mínima de cinc proyectado deberá ser de 200 gr/m^2.

Selección de la tubería.

Para los diámetros comprendidos entre D 80 y 600 mm. (inclusive) deberá adaptarse la tubería con un espesor de pared correspondiente a K=9. Para diámetros superiores deberá definirse en cada caso el espesor de pared a adoptar.

Tipo de junta.

Automática flexible Norma de aplicación para los aros de goma: ISO 4633.

Esta junta une tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso.

La estanqueidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para que la presión interior del agua favorezca la compresión.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma, y el extremo liso debe estar achaflanado.

Goma para juntas.

La goma natural para las juntas deberá ser homogénea, absolutamente exenta de trozos de goma recuperada, y tener una densidad no superior a 1,1 Kg/dm^3.

El contenido de goma vegetal en bruto de calidad elegida (Crepp o Smoked tipo RMA IX) no deberá ser inferior al 75% en volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un porcentaje superior.

Deberá estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto el óxido de cinc; tampoco contendrá extractos acetónicos en cantidad superior al 3,5%

El azufre cubre y combinado no superará el 2% Las cenizas serán inferiores al 10% en peso, las escorias estarán compuestas exclusivamente de óxido de zinc y negro de humo de la mejor calidad; estarán exentas de sílice, magnesio y aluminio.

El extracto clorofórmico no deberá ser superior al 2% y el extracto en potasa alcohólica y la carga deberán estar contenidos en el porcentaje que resulte por diferencia.

Aparte de los antienvejecedores, las cargas deberán estar compuestas de óxido de zinc puro, de negro de humo también, siendo tolerado de un modo impalpable al carbonato cálcico.

Las piezas de goma deberán tratarse con antienvejecedores, cuya composición no permita que se enmohezca su superficie o se alteren sus características físicas o químicas, después de una permanencia durante cuatro meses en el almacén, en condiciones normales de conservación.

Para las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades organolépticas del agua no serán admitidas en la composición de la goma.

La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura 20º C+-5 por 100 y con arreglo a normas aprobadas, y deberá dar dureza de 50 +-5 por 100.

El alargamiento a la rotura no será inferior al 425 por 100, efectuando con arreglo a las normas aprobadas.

La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a 1.500 g/mm^2. La carga unitaria referida a la sección correspondiente al alargamiento del 400 por 100 será no inferior a los 300 g/mm^2.

A efectos de deformación permanente, una junta o parte de ella será sometida entre dos moldes veinticuatro horas a 20ºC y comprimida hasta alcanzar el 50% de la dimensión original. Sacada del molde deberá en diez minutos alcanzar la dimensión primitiva, con una tolerancia del 10% y en una hora con el 5%

Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento la prueba de deformación permanente se repetirá 5 veces, manteniendo la junta comprimida 24 horas en la estufa a 70º C en ambiente seco. La deformación residual, medida al sacar la junta del molde, deberá alcanzar en una hora la dimensión primitiva con el 10% de tolerancia. Efectuadas las pruebas de dureza, alargamiento y carga a la rotura sobre juntas sometidas setenta y dos horas a 78º C en estufa con ambiente normal, se obtendrá los mismos resultados sobre las juntas indicadas anteriormente, con tolerancias inferiores al 10%.

Presión de prueba.

Las máximas presiones admitidas por los tubos de fundición dúctil dependen de:

- el espesor de pared, es decir, el valor del coeficiente K.
- y pueden variar en función del DN de la canalización.

Desviación en las juntas.

Las desviaciones angulares en las juntas de los tubos permiten la realización de curvas de gran radio.

Achaflanado de los tubos en el extremo macho.

La tubería de fundición deberá tener las dimensiones del chaflán que figura en el cuadro adjunto.

En el caso de corte de los tubos **es indispensable** restablecer el chaflán para facilitar el montaje de la junta automática y evitar cualquier daño en el anillo de elastómero, que podría originar la no estanqueidad de la misma.

Se recomienda hacer desaparecer todo resto de rebarba después de efectuar el corte.

La geometría del chaflán corresponderá a las dimensiones de la tabla adjunta.

Medición y abono tuberías de fundición.

Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta de goma, acople de las tuberías y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias. También va incluido en este precio la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla.

942.- **TUBOS POLITILENO (PE).**

El diámetro normalizado es de ¾”(25 mm), hasta 3” (90 mm) y será de Baja Densidad (BD).

942.1.- **ESPECIFICACIONES.**

Tubería de polietileno para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada s/norma UNE 53.131 (medida y características) y 53.133 (métodos de ensayo).

La tubería vendrá en barras a partir de ø75 mm.

942.2.- **MARCA DE CALIDAD.**

Deberá estar en posesión de la Marca de calidad, homologada por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Asimismo dispondrá de correspondiente registro sanitario del Ministerio de Sanidad y Consumo.

942.3.- **TIPO DE JUNTA.**

La unión entre tubos se realizará mediante manguitos electrosoldados.

Deberán cumplir los ensayos según las Normas:

- UNE 53.405 Resistencia a la presión interior.
- UNE 53.406 Resistencia a la depresión.
- UNE 53.407 Resistencia a la presión interior en curvatura.
- UNE 53.408 Resistencia al arrancamiento.

10 Atmósferas.

Diámetro nominal	ϕ exterior m/m	Espesor pared m/m
½" ~ 15	20	2,8
¾ ~ 20	25	3,5
1" ~ 25	32	4,4
11/4" ~32	40	5,5
1½" ~ 40	50	6,9
2" ~ 50	63	8,6
2½" ~ 65	75	10,3
3" ~ 75	90	12,3

942.4.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta de goma, piezas de unión, manguitos de derivación piezas especiales, tés, codos, acople de las tuberías y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias, etc... También va incluido en este precio la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla.

3.5.2.-PIEZAS.

951.- VÁLVULAS.

Todas las válvulas podrán ser de PN16 o PN25 incluyendo en su precio la tornillería y la junta que corresponde a cada presión.

951.1.- VÁLVULA COMPUERTA

Se instalarán válvulas de compuerta con las siguientes generalidades:

- Las válvulas podían ir enterradas, con tubos de PVC para permitir la apertura y cierre con cuadradillo y Boca de llave, con las siguientes características en versión para calzadas: En fundición gris, con tapa en fundición dúctil, y revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán.

- Realizada en fundición de grafito laminar conforme a las normas UNE 36111 y en fundición dúctil conforme a las normas UNE 36-118-73.

- El manejo de las válvulas deberá hacerse con el cuidado necesario, a fin de prevenir cualquier perjuicio o daño en ellas. Todas las juntas deberán estar dispuestas y limpias antes de la instalación. El contratista deberá ajustar todas las guarniciones del vástago y probar cada válvula antes de su instalación, con el objeto de asegurar una operacionalidad apropiada.

- Todas las válvulas se deberán instalar de tal modo que la verticalidad del vástago se efectúe mediante plomada, y su situación respecto al trazado sea la mostrada en los planos.

- El cuerpo y la tapa de cada válvula estará construido de fundición dúctil y provisto de bridas, las cuales deberán tener caras perfectamente pulidas y perforadas para permitir su conexión con las bridas adyacentes, con el número de tornillos necesarios para obtener una unión rígida y estanca.

- El cuerpo deberá ser suministrado con los asientos del disco necesarios para asegurar la mayor estanqueidad posible en la posición de cierre de la válvula.

- El vástago de cada válvula, deberá ser de acero inoxidable resistente a la corrosión. Se deberán proveer las empaquetadoras y prensaestopas nececarios para el sellado del paso de los extremos del vástago a través del cuerpo. Deberá ser posible el reemplazo de las empaquetadoras sin necesidad de desmontar el bonete de la válvula.

- El cálculo de resistencia de los elementos sometidos a esfuerzos de origen hidráulico, se deberá hacer sobre la base de fuerzas equivalente al doscientos por ciento (200%) de la carga hidráulica máxima aplicables.

- En ningún caso, las tensiones resultantes del esfuerzo combinado producido por la acción conjunta de las cargas exteriores y esfuerzos mecánicos máximos de operación (obstrucción del movimiento del disco de la válvula, por ejemplo) excederán de dos tercios (2/3) de la tensión garantizada máxima admisible del acero utilizado.

- Para los componentes de los accionamientos, sometidos a esfuerzos de operación, se adoptará una tensión admisible máxima no superior a un quinto (1/5) de la tensión garantizada mínima de rotura de los materiales a utilizarse.

- Las válvulas deberán instalarse con los timbrajes indicados en los planos en cada posición relativa en las tuberías o en las estaciones de bombeo.

Las **características constructivas** son:

La válvula compuerta a utilizar es la EURO 20 o similar y se definirá fundamentalmente por los siguientes puntos:

- Estanqueidad perfecta conseguida por compresión de elastómero de la compuerta.
- Eliminación de frotamiento en las tomas de estanqueidad.
- Pases de maniobra muy por debajo de los prescritos en las Normas ISO y NF
- Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío
- Compuerta en fundición dúctil revestida totalmente
- Tuerca de maniobra en aleación de cobre.
- Ausencia de tornillería para la unión tapa y cuerpo.
- Compuerta totalmente revestida de elastómero (incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del eje).
- Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxy

951.2.- **VÁLVULAS DE ESFERA**

Serán de cuerpo y bola de bronce. y accionadas mediante manilla.

Serán de alguna marca y modelo aceptado por SCPSA.

955.- **HIDRANTES**.

Con los siguientes materiales:

BRIDAS: PN-16. Según DIN 2533.

Cuerpo, acoplamiento	……..	GGG-50 (nodular)
Cierre	…….	GGG-50 + E.P.D.M.
Estopa, juntas	……	E.P.D.M.
Válvula hembra 2 ½" (bronce)	…….	RG-5
Racor Barcelona 70	……..	Al.Forj.UNE 23400.

956.- **BOCAS DE RIEGO.**

Las bocas de riego serán de tipo Monobloque y con las siguientes características técnicas:

- Cuerpo de hierro fundido (calidad GGG 40) (Dúctil).
- Mecanismo de latón alta calidad.
- Válvula de cierre provista con junta de goma.

En todo caso deberá someterse a la consideración del Director de la obra una boca de riego completa, a fin de que éste autorice la adquisición de la totalidad, si estima que reúne las condiciones precisas.

957.- **COLLARÍN.**

Las especificaciones de materiales son las siguientes:

* Collarín:	Fundición Nodular FGE 42-12, s/UNE 36118. Revestimiento con pintura epoxi poliamida s/ ISO 8130, color azul.
* Refuerzo Abrazadera:	Ppvdf S/ iso 1873-1, color negro.
* Abrazadera:	Acero Inoxidable AISI-304.
* Perfil Abrazadera:	Caucho natural dieléctrico s/UNE 53-606.
* Tornillería:	Acero Inoxidable a2-70 s/ASTM 194.
* Junta de unión:	EPDM, s/ UNE 35-571, color negro.

962.- **ANCLAJES DE TUBERÍAS EN CÁMARA DE LLAVES Y ARQUETAS.**

Serán de chapa de acero galvanizado de 3 mm de espesor, según detalle de planos e irán anclados al suelo mediante “spit” y atornillados a las bridas o abrazando los tubos con una banda de caucho de protección.

Las dimensiones reales se ajustarán a la realidad de la obra ejecutada.

Se medirá por unidad colocada incluso mano de obra y elementos auxiliares.

3.6.- FIRMES

510.- **ZAHORRAS.**

510.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

- Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
- Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
- Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

510.2.- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

510.2.1.- **Características generales.**

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.

Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, siempre que cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento (5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.
El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

510.2.2.- **Composición química**.

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO_3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos.

510.2.3.- **Limpieza**.

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

T00 a T1	T2 a T4 arcenes de T00 a T2	Arcenes de T3 y T4
EA > 40	EA > 35	EA > 30

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.

510.2.4.- **Plasticidad**.

El material será "no plástico", según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en cualquier caso; así como para las zahorras naturales en carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3; en carreteras con categoría de tráfico pesado T4 el límite líquido de las zahorras naturales, según la UNE 103103, será inferior a veinticinco (25) y su índice de plasticidad, según la UNE 103104, será inferior a seis (6).

En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41 y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá admitir, tanto para las zahorras artificiales como para las naturales que el índice de plasticidad según la UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea inferior a treinta (30).

510.2.5.- **Resistencia a la fragmentación**.

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2.

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

CATEGORIA TRAFICO PESADO	
T00 a T2	T3, T4 y arcenes
30	35

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco megapascales (35 MPa), así *como para áridos siderúrgicos, el valor* del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20, especificado en la tabla 510.3.1.

En el caso de los áridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate de áridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para áridos siderúrgicos a emplear como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Ángeles podrá ser superior hasta en diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2.

510.2.6.- **Forma.**

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

510.2.7.- **Angulosidad**.

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

510.3.- **TIPO Y COMPOSICIÓN DEL MATERIAL.**

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras naturales.

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ZAHORRA ARTIFICIAL(*)	ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)								
	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZA25	100	75-100	65-90	40-63	26-45	15-32	7-21	4-16	0-9
ZA20	-	100	75-100	45-73	31-54	20-40	9-24	5-18	0-9
ZAD20	-	100	65-100	30-58	14-37	0-15	0-6	0-4	0-2

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.

TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ZAHORRA NATURAL (*)	ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)									
	50	40	25	20	8	4	2	0,500	0,250	0,063
ZN40	100	80-95	65-90	54-84	35-63	22-46	15-35	7-23	4-18	0-9
ZN25	-	100	75-95	65-90	40-68	27-51	20-40	7-26	4-20	0-11
ZN20	-	-	100	80-100	45-75	32-61	25-50	10-32	5-24	0-11

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

510.4.- **EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de prueba.

510.4.1.- **Central de fabricación de la zahorra artificial.**

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo y la producción horaria mínima de la central.

En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).

Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán, asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.

Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos ; no obstante, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de zahorras artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m^2).

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.

510.4.2.- **Elementos de transporte.**

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por carreteras en servicio.

510.4.3.- **Equipo de extensión.**

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1, y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m^2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de sistemas automáticos de nivelación.

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de extensión de las zahorras.

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del material delante del equipo de extensión.

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste.

Las anchuras mínima y máxima de extensión se fijarán en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar alineadas con las existentes en la extendedora.

510.4.4.- **Equipo de compactación.**

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de acción suave.

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.

El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración adecuadas.

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas (5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho décimas de megapascal (0,8 MPa).

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.

510.5.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

510.5.1.- **Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.**

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del material (apartado 510.9.1).

Dicha fórmula señalará:

- En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación.
- La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso granulométrico.
- La humedad de compactación.
- La densidad mínima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4.

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL.

CARACTERISTICA			CATEGORIA DE TRAFICO PESADO	
			T00 a T1	T2 a T4 y arcenes
Cernido por los tamices UNE-EN 933-2	> 4 mm		±6	±8
	£ 4 mm		±4	±6
	0,063 mm		±1,5	±2
Humedad de compactación		% respecto de la óptima	±1	*- 1,5 / + 1*

510.5.2.- **Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra.**

Una capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

510.5.3.- **Preparación del material.**

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se realizará también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares permita expresamente la humectación in situ.

En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así como su uniformidad.

510.5.4.- **Extensión de la zahorra**.

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.

510.5.5.- **Compactación de la zahorra.**

Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.5.1, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la tongada.

510.6.- **TRAMO DE PRUEBA.**

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de la obra.

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso inferior a cien metros (100 m). El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:
  - En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.
  - En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra, corrección de la humedad de compactación, etc.).
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:
  - En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.
  - En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos suplementarios.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

510.7.- **ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.**

510.7.1.- **Densidad.**

Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.

510.7.2.- **Capacidad de soporte.**

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa (E_{v2}), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:

Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico pesado.

TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO E_{v2} (MPa)

TIPO DE ZAHORRA	CATEGORIA DE TRAFICO PESADO			
	T00 a T1	T2	T3	T4 y arcenes
ARTIFICIAL	180	150	100	80
NATURAL			80	60

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos E_{v2}/E_{v1} será inferior a dos unidades y dos décimas (2,2).

510.7.3.- **Rasante, espesor y anchura.**

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado 510.10.3.

510.7.4.- **Regularidad superficial.**

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a extender sobre ella.

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE DE HECTOMETROS	ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)		
	e ³ 20	10 < e < 20	e £ 10
50	< 3,0	< 2,5	< 2,5
80	< 4,0	< 3,5	< 3,5
100	< 5,0	< 4,5	< 4,0

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

510.8.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico. Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo indicado en el artículo 530 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras.

510.9.- **CONTRO DE CALIDAD.**

510.9.1.- **Control de procedencia del material.**

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado 510.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m^3) o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m^3).

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.

El Director de las Obras comprobará además:

- La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.
- La exclusión de vetas no utilizables.

510.9.2.- **Control de ejecución.**

510.9.2.1.- FABRICACIÓN.

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.

En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus accesos.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de muestras en los acopios.

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m^3) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde:
  - Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la UNE-EN 933-9.
  - Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.
- Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m^3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se fabricase menos material:
  - Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, respectivamente.
  - Proctor modificado, según la UNE 103501.
  - Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).
  - Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
  - Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
- Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m^3) de material producido, o una (1) vez al mes si se fabricase menos material:
  - Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.
  - El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de recepción de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

510.9.2.2.- PUESTA EN OBRA.

Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.
Se comprobarán frecuentemente:

- El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.
- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un procedimiento aprobado por el Director de las Obras.
- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, verificando:
  - Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.
  - El lastre y la masa total de los compactadores.
  - La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
  - La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
  - El número de pasadas de cada compactador.

510.9.3.- **Control de recepción de la unidad terminada.**

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).
Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4.

510.10.- **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL LOTE.**

510.10.1.- **Densidad.**

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.

510.10.2.- **Capacidad de soporte**.

El módulo de compresibilidad E_{v2} y la relación de módulos E_{v2}/E_{v1}, obtenidos en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir los módulos especificados.

510.10.3.- **Espesor.**

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que bajen del especificado en un diez por ciento (10%).

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la siguiente manera:

- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.
- Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

510.10.4.- **Rasante.**

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existirán zonas que retengan agua.

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la Administración.

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista, siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos.

510.10.5.- **Regularidad superficial.**

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:

- Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm) y se volverá a compactar y refinar por cuenta del Contratista.
- Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).

510.11.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m^3) medidos sobre los planos de Proyecto.

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.

510.12.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

510.13.- **NORMAS DE REFERENCIA EN ESTE ARTÍCULO.**

- NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).
- NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras
- NLT-357 Ensayo de carga con placa.
- UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.
- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.
- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
- UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas.
- UNE-EN 196-2 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cemento.
- UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
- UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.
- UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.
- UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.
- UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
- UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.
- UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.
- UNE-EN 1097-5 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en estufa.
- UNE-EN 1744-1 Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos. Parte 1: Análisis químico.

530.- **RIEGOS DE IMPRIMACIÓN**

530.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

530.2- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

530.2.1.- **Ligante hidrocarbonado**

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y, salvo justificación en contrario, deberá estar incluido entre los que a continuación se indican:

- FM100 del artículo 212, "Betún fluidificado para riegos de imprimación", de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.
- EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del artículo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego o, en su defecto, del PG3, siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.

530.2.2.- **Árido de cobertura**

Será de aplicación lo preceptuado en el apartado 530.2.2 del PG3.

530.3.- **DOTACION DE LOS MATERIALES.**

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotación no será inferior en ningún caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m^2) de ligante residual.

La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual circulación durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotación, en ningún caso, será superior a 6 l/m^2, ni inferior a 4 l/m^2.

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

530.4.- **EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

530.4.1.- **Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonato.**

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.

530.4.2.- **Equipo para la extensión del árido de cobertura**

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del árido.

530.5.- Ejecución de las obras.

Será de aplicación lo establecido en el apartado 530.5 del PG3.

530.6.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).

530.7.- **CONTROL DE CALIDAD.**

530.7.1.- **Control de procedencia de los materiales.**

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.4 del artículo 212 de este Pliego o 213.4 del artículo 213 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8.

530.7.2.- **Control de calidad de los materiales.**

530.7.2.1.- CONTROL DE CALIDAD DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 212.5 del artículo 212 de este Pliego o 213.5 del artículo 213 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

530.7.2.2.- CONTROL DE CALIDAD DEL ÁRIDO DE COBERTURA

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras.

530.7.3.- **Control de ejecución.**

Será de aplicación lo establecido en el apartado 5307.3 del PG3.

530.8.- **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.**

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

530.9.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá la preparación de la superficie existente y la aplicación del ligante hidrocarbonado.

El árido, eventualmente empleado en riegos de imprimación, se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas directamente en una báscula contrastada. El abono incluirá la extensión del árido.

530.10.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO**

- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.
- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo.
- UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.
- UNE-EN 933-1 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.
- UNE-EN 933-2 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.
- UNE-EN 933-8 Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
- UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.

531.- **RIEGO DE ADHERENCIA**

531.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

A efectos de aplicación de este artículo, no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo 532 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, como riegos de curado.

531.2.- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

531.2.1.- **Emulsión bituminosa.**

Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.2.1 del PG3.

531.3.- **DOTACION DEL LIGANTE.**

La dotación de la emulsión bituminosa a utilizar vendrá definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m^2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m^2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3) ; o una capa de rodadura drenante (artículo 542 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D ó S (artículo 542 de este Pliego o, en su defecto, del PG3) empleada como rehabilitación superficial de una carretera en servicio.

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las pruebas realizadas en obra.

531.4.- **EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras.

531.4.1.- **Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa.**

Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.4.1 del PG3.

531.5.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se cumplirá lo establecido en el apartado 531.5 del PG3.

531.6.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la rotura de la emulsión.

531.7.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Este punto se divide en tres apartados que a continuación se enumeran. Para todos ellos se cumplirá lo establecido en el apartado 531.7 del PG3.

531.7.1.- **Control de procedencia de la emulsión bituminosa.**
531.7.2.- **Control de calidad de la emulsión bituminosa.**
531.7.3.- **Control de ejecución.**

531.8.- **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.**

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios anteriores.

531.9.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la dotación media del lote. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y el de la aplicación de la emulsión.

531.10.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

531.11.- **NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO.**

- NLT-138 Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.
- UNE-EN 12697-3 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 3: Recuperación de betún: Evaporador rotatorio.

542.- **MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE**

542.1.- **DEFINICIÓN.**

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de alto módulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y trece centímetros (7 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil megapascales (11 000 MPa).

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 542.8.

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo.
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.
- Extensión y compactación de la mezcla.

542.2.- **MATERIALES.**

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la construcción.

542.2.1.- **Ligante hidrocarbonado.**

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado, en función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 del PG3 y, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes artículos de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

Para mezclas bituminosas en caliente de alto módulo el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será el BM-1 para las categorías de tráfico pesado T00 y T0 y el B13/22 para las categorías de tráfico pesado T1 y T2.

Los betunes de penetración indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen en el artículo 211, podrán ser sustituídos por betunes de penetración que cumplan con los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea UNE-EN 12591, según se indica:

- B40/50 por B35/50
- B60/70 por B50/70
- B80/100 por B70/100

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T0, en las mezclas bituminosas a emplear en capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizarán exclusivamente betunes asfálticos modificados con polímeros.

Para mezclas bituminosas drenantes, además de los betunes modificados indicados en la tabla 542.1.A, se podrá emplear el tipo BM-3a, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1.

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 de este Pliego o, en su defecto, del PG3, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras establecerá el tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras.

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como modificadores de la reología de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumáticos fuera de uso, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales

542.2.2.- **Áridos.**

542.2.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, podrán emplearse como áridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.

.

El árido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2.

542.2.2.2.- ÁRIDO GRUESO.

Definición del árido grueso.

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2.

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas).

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2 del PG3.

Forma del árido grueso (Índice de lajas.

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG3.

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los Ángeles).

El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG3.

Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de pulimento acelerado).

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según el anexo D de la UNE 146130, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG3.

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas).

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de impurezas, según el anexo C de la UNE 146130, del árido grueso deberá ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa ; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.

542.2.2.3.- ÁRIDO FINO.

Definición del árido fino.

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Procedencia del árido fino.

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.6 del PG3.

Limpieza del árido fino.

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias extrañas.

Resistencia a la fragmentación del árido fino.

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Ángeles.

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base.

542.2.2.4.- POLVO MINERAL.

Definición del polvo mineral.

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

Procedencia del polvo mineral.

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o especialmente preparado.

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del PG3.

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de éste.

Finura y actividad del polvo mineral.

La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm^3).

542.2.3.- **Aditivos.**

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa del firme, se definirá en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según la tabla 542.9 del PG3.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 del PG3, según el tipo de mezcla o de capa.

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11 del PG3.

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificación en contrario, estará comprendida entre uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5).

542.3.- TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1

542.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Además de lo establecido en el apartado 542.4 del PG3, se cumplirán las condiciones siguientes:

a) Se prohibirá el empleo de áridos cuyo acopio no haya sido debidamente controlado de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.

b) Un mes antes de la iniciación del proceso de fabricación de las mezclas bituminosas deberá existir un acopio de áridos de volumen suficiente para cubrir las necesidades de producción de la planta de fabricación durante cuarenta horas de trabajo a plena capacidad salvo que exista autorización en otro sentido por parte del Director de Obra.

542.5.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Se estará a lo prescrito en el apartado 542.5 del PG3, con la salvedad de que en la capa de rodadura deberá alcanzarse como mínimo una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida en laboratorio al aplicar a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall.

542.6.- **TRAMOS DE PRUEBA**

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación.

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de la obra en construcción.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, etc.).
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos rápidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se analizará, además, la correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa según la NLT-327.

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

542.7.- **ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA.**

542.7.1.- **Densidad.**

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:

- Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (³ 6 cm): noventa y ocho por ciento (98%).
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento (97%).

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.4, la compactación prevista en la NLT-352.

542.7.2.- **Rasante, espesor y anchura.**

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los Planos.

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.

542.7.3.- **Regularidad superficial.**

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.14 ó 542.15 del PG3.

542.7.4.- **Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.**

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.16 del PG3.

542.8.- **LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN.**

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente:

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

542.9.- **CONTROL DE CALIDAD.**

Este punto se divide en cuatro apartados que a continuación se enumeran. Para todos ellos se cumplirá lo establecido en el apartado 542.9 del PG3.

542.9.1.- **Control de procedencia.**
542.9.2.- **Control de calidad de los materiales.**
542.9.3.- **Control de ejecución.**
542.9.4.- **Control de recepción de la unidad terminada.**

542.10.- **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.**

Este punto se divide en cuatro apartados que a continuación se enumeran. Para todos ellos se cumplirá lo establecido en el apartado 542.10 del PG3.

542.10.1.- **Densidad.**
542.10.2.- **Espesor.**
542.10.3.- **Regularidad superficial.**
542.10.4.- **Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento.**

542.11.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por metros cuadrados (m^2) realmente ejecutados.

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta unidad de obra. El riego de adherencia se abonará según lo prescrito en el artículo 531 de este Pliego, o, en su defecto, del PG3.

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas subyacentes.

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante deducida de los ensayos de control de cada lote. En ningún caso será de abono el empleo de activantes o aditivos, así como tampoco el ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.

El polvo mineral de aportación y las adiciones, sólo se abonarán si lo previera explícitamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su abono se hará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición abonable de fabricación y puesta en obra de cada lote, por la dotación media.

542.12.- **ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD.**

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

542.13.- **NORMAS REFERIDAS EN ESTE ARTÍCULO.**

- NLT-159 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall.
- NLT-162 Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas compactadas (ensayo de inmersión-compresión).
- NLT-168 Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas.
- NLT-173 Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas mediante la pista de ensayo de laboratorio.
- NLT-176 Densidad aparente del polvo mineral en tolueno.
- NLT-326 Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).
- NLT-327 Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS.
- NLT-330 Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de carreteras.
- NLT-335 Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica volumétrica.
- NLT-336 Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida del rozamiento transversal.
- NLT-349 Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras.
- NLT-352 Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste.
- UNE 146130 Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras áreas pavimentadas.
- UNE-EN 932-1 Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1: Métodos de muestreo.
- UNE-EN 933-1 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
- UNE-EN 933-2 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.
- UNE-EN 933-3 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.
- UNE-EN 933-5 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.
- UNE-EN 933-8 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.
- UNE-EN 933-9 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.
- UNE-EN 1097-2 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación.
- UNE-EN 1097-6 Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 6: Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.
- UNE-EN 12591 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes para pavimentación.
- UNE-EN 12697-1 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 1: Contenido de ligante soluble.
- UNE-EN 12697-2 Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezcla bituminosa en caliente. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas.

550.- **PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.**

550.1.- **PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGÓN.**

Las características y naturaleza de los materiales a utilizar se ajustarán a las prescripciones de la norma EH-88. Sin embargo, para las condiciones de la ejecución de esta unidad de obra se tendrán prioritariamente en cuenta las condiciones del Artículo 550 del PG3.

Estas condiciones el ámbito de los pavimentos de estacionamientos y las aceras peatonales del proyecto.

Su ejecución incluye las siguientes operaciones:

- Estudio de hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. - Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.
- Fabricación del hormigón.
- Transporte del hormigón.
- Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas.
- Colocación de los elementos de las juntas. - Puesta en obra del hormigón.
- Colocación de armaduras.
- Ejecución de las juntas en fresco.
- Realización de la textura superficial. - Acabado.
- Protección del hormigón fresco y curado. - Ejecución de juntas serradas.
- Desencofrado.
- Sellado de las juntas.

❖ Tipo de hormigón.- HP-35, resistencia característica

❖ Flexotracción 40 kp/cm2

❖ Resistencia media a los 7 días ~32 kp/cm2

❖ Dosificación del hormigón: Según ensayos previos de Laboratorio.

❖ Relación agua/cemento: menor de 0,5

❖ Consistencia: seca, asiento entre 2 y 5 cm. Se autoriza el uso de aditivo superfluidificante s/definición en partida del Presupuesto del Proyecto y siempre que los resultados de los ensayos propios sean satisfactorios a criterio de la Dirección de Obra.

- Tramo de ensayos: Una vez adoptada la dosificación del hormigón se procederá a realizar un tramo de ensayo de obra, comprobando que los medios de vibración son capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del pavimento; que se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad superficial establecidas; que el proceso de curado y protección del hormigón fresco es adecuado; y que las juntas se realizan correctamente.

Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de ensayo, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra, hasta obtener un pavimento con las cualidades exigidas.

En dicho tramo de ensayo se extraerán testigos para la determinación de la resistencia del hormigón. El valor medio de los resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los ensayos de información.

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en este PPT para la unidad de obra correspondiente.

Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio de la Dirección de Obra, se impermeabilizará la superficie de apoyo con un producto bituminoso adecuado, o se cubrirá con papel especial, láminas de material plástico u otro procedimiento aprobado por la Dirección de Obra.

550.2.- **FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN.**

El hormigón procederá de Central de Hormigonado.

Los aditivos en forma líquida o de pasta se añadirán al agua de amasado antes de su introducción en la hormigonera. Los aditivos en polvo deberán introducirse en la hormigonera junto con el cemento o los áridos, excepto cuando el aditivo contenga cloruro cálcico, en cuyo caso no podrá añadirse en contacto con el cemento.

550.3.- **PUESTA EN OBRA.**

No deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y acabado.

Si se interrumpe la extensión por más de media hora (1/2 h) se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas. Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá junta de hormigonado transversal.

El hormigonado se hará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción.

Los trabajos de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados para proteger el pavimento.

Las juntas de hormigonado transversales efectuadas en fresco, se dispondrán a fin de jornada, o cuando se haya producido por cualquier causa una interrupción en el proceso de hormigonado que haga temer un comienzo de fraguado en el frente de avance. A este respecto, una parada de treinta minutos (30 min) en tiempo seco y caluroso, será causa suficiente para establecer una junta de hormigonado.

En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior, que ha de situarse en la posición estricta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o elemento similar aprobado por la Dirección de Obra. Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después del extendido y, vibrado del hormigón y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido adecuado y se retocarán manualmente las zonas de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan quedado en torno a éstos.

Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en el hormigón fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por la Dirección de Obra.

550.4-. **ACABADO.**

Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón para facilitar su acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se empleará hormigón aún no extendido.

En pavimentos para tráfico ligero, se admite un fratasado manual. Por otra parte, este acabado podrá emplearse también en aquellos lugares que por su forma o ubicación no permitan el empleo de máquinas. La superficie del hormigón se alisará y nivelará con dos fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y diez centímetros (10 cm) de anchura, rigidizados con costillas y con tornillos de ajuste entre las costillas y el fratás a distancias no superiores a sesenta centímetros (60 cm) entre centros. Los fratases tendrán un mango suficientemente largo para que puedan ser manejados desde fuera del pavimento. Con el borde del fratás se recortarán todas las protuberancias, rellenando las depresiones con el material así obtenido hasta conseguir una superficie correcta y uniforme. Los fratases se mantendrán con su mayor dimensión paralela al eje del pavimento. Cada pasada sucesiva solapará sólo ligeramente la pasada anterior, volviendo luego a pasar el fratás para alisar la banda de solape.

Terminadas las operaciones de fratasado y cuando el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros (12 mm) de radio.

Las juntas transversales de construcción y las juntas de dilatación se redondearán del mismo modo que los bordes longitudinales, pero con un radio de seis milímetros (6 mm).

550.5.- **TEXTURA SUPERFICIAL.**

Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará una textura transversal o longitudinal homogénea a la superficie del pavimento en forma de estriado o ranurado. La Dirección de Obra, tras las pruebas oportunas, determinará el tipo de tratamiento superficial a emplear.

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de plástico, alambre u otro material aprobado por la Dirección de Obra. Las estrías producidas serán sensiblemente perpendiculares o paralelas al eje de la calzada, según se trate de una textura transversal o longitudinal.

La textura superficial por ranurado será siempre transversal y se obtendrá mecánicamente mediante un peine con varillas de plástico, acero u otro material, o una placa con salientes de la misma forma que las ranuras a obtener; el dispositivo utilizado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Las ranuras serán paralelas entre sí y tendrán una anchura y una profundidad comprendidas entre cinco (5) y siete (7) milímetros. La distancia entre sus ejes será variable y comprendida entre quince (15) y treinta y cinco (35) milímetros.

550.6.- **PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN FRESCO Y CURADO.**

Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o viento; y contra los enfriamientos bruscos y la congelación.

En obras a ejecutar en zonas con clima lluvioso, la Dirección de Obra podrá exigir la disposición de una tienda sobre las maquinas de puesta en obra para proteger el hormigón hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el acabado no sea afectado por la lluvia. Asimismo se podrá exigir un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al menos, a la que pueda ser acabada en veinte minutos (20 min) de trabajo.

El hormigón se someterá al proceso de curado previsto en el PPT o en el Presupuesto del Proyecto en cuanto haya adquirido la resistencia suficiente para que la terminación superficial no se vea afectada. Dicho proceso se prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije la Dirección de Obra, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas de la obra; en general, dicho período no será inferior a siete (7) días.

Deberán someterse al proceso de curado todas las superficies expuestas del pavimento, incluidos los bordes en el momento en que queden libres.

550.7.- **CURADO CON PRODUCTOS FILMÓGENOS.**

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, éstos deberán aplicarse tan pronto como hayan concluido las operaciones de acabado y el agua libre sobre la superficie haya desaparecido completamente, adquiriendo ésta un tono mate. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el producto deberá ser aplicado antes de dicho plazo.

Cuando las condiciones atmosféricas favorezcan la desecación del hormigón, la Dirección de Obra podrá ordenar el reforzar la acción del producto de curado, bien extendido sobre la superficie de las losas una neblina fina de agua, o bien aplicando una capa de arena, láminas de plástico u otros materiales que proporcionen el debido aislamiento. Dichas medidas se prolongarán durante el período que la Dirección de Obra considere necesario.

El producto de curado será aplicado en toda la superficie del pavimento por medios accionados mecánicamente que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme. El pulverizador irá provisto de dispositivos que proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento; y de un dispositivo mecánico en el tanque de almacenamiento del producto de curado que someta a éste a una continua agitación durante su aplicación sobre el pavimento. igualmente deberá disponer de un manómetro para controlar la presión de aplicación del proyecto, de un contador para controlar el rendimiento, y de los dispositivos necesarios para modificar el rendimiento cuando se desee.

Los pulverizados accionados manualmente podrán ser utilizados en obras pequeñas, zonas irregulares o bien inaccesibles por los dispositivos mecánicos; y siembre bajo la aprobación de la Dirección de Obra.

Se extenderá producto de curado sobre las paredes de las juntas inmediatamente después de ser serradas, en caso de que se ejecuten por este sistema. Igualmente se extenderá producto de curado sobre las zonas en que por cualquier circunstancia la película formada se estropee durante el período de curado.

550.8.- **CURADO MEDIANTE MEMBRANAS IMPERMEABLES.**

Cuando las juntas del pavimento se ejecuten en fresco, y previa autorización de la Dirección de Obra, el curado también podrá realizarse por cubrición de la superficie con membrana impermeable, una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial.

Hasta que la superficie del hormigón se cubra con las membranas impermeables se mantendrá húmeda aplicando agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina y no de riego. El agua no será aplicada a presión directamente sobre el hormigón, y no se permitirá que se acumule sobre la superficie de forma que se produzca un flujo de agua en ésta o se deslave el hormigón.

Las membranas serán de plástico o papel, cumpliendo con las especificaciones del apartado 5º del PG3.

Para evitar el levantamiento de las membranas por efecto del viento, todos los bordes laterales y solapes se asegurarán con caballetes continuos de tierra u otros materiales adecuados.

550.9.- **PROTECCIÓN CONTRA EL FRÍO.**

Durante el período de curado del hormigón, e independientemente de las precauciones a adoptar en su fabricación y puesta en obra, deberá protegerse el pavimento contra la acción de un enfriamiento rápido o helada. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura ambiente de más de veinticinco grados centígrados (25ºC) entre el día y la noche, se le protegerá con materiales aislantes hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.

550.10- **EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS.**

En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tal que el borde de la ranura sea limpio y no se produzcan anteriormente grietas de retracción en la superficie del hormigón.

Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación de la Dirección de Obra, la operación de serrado podrá realizarse en dos fases: la primera de ellas hasta la profundidad definida en los Planos, y la segunda, de ensanche para alojamiento del producto de sellado en la parte superior de la ranura.

550.11.- **SELLADO DE LAS JUNTAS.**

Una vez terminado el período de curado del hormigón se procederá al sellado de las juntas. Previamente se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un producto adecuado cuando el tipo de material que se emplee lo requiera.

Posteriormente se procederá a la colocación del material de sellado o el perfil extrusionado previamente aprobado por la Dirección de Obra.

Se cuidará especialmente la limpieza de la operación y se recogerá el posible exceso de material. El perfil de la junta sellada no deberá resultar con menisco convexo, ni presentar soluciones de continuidad en los bordes.

Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse, salvo autorización de la Dirección de Obra, cuando la temperatura del aire baje de cinco grados centígrados (5ºC), o en caso de lluvia o viento fuerte.

550.12.- **TOLERANCIAS DEL PAVIMENTO.**

La regularidad superficial de cada zona del pavimento se controlará dentro de las veinticuatro horas (24 h) a partir de su ejecución.

La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros (3 mm) respecto a una regla de tres metros (3 m), apoyada sobre la superficie en cualquier dirección.

En el pavimento de los estacionamientos, los puntos altos defectados, que sean causa de incumplimiento de las anteriores tolerancias, se eliminarán por métodos abrasivos. Después de ser eliminados éstos, se pasará de nuevo la regla en una longitud igual a la distancia entre juntas entre las que esté comprendida la irregularidad detectada. La superficie corregida debe estar limitada por bordes longitudinales de losas o juntas longitudinales y por líneas perpendiculares a ellas, de forma que se obtengan áreas rectangulares.

En el pavimento de aceras se demolerá el módulo o losa y volverá a hormigonarse.

El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de diez centímetros (10 cm) de diámetro, con la frecuencia y en los puntos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, señale la Dirección de Obra. El espesor del pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor inferior a 10 mm del prescrito.

Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores 2 un centímetro (1 cm).

En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, la Dirección de Obra podrá aceptar la losa afectada u ordenar la demolición total o parcial de la misma y su posterior reconstrucción.

La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, al final del período de garantía, las fisuras no se han agravado ni han originado daños a las losas vecinas. en caso contrario, la Dirección de Obra podrá ordenar la demolición y posterior reconstrucción de las losas fisuradas.

Si, a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberán ser reparadas con un mortero de resina epoxi aprobado por la Dirección de Obra.

550.13.- **APERTURA AL TRÁFICO.**

El pavimento podrá abrirse al paso de personas y de materiales para operaciones de serrado y comprobación de la regularidad superficial cuando haya transcurrido el plazo necesarios para que no se produzcan desperfectos superficiales, y siempre que haya secado el producto de curado si se utiliza este método.

El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que haya curado un mínimo de tres (3) días.

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete (7) días o de que el hormigón haya alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la resistencia específica a veintiocho días (28 d). Todas las juntas deberán haber sido selladas o al menos obturadas provisionalmente.

La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días (14 d) a partir de la terminación del pavimento.

550.14.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Se medirá por metro cuadrado de pavimento calculado con el espesor indicado en el proyecto.

560.- **ADOQUIN.**

La pavimentación se hará con adoquines de hormigón de calidad EUROADOQUIN, con las características definidas en el presente proyecto y según las fases que se describen a continuación:

560.1.- **CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS ADOQUINES DE HORMIGÓN.**

Los adoquines que hayan de emplearse en esta obra se ajustarán a lo especificado en el Proyeco de Norma Europea prEN 1338. Cuando no se trate de adoquines amparados por la denominación EUROADOQUIN, será necesario verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la citada prEN 1338.

Los adoquines irán identificados mediante los siguientes datos:

Identificación del fabricante y fábrica.
Referencia al cumplimiento de la prEN 1338.
Identificación de las dimensiones nominales.
Fecha de fabricación.
La marca y logotipo EUROADOQUIN cuando los adoquines estén amparados por esta denominación.
Esta identificación quedará reflejada en el albarán y en el paquete.

Los adoquines, además, tendrán las siguientes características, serán pétreo de textura superficial abujardada, fabricado en dos capas, una húmeda vibroprensada y otra semiseca con resistencia a flexión (cara:7 y revés:6), desgaste por abrasión (1.2 mm) y absorción de agua (5.5%).

560.2.- **OPERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DEL PAVIMENTO.**

Se localizarán los servicios urbanos y se adoptarán las precauciones necesarias para evitar daños, tanto a las instalaciones enterradas como a los tendidos existentes, adecuando las vías de acceso si fuera necesario.

Se preparará la explanada, o superficie sobre la que se apoyará el firme, despejándola de obstáculos y procediendo a su desbroce y retirada de materia orgánica, si fuera necesario. Se comprobará que dicha superficie se mantiene seca y drenada.

Se aportarán o retirarán las tierras que sea preciso para dejar la superficie de apoyo del firme a la cota de proyecto.

Se procederá a compactar la explanada, de forma que se asegure su adecuada capacidad portante.

Para lo que sea conveniente y de aplicación, las especificaciones del presente Proyecto pueden contemplarse con las del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG·3).

560.3.- **SUBBASE.**

No se extenderá la subbase cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 grados centígrados.

Para lo que sea conveniente y de aplicación, las especificaciones del presente Proyecto pueden contemplarse con las del Pliego de Condiciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG3).

560.4.- **BASE.**

Sobre la subbase, cuando esté prevista en el Proyecto, o directamente sobre la explanada en caso contrario, se procederá a extender la base del pavimento, constituida según la solución adoptada, reflejada en los planos.

La superficie superior de la base no se desviará en mas de 10 mm de los niveles establecidos en lel Proyecto, y se extenderá hasta los bordes de confinamiento.

560.5.- **BORDES DE CONFINAMIENTO.**

El apoyo de los bordes de confinamiento se situará a no menos de 15 cm por debajo del nivel inferior a los adoquines. Se sellarán las juntas verticales entre elementos contiguos, a fin de evitar la salida de arena.

560.6.- **CAPA DE ARENA.**

El espesor final de la capa de arena, sobre la que se asentarán los adoquines, una vez colocados estos y vibrado el pavimento, será uniforme y estará comprendido entre 3 y 5 cm.

La arena, con granulometría de 2 a 6 mm, no contendrá más de un 3% de materia orgánica y arcilla. Se tendrá en cuenta lo especificado en las normas UNE 83-115 y UNE 83-116 sobre la friabilidad y el desgaste de la arena.

Una vez nivelada la arena, no deberá pisarse sobre ella.

Los adoquines se irán colocando a medida que se extiende y nivela la capa de arena, de modo que ésta quede el menor tiempo posible descubierta.

560.7.- **COLOCACIÓN, COMPACTACIÓN Y SELLADO DEL PAVIMENTO DE ADOQUINES.**

Los adoquines se colocarán con un interespacio de 1 a 2 mm.

Hasta que el pavimento sea compactado, no debe soportar más cargas que las de los operarios trabajando en su colocación.

La compactación se realizará, por vibrado, en dos fases.

En la primera, al asentarse los adoquines en la capa de arena, ésta rellena parcialmente las juntas; posteriormente, las juntas son selladas completamente con arena y se aplica un nuevo ciclo de compactación hasta llevar el pavimento a su estado final. El sellado de las juntas con arena puede requerir varias pasadas.

Finalmente, la rena sobrante se retirará por barrido, nunca por lavado con agua.

561.- **CENEFAS DE ADOQUIN.**

Estará constituido por adoquines de piedra, y seguirán las indicaciones marcadas en los planos.

Se colocarán sobre una capa de 5 cm. de mezcla de arena y de cemento en proporción de 5 a 1. Las juntas irán rellenadas de mortero, espolvoreándose cemento en la capa superior, el cual entrará por aquéllas.

Dicha capa de arena será uniforme, carente de arcillas, y deberá ser reglada, colocándose 1 cm. más alto que su cota definitiva.

Se tendrá especial cuidado en las cotas longitudinales de las partes centrales de las calles, al objeto de no formar baches donde se quede el agua.

570.- **BORDILLOS.**

570.1.- **DEFINICIÓN.**

Se definen como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera, la de una isleta o la de un andén.

Incluye las siguientes operaciones:

- Excavación y/o terraplenado del lecho de asiento.
- Extensión de la solera de hormigón en el lecho de asiento.
- Extensión del mortero de agarre.
- Colocación, nivelado, alineado y rejuntado de los bordillos.
- Ejecución del contrabordillo y de la rigola nivelada.

570.2.- **MATERIALES.**

El mortero a utilizar será mortero de cemento designado como N-450 en el art. 611. "Mortero de cemento" en el PG-3.

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, con la forma y dimensiones definidas en los planos.

El hormigón a utilizar será del tipo HM-20 o superior tanto en el bordillo prefabricado como en el lecho de asiento, contrabordillo y rigola.

Las caras vistas del bordillo serán vibradas, lisas y exentas de coloraciones extrañas, coqueras y otros defectos.

570.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se especificarán en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

570.4.- **FORMA Y DIMENSIONES.**

- La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos.
- La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos.
- La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m.
- Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de 10 mm.

570.5.- **CALIDAD.**

- Peso específico neto: No será inferior a 3.300 kg/m^3.
- Carga de Rotura (comprensión): Mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (> 200 kg/cm^2).
- Tensión de rotura (flexotracción): No será inferior a sesenta kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (> 60 kg/cm^2).

570.6.- **ABSORCIÓN DE AGUA.**

- Máxima = 6% en peso.
- Heladicidad: Inerte a + 20º C.

570.7.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Los bordillos se abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto , abonándose los metros lineales (ml) realmente colocados, de cada tipo, medidos en el terreno.

En este precio se encuentra incluido el bordillo, lecho de asiento, mortero, contrabordillo, rigola, excavación para el asiento, etc., y cuantas operaciones y materiales sean necesarios para la total terminación de esta unidad de obra.

572.- **PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN ACERAS.**

El pavimento de hormigón en aceras es de: Solera de hormigón del tipo HM-20 de 15 cm. de espesor, apoyada en 20 cm. de Base Granular.

La fabricación y puesta en obra del hormigón se hará ajustándose a lo prescrito en la vigente Instrucción para el Proyecto y Ejecución de las Obras de Hormigón, dejando previstas juntas de construcción cada 5 metros lineales como máximo.

Se incluye en dicha partida la extensión de un producto filmógeno de curado que evite la desecación superficial del hormigón, y al mismo tiempo la aparición de fisuras en el mismo.

El acabado se realizará escobillado a la escoba de brezo.

Se realizará, previamente, una muestra para su aprobación por la Dirección de Obra.

La aparición de fisuras o la existencia de textura uniforme en la superficie vista, será motivo de demolición.

La realización de las aceras está dividida en dos partidas independientes:

- Ejecución de la capa de base granular, incluido preparación y compactación del terreno, y compactación y nivelación de la capa granular.
- Ejecución de la solera de hormigón, incluyendo fabricación, colocación, compactación, vibrado, extensión del producto de curado, juntas transversales y ruleteado de la superficie acabada.

572.1.- **SOLADOS DE BALDOSA HIDRAULICA.**

La baldosa hidráulica deberá colocarse necesariamente sobre una base de hormigón. Sobre este hormigón se extenderá una fina capa de arena y sobre ésta el mortero de agarre de unos 2 cm de espesor. Las baldosas, así colocadas, deberán contar con las correspondientes juntas de dilatación de 1’5 cm de espesor de forma que no se formen paños superiores a 25 m^2, y una separación longitudinal máxima entre ellas de 8 metros. El sellado superficial de las juntas, que no serán superiores a 5 mm., se hará mediante lechada de cemento, repartida con escobilla de forma que no quede sobre la superficie de las baldosas. La prueba de agarre se hará mediante golpeteo con mango de pico, debiendo levantarse y reponerse aquellas zonas que no hayan quedado agarradas.

Las juntas de las baldosas coincidirán con las juntas de la solera de hormigón.

572.2.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Se realizará por metros cuadrados y se abonará al precio que figure en los Cuadros de Precios, que comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, así como la maquinaria y mano de obra necesarias para su terminación.

3.7.- INSTALACIONES

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los planos y datos de que disponga, o en los reconocimientos efectuados, deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectadas, considerando la mejor forma de ejecutar los trabajos para no dañarlos y señalando los que, en último extremo, considera necesario modificar. Si el Director de la obra se muestra conforme, solicitará a las Empresas u Organismos correspondientes la modificación de estas instalaciones, abonándose mediante factura los trabajos que sean necesarios realizar. No obstante, si con el fin de acelerar las obras, las Entidades interesadas recaban la colaboración del Contratista, este deberá prestar la ayuda necesaria.

3.7.1.- **TUBOS PARA ILUMINACIÓN Y FUERZAS ELÉCTRICAS.**

3.7.1.1.- **DEFINICIÓN.**

Comprende la adquisición, transporte y colocación del tubo de P.V.C. de 10 cm. de diámetro, para la futura colocación de los cables de iluminación. En el caso de Telefónica y Fuerzas Eléctricas los tubos los proporcionarán estas Compañías.

Se colocarán sobre una solera de hormigón HM-15, para recubrirlos posteriormente con el mismo material que está incluido en el precio. El diámetro del tubo es el de la parte interna del mismo.

3.7.1.2.- **MATERIALES Y EJECUCIÓN.**

Los tubos de P.V.C. deberán ser aceptados por la Dirección de Obras, no debiendo presentar defecto alguno, y colocarse perfectamente alineados.

El hormigón deberá cumplir lo estipulado en el artículo 610 del P.G.3.

3.7.1.3.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Se medirán por metros realmente colocados, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios.

3.7.2.- **ARQUETAS ALUMBRADO.**

3.7.2.1.- **DEFINICIÓN.**

Comprende las operaciones de excavación, preparación de la solera y construcción del cuerpo de obra con hormigón HM-20, y posterior lucido de las paredes interiores de la arqueta con el mismo mortero de cemento.

Las conexiones de los tubos se efectuarán a las cotas fijadas en los planos, con longitud de tubos no mayores de 30 cm, sujetos a las paredes con resinas epoxi. Asimismo llevarán un mallazo ϕ8 a 15.

El hormigón y mortero empleado cumplirán las normas descritas en el Pliego General y Particular del presente Proyecto.

Las arquetas para iluminación están provistas de una tapa y cerco de fundición nodular, que va anclada en el cuerpo de obra de la arqueta. La tapa y cerco serán de las dimensiones y formas que figuran en los planos. Podrán utilizarse en todos los casos modelos prefabricados que respondan al oficial en características y dimensiones, y sean autorizados previamente por la Dirección de Obra.

3.7.2.2.- **MEDICIÓN Y ABONO.**

Se medirán por unidades totalmente construidas y acabadas, y se abonarán según los precios que figuran en el Cuadro de Precios. Se incluye la excavación.

3.7.3.- **INSTALACIONES TELEFÓNICAS.**

Se detallan es este capítulo las especificaciones relativas a instalaciones telefónicas siendo de aplicación, para todo lo no detallado, las contenidas, en los anteriores, especialmente en el de saneamiento, sobre excavaciones, rellenos, hormigones, ensayos, condiciones generales etc.

3.7.3.1.- **NORMAS DE TELEFÓNICA A CONSIDERAR.**

Serán de aplicación las siguientes normas:

NÚMERO	TÍTULO
434.012	Sección 1. General
434.012	Sección 2ª. Canalizaciones Principales General
434.012	Sección 4ª. Canalizaciones Principales con tubos de P.V.C.
434.012	Sección 7ª. Cámaras de Registro General
434.012	Sección 9ª. Cámaras de Registro para canalizaciones con tubos de P.V.C.
434.012	Sección 10ª. Arquetas
434.012	Canalizaciones subterráneas en zonas residenciales y urbanizaciones.

3.7.3.2.-**MATERIALES.**

3.7.3.2.1.- **Tubos.**

MARCA: PLASTICOS DEL EBRO o similar.

TIPO:

DIAMETRO: 110 mm y 160 mm.

Tubos flexibles construidos en polietileno; suministrados en rollos; la pared exterior será corrugada y la interior totalmente lisa, permitiendo una trazado no necesariamente rectilíneo. Su grado de dureza frente a choques mecánicos será de 7, según Norma UNE EN 50086-2-4.. Aceptado por IBERDROLA.

3.7.3.2.2.- **Soportes distanciadores.**

Serán de material plástico, suficientemente rígido y resistente al choque. Se ajustarán a las especificaciones de la 734003 "Soportes distanciadores para canalizaciones con Tubos de P.V.C.".

3.7.3.2.3.- **Codos.**

Son de P.V.C. rígido de sección circular, ajustados a las especificaciones de la 734005 "Codos de P.V.C. para canalizaciones con tubos de P.V.C.".

3.7.3.2.4.- **Tapones de obturación.**

Son de polietileno flexible y forma troncocónica, ajustados a las especificaciones de la 734004 "Tapones de obturación para Canalizaciones con tubos de P.V.C."

3.7.3.3.- **EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.**

3.7.3.3.1.- **Proceso constructivo de la canalización principal.**

El orden de las operaciones a seguir en este proceso es el siguiente:

a) Excavar la zanja.
b) Formar una solera de hormigón de 8 cm de espesor.
c) Colocar una primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a intervalos de 70 cm. Estas distancias deberán ser reducidas, en general, en las curvas, para que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes.
d) Rellenar de hormigón los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón.
e) Colocar la segunda capa de tubos, introduciéndolos en los soportes anteriores. Sobre estos tubos se acopla, a su vez, una segunda hilera de soportes distanciadores de tal forma que queden al tresbolillo con los de la primera hilera de los citados soportes.
f) Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requeridas.
g) Una vez cubierta de hormigón la parte superior de la última capa de tubos, se continuará hormigonando hasta completar 8 cm que será la capa de protección superior del prisma. Las protecciones laterales serán de 6 y 10 cm según se trate de canalizaciones en base 4 o base 2 respectivamente.

3.7.3.3.2.- **Construcción del prisma.**

Disposición de los conductos.

El número de conductos correspondientes a cada sección de canalización es variable en cada caso y será indicada en el plano correspondiente.

Dimensiones del prisma de canalización.

Las dimensiones del prisma de canalización son variables según el número de conductos y serán los especificados en los planos del Proyecto.

Encolado de tubos.

Se utilizará como norma general el tubo de P.V.C. ~ 110 mm y 1,2 mm de espesor.

Cuando las circunstancias así lo aconsejen se utilizará el de 3,2 mm de espesor.

La unión entre estos tubos entres sí, se realizará por encolado e introducción en el extremo recto de uno en el extremo en forma de copa del otro. Las operaciones y precauciones a tener en cuenta en dicha unión, a fin de garantizar una completa estanqueidad de la misma serán las siguientes:

- Se limpiarán las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a continuación las gotas o residuos que puedan quedar.
- El adhesivo, una vez removido en el bote, se aplicará a brocha en el interior de la copa y en el exterior del extremo recto, de tal forma que queden capas finas y uniformes de adhesivo. Esta aplicación se hará en sentido longitudinal del tubo, no en el periférico y de dentro a fuera.
- Se introduce el tubo, sin girarlo, en la copa, antes de que el adhesivo haya empezado a secar. Deben sujetarse durante algunos segundos hasta que el adhesivo haya empezado a secarse.
- Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de realizada.

Empleo de soportes distanciadores.

Estos soportes se utilizarán como apoyo de los tubos, así como para mantener constante la separación de los mismos, a fin de permitir que el hormigón penetre en ellos con facilidad.

Los modelos existentes son:

- Soporte distanciados 110/4 para apoyo de 4 tubos de 110 mm. de diámetro.
- Soporte distanciados 110/8 para apoyo de 8 tubos de 110 mm de diámetro.
- Soporte distanciados 63/4 para apoyo de 4 tubos de 63 mm de diámetro. También existe el de 63/8 para apoyo de 8 tubos.

Curvado de tubos y codos de desviación.

Los codos se utilizarán en curvas de radio de curvatura mínima de 25 m. En puntos de mayor curvatura se emplearán codos, operándose con ellos de forma idéntica a los tubos.

Observaciones.

Se procurará no pisar los tubos ni dejar caer materiales a las zanjas. El vertido del hormigón deberá realizarse de manera que los tubos no sufran deformaciones permanentes superiores a las admisibles. A profundidades mayores de 1,50 m no deberá verterse el hormigón sobre los tubos, a fin de evitar los posibles desplazamientos y deformaciones de los tubos. Para ello se interpondrán, en este caso, tablones u otros elementos, que amortiguasen el choque.

3.7.3.3.3.- **Cámaras de registro.**

Tipos de cámaras.

Existen dos series de cámaras, en función del número de conductos que acceden a ellas y de la función topológica a desempeñar, siendo estas la serie BR y la serie GABPF.

SERIE BR

Forman parte de esta serie las cámaras a las que acceden por una de sus paredes 12 conductos o más de canalización principal.

SERIE GABPF

Las cámaras de esta serie son de menor tamaño que la anterior.

Materiales y construcción.

Serán prefabricados, previamente homologados por la Compañía Suministradora.

3.7.3.3.4.- **Arquetas.**

Existen los tipos “D”,”H” y “M” empleándose las que figuran en los planos del Proyecto.

Todas las arquetas serán prefabricadas, normalizadas por la Compañía Suministradora.

3.7.3.3.5.- **Pruebas de conductos.**

Inmediatamente después de construida una sección de canalización y antes de proceder a la reposición de pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de los conductos instalados, consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo adecuado para comprobar la inexistencia de materia extraña o de alguna deformación del conducto que dificulte o impida el tendido del cable, a la vez que puedan eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los conductos. El mandril y el sistema operativo serán los normalizados por la C.T.N.E., cuyos vigilantes podrán revisar las operaciones.

3.7.3.4.- **MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS.**

Las excavaciones, rellenos etc se medirán según las indicaciones generales del Proyecto.

Las arquetas y cámaras se medirán y abonarán en base a las unidades definidas en los presupuestos parciales correspondientes.

Los prismas se medirán y abonarán en base a las unidades definidas en los presupuestos parciales correspondientes.

La limpieza y mandrilado se medirá y abonará con el precio establecido al efecto.

850.- **CÁMARAS Y REGISTROS PARA TELEFONÍA.**

Consiste esta unidad en la construcción de cámaras y registros de cualquiera de los tipos habitualmente utilizados por la C.T.N.E.

Las cámaras y registros tendrán la forma, dimensiones, características y accesorios que habitualmente utiliza la C.T.N.E. y que se reflejan en los planos.

Se medirán y abonarán por el número de ellas, de cada tipo, realmente construidas, valoradas de acuerdo con el precio establecido para cada modelo en el Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto.

El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para dejar la unidad totalmente terminada a juicio del Ingeniero Director de las Obras, incluso la excavación y el relleno de la zanja.

3.8.- VARIOS

997.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS.

997.1.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN.

Todas las unidades de obra no especificadas expresamente en este Pliego y que figuren en el Cuadro de Precios cumplirán las prescripciones Técnicas del PG-3, y en su defecto su ejecución se atendrá al buen arte de construir y a las instrucciones dadas por la Dirección de Obra.

Su definición y forma de abono será la expresada en el texto que figura en el Cuadro de Precios. En caso de duda la interpretación se ajustará a los criterios señalados en el presente Pliego para las unidades de obra similares u homologables, a juicio del Director de Obra.

998.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN.

998.1.-DEFINICIÓN.

La conservación de la obra durante la ejecución consiste en mantener todo el tramo de la carretera objeto del proyecto en buenas condiciones de viabilidad a lo largo de la duración.

Si por necesidades durante la ejecución de las obras, dada la forma de ejecución elegida por el Contratista, fuera necesaria la construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, se construirán estos de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y según orden el Ingeniero de Construcción, incluso riego asfáltico si lo considerase necesario.

El Contratista queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato con arreglo a lo que prescribe el Código de la Circulación vigente y la Orden Ministerial del M.O.P.U. del 14 de Marzo de 1960 y las aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67-1960 de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales.

998.2.- EJECUCIÓN.

El Contratista deberá garantizarse, en todo punto por donde discurre el tráfico, tanto en el firme antiguo como en los nuevos tramos abiertos a la circulación, como en cualquier desvío provisional, y en todo momento, las siguientes condiciones mínimas:

a) No interrumpir el tránsito, ni disminuir la fluidez de la circulación hasta el punto de no poderse encauzar la circulación afluente. Para ello dispondrá el Contratista cuanto personal, medios, señalización (incluso semáforos), etc., fueran necesarios.
b) Contar con una rodadura cómoda y segura para velocidades superiores a cuarenta kilómetros por hora (40km/h).

c) Atender inmediatamente a la reparación de cuantos baches, grietas y descarnaduras se produzcan en el firme durante el periodo de las obras, especialmente de aquellas que pudieran ocasionar su degradación rápida. Debe así conservarse con características análogas a las iniciales.

El Ingeniero de Construcción, dictará las normas oportunas tanto en materiales como en la ejecución, aprobando o rechazando estos trabajos una vez realizados, así como los medios de señalización que se empleen.

998.3.- **ABONO.**

La conservación de la obra, durante la ejecución, no será de abono por separado por estar incluidas dichas operaciones en todas y cada una de las unidades de obra.

999.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.

El proyecto contempla una partida alzada a justificar:

- Partida alzada a justificar para seguridad y salud.
- Partida alzada a justificar para la realización de cruces con red de telefonía.

Estas partidas se medirán y abonarán por sus unidades constitutivas realmente realizadas a los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios del Proyecto.

Tajonar, Agosto de 2023

Por EUNATE CIA DE INGENIERÍA S.L.



Fdo. **IÑIGO ENCINAS GUAZA.**
ICCP, Colegiado nº19.233.



Fdo. **JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA.**
ITOP, Colegiado nº 8.644.

PRESUPUESTO

C U A D R O D E P R E C I O S Nº 1

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
1	ml	Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.	Cuatro euros con sesenta y nueve cents.	4,69
2	ml	Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.	Trece euros con cuarenta y tres cents.	13,43
3	ud	Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=200 mm., con piezas necesarias, suministro y colocación. Totalmente instalado.	Setenta y dos euros con veinticuatro cents.	72,24
4	ud	Codo de fundición nodular, D=200mm. E-E, para cualquier ángulo, con junta expres y accesorios, totalmnete colocado y probado.	Doscientos cuarenta y cuatro euros con noventa cents.	244,90
5	ud	Reducción de fundición nodular BB ,de D=300mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y probado.	Cuatrocientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y siete cents.	458,47
6	ud	Trampillón de maniobra para válvula de compuerta enterrada en vial, formado por eje telescópico de maniobra de fundición dúctil, trampillón para todo tipo de válvulas de fundición, protección compuesta por tubería de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigón. S/planos, totalmente instalado y probado.	Ciento diecinueve euros con setenta y ocho cents.	119,78
7	ud	"Te" de fundición nodular, brida-brida-brida, derivación a varios diámetros, con piezas necesarias, suministro y colocación, D=200mm.	Doscientos cincuenta y ocho euros con cuarenta y siete cents.	258,47
8	ml	Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=100 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.		

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
			Cuarenta y nueve euros con noventa y seis cents.	49,96
9	ml	Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=200 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.		
			Ochenta y tres euros con setenta cents.	83,70
10	ud	Válvula de compuerta con bridas, de fundición nodular, de diámetro D=200 mm. y PN-16, tipo Euro-21 de Saint-Gobain o similar. Incluso p/p de tornillería bicromatada, juntas y volante.Totalmente instalada y probada.		
			Setecientos setenta y nueve euros con sesenta cents.	779,60
11	ud	Arqueta de registro de fundición nodular con aislante térmico, para el alojamiento del contador de 52x21x21 cm., con soporte fijo en interior, racord de desmontaje y juntas tóricas, llaves de entrada y salida de 1", enlaces, contador de 20 mm antihielo, piezas especiales y conexión a la acometida existente. Incluso relleno de la arqueta de material aislante témico, p/p de asiento con material granular y recibido con la rasante del pavimento.Totalmente instalada y probada.		
			Ciento noventa y siete euros con dieciséis cents.	197,16
12	ud	Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.		
			Cuarenta y dos euros con veintinueve cents.	42,29
13	ud	Collarín de toma de 2" para boca de riego, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.		
			Treinta y dos euros con treinta y nueve cents.	32,39
14		Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.		
			Mil doscientos euros.	1.200,00
15	ml	Mantenimiento del funcinamiento de alumbrado, incluye cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento, con cable de tierra y tomas de tierra. Mantenimiento del funcinamiento.		
			Once euros.	11,00

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
16	ud	Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm para empotrar con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.	Sesenta y ocho euros con treinta y siete cents.	68,37
17	ud	Bolardo polipropileno flexible, desmontable, tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm., inclusos bases de sujección con cierre mediante llave de cabeza triangular para su extracción, con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.	Doscientos cuarenta y cuatro euros con veintidós cents.	244,22
18	m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.	Ciento trece euros con cincuenta cents.	113,50
19	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.	Ciento diecinueve euros con cuarenta y nueve cents.	119,49
20	m2	Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.	Treinta y cuatro euros con diez cents.	34,10
21	m2	Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.	Diecisiete euros con veinticuatro cents.	17,24
22	m2	Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.	Veintiún euros con ochenta y nueve cents.	21,89
23	ml	Mantenimiento de servicios de abastecimiento, tendidos aéreos con tubería de polietileno (protegida con coquilla aislante), conexiones provisionales a la red y a las viviendas.. etc. durante la ejecución de las obras. Incluye las dos fachadas de la calle. Incluso retirada de todas las instalaciones provisionales una vez finalizadas las obras.	Catorce euros.	14,00

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
24	ml	Localización de la tubería con medios mecánicos y/o manual asi como el mantenimiento del servicio del gas, incluye descubrir, protección de la tubería con arena y/o hormigón acondicionado de los paso con los distintos servicios de saneamiento y abastecimineto. Siguiendo la indicaciones de Gas Navarra.	Veintidós euros.	22,00
25	m3	Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.	Veintisiete euros con treinta y tres cents.	27,33
26	m2	Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes	Seis euros con cinco cents.	6,05
27	m3	Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.	Ocho euros con treinta y un cents.	8,31
28	m3	Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.	Veintisiete euros con cuarenta y seis cents.	27,46
29	m3	Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.	Once euros con veinticuatro cents.	11,24
30	m3	Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.	Veintiocho euros con noventa y seis cents.	28,96
31	m3	Gravillín 3/8 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.	Veintiocho euros con noventa y seis cents.	28,96

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
32	m2	Losa prefabricada de hormigón similar a la existente, asentada sobre capa de mortero de cemento nivelada 6 cm de espesor, cemento de unión entre mortero y baldosa, humectado, maceado de las baldosas con medios manuales y mecánicos, recebados de las juntas con cemnto y arena silicea, barrido y limpieza. P/p de cortes y remates con arquetas y finales. Medios auxiliares, totalmente colocado.	Treinta euros con dieciocho cents.	30,18
33	t	Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, AC 16 SURF 50/70 D OFITA (D-8), en capa de rodadura, incluído transporte, p/p de operaciones intermedias de su puesta en obra, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. (Art. 542 del PPTP)	Ciento veintiséis euros con setenta y tres cents.	126,73
34	t	Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.	Ciento dieciocho euros con cincuenta y nueve cents.	118,59
35	m2	Impresión con una malla de acero o plástico de alta densidad con formato a decidir en obra po la D.O., sobre capa de aglomerado asfáltico recién extendida o recalentando previamente la superficie asfáltica con máquina de Infrarrojos. El sistema se acaba con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgaste tipo ZoruBond-PU o similar.	Diecinueve euros con sesenta cents.	19,60
36	t	Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.	Seiscientos cincuenta y siete euros con veinte cents.	657,20
37	m2	Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.	Un euro con diez cents.	1,10
38	m2	Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con una dotación de 1.5 kg/m2 de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.	Un euro con quince cents.	1,15
39	m3	Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.	Veintinueve euros con siete cents.	29,07

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
40	ml	Acondicionado y reposiciones de las fachadas a la nueva rasante de la calle, con materiales igual o similar a los existentes, todo incluido, según las indicaciones de la Dirección de Obra.	Trece euros.	13,00
41	ud	Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto	Ocho mil cincuenta y tres euros con noventa y seis cents.	8.053,96
42	ud	Arqueta de Telefonos, tipo H prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos, regletas de suspensión de cables, soportes de enganches de poleas, marcco y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañia telefonía.	Trescientos sesenta y siete euros con treinta y tres cents.	367,33
43	ud	Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañía de telefonía.	Ciento nueve euros con treinta y cuatro cents.	109,34
44	ml	Canalización de telefonía, comprendiendo apertura de zanja, colocación de 2 tubos de PVC 110 mm.hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulforresistente, cinta de señalización relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20 no plástico, según planos. Totalmente terminado y probado.	Veinticinco euros con ochenta y un cents.	25,81
45	ml	Canalización telefónica, comprendiendo apertura de zanja en terrenos libres, colocación de2 tubos PVC rígidos de 63 mm. (aportados por Telefónica), hormigonado del prisma con HM-20, relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20. Totalmente terminado y probado.	Ocho euros con trece cents.	8,13
46	ud	Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre de válvula de asiento elastico y válvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barcelona incluido arqueta de hormigón con marco y tapa,"T" de derivación, adquisición y colocación del piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado s/planos.	Seiscientos nueve euros.	609,00
47	ud	Boca de riego de arqueta, de DN=50 mm., incluso arqueta, refuerzo bloque de apoyo de hormigón, abrazadera, tuberia de PAD 63 mm., adquisición y colocación del piecerío de enlace, s/planos, totalmente instalada y probada..	Doscientos doce euros con cuarenta y un cents.	212,41
48	m2	Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje.		

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
			Dieciocho euros con treinta cents.	18,30
49	ud	Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.	Ciento veintiún euros con noventa y cinco cents.	121,95
50	ud	Señal cuadrada de 40 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.	Ciento dieciséis euros con sesenta y cinco cents.	116,65
51	ud	Aletas de hormigón armado HA-25/B/20-IIa, de entrada o salida de desagües, incluso excavaciones y rellenos, p/p de impostas, según planos totalmente terminado.	Ciento setenta y nueve euros con veintiún cents.	179,21
52	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	Doce cents.	0,12
53	t	Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.	Noventa euros.	90,00
54	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).	Cuatro euros.	4,00
55	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	Seis euros con cincuenta cents.	6,50
56	t	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.	Veinte euros.	20,00
57	ud	Arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento con tubo de PVC D=160, incluyendo aqueta base de PVC D=400 mm. y altura variable inferior, marco y tapa de fundición nodular de 40 x 40 cm., formación de media caña de tubo de PVC en fondo, conexión a la tubería domiciliaria existente y a la nueva tubería de acometida. Incluso la localización de tubería de la acometida existente, medios auxiliares, según planos, totalmente terminado.		

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
			Doscientos veintisiete euros con sesenta y nueve cents.	227,69
58	ud	Marco y rejilla de fundición nodular cóncava SQUADRA 400 o simlar clase C250., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente instalado.	Ciento veintiocho euros con cuarenta y dos cents.	128,42
59	ud	Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores 0.4x0.40x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.	Ochenta y nueve euros con cincuenta y seis cents.	89,56
60	ml	Zanja para redes, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-25, con un ancho de zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	Trece euros.	13,00
61	ud	Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.	Doscientos tres euros con noventa y nueve cents.	203,99
62	ud	Módulo recrecido para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior s/planos, y 250 mm. de altura, incluso p.p. de juntas, colocado y probado.	Ciento veintisiete euros con sesenta y siete cents.	127,67
63	ud	Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.	Trescientos cincuenta y nueve euros con nueve cents.	359,09
64	ud	Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.	Trescientos sesenta y siete euros con catorce cents.	367,14

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
65	ud	Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.	Doce euros con noventa y seis cents.	12,96
66	ml	Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/ UNE EN 1452-2, de 160 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas, entronques y conexiones a tuberías o pozoa de registro, pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	Quince euros con noventa y nueve cents.	15,99
67	ml	Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE EN 1452-2, de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	Veintitrés euros con tres cents.	23,03
68	ml	Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	Cuarenta y tres euros con sesenta y nueve cents.	43,69
69	ud	Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.	Veintiséis euros.	26,00
70	ud	Salida de bajante de pluviales a la calzada mediante adaptador en "T" de fundición nodular tipo Funditubo o similar, con brida de registro, de D=80-125 y tubería de PVC hasta conectar con pluviales, sujecciones y conexiones, totalmente terminado.	Ciento veinte euros.	120,00
71	ud	Conexión del nuevo colector a la red de saneamiento existente, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.	Ciento sesenta euros.	160,00
72	ud	Conexión a la red de abastecimiento existente con piecerío de fundición nodular, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.	Doscientos ochenta euros.	280,00
73	ml	Canalización eléctrica para alumbrado, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado.		

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
			Veinticinco euros con ochenta y tres cents.	25,83
74	ml	Canalización eléctrica para fuerzas eléctricas, compuesta de 1 tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.		
			Dieciocho euros con cuarenta y ocho cents.	18,48
75	ml	Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 2 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.		
			Treinta y un euros con cuarenta y cinco cents.	31,45
76	ml	Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 3 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.		
			Treinta y seis euros con doce cents.	36,12
77	ud	Arqueta prefabricada de hormigón, de M.T. y B.T., troncopiramidal modelo Iberdrola, de 1m. de profundidad tipo M2-T2. Con marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. Incluso excavación y rellenos, lecho de grava. Totalmente terminada.		
			Trescientos tres euros con veintinueve cents.	303,29
78	ud	Reposición de arquetas existentes, con reposición de marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA, herramientas y medios auxiliares.		
			Doscientos treinta y ocho euros con veinticuatro cents.	238,24

Núm	UM	Descripción	Importe en letras	Imp. cifras
79	ud	Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.	Sesenta y cinco euros con treinta y dos cents.	65,32

Tajonar, 25/08/2023

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP



Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado Nº 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS



Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado Nº 8.644

C U A D R O D E P R E C I O S Nº 2

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

Nº	Ud.	Descripción	Precio

1 ml Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra		2,2417
Materiales		2,4486
Suma		4,6903
	Redondeo	-0,0003
TOTAL		**4,69**

2 ml Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Mano de obra		4,3248
Materiales		9,1054
Suma		13,4302
	Redondeo	-0,0002
TOTAL		**13,43**

3 ud Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=200 mm., con piezas necesarias, suministro y colocación. Totalmente instalado.

Mano de obra		7,9118
Materiales		58,6074
Maquinaria		5,7240
Suma		72,2432
	Redondeo	-0,0032
TOTAL		**72,24**

4 ud Codo de fundición nodular, D=200mm. E-E, para cualquier ángulo, con junta expres y accesorios, totalmnete colocado y probado.

Mano de obra		9,8898
Materiales		227,8576
Maquinaria		7,1550
Suma		244,9024
	Redondeo	-0,0024
TOTAL		**244,90**

Nº	Ud.	Descripción	Precio

5 ud Reducción de fundición nodular BB ,de D=300mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y probado.

Mano de obra		11,8678
Materiales		438,0132
Maquinaria		8,5860
Suma		458,4670
	Redondeo	0,0030
TOTAL		**458,47**

6 ud Trampillón de maniobra para válvula de compuerta enterrada en vial, formado por eje telescópico de maniobra de fundición dúctil, trampillón para todo tipo de válvulas de fundición, protección compuesta por tubería de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigón. S/planos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra		19,0800
Materiales		100,7000
		119,78
TOTAL		

7 ud "Te" de fundición nodular, brida-brida-brida, derivación a varios diámetros, con piezas necesarias, suministro y colocación, D=200mm.

Mano de obra		39,5592
Materiales		209,3712
Maquinaria		9,5400
Suma		258,4704
	Redondeo	-0,0004
TOTAL		**258,47**

8 ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=100 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.

Mano de obra		2,6373
Materiales		45,4189
Maquinaria		1,9080
Suma		49,9642
	Redondeo	-0,0042
TOTAL		**49,96**

Nº	Ud.	Descripción	Precio

9 ml Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=200 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.

Mano de obra		3,2966
Materiales		78,0160
Maquinaria		2,3850
Suma		83,6976
	Redondeo	0,0024
TOTAL		**83,70**

10 ud Válvula de compuerta con bridas, de fundición nodular, de diámetro D=200 mm. y PN-16, tipo Euro-21 de Saint-Gobain o similar. Incluso p/p de tornillería bicromatada, juntas y volante.Totalmente instalada y probada.

Mano de obra		16,4830
Materiales		763,1152
Suma		779,5982
	Redondeo	0,0018
TOTAL		**779,60**

11 ud Arqueta de registro de fundición nodular con aislante térmico, para el alojamiento del contador de 52x21x21 cm., con soporte fijo en interior, racord de desmontaje y juntas tóricas, llaves de entrada y salida de 1", enlaces, contador de 20 mm antihielo, piezas especiales y conexión a la acometida existente. Incluso relleno de la arqueta de material aislante témico, p/p de asiento con material granular y recibido con la rasante del pavimento.Totalmente instalada y probada.

Mano de obra		19,0800
Materiales		178,0800
TOTAL		**197,16**

12 ud Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra	9,5400

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Materiales		32,7540
		Suma		42,2940
			Redondeo	-0,0040
		TOTAL		**42,29**

13 ud Collarín de toma de 2" para boca de riego, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.

Mano de obra		7,6320
Materiales		24,7616
Suma		32,3936
	Redondeo	-0,0036
TOTAL		**32,39**

14 Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.

Sin descomposición		1.200,0000
TOTAL		**1.200,00**

15 ml Mantenimiento del funcinamiento de alumbrado, incluye cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento, con cable de tierra y tomas de tierra. Mantenimiento del funcinamiento.

Sin descomposición		11,0000
TOTAL		**11,00**

16 ud Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm para empotrar con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.

Mano de obra		28,1960
Materiales		33,8140
Maquinaria		6,3600
TOTAL		**68,37**

17 ud Bolardo polipropileno flexible, desmontable, tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm., inclusos bases de sujección con cierre mediante llave de cabeza triangular para su extracción, con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.

Nº	Ud.	Descripción	Precio
		Mano de obra	29,8920
		Materiales	207,5480
		Maquinaria	6,7840
		Suma	244,2240
		Redondeo	-0,0040
		TOTAL	**244,22**

18 m3 Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.

Mano de obra		11,4798
Materiales		94,6050
Maquinaria		7,4200
Suma		113,5048
Redondeo		-0,0048
TOTAL		**113,50**

19 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Mano de obra		18,3677
Materiales		93,2800
Maquinaria		7,8440
Suma		119,4917
Redondeo		-0,0017
TOTAL		**119,49**

20 m2 Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.

Mano de obra		18,3677
Materiales		10,9604
Maquinaria		4,7700
Suma		34,0981
Redondeo		0,0019
TOTAL		**34,10**

21 m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Nº	Ud.	Descripción	Precio
		Mano de obra	7,6532
		Materiales	9,5909
		Suma	17,2441
		Redondeo	-0,0041
		TOTAL	**17,24**

22 m2 Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra		7,6532
Materiales		13,0401
Maquinaria		1,1925
Suma		21,8858
	Redondeo	0,0042
TOTAL		**21,89**

23 ml Mantenimiento de servicios de abastecimiento, tendidos aéreos con tubería de polietileno (protegida con coquilla aislante), conexiones provisionales a la red y a las viviendas.. etc. durante la ejecución de las obras. Incluye las dos fachadas de la calle. Incluso retirada de todas las instalaciones provisionales una vez finalizadas las obras.

Sin descomposición	14,0000
TOTAL	**14,00**

24 ml Localización de la tubería con medios mecánicos y/o manual asi como el mantenimiento del servicio del gas, incluye descubrir, protección de la tubería con arena y/o hormigón acondicionado de los paso con los distintos servicios de saneamiento y abastecimineto. Siguiendo la indicaciones de Gas Navarra.

Sin descomposición	22,0000
TOTAL	**22,00**

25 m3 Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra	0,7802
Materiales	19,8219

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		6,7289
		Suma		27,3310
			Redondeo	-0,0010
		TOTAL		**27,33**

26 m2 Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes

	Mano de obra		0,6784
	Maquinaria		5,3691
	Suma		6,0475
		Redondeo	0,0025
	TOTAL		**6,05**

27 m3 Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.

	Mano de obra		0,6784
	Maquinaria		7,6320
	Suma		8,3104
		Redondeo	-0,0004
	TOTAL		**8,31**

28 m3 Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

	Mano de obra		3,3920
	Materiales		19,8220
	Maquinaria		4,2421
	Suma		27,4561
		Redondeo	0,0039
	TOTAL		**27,46**

29 m3 Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.

	Mano de obra	0,5088

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Materiales		5,3000
		Maquinaria		5,4324
		Suma		11,2412
			Redondeo	-0,0012
		TOTAL		**11,24**

30 m3 Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.

Mano de obra			2,3744
Materiales			19,4616
Maquinaria			7,1232
	Suma		28,9592
		Redondeo	0,0008
	TOTAL		**28,96**

31 m3 Gravillín 3/8 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra			2,3744
Materiales			19,4616
Maquinaria			7,1232
	Suma		28,9592
		Redondeo	0,0008
	TOTAL		**28,96**

32 m2 Losa prefabricada de hormigón similar a la existente, asentada sobre capa de mortero de cemento nivelada 6 cm de espesor, cemento de unión entre mortero y baldosa, humectado, maceado de las baldosas con medios manuales y mecánicos, recebados de las juntas con cemnto y arena silicea, barrido y limpieza. P/p de cortes y remates con arquetas y finales. Medios auxiliares, totalmente colocado.

Mano de obra			14,3100
Materiales			14,6810
Maquinaria			1,1925
	Suma		30,1835
		Redondeo	-0,0035
	TOTAL		**30,18**

Nº	Ud.	Descripción	Precio

33 t Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, AC 16 SURF 50/70 D OFITA (D-8), en capa de rodadura, incluído transporte, p/p de operaciones intermedias de su puesta en obra, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. (Art. 542 del PPTP)

Mano de obra		24,3800
Materiales		28,2776
Maquinaria		74,0728
Suma		126,7304
	Redondeo	-0,0004
TOTAL		**126,73**

34 t Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

Mano de obra		24,3800
Materiales		20,1400
Maquinaria		74,0728
Suma		118,5928
	Redondeo	-0,0028
TOTAL		**118,59**

35 m2 Impresión con una malla de acero o plástico de alta densidad con formato a decidir en obra po la D.O., sobre capa de aglomerado asfáltico recién extendida o recalentando previamente la superficie asfáltica con máquina de Infrarrojos. El sistema se acaba con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgaste tipo ZoruBond-PU o similar.

Sin descomposición	19,6000
TOTAL	**19,60**

36 t Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.

Materiales	657,2000
TOTAL	**657,20**

37 m2 Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Nº	Ud.	Descripción	Precio
		Sin descomposición	1,1000
			1,10
		TOTAL	

38 m2 Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con una dotación de 1.5 kg/m2 de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Sin descomposición	1,1500
	1,15
TOTAL	

39 m3 Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

Mano de obra		0,6038
Materiales		23,7009
Maquinaria		4,7688
Suma		29,0735
	Redondeo	-0,0035
TOTAL		**29,07**

40 ml Acondicionado y reposiciones de las fachadas a la nueva rasante de la calle, con materiales igual o similar a los existentes, todo incluido, según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Sin descomposición	13,0000
	13,00
TOTAL	

41 ud Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto

Sin descomposición	8.053,9600
	8.053,96
TOTAL	

42 ud Arqueta de Telefonos, tipo H prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos, regletas de suspensión de cables, soportes de enganches de poleas, marcco y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañia telefonía.

Mano de obra	13,1864
Materiales	339,2000

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		14,9460
		Suma		367,3324
			Redondeo	-0,0024
		TOTAL		**367,33**

43 ud Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañía de telefonía.

	Mano de obra		13,1864
	Materiales		66,5786
	Maquinaria		29,5740
	Suma		109,3390
		Redondeo	0,0010
	TOTAL		**109,34**

44 ml Canalización de telefonía, comprendiendo apertura de zanja, colocación de 2 tubos de PVC 110 mm.hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulforresistente, cinta de señalización relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20 no plástico, según planos. Totalmente terminado y probado.

	Mano de obra		6,7550
	Materiales		18,3440
	Maquinaria		0,7107
	Suma		25,8097
		Redondeo	0,0003
	TOTAL		**25,81**

45 ml Canalización telefónica, comprendiendo apertura de zanja en terrenos libres, colocación de2 tubos PVC rígidos de 63 mm. (aportados por Telefónica), hormigonado del prisma con HM-20, relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20. Totalmente terminado y probado.

	Mano de obra		0,8212
	Materiales		6,5981
	Maquinaria		0,7107
	TOTAL		**8,13**

46 ud Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre de válvula de asiento elastico y válvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barcelona incluido arqueta de hormigón con marco y tapa,"T" de derivación, adquisición y colocación del piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado s/planos.

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Sin descomposición		609,0000
				609,00
		TOTAL		

47 ud Boca de riego de arqueta, de DN=50 mm., incluso arqueta, refuerzo bloque de apoyo de hormigón, abrazadera, tuberia de PAD 63 mm., adquisición y colocación del piecerío de enlace, s/planos, totalmente instalada y probada..

Mano de obra		40,7356
Materiales		171,6778
Suma		212,4134
	Redondeo	-0,0034
TOTAL		**212,41**

48 m2 Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje.

Mano de obra		15,2640
Materiales		2,2769
Maquinaria		0,7638
Suma		18,3047
	Redondeo	-0,0047
TOTAL		**18,30**

49 ud Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.

Mano de obra		11,4480
Materiales		105,4170
Maquinaria		5,0880
Suma		121,9530
	Redondeo	-0,0030
TOTAL		**121,95**

50 ud Señal cuadrada de 40 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.

Mano de obra	11,4480
Materiales	100,1170

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		5,0880
		Suma		116,6530
			Redondeo	-0,0030
		TOTAL		**116,65**

51 ud Aletas de hormigón armado HA-25/B/20-IIa, de entrada o salida de desagües, incluso excavaciones y rellenos, p/p de impostas, según planos totalmente terminado.

	Mano de obra		48,7737
	Materiales		105,3290
	Maquinaria		25,1113
	Suma		179,2140
		Redondeo	-0,0040
	TOTAL		**179,21**

52 mk Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

	Sin descomposición	0,1200
	TOTAL	**0,12**

53 t Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

	Sin descomposición	90,0000
	TOTAL	**90,00**

54 m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

	Sin descomposición	4,0000
	TOTAL	**4,00**

55 m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

	Sin descomposición	6,5000
	TOTAL	**6,50**

Nº	Ud.	Descripción	Precio

56 t Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

Sin descomposición	20,0000
TOTAL	**20,00**

57 ud Arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento con tubo de PVC D=160, incluyendo aqueta base de PVC D=400 mm. y altura variable inferior, marco y tapa de fundición nodular de 40 x 40 cm., formación de media caña de tubo de PVC en fondo, conexión a la tubería domiciliaria existente y a la nueva tubería de acometida. Incluso la localización de tubería de la acometida existente, medios auxiliares, según planos, totalmente terminado.

Mano de obra		13,5680
Materiales		204,5800
Maquinaria		9,5400
Suma		227,6880
	Redondeo	0,0020
TOTAL		**227,69**

58 ud Marco y rejilla de fundición nodular cóncava SQUADRA 400 o simlar clase C250., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente instalado.

Mano de obra		11,0240
Materiales		117,3950
Suma		128,4190
	Redondeo	0,0010
TOTAL		**128,42**

59 ud Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores 0.4x0.40x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra	29,6694
Materiales	49,2900

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		10,6000
		Suma		89,5594
			Redondeo	0,0006
		TOTAL		**89,56**

60 ml Zanja para redes, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-25, con un ancho de zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Sin descomposición		13,0000
		13,00
TOTAL		

61 ud Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

Mano de obra		13,1864
Materiales		180,2000
Maquinaria		10,6000
Suma		203,9864
	Redondeo	0,0036
TOTAL		**203,99**

62 ud Módulo recrecido para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior s/planos, y 250 mm. de altura, incluso p.p. de juntas, colocado y probado.

Mano de obra		13,1864
Materiales		103,8800
Maquinaria		10,6000
Suma		127,6664
	Redondeo	0,0036
TOTAL		**127,67**

63 ud Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.

Mano de obra	13,1864
Materiales	335,2992

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		10,6000
		Suma		359,0856
			Redondeo	0,0044
		TOTAL		**359,09**

64 ud Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.

Mano de obra			65,9320
Materiales			278,9432
Maquinaria			22,2600
Suma			367,1352
		Redondeo	0,0048
TOTAL			**367,14**

65 ud Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.

Mano de obra			6,5932
Materiales			6,3706
Suma			12,9638
		Redondeo	-0,0038
TOTAL			**12,96**

66 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/ UNE EN 1452-2, de 160 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas, entronques y conexiones a tuberías o pozoa de registro, pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Mano de obra			3,9559
Materiales			12,0310
Suma			15,9869
		Redondeo	0,0031
TOTAL			**15,99**

67 ml Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE EN 1452-2, de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Mano de obra			4,6152

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Materiales		18,4122
		Suma		23,0274
			Redondeo	0,0026
		TOTAL		**23,03**

68 ml Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Mano de obra		1,9780
Materiales		40,2800
Maquinaria		1,4310
Suma		43,6890
	Redondeo	0,0010
TOTAL		**43,69**

69 ud Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

Sin descomposición	26,0000
TOTAL	**26,00**

70 ud Salida de bajante de pluviales a la calzada mediante adaptador en "T" de fundición nodular tipo Funditubo o similar, con brida de registro, de D=80-125 y tubería de PVC hasta conectar con pluviales, sujecciones y conexiones, totalmente terminado.

Sin descomposición	120,0000
TOTAL	**120,00**

71 ud Conexión del nuevo colector a la red de saneamiento existente, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.

Sin descomposición	160,0000
TOTAL	**160,00**

72 ud Conexión a la red de abastecimiento existente con piecerío de fundición nodular, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.

Nº	Ud.	Descripción	Precio
		Sin descomposición	280,0000
			280,00
		TOTAL	

73 ml Canalización eléctrica para alumbrado, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado.

Mano de obra		4,2835
Materiales		19,9410
Maquinaria		1,6013
Suma		25,8258
	Redondeo	0,0042
TOTAL		**25,83**

74 ml Canalización eléctrica para fuerzas eléctricas, compuesta de 1 tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

Mano de obra		4,1429
Materiales		13,6919
Maquinaria		0,6406
Suma		18,4754
	Redondeo	0,0046
TOTAL		**18,48**

75 ml Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 2 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

Mano de obra		6,8018
Materiales		23,7745
Maquinaria		0,8709
Suma		31,4472
	Redondeo	0,0028
TOTAL		**31,45**

Nº	Ud.	Descripción	Precio

76 ml Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 3 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

Mano de obra		5,1366
Materiales		28,8026
Maquinaria		2,1771
Suma		36,1163
	Redondeo	0,0037
TOTAL		**36,12**

77 ud Arqueta prefabricada de hormigón, de M.T. y B.T., troncopiramidal modelo Iberdrola, de 1m. de profundidad tipo M2-T2. Con marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. Incluso excavación y rellenos, lecho de grava. Totalmente terminada.

Mano de obra		19,0800
Materiales		258,7672
Maquinaria		25,4400
Suma		303,2872
	Redondeo	0,0028
TOTAL		**303,29**

78 ud Reposición de arquetas existentes, con reposición de marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA, herramientas y medios auxiliares.

Mano de obra		45,7920
Materiales		161,9150
Maquinaria		30,5280
Suma		238,2350
	Redondeo	0,0050
TOTAL		**238,24**

79 ud Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

Mano de obra	22,3355
Materiales	40,8767

Nº	Ud.	Descripción		Precio
		Maquinaria		2,1050
		Suma		65,3172
			Redondeo	0,0028
		TOTAL		**65,32**

Tajonar, 25/08/2023

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP



Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado Nº 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS



Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado Nº 8.644

EUNATE
Compañia de Ingeniería, S.L.
Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ªplanta
31192 Tajonar (NAVARRA)
Tfno.: (+34) 948 29 02 37
eunate@eunateing.com

M E D I C I O N E S

Obra: PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

1 PAVIMENTACIÓN CON REDES

1.1 REDES

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1 998,24 m3 Excavación zanja todo.

Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.

Descripción	1/Talud	Anc. Inf.	Altura	Distancia	Volumen
Abast	3,000	0,700	0,900	153,000	137,700
	3,000	0,700	0,900		
				Total ...	**137,70**

2 535,31 m3 Relleno selec. zanjas. prestamos

Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Exc. zanja	1.012,010				1.012,010
Firme calzada	-211,000				-211,000
Gravillin	-232,740				-232,740
Grava	-8,000				-8,000
tub	-0,078	320,000			-24,960
				Total ..	**535,31**

3 8,00 m3 Grava de tamaño 19-24 mm.

Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Trasdós pozos:					
- Fecales	4,000				4,000
- Pluviales	4,000				4,000
				Total ..	**8,00**

4 232,74 m3 Gravillín 3/8 mm. asiento tuberia

Gravillín 3/8 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Fecales D315	1,000	159,620		0,530	84,599
Pluv D315	1,000	162,720		0,530	86,242
Abast D200	1,000	130,000		0,430	55,900
Abast D100	1,000	20,000		0,300	6,000
				Total ..	**232,74**

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial

5 114,00 ml Zanja para redes

Zanja para redes, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-25, con un ancho de zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas:					
- Fec.	17,000	3,000			51,000
- Abast	17,000	3,000			51,000
- BR	3,000	3,000			9,000
- Hidrante	1,000	3,000			3,000
				Total ..	**114,00**

1.1.2 TUBERÍAS Y REGISTROS

1.1.2.1 ARQUETA DE CONEXIÓN

1 14,00 m3 Excavación zanja todo.
Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	2,000	2,000	3,500	14,000
				Total ..	**14,00**

2 4,00 m3 Grava de tamaño 19-24 mm.
Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.

3 8,00 m3 Relleno selec. zanjas. prestamos
Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.

4 38,40 m2 Encofrado plano V. P.P.
Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	8,000	2,000	1,200	2,000	38,400
				Total ..	**38,40**

5 38,400 m2 Mallazo 15x15/10
Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	8,000	2,000	1,200	2,000	38,400
				Total ..	**38,400**

6 3,000 m2 Mallazo 15x15/12
Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
solera	1,000	2,000	1,500		3,000
				Total ..	**3,000**

7 7,60 m3 Hormigón HA-25

Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	1,000	2,000	1,200	0,250	0,600
	8,000	2,000	0,200	2,000	6,400
	1,000	2,000	1,200	0,250	0,600
				Total ..	**7,60**

8 1,80 m3 Hormigón HM-20.

Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
acondicionasdo base	1,000	2,000	2,000	0,200	0,800
medias cañas	1,000				1,000
				Total ..	**1,80**

9 1,00 ud Marco y tapa de fundición PAMREX

Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Fundi-tubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.

10 6,00 ud Pate para pozo registro

Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.

1.1.2.2 SANEAMIENTO

1 **150,00** **ml** **Tuberia PVC san. D=315**

Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Colector	1,000	150,000			150,000
				Total ..	**150,00**

2 **51,00** **ml** **Tuberia PVC san. D=160**

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/ UNE EN 1452-2, de 160 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas, entronques y conexiones a tuberías o pozoa de registro, pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	17,000	3,000			51,000
				Total ..	**51,00**

3 **4,00** **ud** **Modulo cónico D=1000**

Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

4 **4,00** **ud** **Anillo H=250 mm. D=1000**

Módulo recrecido para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior s/planos, y 250 mm. de altura, incluso p.p. de juntas, colocado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

5 **4,00** **ud** **Módulo base pozo D=1000**

Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

6 4,00 ud Marco y tapa de fundición PAMREX

Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

7 16,00 ud Pate para pozo registro

Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000			4,000	16,000
				Total ..	**16,00**

8 18,00 ud Arqueta acomet. saneamiento D160

Arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento con tubo de PVC D=160, incluyendo aqueta base de PVC D=400 mm. y altura variable inferior, marco y tapa de fundición nodular de 40 x 40 cm., formación de media caña de tubo de PVC en fondo, conexión a la tubería domiciliaria existente y a la nueva tubería de acometida. Incluso la localización de tubería de la acometida existente, medios auxiliares, según planos, totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	18,000				18,000
				Total ..	**18,00**

9 18,00 ud Conexiónes tuberias.

Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

10 1,00 ud Conexión de tuberías a la red de saneamiento exist

Conexión del nuevo colector a la red de saneamiento existente, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.

1.1.2.3 PLUVIALES

1 170,00 ml Tuberia PVC san. D=315

Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Colector	1,000	170,000			170,000
				Total ..	**170,00**

2 15,00 ml Tuberia PVC san. D=200

Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE EN 1452-2, de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Sumideros	5,000	3,000			15,000
				Total ..	**15,00**

3 4,00 ud Módulo base pozo D=1000

Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

4 4,00 ud Modulo cónico D=1000

Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

5 4,00 ud Marco y tapa de fundición PAMREX

Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

6 12,00 ud Pate para pozo registro

Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Pozos	4,000	3,000			12,000
				Total ..	**12,00**

7 5,000 ud Marco y rejilla caz 40 x 40

Marco y rejilla de fundición nodular cóncava SQUADRA 400 o simlar clase C250., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente instalado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Sumideros	5,000				5,000
				Total ..	**5,000**

8 5,000 ud Arqueta sumidero 40 x 40

Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores 0.4x0.40x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Sumideros	5,000				5,000
				Total ..	**5,000**

9 22,00 ud Conexiónes tuberias.

Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Sumideros	5,000				5,000
bajantes	17,000				17,000
				Total ..	**22,00**

10 21,00 ud Salida de bajante de pluviales calzada.

Salida de bajante de pluviales a la calzada mediante adaptador en "T" de fundición nodular tipo Funditubo o similar, con brida de registro, de D=80-125 y tubería de PVC hasta conectar con pluviales, sujecciones y conexiones, totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Bajantes	21,000				21,000
				Total ..	**21,00**

11 1,00 ud Aletas desagües

Aletas de hormigón armado HA-25/B/20-IIa, de entrada o salida de desagües, incluso excavaciones y rellenos, p/p de impostas, según planos totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Aleta	1,000				1,000
				Total ..	**1,00**

1.1.2.4 ABASTECIMIENTO

1 **130,00** **ml** **Tubería fundición D=200**

Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=200 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Tub.	1,000	130,000			130,000
				Total ..	**130,00**

2 **23,00** **ml** **Tubería fundición D=100**

Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=100 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calle perpendicular 20,000 20,000	20,000				20,000
Hidrante	3,000				3,000
				Total ..	**23,00**

3 **9,00** **ml** **Tubería de polietileno 63mm**

Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BR	3,000	3,000			9,000
				Total ..	**9,00**

4 **51,00** **ml** **Tubería de polietileno 32 mm**

Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	17,000	3,000			51,000
				Total ..	**51,00**

Descripción				Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial

5 **1,000** **ud** **Reducción B-B, D=300mm.**
Reducción de fundición nodular BB ,de D=300mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y probado.

6 **1,00** **ud** **"Te" FN BBB, D=200mm.**
"Te" de fundición nodular, brida-brida-brida, derivación a varios diámetros, con piezas necesarias, suministro y colocación, D=200mm.

7 **2,00** **ud** **Válvula comp. D=200mm**
Válvula de compuerta con bridas, de fundición nodular, de diámetro D=200 mm. y PN-16, tipo Euro-21 de Saint-Gobain o similar. Incluso p/p de tornillería bicromatada, juntas y volante.Totalmente instalada y probada.

8 **2,000** **ud** **Codo FN E-E, D=200mm.**
Codo de fundición nodular, D=200mm. E-E, para cualquier ángulo, con junta expres y accesorios, totalmnete colocado y probado.

9 **2,000** **ud** **Enlace FN B-E, D=200**
Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=200 mm., con piezas necesarias, suministro y colocación. Totalmente instalado.

10 **2,00** **ud** **Suministro y colocación de Trampillón**
Trampillón de maniobra para válvula de compuerta enterrada en vial, formado por eje telescópico de maniobra de fundición dúctil, trampillón para todo tipo de válvulas de fundición, protección compuesta por tubería de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigón. S/planos, totalmente instalado y probado.

11 **18,00** **ud** **Collarín de toma 1"**
Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	18,000				18,000
				Total ..	**18,00**

12 **18,00** **ud** **Arqueta de registro de fundición nodular, par aloj**
Arqueta de registro de fundición nodular con aislante térmico, para el alojamiento del contador de 52x21x21 cm., con soporte fijo en interior, racord de desmontaje y juntas tóricas, llaves de entrada y salida de 1", enlaces, contador de 20 mm antihielo, piezas especiales y conexión a la acometida existente. Incluso relleno de la arqueta de material aislante témico, p/p de asiento con material granular y recibido con la rasante del pavimento.Totalmente instalada y probada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	18,000				18,000
				Total ..	**18,00**

13 **3,00** **ud** **Collarín de toma 2"**

Collarín de toma de 2" para boca de riego, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BR	3,000				3,000
				Total ..	**3,00**

14 3,00 ud Boca de riego

Boca de riego de arqueta, de DN=50 mm., incluso arqueta, refuerzo bloque de apoyo de hormigón, abrazadera, tuberia de PAD 63 mm., adquisición y colocación del piecerío de enlace, s/planos, totalmente instalada y probada..

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
BR	3,000				3,000
				Total ..	**3,00**

15 1,00 ud Hidrante ent.D=100mm.2sal

Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre de válvula de asiento elastico y válvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barcelona incluido arqueta de hormigón con marco y tapa,"T" de derivación, adquisición y colocación del piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado s/planos.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Hidrante	1,000				1,000
				Total ..	**1,00**

16 2,00 ud Conexión a la red de abastecimiento existente, p.p

Conexión a la red de abastecimiento existente con piecerío de fundición nodular, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Conexion	2,000				2,000
				Total ..	**2,00**

17 150,00 ml Partida Alzada de abono integro abastecimiento

Mantenimiento de servicios de abastecimiento, tendidos aéreos con tubería de polietileno (protegida con coquilla aislante), conexiones provisionales a la red y a las viviendas.. etc. durante la ejecución de las obras. Incluye las dos fachadas de la calle. Incluso retirada de todas las instalaciones provisionales una vez finalizadas las obras.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Servicio de abast.	1,000	150,000			150,000
				Total ..	**150,00**

1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 **57.398,80** **mk** **Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros**
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Exc. Zanja todo	1,000	998,24*1.15*50	57.398,800
		Total ...	**57.398,80**

2 **1.147,98** **m3** **Tasa en concepto de gestión de tierras y rocas**
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Exc. Zanja todo	1,150	998,240			1.147,976
				Total ..	**1.147,98**

3 **13,80** **m3** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición conexión	1,000	12*1.15	13,800
	0,000		0,000
		Total ...	**13,80**

4 **2,00** **t** **Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)**
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

5 **10,00** **t** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD

1	**0,50**	**ud**	**Partida alzada a justificar para la seguridad y sa** Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto

1.2 PAVIMENTACION

1.2.1 CALZADA

1 649,40 m2 Demolición de pavimento

Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400				469,400
Ramal salida	170,000				170,000
Conexiones	10,000				10,000
				Total ..	**649,40**

2 357,17 m3 Cajeado de la calle

Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400			0,500	234,700
Ramal salida	170,000			0,500	85,000
Conex	10,000			0,500	5,000
Saneo	10,000	% sobre	324,700		32,470
				Total ..	**357,17**

3 214,30 m3 Suelo selecc. CBR>20 98%PM

Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400			0,300	140,820
Ramal salida	170,000			0,300	51,000
conex.	10,000			0,300	3,000
Saneo	10,000	% sobre	194,820		19,482
				Total ..	**214,30**

4 162,35 m3 Base zahorra artificial

Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400			0,250	117,350
Ramal salida	170,000			0,250	42,500
Conex.	10,000			0,250	2,500

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
				Total ..	**162,35**

5 5,00 m3 Hormigón HM-20.

Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Refuerzos	5,000				5,000
				Total ..	**5,00**

6 649,40 m2 Riego de imprimación

Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con una dotación de 1.5 kg/m2 de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400				469,400
Ramal salida	170,000				170,000
conex.	10,000				10,000
				Total ..	**649,40**

7 649,40 m2 Riego de adherencia.

Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400				469,400
Ramal salida	170,000				170,000
conex.	10,000				10,000
				Total ..	**649,40**

8 109,10 t Mezcla calizo S-20

Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Carriles calzada	2,400	469,400		0,070	78,859
Ramal salida	2,400	170,000		0,070	28,560
conex.	2,400	10,000		0,070	1,680
				Total ..	**109,10**

9 64,94 t Mezcla D-8, capa rodad.

Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, AC 16 SURF 50/70 D OFITA (D-8), en capa de rodadura, incluído transporte, p/p de operaciones intermedias de su puesta en obra, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. (Art. 542 del PPTP)

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Carriles calzada	2,500	469,400		0,040	46,940
Ramal salida	2,500	170,000		0,040	17,000
conex.	2,500	10,000		0,040	1,000
				Total ..	**64,94**

10 8,48 t Lig.bitum.mezcla asf.cal.

Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
S-20	0,045	109,100			4,910
D-8	0,055	64,940			3,572
				Total ..	**8,48**

11 479,40 m2 Estampación con cuadricula

Impresión con una malla de acero o plástico de alta densidad con formato a decidir en obra po la D.O., sobre capa de aglomerado asfáltico recién extendida o recalentando previamente la superficie asfáltica con máquina de Infrarrojos. El sistema se acaba con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgaste tipo ZoruBond-PU o similar.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Calzada	469,400				469,400
Conexión	10,000				10,000
				Total ..	**479,40**

1.2.2 ACERA

1 302,50 m2 Demolición de pavimento

Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500				302,500
				Total ..	**302,50**

2 133,10 m3 Cajeado de la calle

Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500			0,400	121,000
Saneo	10,000	% sobre	121,000		12,100
				Total ..	**133,10**

3 83,19 m3 Suelo selecc. CBR>20 98%PM

Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500			0,250	75,625
Saneo	10,000	% sobre	75,625		7,563
				Total ..	**83,19**

4 75,63 m3 Base zahorra artificial

Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500			0,250	75,625
				Total ..	**75,63**

5 45,38 m3 Hormigón HM-20.

Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500			0,150	45,375
				Total ..	**45,38**

6 302,50 m2 Losa prefabricada

Losa prefabricada de hormigón similar a la existente, asentada sobre capa de mortero de cemento nivelada 6 cm de espesor, cemento de unión entre mortero y baldosa, humectado, maceado de las baldosas con medios manuales y mecánicos, recebados de las juntas con cemnto y arena silicea, barrido y limpieza. P/p de cortes y remates con arquetas y finales. Medios auxiliares, totalmente colocado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acera	302,500				302,500
				Total ..	**302,50**

7 310,00 ml Acondicionado de las fachadas a la nu

Acondicionado y reposiciones de las fachadas a la nueva rasante de la calle, con materiales igual o similar a los existentes, todo incluido, según las indicaciones de la Dirección de Obra.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Fachadas	2,000	150,000			300,000
	10,000				10,000
				Total ..	**310,00**

1.2.3 SEÑALIZACIÓN

1 28,00 ud Bolardo polipropileno tipo barcelona

Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm para empotrar con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Aceras	1,000			28	28,000
				Total ..	**28,00**

2 8,00 ud Bolardo polipropileno desmontable

Bolardo polipropileno flexible, desmontable, tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm., inclusos bases de sujección con cierre mediante llave de cabeza triangular para su extracción, con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Bolardos fexibles	8,000				8,000
				Total ..	**8,00**

3 46,36 m2 Marca vial símbolos, letr

Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
M-6.4 (STOP)	1,000			2.1*1.6	3,360
Pasos de peatones	2,000	4,500	4,000		36,000
	7,000				7,000
				Total ..	**46,36**

4 2,00 ud Señal circular 60 cm. ref

Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.

5 6,00 ud Señal cuadrada 40 cm. ref

Señal cuadrada de 40 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Paso de peatones	4,000				4,000
Minusv	2,000				2,000
				Total ..	**6,00**

1.2.4 SERVICIOS

1.2.4.1 IBERDROLA

1 **18,00** **ml** **Can.eléc. 1 0-110 HM-20**

Canalización eléctrica para fuerzas eléctricas, compuesta de 1 tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	6,000	3,000			18,000
				Total ..	**18,00**

2 **80,000** **ml** **Can.eléc. 3 0-160 HM-20**

Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 3 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Canalizacion tramo éreo	80,000				80,000
				Total ..	**80,000**

3 **1,00** **ml** **Can.eléc. 2 0-160 HM-20**

Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 2 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.

4 **4,00** **ud** **Arqueta Iberdrola 1 m.**

Arqueta prefabricada de hormigón, de M.T. y B.T., troncopiramidal modelo Iberdrola, de 1m. de profundidad tipo M2-T2. Con marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. Incluso excavación y rellenos, lecho de grava. Totalmente terminada.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Arq.	4,000				4,000
				Total ..	**4,00**

1.2.4.2 ALUMBRADO

1 125,00 ml Can.eléc. 2 0-110 HM-20

Canalización eléctrica para alumbrado, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Canalizacion	125,000				125,000
				Total ..	**125,00**

2 6,00 ud Arqueta hormigón,40x40cm

Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.

1.2.4.3 TELEFONÍA

1 **2,00** **ud** **Arqueta Telef.tipo HF**
Arqueta de Telefonos, tipo H prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos, regletas de suspensión de cables, soportes de enganches de poleas, marcco y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañia telefonía.

2 **6,00** **ud** **Arqueta Telef.tipo MF**
Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañía de telefonía.

3 **126,60** **ml** **Can. telef. 2 D-110 HM-20**
Canalización de telefonía, comprendiendo apertura de zanja, colocación de 2 tubos de PVC 110 mm.hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulforresistente, cinta de señalización relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20 no plástico, según planos. Totalmente terminado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Canalizaicon	126,600				126,600
				Total ..	**126,60**

4 **51,00** **ml** **Can. telef. 2 D-63 HM-20**
Canalización telefónica, comprendiendo apertura de zanja en terrenos libres, colocación de2 tubos PVC rígidos de 63 mm. (aportados por Telefónica), hormigonado del prisma con HM-20, relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20. Totalmente terminado y probado.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Acometidas	17,000	3,000			51,000
				Total ..	**51,00**

1.2.5 SERVICIOS AFECTADOS

1.2.5.1 GAS NATURAL

1 181,00 ml Mantenimiento del gas.
Localización de la tubería con medios mecánicos y/o manual asi como el mantenimiento del servicio del gas, incluye descubrir, protección de la tubería con arena y/o hormigón acondicionado de los paso con los distintos servicios de saneamiento y abastecimineto. Siguiendo la indicaciones de Gas Navarra.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Conducción	1,000	130,000			130,000
Acom.	17,000	3,000			51,000
				Total ..	**181,00**

1.2.5.2 ALUMBRADO

1 130,00 ml Cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento:

Mantenimiento del funcinamiento de alumbrado, incluye cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento, con cable de tierra y tomas de tierra. Mantenimiento del funcinamiento.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Canalizacion	130,000				130,000
				Total ..	**130,00**

1.2.5.3 IBERDROLA

1 5,00 ud Arqueta Iberdrola 1 m.

Reposición de arquetas existentes, con reposición de marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA, herramientas y medios auxiliares.

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Reposición de arq.	5,000				5,000
				Total ..	**5,00**

1.2.5.4 TELEFONÍA

1	**1,000**	**Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.** Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.

1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS

1 **33.132,54** **mk** **Transporte s/camión tierras, piedras, áridos o escombros**
Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición	1,000	(669,40+302,50)*0.22*1.15*50	12.294,535
Cajeado	1,000	(220+142.4)*1.15*50	20.838,000
		Total ...	**33.132,54**

2 **416,76** **m3** **Tasa en concepto de gestión de tierras y rocas**
Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).

Descripción	Unidades	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Cajeado	1,150	220,000			253,000
	1,150	142,400			163,760
				Total ..	**416,76**

3 **971,90** **m3** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.

Descripción	Unidades	Fórmula	Parcial
Demolición	1,000	(669,40+302,50)	971,900
	0,000		0,000
		Total ...	**971,90**

4 **3,00** **t** **Tasa de gestión de RP (Residuos Peligrosos)**
Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.

5 **10,00** **t** **Tasa en concepto de gestión de residuos inertes seleccionados**
Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.

1.2.7 SEGURIDAD Y SALUD

1	0,50	ud	**Partida alzada a justificar para la seguridad y sa** Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto

EUNATE
Compañia de Ingeniería, S.L.
Parque Empresarial La Estrella
C/Berroa 2, oficina 203, 2ªplanta
31192 Tajonar (NAVARRA)
Tfno.: (+34) 948 29 02 37
eunate@eunateing.com

P R E S U P U E S T O

PAVIMENTACIÓN Y REDES EN C/JUAN DE BERRUETA DE SANGÜESA

1 PAVIMENTACIÓN CON REDES

1.1 REDES

1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*32*	998,24	m3	Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.	11,24	11.220,22
2	*30*	535,31	m3	Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.	27,46	14.699,61
3	*33*	8,00	m3	Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.	28,96	231,68
4	*34*	232,74	m3	Gravillín 3/8 mm. para asiento y protección de tuberias, con material procedente de cantera, s/detalle de planos, incluso extendido y nivelado, herramientas y medios auxiliares.	28,96	6.740,15
5	*63*	114,00	ml	Zanja para redes, incluyendo excavación, cama y recubrimiento de tubería con gravillín, relleno de zanja con zahorra artifcial ZA-25, con un ancho de zanja de 1 m. y variable en profundidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	13,00	1.482,00
				Total Cap. 1.1.1		**34.373,66**

1.1.2 TUBERÍAS Y REGISTROS

1.1.2.1 ARQUETA DE CONEXIÓN

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*32*	14,00	m3	Excavación en zanja en calles, en cualquier clase de terreno, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, incluso entibación metálica y agotamiento de aguas si fuera necesario.	11,24	157,36
2	*33*	4,00	m3	Grava caliza, procedente de cantera, de tamaño 19-24 mm., para formación de drenes, protección de tuberías, saneos, según detalles en planos, extendida, nivelada y compactada, herramientos y medios auxiliares.	28,96	115,84
3	*30*	8,00	m3	Relleno de zanjas y pozos con zahorra natural, con categoría de suelo seleccionado, s/PG3 y CBR>20, procedente de prestamo o cantera, en capas de 30 cm., incluso extendido, humectación, compactación al 95% del Próctor modificado, herramientas y medios auxiliares.	27,46	219,68
4	*22*	38,40	m2	Encofrado y desencofrado en todo tipo de paramentos vistos, con paneles fenólicos, incluido berenjenos, separadores, espadas, desencofrante, etc., necesarios para su puesta en obra, p/p de puntales, escaleras, andamios y pasarelas de seguridad. Totalmente terminado.	34,10	1.309,44
5	*23*	38,400	m2	Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 10 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.	17,24	662,02
6	*24*	3,000	m2	Mallazo de acero de alta resistencia electrosoldado B-500-S, de cuadricula 15x15 cm. y diámetro 12 mm., doblado, colocación incluido solapes y separadores, pérdidas y recortes; herramientas y medios auxiliares.	21,89	65,67
7	*21*	7,60	m3	Hormigón HA-25/B/20/IIa, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos (bombeo) y manuales, aditivos, vibrado y curado.	119,49	908,12
8	*20*	1,80	m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.	113,50	204,30
9	*67*	1,00	ud	Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.	367,14	367,14
10	*68*	6,00	ud	Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.	12,96	77,76

Total Cap. 1.1.2.1 **4.087,33**

1.1.2.2 SANEAMIENTO

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*71*	150,00	ml	Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	43,69	6.553,50
2	*69*	51,00	ml	Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/ UNE EN 1452-2, de 160 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas, entronques y conexiones a tuberías o pozoa de registro, pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	15,99	815,49
3	*64*	4,00	ud	Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.	203,99	815,96
4	*65*	4,00	ud	Módulo recrecido para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior s/planos, y 250 mm. de altura, incluso p.p. de juntas, colocado y probado.	127,67	510,68
5	*66*	4,00	ud	Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.	359,09	1.436,36
6	*67*	4,00	ud	Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.	367,14	1.468,56
7	*68*	16,00	ud	Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.	12,96	207,36
8	*60*	18,00	ud	Arqueta de acometida domiciliaria de saneamiento con tubo de PVC D=160, incluyendo aqueta base de PVC D=400 mm. y altura variable inferior, marco y tapa de fundición nodular de 40 x 40 cm., formación de media caña de tubo de PVC en fondo, conexión a la tubería domiciliaria existente y a la nueva tubería de acometida. Incluso la localización de tubería de la acometida existente, medios auxiliares, según planos, totalmente terminado.	227,69	4.098,42
9	*72*	18,00	ud	Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.	26,00	468,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
10	*74*	1,00	ud	Conexión del nuevo colector a la red de saneamiento existente, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.	160,00	160,00
				Total Cap. 1.1.2.2		**16.534,33**

1.1.2.3 PLUVIALES

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*71*	170,00	ml	Tubería de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE-1452-2, de 315 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, paso de cámara de TV con informe, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	43,69	7.427,30
2	*70*	15,00	ml	Tuberia de PVC para saneamiento, color gris, s/UNE EN 1452-2, de 200 mm. de diámetro, con campana y junta de goma, incluso p/p de juntas y pruebas de estanquidad, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	23,03	345,45
3	*66*	4,00	ud	Módulo base prefabricado para pozo de registro de saneamiento, de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior, asentado sobre cama de grava, s/planos, incluso p.p. de taladros y juntas para las acometidas del colector, formación de medias cañas, totalmente colocado y probado.	359,09	1.436,36
4	*64*	4,00	ud	Módulo cónico para pozo de registro de saneamiento de hormigón armado, con cemento sulforresistente, de 1000 mm. de diámetro interior y transición 600 mm., s/planos, y 650 mm. de altura, incluso p.p. de picado/recrecido para ajustar su altura a la cota del pavimento y juntas, colocado y probado.	203,99	815,96
5	*67*	4,00	ud	Marco y tapa de fundición nodular de 600 mm. de diámetro, modelo PAMREX D400 de Funditubo, o similar, para una carga de 40 Toneladas, incluso sujección al módulo de hormigón con 4 spit, s/planos, p.p. de encofrado y hormigón HM-20, mortero con resinas de apoyo y fijación, totalmente terminado.	367,14	1.468,56
6	*68*	12,00	ud	Pate trepador para pozo de registro de aluminio, o acero recubierto de polipropileno, modelo homologado, incluso perforaciones, recibido con mortero de anclaje o expansivo, totalmente instalado y probado.	12,96	155,52
7	*61*	5,000	ud	Marco y rejilla de fundición nodular cóncava SQUADRA 400 o simlar clase C250., anclajes, p/p de mortero de agarre, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente instalado.	128,42	642,10
8	*62*	5,000	ud	Arqueta sumidero de hormigón HM-20/B/20/IIa prefabricado o "in situ", de medidas interiores 0.4x0.40x0.50 m. y espesor de pared 0.10 m., inluso p/p de excavaciones, rellenos, entronque de las tuberías PVC mediante juntas elásticas, s/planos, materiales y medios auxiliares, totalmente terminado.	89,56	447,80
9	*72*	22,00	ud	Conexión de tuberías, de sumideros y acometidas, a la red de tuberías o pozos de saneamiento, mediante unión elástica, p/p de pasamuros, taladros, "clip", codos, pinza, herramientas y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.	26,00	572,00
10	*73*	21,00	ud	Salida de bajante de pluviales a la calzada mediante adaptador en "T" de fundición nodular tipo Funditubo o similar, con brida de registro, de D=80-125 y tubería de PVC hasta conectar con pluviales, sujecciones y conexiones, totalmente terminado.	120,00	2.520,00

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
11	*54*	1,00	ud	Aletas de hormigón armado HA-25/B/20-IIa, de entrada o salida de desagües, incluso excavaciones y rellenos, p/p de impostas, según planos totalmente terminado.	179,21	179,21
				Total Cap. 1.1.2.3		**16.010,26**

1.1.2.4 ABASTECIMIENTO

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*10*	130,00	ml	Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=200 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.	83,70	10.881,00
2	*9*	23,00	ml	Tubería de fundición nodular de diámetro interior D=100 mm., PAM NATURAL de Saint-Gobain o similar, con junta automática flexible, revestida interiormente con mortero de cemento de horno alto S/UNE EN 545 y exteriormente mediante dos capas una de zinc-aluminio y otra con pintura epoxy azul S/UNE EN 545. Fabricada s/Norma UNE EN ISO 9002 incluso p/p de juntas, cortes y biselado de los extremos totalmente colocada, probada, toma de datos de la situación real y recepcionada.	49,96	1.149,08
3	*2*	9,00	ml	Tubería de polietileno Ø63 mm, PE 100 (Alta Densidad) para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope o manguitos electrosoldables, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.	13,43	120,87
4	*1*	51,00	ml	Tubería de polietileno Ø32 mm, PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201, dispondrá de la marca de calidad homologada. Se incluye parte proporcional de soldadura a tope, piezas especiales (codos, manguitos a tope con bridas, uniones con distintos tipos de tuberías, .etc.), conexiones, totalmente instalada y probada.	4,69	239,19
5	*6*	1,000	ud	Reducción de fundición nodular BB ,de D=300mm., con juntas, tornillería y accesorios, totalmnete colocado y probado.	458,47	458,47
6	*8*	1,00	ud	"Te" de fundición nodular, brida-brida-brida, derivación a varios diámetros, con piezas necesarias, suministro y colocación, D=200mm.	258,47	258,47
7	*11*	2,00	ud	Válvula de compuerta con bridas, de fundición nodular, de diámetro D=200 mm. y PN-16, tipo Euro-21 de Saint-Gobain o similar. Incluso p/p de tornillería bicromatada, juntas y volante.Totalmente instalada y probada.	779,60	1.559,20
8	*5*	2,000	ud	Codo de fundición nodular, D=200mm. E-E, para cualquier ángulo, con junta expres y accesorios, totalmnete colocado y probado.	244,90	489,80
9	*4*	2,000	ud	Enlace brida-enchufe de fundición nodular, de diámetro D=200 mm., con piezas necesarias, suministro y colocación. Totalmente instalado.	72,24	144,48

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
10	*7*	2,00	ud	Trampillón de maniobra para válvula de compuerta enterrada en vial, formado por eje telescópico de maniobra de fundición dúctil, trampillón para todo tipo de válvulas de fundición, protección compuesta por tubería de PVC de 110 mm, refuerzos de hormigón. S/planos, totalmente instalado y probado.	119,78	239,56
11	*13*	18,00	ud	Collarín de toma de 1" para viviendas, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.	42,29	761,22
12	*12*	18,00	ud	Arqueta de registro de fundición nodular con aislante térmico, para el alojamiento del contador de 52x21x21 cm., con soporte fijo en interior, racord de desmontaje y juntas tóricas, llaves de entrada y salida de 1", enlaces, contador de 20 mm antihielo, piezas especiales y conexión a la acometida existente. Incluso relleno de la arqueta de material aislante témico, p/p de asiento con material granular y recibido con la rasante del pavimento.Totalmente instalada y probada.	197,16	3.548,88
13	*14*	3,00	ud	Collarín de toma de 2" para boca de riego, desde tuberías de fundición o de polietileno formado por un collarín de fundición y acero inoxidable, tornillos de acero inoxidable, enlace macho-enchufe de 1" de latón, para 10 atm. de presión, piezas especiales, s/planos, totalmente instalado y probado.	32,39	97,17
14	*50*	3,00	ud	Boca de riego de arqueta, de DN=50 mm., incluso arqueta, refuerzo bloque de apoyo de hormigón, abrazadera, tuberia de PAD 63 mm., adquisición y colocación del piecerío de enlace, s/planos, totalmente instalada y probada..	212,41	637,23
15	*49*	1,00	ud	Hidrante modelo Navarra (marca Belgicast),toma de D=100mm. y dos salidas de 75mm. con cierre de válvula de asiento elastico y válvulas de 2.5" en cada una de las bocas. Salida con racor Barcelona incluido arqueta de hormigón con marco y tapa,"T" de derivación, adquisición y colocación del piecerio y relleno de gravilla cubierta con mortero en el interior de la arqueta, totalmente instalado s/planos.	609,00	609,00
16	*75*	2,00	ud	Conexión a la red de abastecimiento existente con piecerío de fundición nodular, p.p de localización, excavación, achiques, rellenos y reposición de pavimento.	280,00	560,00
17	*25*	150,00	ml	Mantenimiento de servicios de abastecimiento, tendidos aéreos con tubería de polietileno (protegida con coquilla aislante), conexiones provisionales a la red y a las viviendas.. etc. durante la ejecución de las obras. Incluye las dos fachadas de la calle. Incluso retirada de todas las instalaciones provisionales una vez finalizadas las obras.	14,00	2.100,00
				Total Cap. 1.1.2.4		**23.853,62**

1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*55*	57.398,80	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	0,12	6.887,86
2	*57*	1.147,98	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).	4,00	4.591,92
3	*58*	13,80	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	6,50	89,70
4	*56*	2,00	t	Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.	90,00	180,00
5	*59*	10,00	t	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.	20,00	200,00

Total Cap. 1.1.3 **11.949,48**

1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*44*	0,50	ud	Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto	8.053,96	4.026,98

Total Cap. 1.1.4 **4.026,98**

1.2 PAVIMENTACION

1.2.1 CALZADA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*28*	649,40	m2	Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes	6,05	3.928,87
2	*29*	357,17	m3	Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.	8,31	2.968,08
3	*27*	214,30	m3	Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.	27,33	5.856,82
4	*42*	162,35	m3	Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.	29,07	4.719,51
5	*20*	5,00	m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.	113,50	567,50
6	*41*	649,40	m2	Riego de imprimación mediante la extensión de una emulsión especial de imprimación con una dotación de 1.5 kg/m2 de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.	1,15	746,81
7	*40*	649,40	m2	Riego de adherencia mediante la extensión de una emulsión aniónica ECR-0, con una dotación de 0.5 Kg/m2, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.	1,10	714,34
8	*37*	109,10	t	Mezcla asfáltica en caliente con árido calizo tipo AC 22 BIN 50/70 S CALIZA S/UNE-EN 13108 S-20, en capa intermedia, incluso transporte, extendido y compactado, de acuerdo con el PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. P/p de señalistas.	118,59	12.938,17
9	*36*	64,94	t	Mezcla asfáltica en caliente con aridos ofíticos, AC 16 SURF 50/70 D OFITA (D-8), en capa de rodadura, incluído transporte, p/p de operaciones intermedias de su puesta en obra, extendido y compactado, de acuerdo con PG3 y Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto. (Art. 542 del PPTP)	126,73	8.229,85
10	*39*	8,48	t	Ligante bituminoso para mezcla asfáltica en caliente.	657,20	5.573,06

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
11	*38*	479,40	m2	Impresión con una malla de acero o plástico de alta densidad con formato a decidir en obra po la D.O., sobre capa de aglomerado asfáltico recién extendida o recalentando previamente la superficie asfáltica con máquina de Infrarrojos. El sistema se acaba con un recubrimiento polimérico de alta resistencia al desgaste tipo ZoruBond-PU o similar.	19,60	9.396,24
				Total Cap. 1.2.1		**55.639,25**

1.2.2 ACERA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*28*	302,50	m2	Demolición de todo tipo de pavimento, de espesor variables, incluso carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares. P/p de demolición de pequeñas obras de fábrica y retirada de arquetas, rejillas y mobiliario urbano existentes	6,05	1.830,13
2	*29*	133,10	m3	Cajeado de la calle, reperfilado y compactación de la superficie excavada, carga y transporte de productos excavados a zona de acopio para su posterior transporte a vertedro, herramientas y medios auxiliares.	8,31	1.106,06
3	*27*	83,19	m3	Suelo seleccionado S/PG3 con CBR>20 procedente de préstamo o cantera (todo-uno de 2ª), en capas de 30 cm. máximo, incluso extendido, humectación, compactado al 98% del Próctor Modificado, refino de taludes, herramientas y medios auxiliares.	27,33	2.273,58
4	*42*	75,63	m3	Base con zahorra artificial ZA-25, procedente de cantera de árido calizo, incluso, transporte, extendido, humectación, compactación en capas no superiores a 25 cm. de espesor, hasta obtener el 100% de Próctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado, herramientas y demás medios auxiliares.Totalmente terminado.	29,07	2.198,56
5	*20*	45,38	m3	Hormigón HM-20/B/20/X0, con arido de 20 mm., procedente de planta y puesta en obra con medios mecánicos y manuales, nivelado y puesto a cota.aditivos, vibrado y curado, p/p cortes.	113,50	5.150,63
6	*35*	302,50	m2	Losa prefabricada de hormigón similar a la existente, asentada sobre capa de mortero de cemento nivelada 6 cm de espesor, cemento de unión entre mortero y baldosa, humectado, maceado de las baldosas con medios manuales y mecánicos, recebados de las juntas con cemnto y arena silicea, barrido y limpieza. P/p de cortes y remates con arquetas y finales. Medios auxiliares, totalmente colocado.	30,18	9.129,45
7	*43*	310,00	ml	Acondicionado y reposiciones de las fachadas a la nueva rasante de la calle, con materiales igual o similar a los existentes, todo incluido, según las indicaciones de la Dirección de Obra.	13,00	4.030,00

Total Cap. 1.2.2 **25.718,41**

1.2.3 SEÑALIZACIÓN

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*17*	28,00	ud	Bolardo polipropileno flexible tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm para empotrar con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.	68,37	1.914,36
2	*18*	8,00	ud	Bolardo polipropileno flexible, desmontable, tipo barcelona o similar, a decidr en obra, color negro de medidas 1000X100 mm., inclusos bases de sujección con cierre mediante llave de cabeza triangular para su extracción, con anilla de acero inoxidable, p/p de broca y mortero sin retracción. Tatalmente instalado.	244,22	1.953,76
3	*51*	46,36	m2	Marca vial símbolos, letras, números y flechas, reflectante blanca, realmente pintado, incluso premarcaje.	18,30	848,39
4	*52*	2,00	ud	Señal circular 60 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.	121,95	243,90
5	*53*	6,00	ud	Señal cuadrada de 40 cm. reflectante, colocada en obra, incluso cimentación, elementos de sustentación y piezas de sujeción.	116,65	699,90
				Total Cap. 1.2.3		**5.660,31**

1.2.4 SERVICIOS

1.2.4.1 IBERDROLA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*77*	18,00	ml	Canalización eléctrica para fuerzas eléctricas, compuesta de 1 tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.	18,48	332,64
2	*79*	80,000	ml	Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 3 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo seleccionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.	36,12	2.889,60
3	*78*	1,00	ml	Canalización eléctrica para B.T., compuesta de 2 tubos de polietileno de diámetro 160mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4),exentos de halogenos, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo seleccionado CBR>20 y cinta de señalización, p/p de piezas especiales tapones y probado. Totalmente terminado.	31,45	31,45
4	*80*	4,00	ud	Arqueta prefabricada de hormigón, de M.T. y B.T., troncopiramidal modelo Iberdrola, de 1m. de profundidad tipo M2-T2. Con marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A. Incluso excavación y rellenos, lecho de grava. Totalmente terminada.	303,29	1.213,16
				Total Cap. 1.2.4.1		**4.466,85**

1.2.4.2 ALUMBRADO

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*76*	125,00	ml	Canalización eléctrica para alumbrado, compuesta de dos tubos de polietileno de diámetro 110mm., de doble pared corrugado exterior y liso interior (S/UNE EN 50086-2-4), piezas especiales y tapones, embebidos totalmente en un prisma de hormigón HM-20/B/30-Ib, con un recubrimiento mínimo de 8 cm. a exterior y 3 cm. S/planos. Incluido excavación, transporte a vertedero, relleno de zanja con suelo selecionado CBR>20 y cinta de señalización. Totalmente terminado.	25,83	3.228,75
2	*82*	6,00	ud	Arqueta, prefabricada de hormigón, de registro en derivación o cambio de direcciòn de 0.60 m. de profundidad y 0,40x0,40 m de interior, incluso marco y tapa fuerte de 0,40x0,40 de fundición, incluido excavación, relleno, totalmente terminada.	65,32	391,92
				Total Cap. 1.2.4.2		**3.620,67**

1.2.4.3 TELEFONÍA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*45*	2,00	ud	Arqueta de Telefonos, tipo H prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos, regletas de suspensión de cables, soportes de enganches de poleas, marcco y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañia telefonía.	367,33	734,66
2	*46*	6,00	ud	Arqueta de Telefonos, tipo MF prefabricada de hormigón, incluso, excavación y relleno, marcos y tapa homologada, p/p pasatubos, totalmente terminado de acuerdo con la compañía de telefonía.	109,34	656,04
3	*47*	126,60	ml	Canalización de telefonía, comprendiendo apertura de zanja, colocación de 2 tubos de PVC 110 mm.hormigonado del prisma con HM-20, con cemento sulforresistente, cinta de señalización relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20 no plástico, según planos. Totalmente terminado y probado.	25,81	3.267,55
4	*48*	51,00	ml	Canalización telefónica, comprendiendo apertura de zanja en terrenos libres, colocación de2 tubos PVC rígidos de 63 mm. (aportados por Telefónica), hormigonado del prisma con HM-20, relleno y compactado de la zanja con suelo selecioneado CBR>20. Totalmente terminado y probado.	8,13	414,63
				Total Cap. 1.2.4.3		**5.072,88**

1.2.5 SERVICIOS AFECTADOS

1.2.5.1 GAS NATURAL

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*26*	181,00	ml	Localización de la tubería con medios mecánicos y/o manual asi como el mantenimiento del servicio del gas, incluye descubrir, protección de la tubería con arena y/o hormigón acondicionado de los paso con los distintos servicios de saneamiento y abastecimineto. Siguiendo la indicaciones de Gas Navarra.	22,00	3.982,00
				Total Cap. 1.2.5.1		**3.982,00**

1.2.5.2 ALUMBRADO

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*16*	130,00	ml	Mantenimiento del funcinamiento de alumbrado, incluye cable de cobre flexible. Clase: 5.T. aislamiento, con cable de tierra y tomas de tierra. Mantenimiento del funcinamiento.	11,00	1.430,00

Total Cap. 1.2.5.2 **1.430,00**

1.2.5.3 IBERDROLA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*81*	5,00	ud	Reposición de arquetas existentes, con reposición de marco y tapa de fundición dúctil según las normas de Iberdrola NI-50.20.02., de 0.70x0.70 con el anagrama IBERDROLA, herramientas y medios auxiliares.	238,24	1.191,20

Total Cap. 1.2.5.3 **1.191,20**

1.2.5.4 TELEFONÍA

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*15*	1,000		Partida alzada justificar para la realización de cruces con red de telefonía.	1.200,00	1.200,00

Total Cap. 1.2.5.4 **1.200,00**

1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*55*	33.132,54	mk	Transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	0,12	3.975,90
2	*57*	416,76	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5).	4,00	1.667,04
3	*58*	971,90	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados.	6,50	6.317,35
4	*56*	3,00	t	Tasa de gestión de residuos potencialmente peligrosos, realizado por gestor autorizado.	90,00	270,00
5	*59*	10,00	t	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos de construcción o demolición no pétreos (Códigos LER 17.01: cartón-papel, madera, vidrio, plásticos y metales incluidos envases y embalajes de estos materiales así como biodegradables del desbroce) seleccionados.	20,00	200,00

Total Cap. 1.2.6 **12.430,29**

1.2.7 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	CP	Medición	UM	Descripción	Precio	Importe
1	*44*	0,50	ud	Partida alzada a justificar para la seguridad y salud de la obra, S/presupuesto	8.053,96	4.026,98

Total Cap. 1.2.7 **4.026,98**

RESUMEN DE CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Descripción	Importe
1.1.2.1 ARQUETA DE CONEXIÓN	4.087,33
1.1.2.2 SANEAMIENTO	16.534,33
1.1.2.3 PLUVIALES	16.010,26
1.1.2.4 ABASTECIMIENTO	23.853,62
1.1.2 TUBERÍAS Y REGISTROS	**60.485,54**
1.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS	34.373,66
1.1.2 TUBERÍAS Y REGISTROS	60.485,54
1.1.3 GESTIÓN DE RESIDUOS	11.949,48
1.1.4 SEGURIDAD Y SALUD	4.026,98
1.1 REDES	**110.835,66**
1.2.4.1 IBERDROLA	4.466,85
1.2.4.2 ALUMBRADO	3.620,67
1.2.4.3 TELEFONÍA	5.072,88
1.2.4 SERVICIOS	**13.160,40**
1.2.5.1 GAS NATURAL	3.982,00
1.2.5.2 ALUMBRADO	1.430,00
1.2.5.3 IBERDROLA	1.191,20
1.2.5.4 TELEFONÍA	1.200,00
1.2.5 SERVICIOS AFECTADOS	**7.803,20**
1.2.1 CALZADA	55.639,25
1.2.2 ACERA	25.718,41
1.2.3 SEÑALIZACIÓN	5.660,31
1.2.4 SERVICIOS	13.160,40
1.2.5 SERVICIOS AFECTADOS	7.803,20
1.2.6 GESTIÓN DE RESIDUOS	12.430,29
1.2.7 SEGURIDAD Y SALUD	4.026,98
1.2 PAVIMENTACION	**124.438,84**
1.1 REDES	110.835,66
1.2 PAVIMENTACION	124.438,84
1 PAVIMENTACIÓN CON REDES	**235.274,50**
1 PAVIMENTACIÓN CON REDES	235.274,50
	235.274,50

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL			**235.274,50**
10,00	% GASTOS GENERALES		23.527,45
6,00	% BENEFICIO INDUSTRIAL		14.116,47
		SUMA	**272.918,42**
21,00	% IVA		57.312,87
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION			**330.231,29**

Asciende el presente presupuesto de licitación a la expresada cantidad de:

TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON VEINTINUEVE CENTS.

Tajonar, 25 de Agosto de 2023

POR EUNATE CÍA DE INGENIERÍA, S.L.

EL INGENIERO DE CAMINOS, CC. y PP

Fdo. IÑIGO ENCINAS GUAZA
Colegiado Nº 19.233

EL INGENIERO T. DE OBRAS PÚBLICAS

Fdo. JOSÉ IGNACIO INFANTE SIERRA
Colegiado Nº 8.644
