Mancomunidad Comarca de Pamplona
Iruñerriko Mankomunitatea

Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerriko Zerbitzuak e.a.

PROYECTO:

00001190
RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA

JUNIO 2026

INDICE

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº1 TOPOGRAFÍA
ANEJO Nº2 SERVICIOS AFECTADOS
PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS
ANEJO Nº3 SEÑALIZACIÓN
PLANO DE SEÑALIZACIÓN
ANEJO Nº4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS)
ESS: MEMORIA
ESS: PLANOS
ESS: PPTP
ESS: DESGLOSE DE PRESUPUESTO
ESS: MEDICIONES
ESS: CUADRO DE PRECIOS Nº1
ESS: PRESUPUESTO
ANEJO Nº5 ESTUDIO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
DOCUMENTO Nº2 PLANOS
PLANO Nº1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
PLANO Nº2 CONJUNTO DE REDES.PLANTA ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº3 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº4 ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº5 ABASTECIMIENTO. NUDOS.
PLANO Nº6 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.
PLANO Nº7 SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº8 SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº9 ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.
PLANO Nº10 SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO
DESGLOSE DE PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº1
MEDICIONES AUXILIARES
MEDICIONES
PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA

INDICE

Memoria
Anejos a la memoria
Anejo Nº1 Topografía
Anejo Nº2 Servicios Afectados
Plano de Servicios Afectados
Anejo Nº3 Señalización
Plano de Señalización
Anejo Nº4 Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
ESS: Memoria
ESS: Planos
ESS: PPTP
ESS: Desglose de Presupuesto
ESS: Mediciones
ESS: Cuadro de precios nº1
ESS: Presupuesto
Anejo Nº5 Estudio de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD)

MEMORIA

ÍNDICE

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

2. OBJETO DEL PROYECTO

3. SOLUCIÓN ADOPTADA

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

5. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

6. CONTROL DE CALIDAD

7. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

9. REVISIÓN DE PRECIOS

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

En el año 2025, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona redactó una memoria valorada para valorar las actuaciones necesarias para la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento en el ámbito de las calles Cantera, Arturo Campión y Navarra en Ansoain.

Esta memoria se presentó al Plan de Inversiones Locales 2026-2028 dentro de la línea de inversión “Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales”.

Con fecha 19 de enero de 2026, la Dirección General de Administración Local publicó la resolución 5E/2026 por la que se aprobó la relación de inversiones incluidas en el citado plan, estando incluido en entre ellas la renovación de redes que nos ocupa.

Se redacta el presente proyecto para definir de manera completa las actuaciones a realizar para la Renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de las calles Navarra, Arturo Campión, canteras y Plaza Euskal Herria, y poder presentarlo para su inclusión definitiva.

Los colectores de la red de abastecimiento de la zona datan, en su tramo más antiguo, del año 1977 (49 años de antigüedad), mientras que el sector más reciente corresponde al último tramo del ramal de calle Navarra, próximo al cruce con calle Ezcaba, renovado en 1998.

En cuanto a la red de saneamiento dentro de las zonas de actuación, las conducciones son mayoritariamente de hormigón en masa y fueron ejecutadas en dos fases: la red de fecales en 1977 (49 años) y la red de pluviales en 1985 (41 años), lo que evidencia una antigüedad significativa en ambos sistemas.

El presente proyecto se redacta para ejecutarse de manera coordinada y simultánea con las obras de renovación de la pavimentación de las calles del ámbito, actuación promovida y gestionada por el Ayuntamiento de Ansoáin. En el marco de este proyecto, se ha planteado la posibilidad de incorporar vegetación y arbolado para mejorar la calidad ambiental del entorno. No obstante, el análisis de la situación actual de las redes de servicios y de la anchura disponible en las secciones viarias evidencia que la implantación de árboles resulta inviable, ya que la disposición de las conducciones existentes no permite cumplir las distancias mínimas de seguridad exigidas por la normativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sin comprometer la integridad de las infraestructuras.

2. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto tiene por objeto la completa definición, solución y valoración de las obras necesarias para llevar a cabo la renovación de la red de la red de abastecimiento y saneamiento, en las calles de Arturo Campion, Navarra, Canteras y Travesía de Canteras, en el municipio de Ansoáin.

3. SOLUCIÓN ADOPTADA

Para cumplir con el objetivo propuesto, el proyecto contempla la renovación de 544.37m de tubería de abastecimiento de fundición nodular que se ejecutaran con el mismo diámetro que las actuales. Según se aprecia en los planos en planta incorporados al proyecto, las tuberías objeto de renovación cuentan con las siguientes longitudes y diámetros:

Tramo	Diámetro (mm)	Longitudes (m)
AB 1	150	87.86
AB 2	100/150	83.95
AB 3	250	171.81
AB 3.1	100/50	17.64
AB 4	150	87.56
AB 5	C250	70.94
AB 6	300	24.60

Además de la renovación de los ramales principales, se procederá a sustituir todas las acometidas existentes, manteniendo sus diámetros y tipologías actuales. Según el Departamento de clientes de la Mancomunidad de Pamplona, dentro del ámbito de actuación únicamente tres locales requieren una nueva acometida, situados en C/ Arturo Campión nº 4, C/ Arturo Campión nº 5 y C/ Navarra nº 3.

Respecto a la renovación de redes de saneamiento, se instalarán un total de 441.95 m de tuberías para la red de fecales y 320.32 m para la red de pluviales, empleando tuberías de hormigón armado o PVC en función de la pendiente y las características de cada tramo. Tal como se recoge en los planos en planta incluidos en el proyecto, las conducciones previstas para su renovación presentan las longitudes y diámetros que se detallan a continuación.

Tramo	Diámetro (mm)	Material	Longitudes (m)
FE 1	500/600/800	HA	139.69
FE 2	315	PVC	66.64
FE 3	315/300	HA/PVC	84.20
FE 4	400	HA	125.79
FE 5	300	HA	25.62

Tramo	Diámetro (mm)	Material	Longitudes (m)
PL1	315	PVC	61.09
PL 2	300/400	HA	84.91
PL 3	300/400	HA	136.99
PL 4	300	HA	19.74
PL 5	300	HA	17.59

Este último ramal, correspondiente al PL5, no será objeto de renovación integral, sino que se intervendrá mediante un enmangado, actuando sobre el interior de la conducción para mejorar su estanqueidad y prolongar su vida útil sin sustituir la tubería existente.
El proyecto contempla igualmente la posibilidad de enmangar el colector FE5 ya que parece que todas sus acometidas embocan a pozo, sin embargo, será necesario confirmar este extremo cuando se inicien las obras.

Se renuevan todas las acometidas de saneamiento existentes y se instalan arquetas de arranque en todas ellas para permitir un mantenimiento más sencillo. En todos los casos en que ha sido posible, las acometidas de saneamiento se han embocado a pozos evitando la ejecución de conexiones directas mediante injertos a la tubería.

En el caso de las acometidas de pluviales la casuística es más variable. Existen en el ámbito bajantes que vierten a la red existente de pluviales, pero la gran mayoría de ellas vierten directamente a la rigola de la calzada y de allí la escorrentía continua de manera superficial hasta alcanzar un sumidero, donde es captada y vertida a la red. El proyecto únicamente contempla renovar aquellas bajantes que están

conectadas a la red de pluviales, entendiendo que aquellas que vierten al pavimento (a la rígola) continuarán vertiendo al pavimento a no ser que el ayuntamiento de Ansoain aborde su enterramiento y conexión directa a la red de pluviales.

En este proyecto se plantea la renovación de las tuberías que conectan a los sumideros actuales, manteniendo su ubicación actual. El sumidero propiamente dicho (rejilla y arqueta) es responsabilidad del ayuntamiento. No obstante, si el proyecto de pavimentación definiera una nueva disposición para la recogida de aguas en la calle, la canalización de los sumideros hasta el colector de la red de pluviales deberá ser asumida mediante un proyecto propio por la otra parte, al quedar fuera del alcance del presente documento.

Para optimizar la ordenación de los servicios y dejar abierta la posibilidad de incorporar arbolado, el nuevo diseño de las redes no reproducirá su ubicación actual. Las conducciones se desplazarán hacia uno de los márgenes de la vía, de modo que el lado opuesto quede liberado de redes hidráulicas. Las redes se ordenarán procurando la siguiente disposición: desde la línea de fachada se ubicará primero la red de abastecimiento, a continuación, la de pluviales y, por último, la de fecales, quedando cada tramo sujeto a estudio según sus condiciones específicas.

Se han estudiado los perfiles longitudinales de todos los servicios a renovar para que no sea necesario desviar ninguno de los servicios existentes, sin embargo en presupuesto se ha contemplado una reserva económica para afrontar pequeñas modificaciones que puede que sea necesario realizar. También se ha contemplado una partida especifica para la realización de catas en obra que permitan comprobar los longitudinales propuestos y asegurarnos de que no existan interferencias.

Los longitudinales diseñados están fuertemente condicionados por las cotas del ámbito. Apenas tenemos desniveles de 23 centímetros en el terreno, lo que ha provocado que muchas de las tuberías se deban instalar con pendientes por debajo del 1%, tal y como están instaladas actualmente.

Por último, se ha diseñado una red de abastecimiento provisional durante las obras que permitirá mantener el servicio a los vecinos mientras duren los trabajos.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En primer lugar, será necesario contactar con el Ayuntamiento de Ansoáin para coordinar varias cuestiones de accesibilidad e información a los vecinos. La coordinación con el ayuntamiento será permanente durante toda la obra ya que esta renovación de redes está ligada a la renovación de pavimentación que va a abordar el propio ayuntamiento.
Asimismo, será preciso comunicarse con el Departamento de Residuos de S.C.P.S.A. para gestionar el traslado temporal de los contenedores a otra ubicación durante la ejecución de las obras.

Todos los materiales utilizados serán los homologados por la Mancomunidad, Los detalles constructivos que no estén reflejados en los planos deberán ajustarse a los contemplados en la Ordenanza sobre Redes y aprobados por la Dirección de la Obra.

C/Canteras:

En esta calle únicamente se renuevan la red de abastecimiento y el colector de fecales, ya que el colector de pluviales existente se encuentra en condiciones adecuadas para seguir en funcionamiento, pudiendo plantearnos más a futuro el enmangado del mismo.

El ramal de abastecimiento se ha dividido en dos tramos: el AB5, que discurre desde la conexión con la red existente 1 hasta el nudo 2, y el AB1, que se extiende desde el nudo 2 hasta el nudo 4. El ramal AB5 se conecta a la red existente mediante un manguito de unión; se trata de una tubería de 300 mm de diámetro, a la que se incorpora un ramal procedente de calle Ezcaba de 150 mm, y que presenta un punto bajo en el nudo 1, donde se proyecta un desagüe hacia el pozo PL2.4 existente, finalizando su trazado en el nudo 2 con una cruceta.

Por su parte, el ramal AB1 consiste en una tubería de 150 mm, que presenta un punto bajo en el nudo 2.1 (PK0+012.59), con desagüe igualmente dirigido al pozo PL2.4 existente. A continuación, el trazado alcanza un punto alto (PK0+081.88) en la acometida C.3, de 50 mm de diámetro, que actúa como ventosa en la red. En este tramo se incorpora también el ramal AB2, y el conjunto finaliza en el nudo 4, donde se dispone una válvula de retención que permitirá la instalación de una boca de riego y un desagüe.

El colector de fecales, FE1, se replantea siguiendo la configuración existente, respetando tanto los diámetros actuales como las cotas de los pozos. Además, se contempla que el primer pozo (FE 1.1) y el último (FE 1.6) no se renueven por completo, limitándose la actuación a la reparación de los desperfectos detectados, sin proceder a la instalación de nuevos elementos. No obstante, se incorpora un pozo adicional al estado actual entre los dos primeros con el fin de resolver el cruce con las líneas de telecomunicaciones identificadas en la información del PCCS, garantizando así una implantación compatible con los servicios existentes.

Esta calle consta de un gran numero de servicios existentes, tal y como se refleja en el correspondiente plano, donde destaca de manera importante la cámara de Telefónica situada en la esquina este de la intersección entre la calle Canteras y Arturo Campión.

En la calle Canteras existen dos puntos a los que se deberá prestar especial atención a la hora de ejecutar las obras. En las intersecciones con las calles Arturo Campión y Travesía canteras se producen varios cruces entre las redes de fecales, pluviales y abastecimiento. Estos cruces se han estudiado para que no se produzcan interferencias, pero apenas disponen de holgura por lo que si en alguno de los puntos coinciden las campanas de los tubos, es posible que no se puedan respetar las cotas de proyecto. Antes de ejecutar estas tuberías será necesario abrir las zanjas y realizar el replanteo correspondiente para evitar interferencias. Actualmente estos cruces están resueltos mediante la duplicación de tuberías, pasando de una tubería de diámetro 400mm a 2 de 250mm.

C/Lapurbide:

La renovación del ramal de abastecimiento AB6 consiste en una tubería de fundición nodular de 250 mm, que arranca en el nudo 3, donde se instala una válvula de retención para permitir la colocación de una boca de riego y un desagüe. El trazado se resuelve mediante varios codos de 22° y 45° para evitar el pozo PL5.1. La red presenta un punto alto (PK0+019.72) en la acometida C.37, de 32 mm, que actúa como ventosa, y finaliza en el nudo 2 conectando a la cruceta.

El colector de pluviales PL5 se ejecutará mediante un enmangado desde el pozo PL5.1 hasta el colector existente PL2.4, de la tubería de hormigón en masa de 500 mm.

En este tramo de calle no existe colector de fecales, por lo que no se prevé ninguna actuación en dicha red.

Trª Canteras:

Las redes se acumulan en el lado de los portales nº2, nº4 y nº6, dejando espacio en el otro margen de la vía para plantar vegetación.

La renovación del ramal abastecimiento AB2 comienza en la conexión con la red existente 3, desde donde, mediante codos de 45°, la conducción se aproxima progresivamente a la fachada. En el nudo 6 (PK0+011.15) se produce un cambio de diámetro, pasando de una tubería de fundición nodular de 150 mm, que recorre la plaza Euskal Herria, a otra de 100 mm. La red de abastecimiento discurre por la alineación más próxima a la fachada y, debido a la topografía de la acera, a la altura del portal n.º 6 es necesario retranquear la conducción mediante dos codos de 22°. Antes de llegar a calle Canteras, en el nudo 5 (PK0+076.93), se identifica un punto bajo en el que se proyecta la instalación de un desagüe, destinado a evacuar el agua hacia el pozo PL 1.4.

Los colectores de pluviales y fecales discurren paralelos a lo largo de todo el trazado. El colector de fecales FE2 está ejecutado en PVC de 315 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 1,8 %, y vierte finalmente en el pozo FE1.4 del colector FE1. Por su parte, el colector de pluviales PL1, también de PVC de 315 mm, presenta una profundidad media de 1,4 m y una inclinación media del 1 %, finalizando en el pozo PL1.4 existente, perteneciente al colector de pluviales que no se renueva en la calle Canteras.

C/Navarra:

La red de abastecimiento AB4 discurre por el mismo trazado que el actual y se trata de una tubería de 150 mm que comienza en el nudo 8 conectándose a la red existente y que se conecta al ramal AB3. Cuenta con el nudo 7 (PK0+086.10) con válvula de corte.

La red de saneamiento se divide en dos: la que se dirige hacia C/ Ezcaba y la que lo hace hacia C/ Arturo Campión. En el tramo hacia C/ Ezcaba, el ramal de fecales FE5 está formado por una tubería de hormigón en masa de 300 mm, con una profundidad media de 1,25 m y una inclinación del 0,74 %; únicamente se renueva el pozo FE5.1, finalizando el ramal en un pozo existente. El ramal de pluviales PL4, también de hormigón en masa de 300 mm, arranca en una arqueta de inicio debido a la escasa profundidad necesaria para alcanzar una inclinación del 0,66 % y llegar a la cota del pozo existente. Se incorpora un pozo intermedio para ejecutar la renovación dentro del ámbito previsto para la renovación del pavimento.

Las redes que continúan hacia C/ Arturo Campión se describen en el siguiente apartado y son los ramales FE4 y PL3.

C/Arturo Campion:

Las redes se concentran en el lado de los portales comprendidos entre los números 2 y 18, dejando libre el margen opuesto de la vía para la implantación de vegetación. Se desplaza por completo al lado contrario el ramal de abastecimiento, y se ajusta la red de saneamiento al margen seleccionado.

La red de abastecimiento AB3 está formada por una tubería de fundición nodular de 250 mm que discurre paralela a la fachada a lo largo de todo su trazado. Parte de la conexión con la red existente 2 y, mediante codos de 45° y 11°, se aproxima a la fachada. Presenta un punto bajo (PK0+073.35) en el nudo 9 y un punto alto (PK0+076.91) donde se ubica la acometida C.19, de 50 mm. A este ramal se

incorpora el AB4 en el PK0+080.97, y el trazado continúa hasta el nudo 2.2 (PK0+166.80), donde, tras varios codos y deflexiones, finaliza en la válvula de la cruceta del nudo 2.

Existe un ramal denominado AB3.1 que arranca en la conexión con la red existente 2 y da servicio tanto al hidrante como a la boca de riego. El trazado se ejecuta con una tubería de fundición nodular de 100 mm hasta el hidrante, y con una tubería de PE de 50 mm hasta la boca de riego.

La red de saneamiento se divide en dos: la que discurre desde C/ Navarra hacia Av. Villava y la que se dirige hacia C/ Canteras. En el tramo procedente de C/ Navarra, el ramal de fecales FE4 está formado por una tubería de hormigón en masa de 400 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 0,7 %, y conecta con el pozo PL4.8 existente. El ramal de pluviales PL3 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre los pozos PL3.1 y PL3.3, y con tubería de 400 mm desde PL3.3 hasta el pozo existente PL3.8. Presenta una profundidad media de 1,86 m y una inclinación media del 0,45 %. Conviene mencionar que el pozo PL3.7 actúa como pozo de resalto, ya que el ramal llega a una profundidad aproximada de 2,3 m, mientras que el pozo PL3.8 alcanza casi 5 m, generando un salto de cota significativo.

En cuanto a la red que se dirige hacia C/ Canteras, el ramal de fecales FE3 se compone de una tubería de PVC de 315 mm entre los pozos FE3.1 y FE3.3, y de hormigón en masa de 300 mm desde FE3.3 hasta su conexión final en el pozo FE1.3 del ramal FE1. Presenta una profundidad media de 1,94 m, con una inclinación del 1,14 % en el tramo de PVC y del 0,54 % en el tramo de hormigón. El ramal de pluviales PL2 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre PL2.1 y PL2.3, y con tubería de 400 mm desde PL2.3 hasta el pozo existente PL2.4, con una profundidad media de 1,44 m y una inclinación media del 0,66 %.

Dado que el proyecto contempla la reubicación completa de varios ramales de abastecimiento, los trazados antiguos podrán mantenerse en servicio de forma temporal hasta la finalización de las obras, garantizando así la continuidad del suministro. Paralelamente, se instalará una red de abastecimiento provisional, configurada de forma mallada, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el suministro a las viviendas situadas en aquellas calles donde todavía no haya reubicación del ramal de abastecimiento.

Como paso final se considera indispensable, y así se refleja en los precios de las correspondientes unidades de obra, que la línea de abastecimiento este limpia probada y desinfectada.

Previa a la recepción de la obra, tanto los registros como las conducciones de hormigón deberán ser probados según la normativa de la Mancomunidad, el coste de estas pruebas está contemplados en los precios de cada una de las unidades de obra. Todos los colectores deberán someterse a una inspección video gráfica completa. El coste de dicha inspección viene reflejado en el presupuesto. Las pruebas de presión y estanqueidad se deberán realizar de acuerdo con lo previsto en el PPTP de este proyecto, las ordenanzas o lo que indique el Director de las Obras según el caso.

5. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los RCD y con el Decreto Foral 23/2011, que regula la misma en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el presente proyecto incluye un estudio gestión de los RCD. Dicho estudio recoge las condiciones a verificar durante el desarrollo de la obra, proponiéndose en el mismo una posibilidad de disposición de los residuos (con arreglo a la cual se valora en el presupuesto estos requerimientos).

Corresponde al adjudicatario de la obra la redacción del correspondiente Plan de Residuos que deberá ser presentado y aprobado por el promotor con anterioridad al inicio de la generación de cualquier residuo de obra.

6. CONTROL DE CALIDAD

Se han establecido el número de ensayos a realizar con cargo al presupuesto durante la ejecución de la obra. El número, tipo y extensión de dichos ensayos serán establecidos por el Director de las Obra y realizado, bajo su supervisión, por el laboratorio que dicha dirección determine o en su defecto, de acuerdo con lo que sobre el control de calidad se haya previsto en el PPTP de este proyecto.

Igualmente, no comprenden estas pruebas y ensayos presupuestados aquellos que el contratista, en cumplimiento de las exigencias de sus sistemas de calidad deba realizar a su costa.

7. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS

El presupuesto de Ejecución Material de la obra Civil (sin IVA) asciende a OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS (849.835,56€).

Añadiendo el 10% de gastos generales y el 6% de beneficio industrial,el Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra Civil (sin IVA) asciende a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (985.809,25€).

Añadiendo el 21% de IVA el Presupuesto de Ejecución por Contrata incluido IVA asciende a la cantidad de UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS (1.192.829,19€).

Considerando un 7% de honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración sin iva asciende a la cantidad de UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (1.054.815,90€).

Añadiendo el 21% de IVA el Presupuesto para Conocimiento de la Administración IVA incluido asciende a la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (1.276.327,24€).

8. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

El documento que recoge las condiciones técnicas de ejecución de las obras de este Proyecto es el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

En cuanto a las condiciones administrativas se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sin perjuicio de lo que pueda establecer el Pliego de Cláusulas Administrativas de la Obra, se establece un plazo de ejecución de las obras recogidas en este proyecto de NUEVE (9) MESES.

9. REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios no procede en base a la duración del contrato.

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO

INDICE

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
ANEJO Nº1 TOPOGRAFÍA
ANEJO Nº2 SERVICIOS AFECTADOS
PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS
ANEJO Nº3 SEÑALIZACIÓN
PLANO DE SEÑALIZACIÓN
ANEJO Nº4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS)
ESS: MEMORIA
ESS: PLANOS
ESS: PPTP
ESS: DESGLOSE DE PRESUPUESTO
ESS: MEDICIONES
ESS: CUADRO DE PRECIOS Nº1
ESS: PRESUPUESTO
ANEJO Nº5 ESTUDIO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
DOCUMENTO Nº2 PLANOS
PLANO Nº1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
PLANO Nº2 CONJUNTO DE REDES.PLANTA ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº3 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº4 ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº5 ABASTECIMIENTO. NUDOS.
PLANO Nº6 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.
PLANO Nº7 SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº8 SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº9 ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.
PLANO Nº10 SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO
DESGLOSE DE PRESUPUESTO
CUADRO DE PRECIOS Nº1
MEDICIONES AUXILIARES
MEDICIONES
PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

Pamplona, Junio 2026

El autor del proyecto

Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

El director del proyecto

Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

ANEJOS A LA MEMORIA

INDICE

Anejo Nº1 Topografía
Anejo Nº2 Servicios Afectados
  Plano de Servicios Afectados
Anejo Nº3 Señalización
  Plano de Señalización
Anejo Nº4 Estudio de Seguridad y Salud (ESS)
  ESS: Memoria
  ESS: Planos
  ESS: PPTP
  ESS: Desglose de Presupuesto
    ESS: Mediciones
    ESS: Cuadro de precios nº1
    ESS: Presupuesto
Anejo Nº5 Estudio de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD)

ANEJO Nº1 TOPOGRAFIA

ÍNDICE

1. METODOLOGÍA

1.1. OBJETO

1.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

2. BASES DE REPLANTEO

3. COORDENADAS REPLANTEO

1. METODOLOGÍA

1.1. OBJETO

El objeto de este trabajo topográfico es la materialización, lectura y cálculo de las bases, y la toma de los datos necesarios para la realización de un modelo digital del terreno en el cual definir correctamente el proyecto.
Posteriormente servirán para el replanteo, ejecución, control, certificaciones y liquidación de la obra.

1.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Las bases y los puntos se han observado con GPS (Leica GS-18), conectado en tiempo real a la Red de Geodesia Activa de Navarra (RGAN). En el caso de las bases se efectuaron dos ocupaciones en periodos distintos para asegurar una mayor precisión, aplicándose las medias correspondientes para obtener la planimetría en ETRS89 UTM30 y el EGM08-REDNAP para el cálculo de la ondulación geoidal y las correspondientes cotas ortométricas.

Las poligonales y la toma de datos en zonas que no permitieron utilizar GPS se realizaron con una estación total Leica TS 15, con una precisión en medida de distancias, modo estándar, de 2 mm. + 2 ppm y angular de 3" (1 mgon=10 CC)

Las poligonales fueron todas encuadradas con cierres dentro de la tolerancia en x, y, z y compensados todos sus errores convenientemente.

En los cálculos de las coordenadas de las bases y puntos se ha aplicado la corrección de anamorfosis y su reducción al geoide, cuyos coeficientes se adjuntan, así como las correcciones debidas a las condiciones atmosféricas de presión y temperatura, existentes en el momento de la toma de datos, y las de esfericidad y refracción.

El software utilizado para el volcado de datos, dibujo y creación de superficies fue respectivamente LEICA Geo-Office, AUTOCAD 2020 y MDT.

2. BASES DE REPLANTEO

Las bases topográficas empleadas en el levantamiento así como sus coordenadas U.T.M. vienen indicadas en las páginas siguientes:

BM



PLAZA



NAVARRA



ARTURO



EZCABA



CANTERAS



LISTADO DE COORDENADAS DE LAS BASES TOPOGRÁFICAS

En la siguiente tabla quedan reflejadas las coordenadas de todas las bases de topografía reflejadas anteriormente en imágenes.

	Coord. X	Coord. Y	Coord. Z	Código	K
BM	611326,434	4743030,013	425,832	SPIC	0,999686
PLAZA	611375,388	4742996,449	426,253	SPIC	0,999686
NAVARRA	611358,331	4743071,031	425,89	SPIC	0,999686
ARTURO	611337,375	4743140,290	426,379	SPIC	0,999686
EZCABA	611461,944	4743091,365	426,354	SPIC	0,999686
CANTERAS	611303,275	4743116,129	426,113	SPIC	0,999686

3. COORDENADAS REPLANTEO

Las coordenadas de los pozos de fecales son las siguientes:

COLECTOR	POZOS	X	Y
FE1	FE1.1	611363,638	4743195,112
	FE1.2	611338,631	4743160,455
	FE1.3	611332,159	4743151,486
	FE1.4	611297,990	4743110,788
	FE1.5	611286,306	4743098,830
	FE1.6	611275,560	4743086,931
FE2	FE2.1	611319,143	4743049,121
	FE2.2	6113193,315	4743055,698
	FE2.3	611313,214	4743076,563
	FE2.4	611305,220	4743103,294
	FE1.4	611297,990	4743110,788
FE3	FE3.1	611363,694	4743075,487
	FE3.2	611357,305	4743100,049
	FE3.3	611348,236	4743133,650
	FE1.3	611332,159	4743151,486
FE4	FE4.1	611416,707	4743087,512
	FE4.2	611402,422	4743083,515
	FE4.3	611380,847	4743077,478
	FE4.4	611364,755	4743072,295
	FE4.5	611370,580	4743053,239
	FE4.6	611379,689	4743020,295
	FE4.7	611386,476	4743005,998
	FE4.8 EXITS	611386,630	4743004,296
FE5	FE5.1	611440,015	4743090,547
	FE5.2 EXIST.	611464,769	4743097,156

Las coordenadas de los pozos de pluviales son:


COLECTOR	POZOS	X	Y
PL1	PL1.1	611316,081	4743056,710
	PL1.2	611309,518	4743078,888
	PL1.3	611301,884	4743104,531
	PL1.4 EXIST	611293,954	4743112,447
PL2	PL2.1	611362,197	4743077,446
	PL2.2	611355,043	4743104,950
	PL2.3	611347,740	4743131,849
	PL2.4 EXIST	611328,848	4743153,343
PL3	PL3.1	611417,767	4743088,725
	PL3.2	611394,541	4743082,230
	PL3.3	611363,442	4743073,440
	PL3.4	611369,205	4743054,255
	PL3.5	611379,130	4743018,743
	PL3.6	611384,611	4743007,553
	PL3.7	611380,727	4742998,323
	PL3.8 EXIST	611381,888	4742998,111
PL4	PL4.1	611436,051	4743091,457
	PL4.2	611455,003	4743096,962
	PL4.3 EXIST	611465,238	4743099,935
PL5	PL5.1	611312,157	4743159,131
	PL2.4 EXIST	611328,848	4743153,343

Y finalmente los puntos necesarios para el replanteo de la red de abastecimiento son los siguientes:


RAMAL	PUNTOS SINGULARES	X	Y
AB1	NUDO 2	611328,029	4743148,865
	CODO EE 11º	611325,046	4743145,081
	CODO EE 11º	611322,537	4743142,938
	NUDO 2.1	611319,769	4743139,427
	DEFLEXION 1º	611316,674	4743135,502
	DEFLEXION 3º	611306,116	4743122,524
	DEFLEXION 3º	611297,504	4743112,843
	HIDRANTE	611295,286	4743110,560
	RAMAL AB2	611294,503	4743109,753
	DEFLEXION 2º	611285,115	4743100,086
	DEFLEXION 1º	611278,355	4743092,561
	CODO EE 45º	611275,204	4743089,218
	PUNTO ALTO C.3	611273,101	4743089,156
	CODO EE 45º	611270,174	4743089,070
	NUDO 4	611268,372	4743087,042

RAMAL	PUNTOS SINGULARES	X	Y
AB2	CONEXIÓN A RED EXISTENTE 3	611325,096	4743033,692
	CODO EE 45º	611321,683	4743035,510
	NUDO 6	611319,493	4743042,846
	BOCA DE RIEGO	611318,079	4743047,583
	CODO EE 22º	611312,125	4743067,526
	CODO EE 22º	611309,513	4743070,737
	NUDO 5	611299,318	4743104,756
	RAMAL AB1	611294,503	4743109,753
AB3	CONEXION A RED EXISTENTE 2	611382,709	4742998,860
	NUDO 10	611383,098	4742999,924
	CODO EE 45º	611386,246	4743008,553
	CODO EE 11º	611381,125	4743019,558
	DEFLEXION 3º	611372,162	4743052,513
	CODO EE 11º	611367,419	4743067,158
	NUDO 9	611367,338	4743068,515
	PUNTO ALTO C.19	611367,125	4743072,064
	RAMAL AB4	611366,8832	4743076,109
	CODO	611350,584	4743138,351
	CODO EE 45º	611344,548	4743144,387
	DEFLEXION 3º	611336,792	4743144,387
	DEFLEXION 2º	611335,510	4743144,444
	CODO EE 11º	611334,213	4743144,546
	CODO EE 22º	611333,114	4743144,856
	NUDO 2.2	611331,954	4743145,770
	NUDO 2	611328,029	4743148,865
AB3.1	CONEXION A RED EXISTENTE 2	611382,709	4742998,860
	CODO EE 45º	611378,435	4743000,418
	HIDRANTE	611374,369	4743009,145
	BOCA DE RIEGO	611372,988	4743012,315
AB4	NUDO 8	611451,408	4743097,680
	CODO EE 22º	4743091,437	611428,596
	CODO EE 22º	611423,918	4743092,001
	NUDO 7	611368,329	4743076,470
	RAMAL AB3	611366,883	4743076,109

RAMAL	PUNTOS SINGULARES	X	Y
AB5	CONEXION A RED EXISTENTE 1	611368,721	4743206,844
	DEFLEXION 2,5º	611365,931	4743201,532
	DEFLEXION 2,5º	611362,911	4743196,348
	DEFLEXION 2,4º	611360,893	4743193,084
	RAMAL C/EZCABA	611360,756	4743192,880
	DEFLEXION 1,7º	611360,641	4743192,710
	DEFLEXION 2º	611339,874	4743163,887
	NUDO 1	611331,775	4743153,615
	NUDO 2	611328,029	4743148,865
AB6	NUDO 3	611307,671	4743159,006
	CODO EE 22º	611309,841	4743159,201
	CODO EE 22º	611311,729	4743160,189
	CODO EE 45º	611313,469	4743160,345
	DEFLEXION 2º	611314,824	4743159,213
	PUNTO ALTO C.37	611324,205	4743151,880
	NUDO 2	611328,029	4743148,865

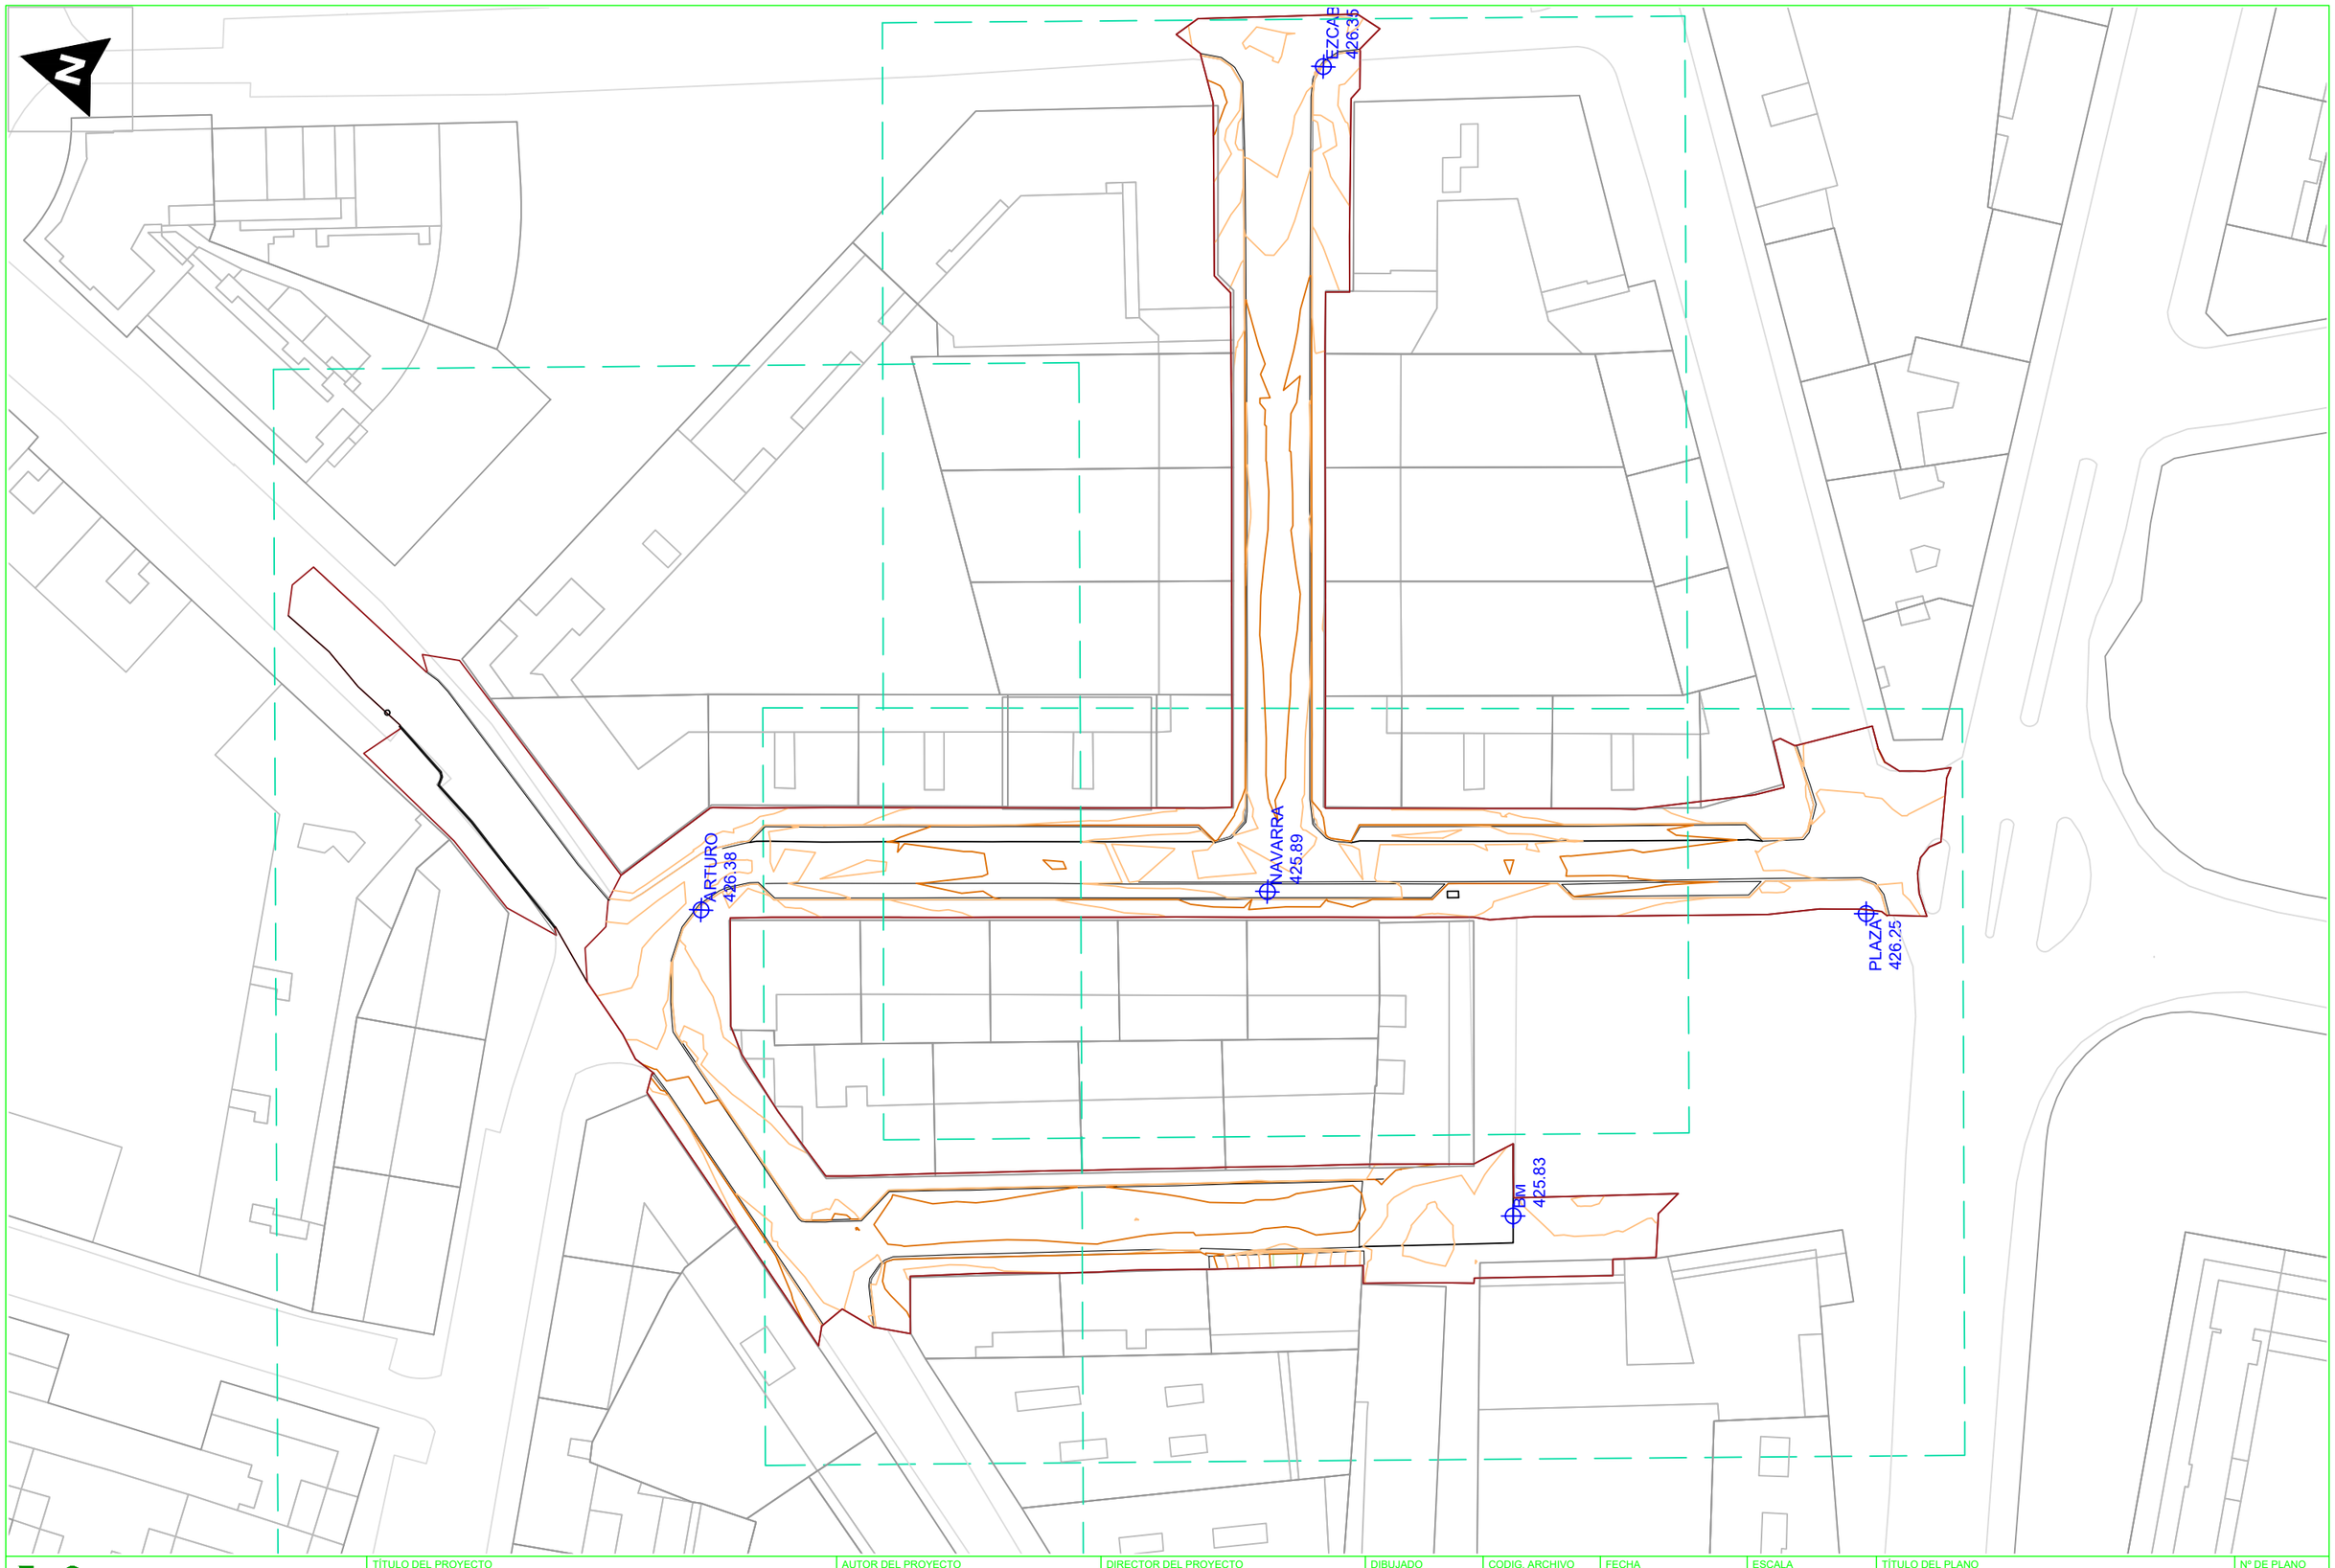


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Iruñerria Mankomunitatea — Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planotopografia.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/750, A1 = 1/325	TÍTULO DEL PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 1 de 4

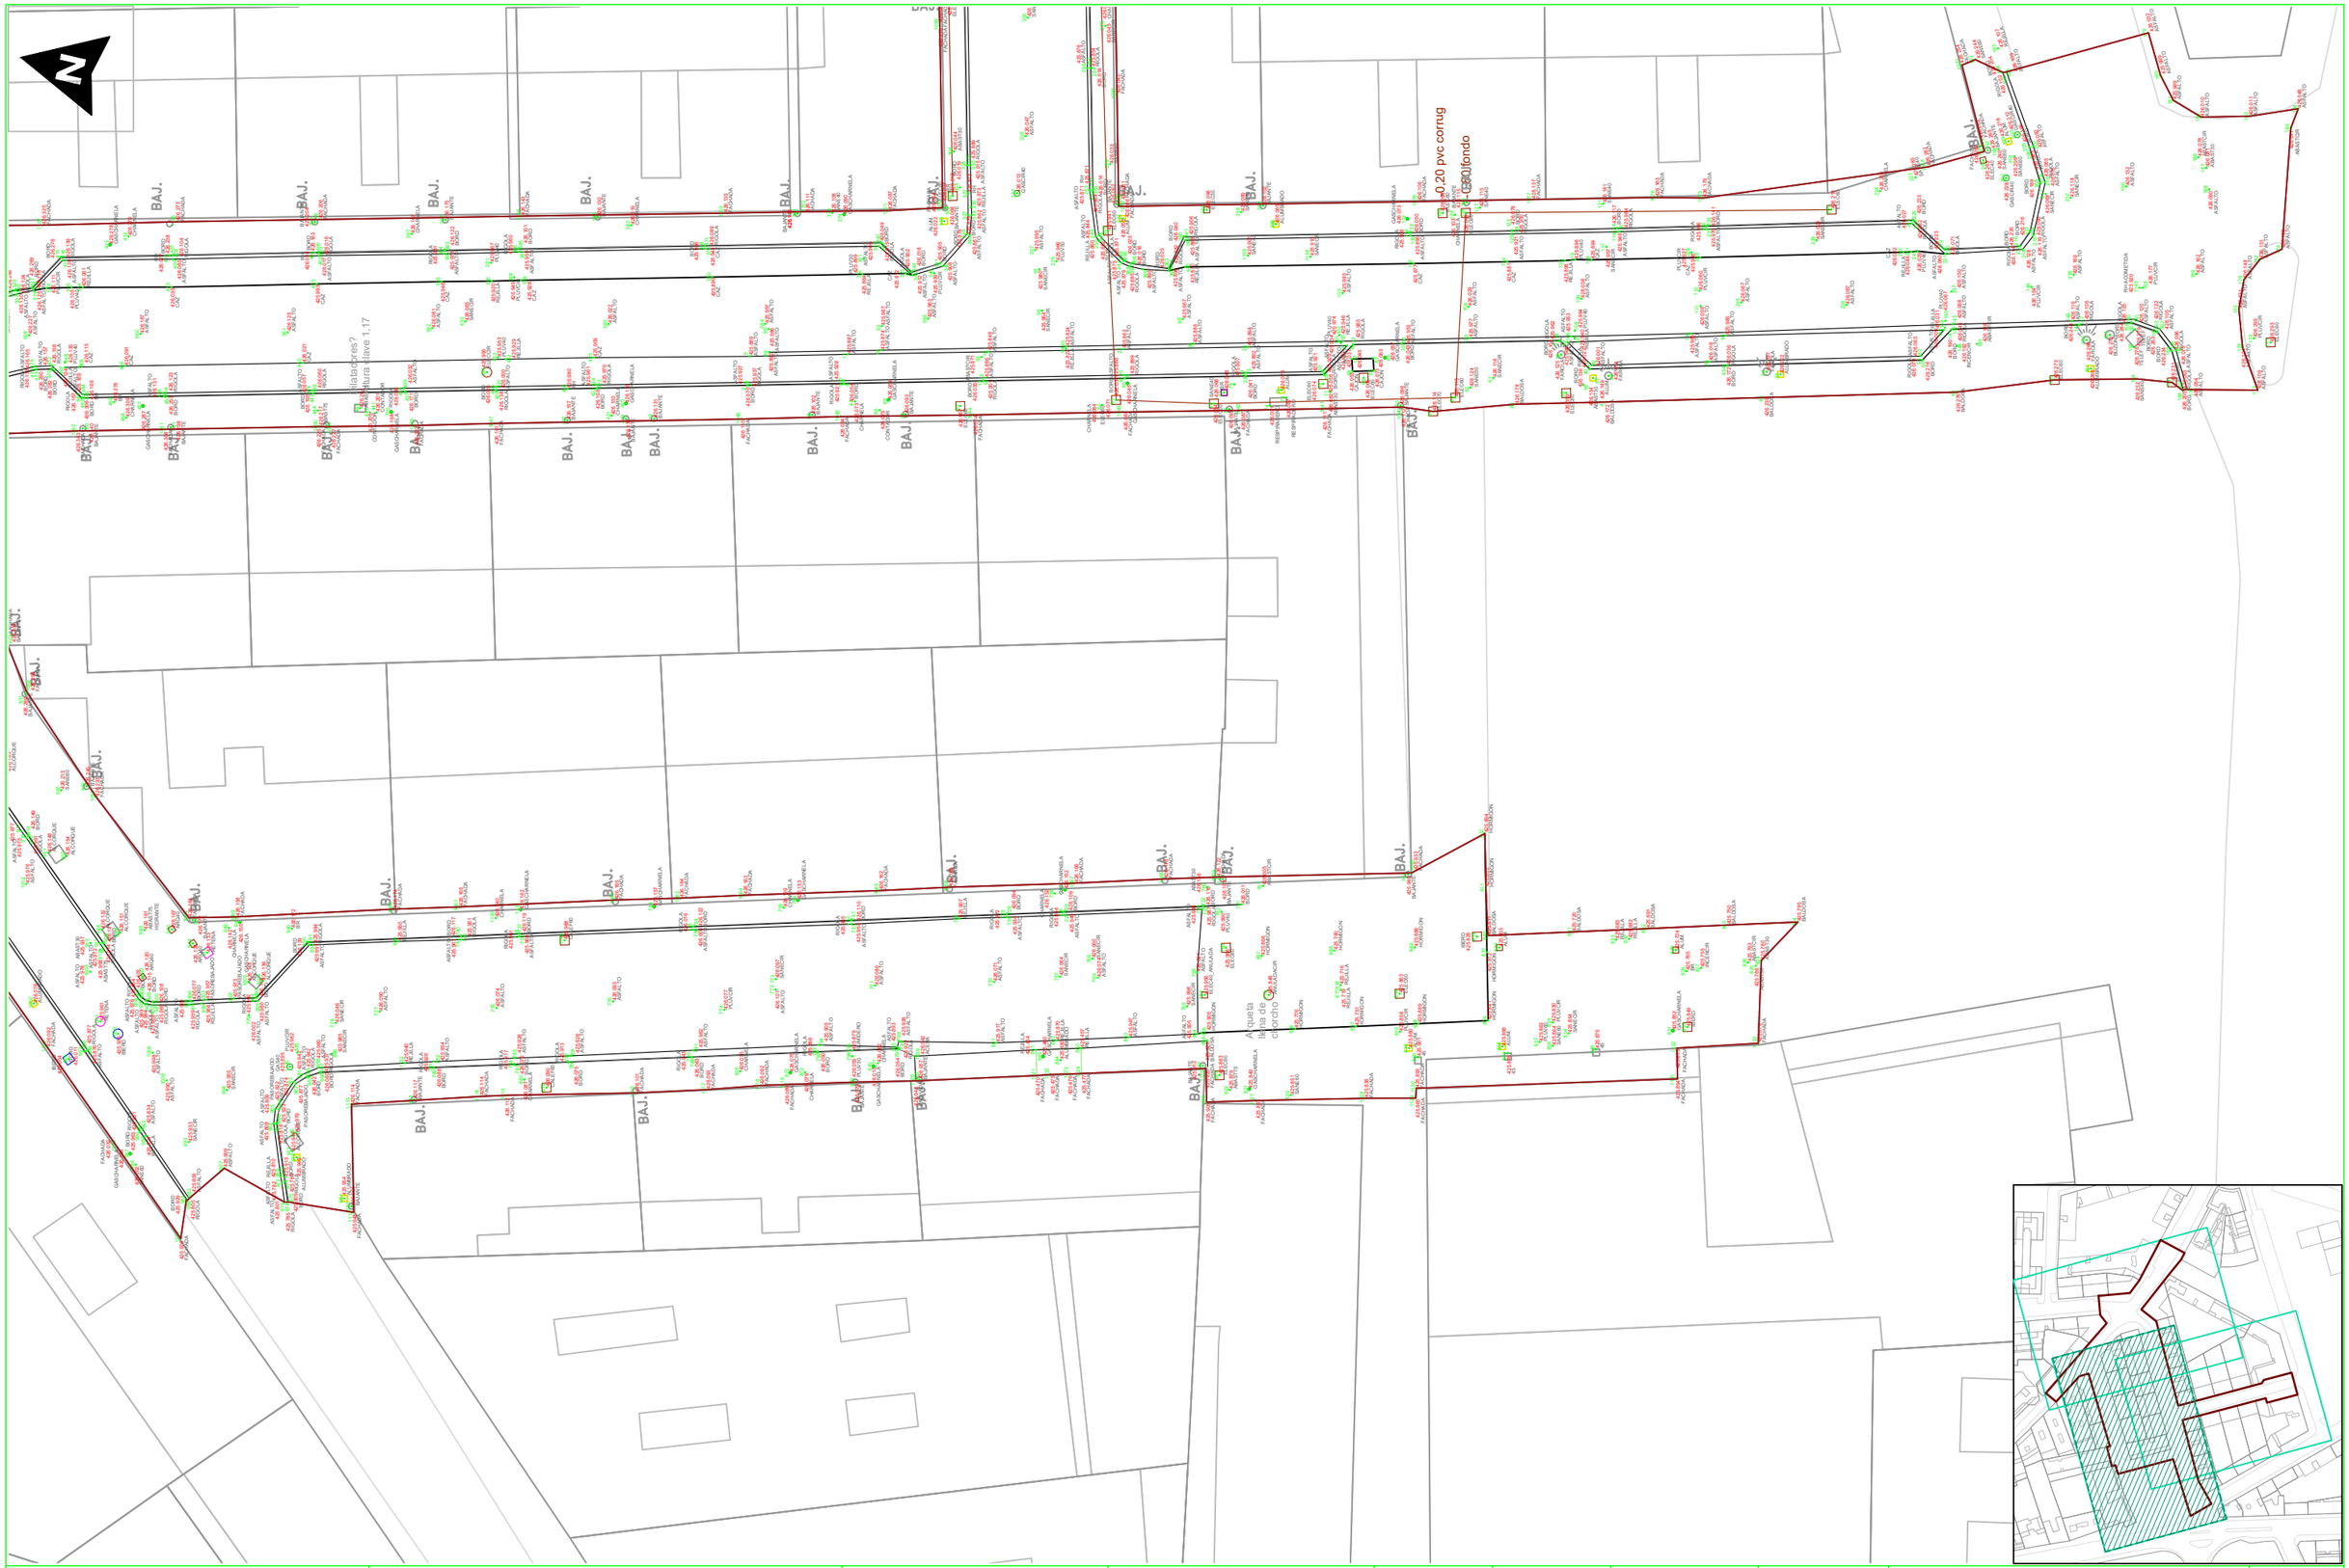

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.
Iruñerria Mankomunitatea
Iruñerria Zerbitzuak s.a.

TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planotopografia.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 2 de 4

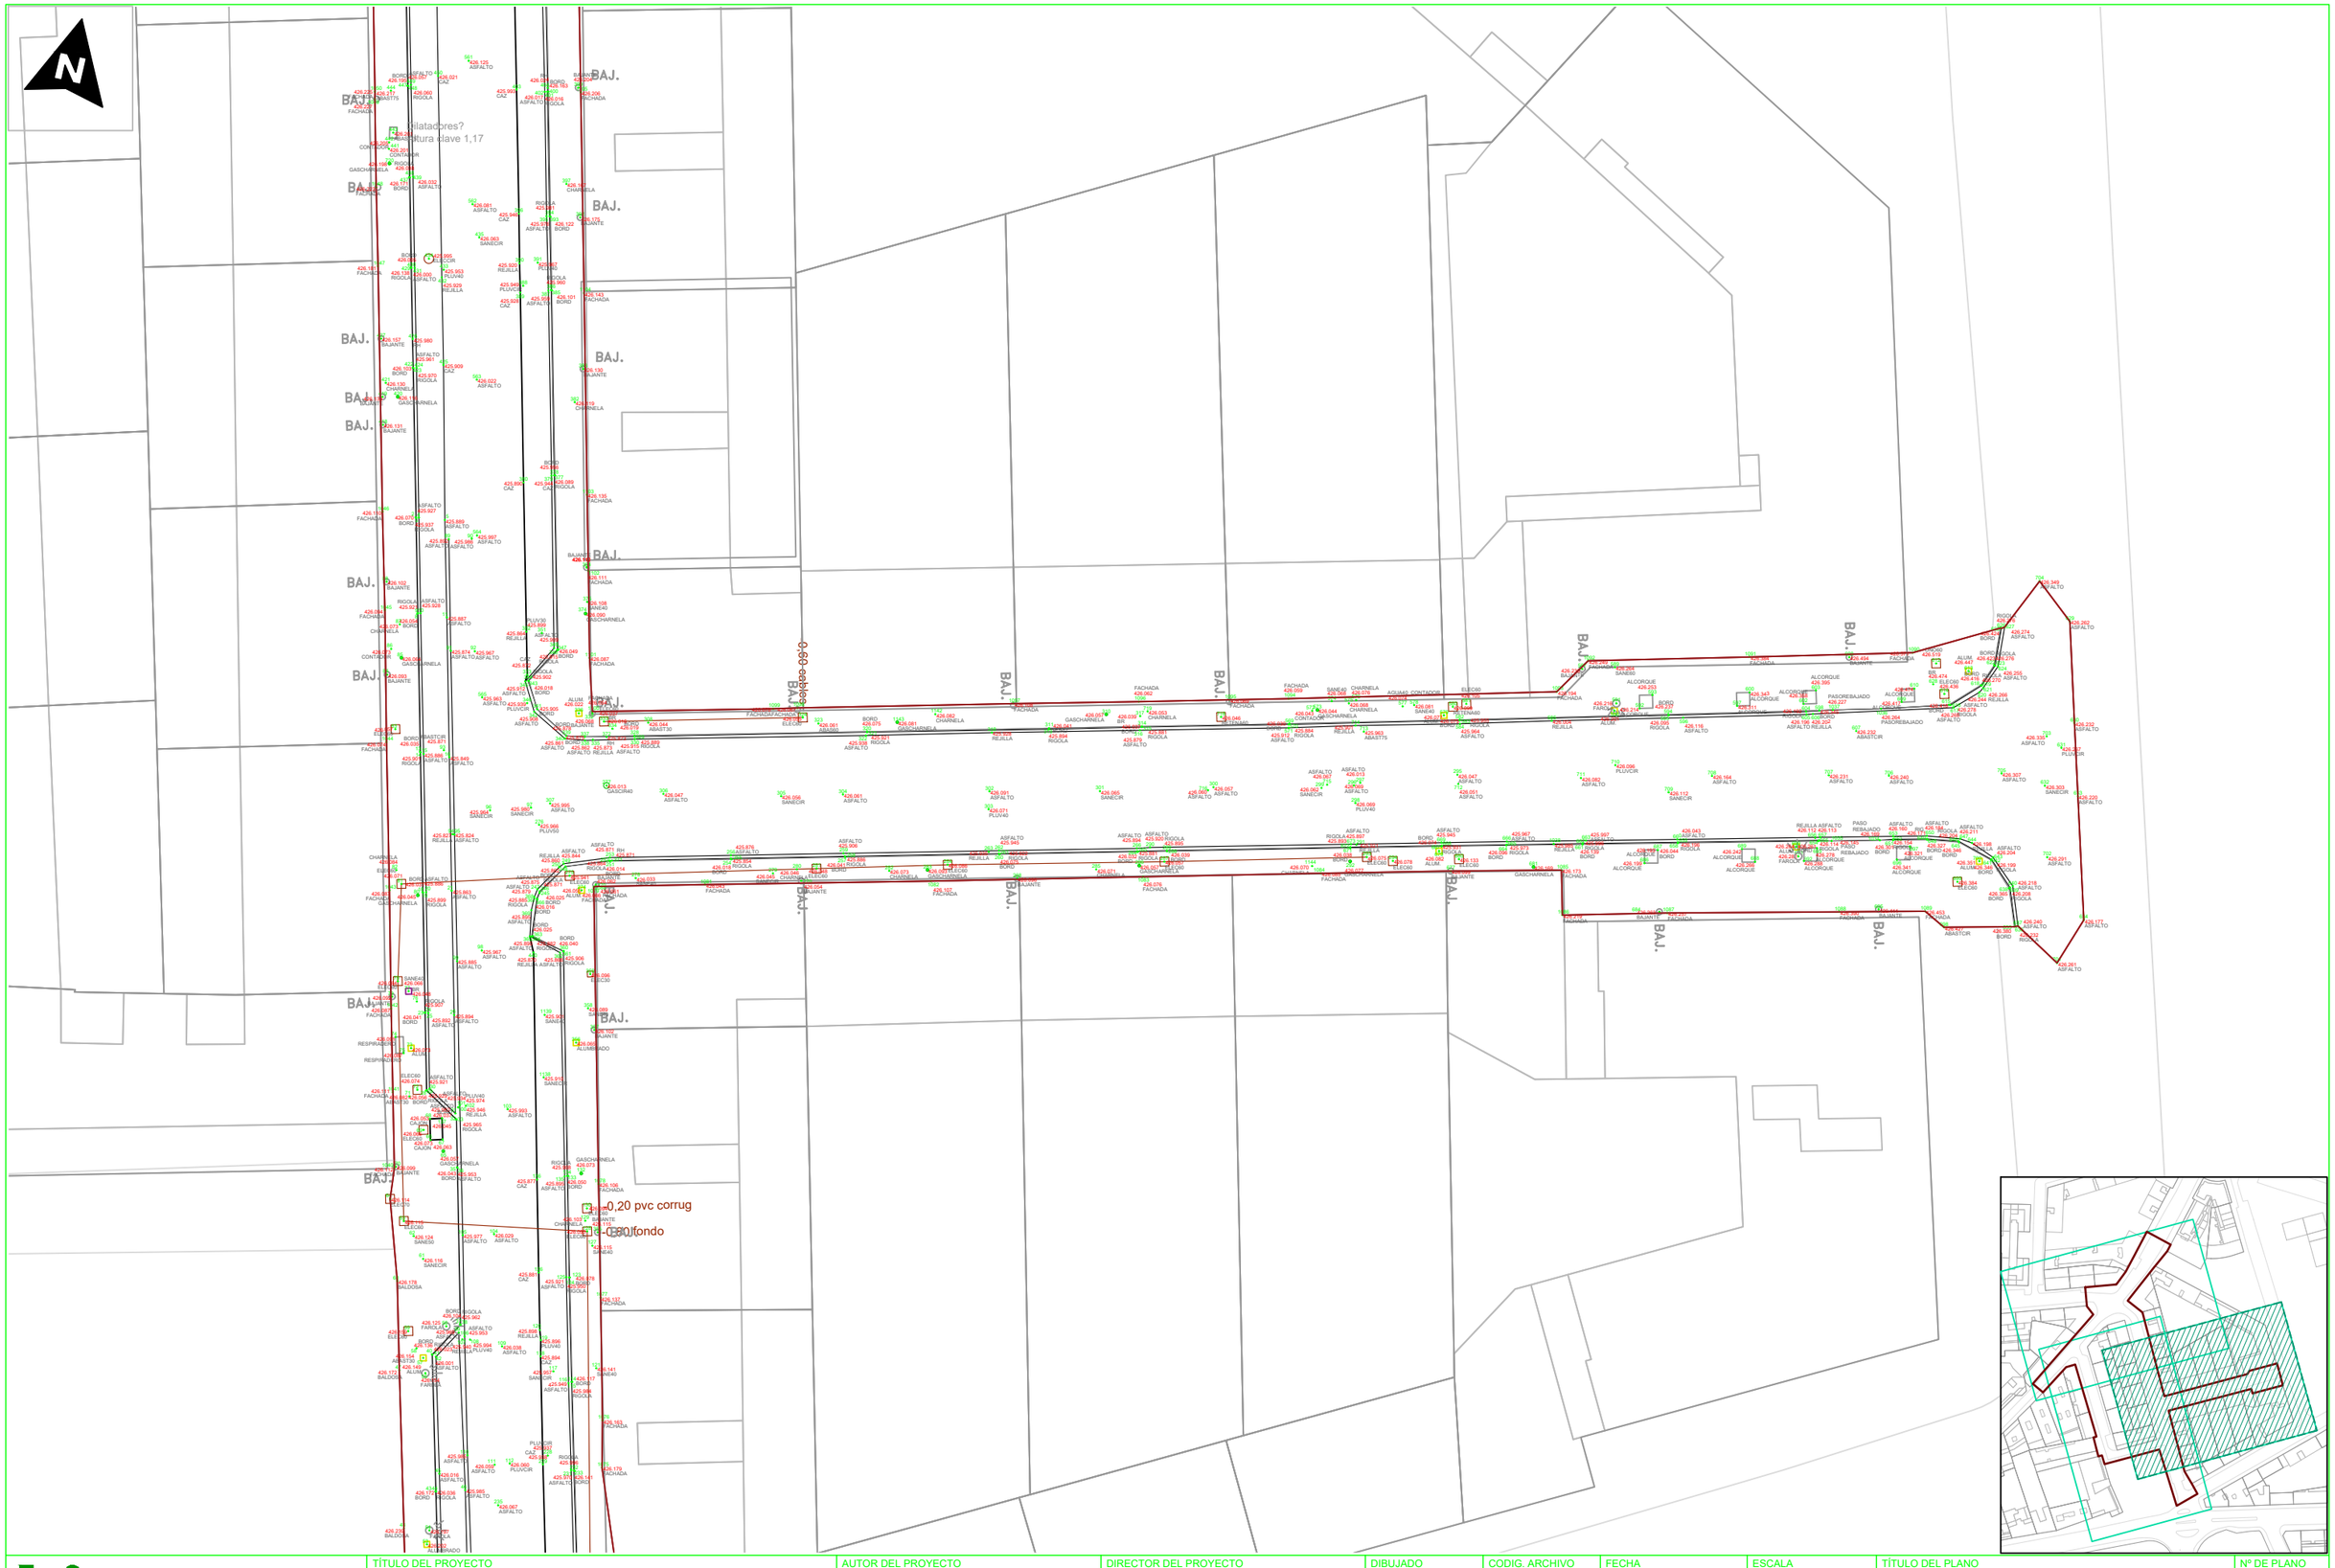

Mancomunidad Comarca de Pamplona Iruñerria Mankomunitatea / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 3 de 4
				CODIGO DWG: 00001190 planotopografia.dwg				


N
Arqueta
llena de agua
Arqueta
llena de agua
Arqueta
llena de agua

ANEJO Nº2 SERVICIOS AFECTADOS

ÍNDICE

1. SERVICIOS AFECTADOS

2. PLANOS

1. SERVICIOS AFECTADOS

En este anejo se analizan los servicios que quedan afectados por las obras, se listarán los servicios uno a uno, contemplando también su posterior reposición.

De los servicios afectados destacamos los siguientes:

- Líneas eléctricas.
- Líneas de telecomunicaciones.
- Alumbrado público.
- Gas.
- Agua (Redes de Abastecimiento y saneamiento en servicio).

Estos servicios están dibujados con la exactitud y el rigor que permite la información proporcionada por el PCCS. Asimismo, durante la visita in situ, varias arquetas y cotas fueron tomadas manualmente, y dicha información ha quedado igualmente reflejada en los planos siguientes.


Además no sólo deberá solicitarse marcaje a los servicios propios de abastecimiento y saneamiento, sino también al menos a las siguientes empresas proveedoras: Telefónica, Gas Navarra, Ono (registros de Retena) e Iberdrola, así como a cualquier otra que pudiera estar presente en el área de actuación.

En los perfiles longitudinales, correspondientes a los planos n.º 4 y n.º 8, las cotas de los distintos servicios se han definido siguiendo criterios habituales de implantación para cada tipo de red, dado que en algunos casos no se dispone de información precisa sobre su profundidad real. No obstante, estas cotas deberán ser revisadas y contrastadas durante la ejecución, y, en caso necesario, ajustadas para garantizar su correcta compatibilidad con el resto de infraestructuras existentes.

2. PLANOS

A continuación se incluye un plano con la superposición de las redes existentes, sin que la presencia aquí de dicho plano exima al contratista de solicitar el marcado in situ de las conducciones ni de proceder a la adopción de los medios necesarios para su localización sin originar interferencias en dichos servicios.

PLANO SERVICIOS AFECTADOS

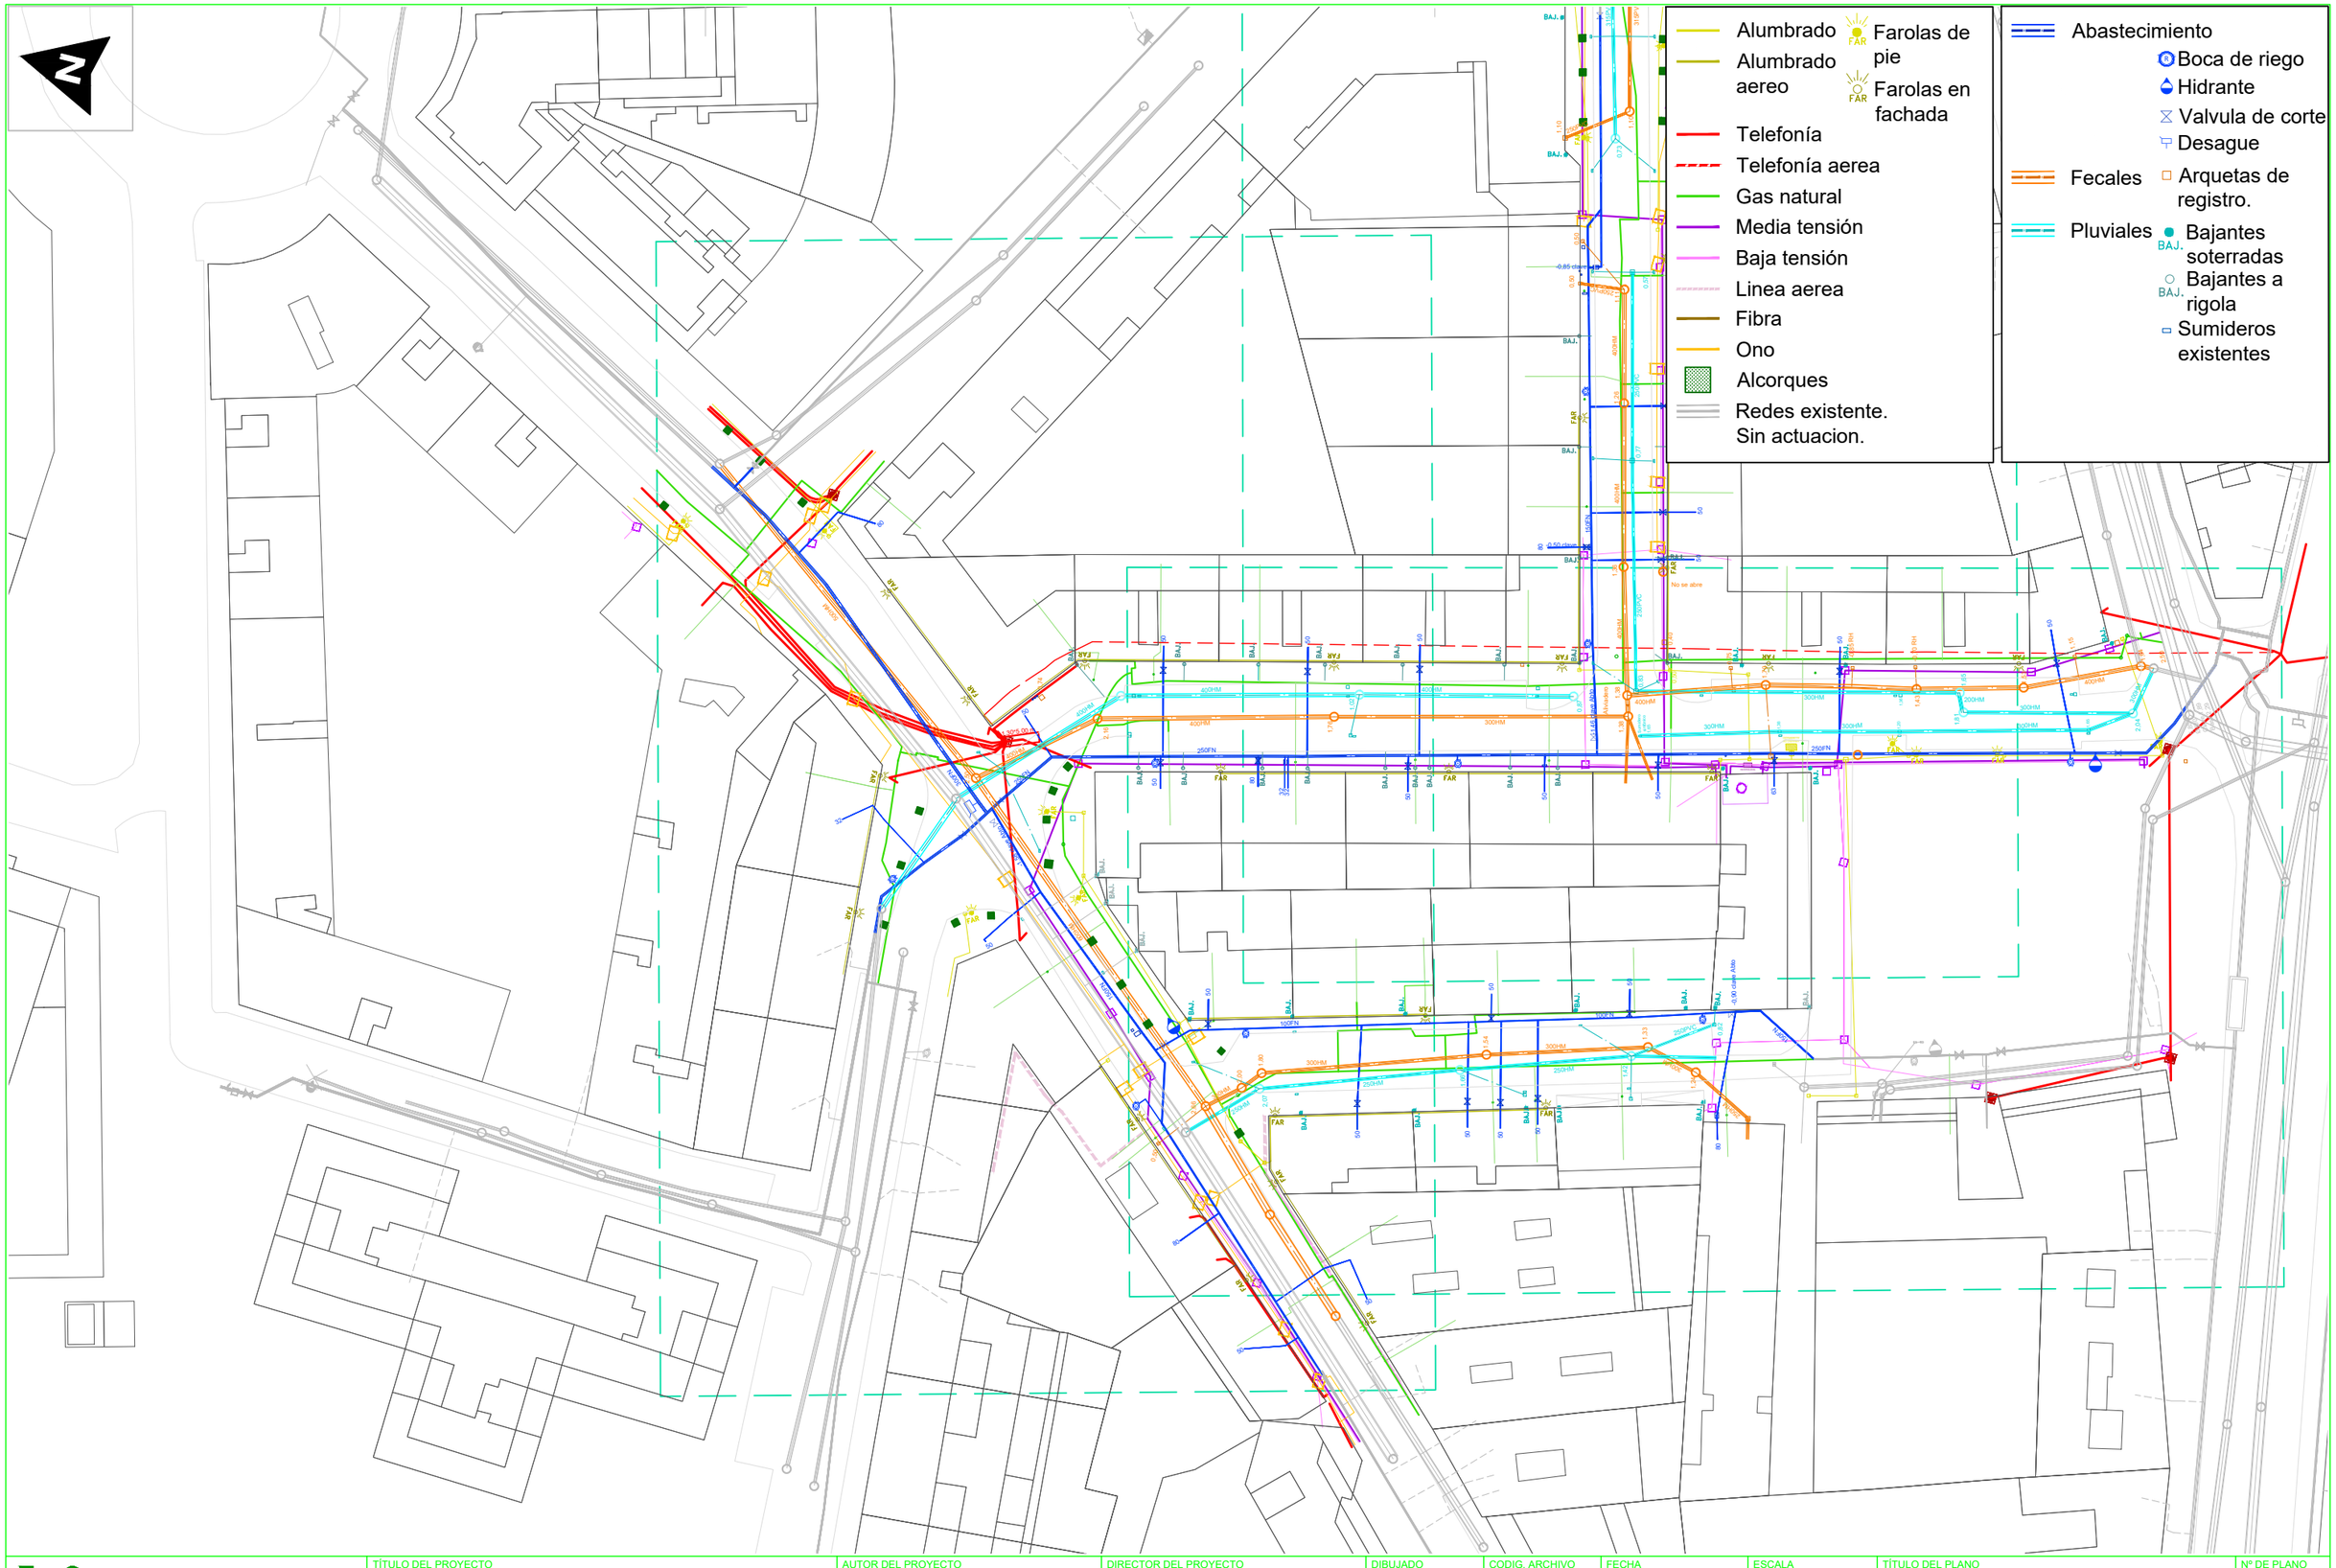


Mancomunidad Comarca de Pamplona
Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.
Ibarretxe Mankomunitatea
Ibarretxe Zerbitzuak s.a.


TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	CODIGO DWG 00001190 planoserviciosafectados.dwg		JUNIO 2026	A3 = 1/750 A1 = 1/325	PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS.	Nº DE HOJA 1 de 4



Mancomunidad Comarca de Pamplona / Zerbitzuak S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoserviciosafectados.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 2 de 4

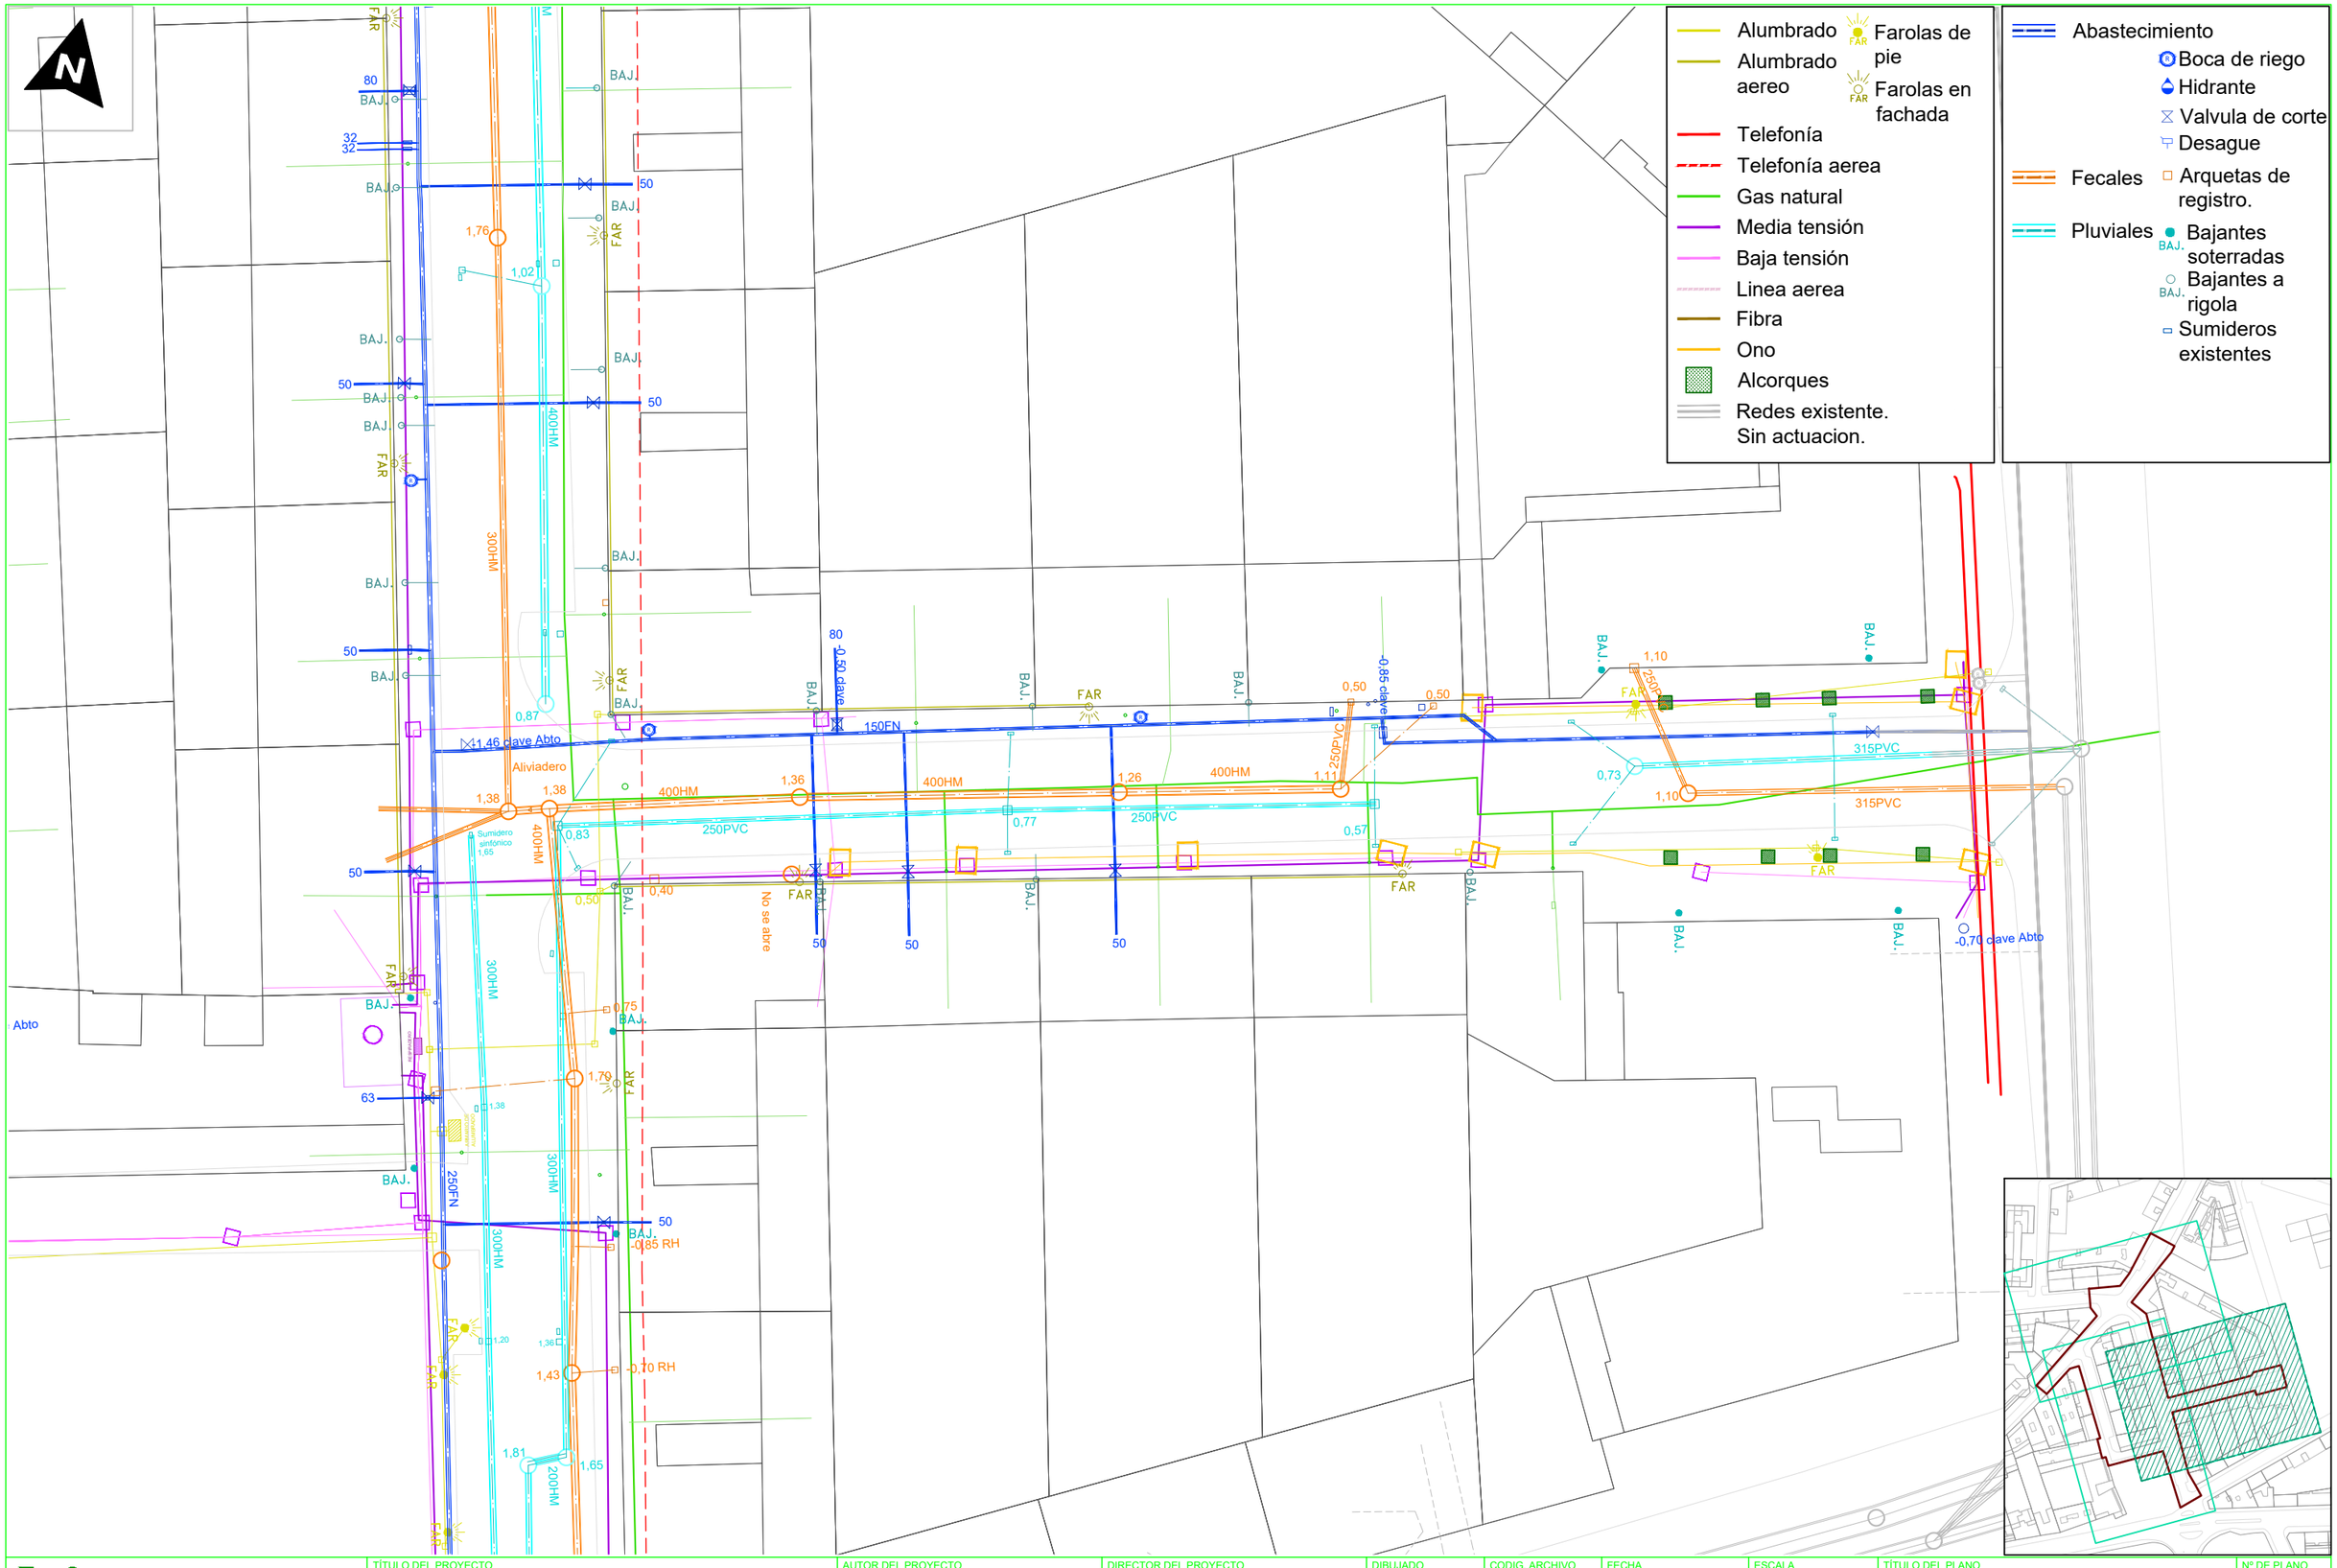

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Ingeniería Mankomunitatea / Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoserviciosafectados.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 3 de 4

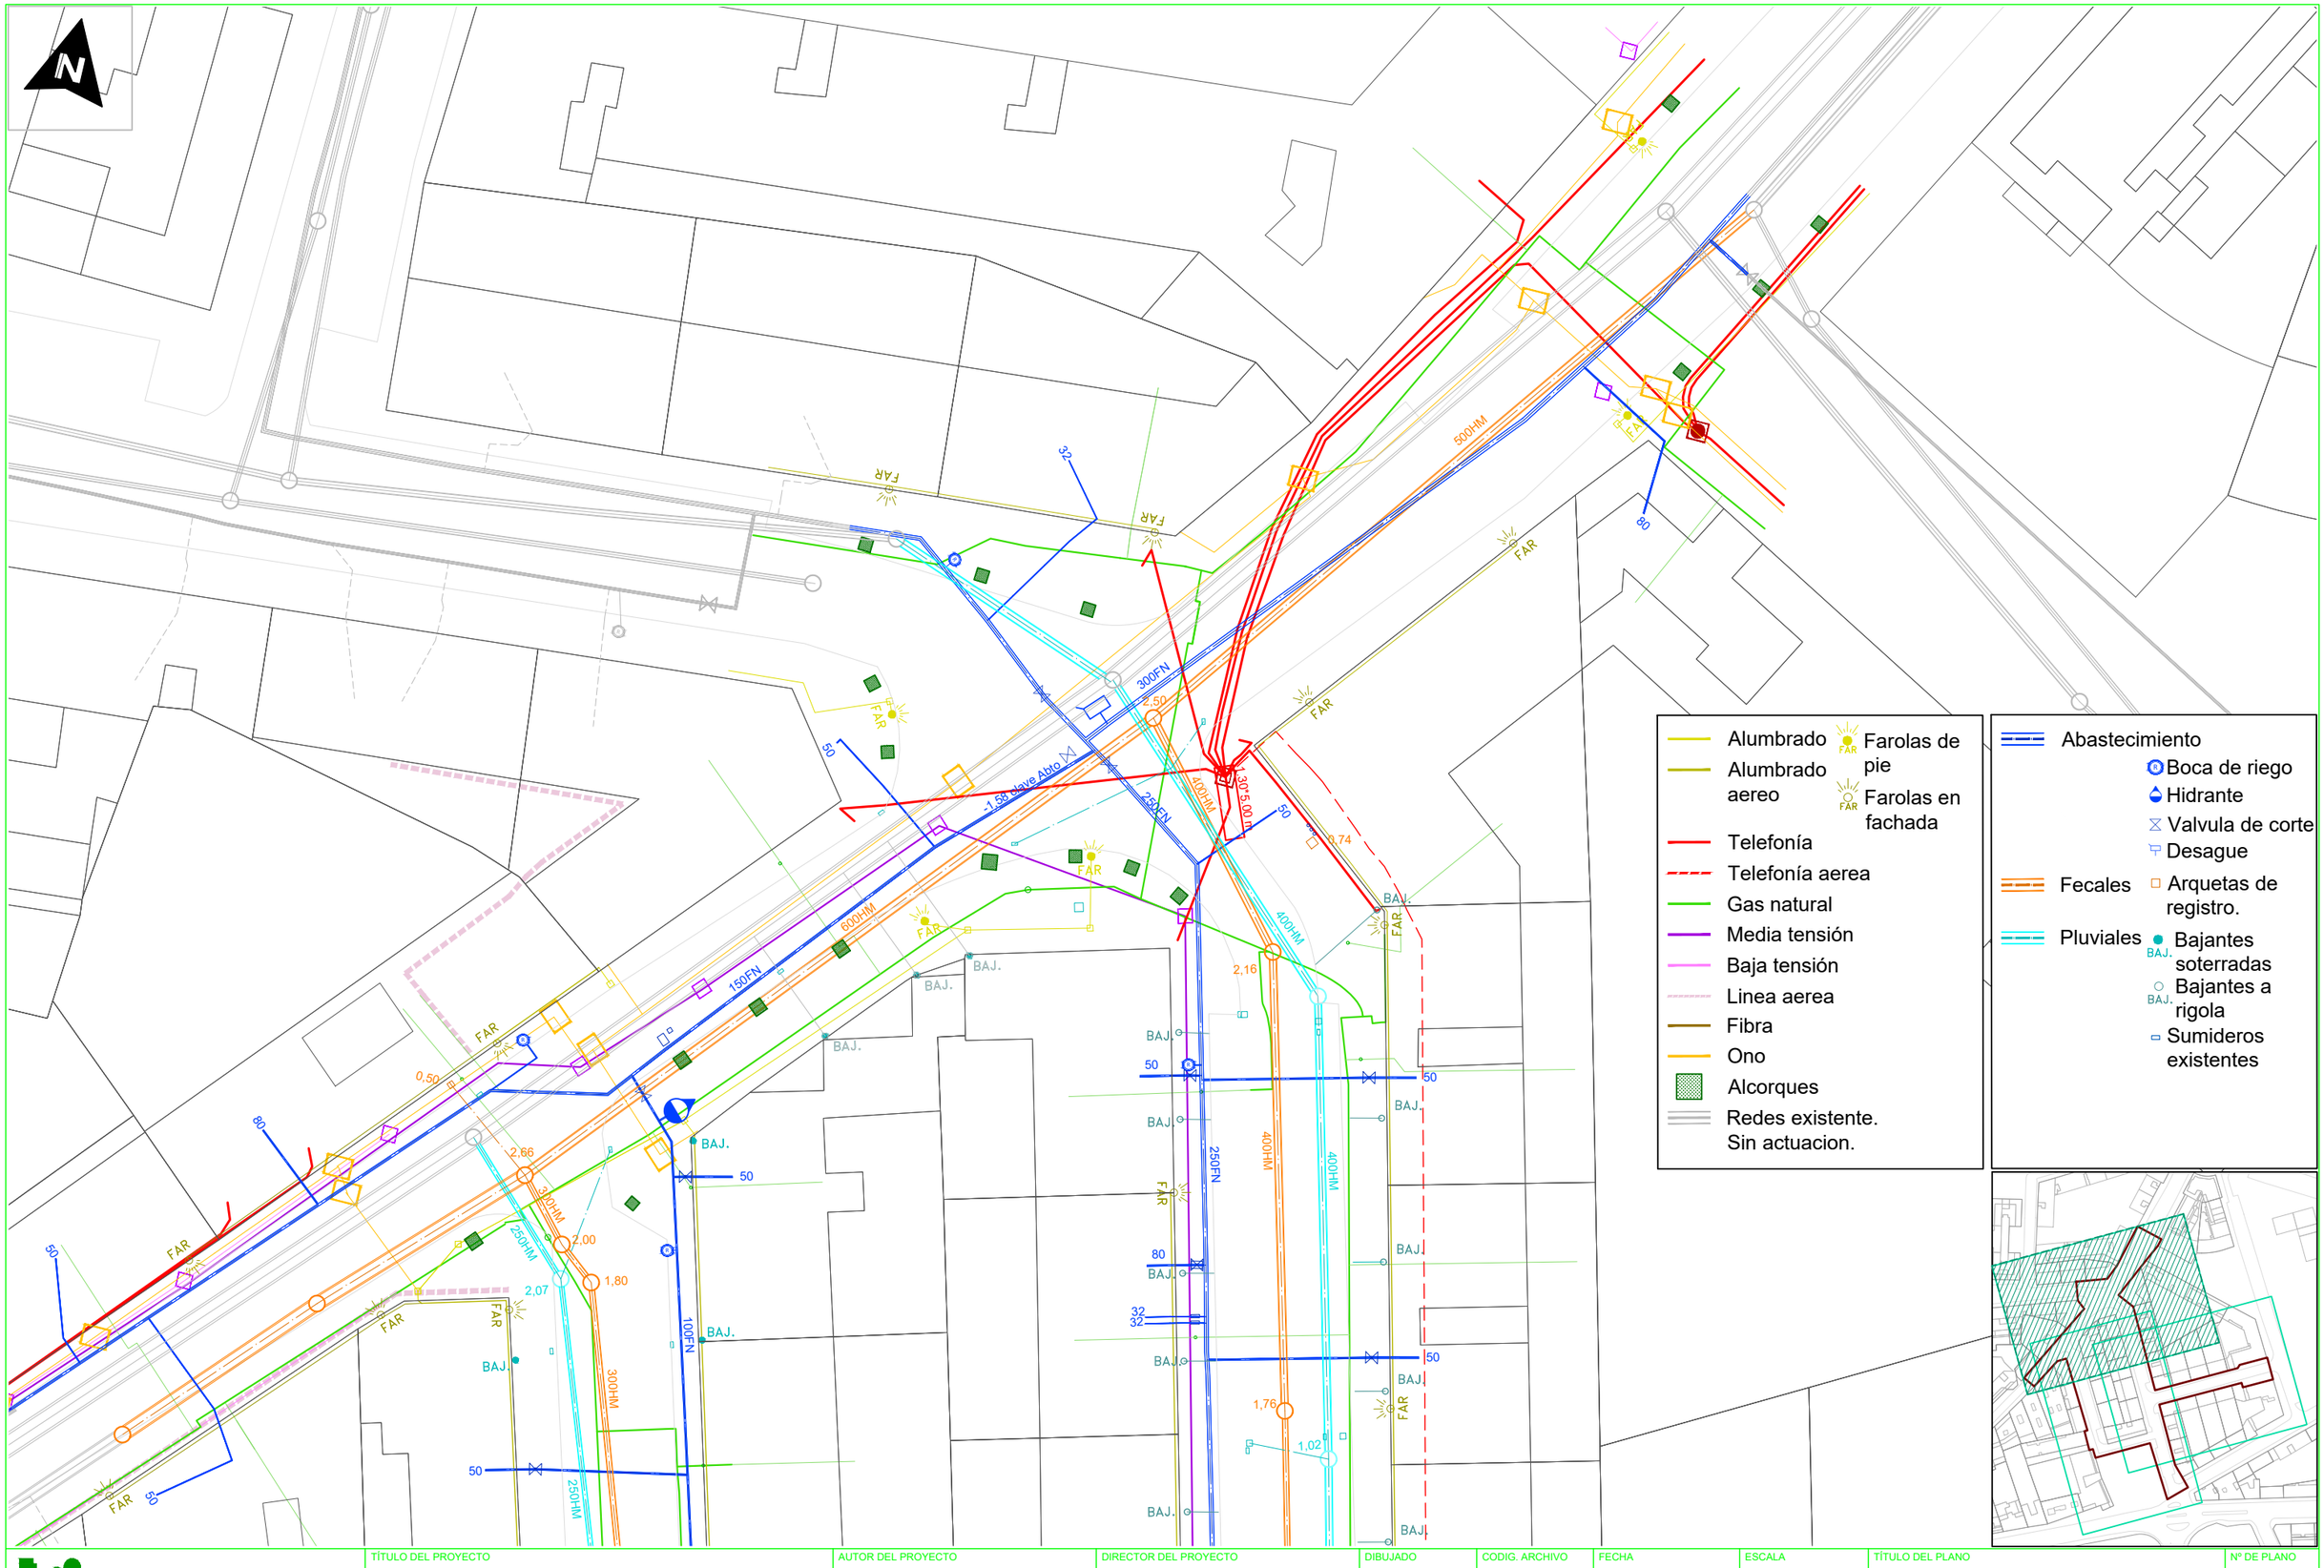

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.

TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 4 de 4
			CODIGO DWG: 00001190 planoserviciosafectados.dwg				

ANEJO Nº3 SEÑALIZACIÓN

ÍNDICE

1. DESCRIPCIÓN

2. PLANO

1. DESCRIPCIÓN

A continuación se propone un planteamiento gráfico (mediante plano) de balizamiento de la obra que posibilite el desarrollo de los trabajos contemplados en el proyecto, así como una previsión de señalización previa para asegurar el trasiego de vehículos y maquinaria de trabajo.

Cualquier otro planteamieto se estudiará tras la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

2. PLANO

Ver plano siguiente:

PLANO DE SEÑALIZACIÓN



Mancomunidad Comarca de Pamplona / Iruñerria Mankomunitatea — Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoseñalizacion.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/750, A1 = 1/325	TÍTULO DEL PLANO: PLANO DE SEÑALIZACION.	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 1 de 4

ANEJO Nº4 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS)

INDICE

ESS: Memoria
ESS: Planos
ESS: PPTP
ESS: Desglose de Presupuesto
  ESS: Mediciones
  ESS: Cuadro de precios nº1
  ESS: Presupuesto

ESS: MEMORIA

INDICE

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

1.3. MARCO JURÍDICO

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A DISPONER EN OBRA

2.1. MEDIDAS GENERALES

2.1.1. Medidas de carácter organizativo

2.1.1.1. Formación e información

2.1.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.

2.1.1.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra

2.1.1.4. Control de la Subcontratación.

2.1.2. Medidas de carácter dotacional

2.1.2.1. Servicio médico

2.1.2.2. Botiquín de obra

2.1.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar

2.1.3. Medidas generales de carácter técnico

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

2.2.1. Medidas generales

2.2.1.1. Recepción de la máquina

2.2.1.2. Utilización de la máquina

2.2.1.3. Reparaciones y mantenimiento en obra

2.2.1.4. Manipulación de cargas.

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION

3.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA.

3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1.1. Demoliciones – picado

3.1.1.2. Excavaciones

3.1.2. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

3.1.2.1. Ferrallado, encofrado, hormigonado y desencofrado

3.1.2.2. Montaje de prefabricados

3.1.3. REDES DE ABASTECIMIENTO

3.1.3.1. Instalación de tubos, piezas especiales y válvulas

3.1.3.2. Pruebas de tubería (estanqueidad y presión)

3.1.3.3. Desinfección de tubería

3.1.4. REDES DE SANEAMIENTO

3.1.4.1. Colocación de arquetas y pozos prefabricados

3.1.4.2. Colocación de pates en obras de fábrica

3.1.4.3. Inspección de tubería con cámara

3.1.5. AFIRMADOS Y PAVIMENTOS

3.1.5.1. Pavimentación, aceras y bordillos

3.1.5.2. Mezclas bituminosas

3.1.6. ACTIVIDADES DIVERSAS

3.1.6.1. Acopios y descargas de materiales

3.1.6.2. Almacenamiento de pinturas, disolventes y combustibles

3.1.6.3. Replanteo, topografía y arqueología

3.1.6.4. Actuaciones en la obra de los servicios técnicos

3.1.6.5. Colocación de carteles

3.1.6.6. Soldadura

3.1.6.7. Trabajos en espacios confinados

3.1.6.8. Operaciones con tuberías de fibrocemento

3.1.6.9. Jardinería, poda y tala

3.1.7. SERVICIOS AFECTADOS

3.1.7.1. Conducciones

3.1.7.2. Líneas de transporte de energía eléctrica

3.1.7.3. Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes...)

3.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

3.2.1. Maquinaria de movimiento de tierras

3.2.1.1. Retroexcavadoras, excavadora mixta, miniexcavadora (bob – cat), pala cargadora, buldózer.

3.2.1.2. Motoniveladora

3.2.1.3. Pisones y compactadores

3.2.1.4. Rodillo Lanza (rana)

3.2.1.5. Camiones y dúmperes

3.2.2. Medios de hormigonado

3.2.2.1. Camión hormigonera

3.2.2.2. Camión Bomba de Hormigón

3.2.2.3. Hormigonera eléctrica

3.2.2.4. Vibrador de hormigón

3.2.3. Medios de fabricación y puesta en obra de firme y pavimentos

3.2.3.1. Camión cisterna de riegos

3.2.3.2. Extendedora de aglomerado asfáltico

3.2.3.3. Compactador de neumáticos

3.2.3.4. Rodillo vibrante autopropulsado

3.2.3.5. Camión basculante

3.2.3.6. Fresadora

3.2.3.7. Barredora

3.2.4. Maquinaria y herramientas diversas

3.2.4.1. Camión grúa-pluma

3.2.4.2. Grúa autopropulsada

3.2.4.3. Grúa torre

3.2.4.4. Compresor

3.2.4.5. Grupo electrógeno

3.2.4.6. Martillo neumático

3.2.4.7. Herramientas manuales

3.2.4.8. Motosierra

3.2.4.9. Tronzadora

3.2.4.10. Radial

3.2.4.11. Taladro

3.2.4.12. Cortadora de pavimentos

3.2.4.13. Sierra circular de mesa

3.2.4.14. Batidora para mortero

3.2.5. Equipos de trabajo diversos

3.2.5.1. Plataforma elevadora

3.2.5.2. Escaleras de mano

3.2.5.3. Andamios

3.2.5.4. Entibación

3.2.5.5. Puntales

3.2.5.6. Eslingas, cadenas, cuerdas y cables.

4. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO

5. CONCLUSIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del proyecto de construcción "00001190 RENOVACION DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA.""

El promotor es Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

El proyecto ha sido realizado por los Servicios técnicos de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: No se ha designado

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

En primer lugar, será necesario contactar con el Ayuntamiento de Ansoáin para coordinar varias cuestiones de accesibilidad e información a los vecinos. La coordinación con el ayuntamiento será permanente durante toda la obra ya que esta renovación de redes está ligada a la renovación de pavimentación que va a abordar el propio ayuntamiento.
Asimismo, será preciso comunicarse con el Departamento de Residuos de S.C.P.S.A. para gestionar el traslado temporal de los contenedores a otra ubicación durante la ejecución de las obras.

Todos los materiales utilizados serán los homologados por la Mancomunidad, Los detalles constructivos que no estén reflejados en los planos deberán ajustarse a los contemplados en la Ordenanza sobre Redes y aprobados por la Dirección de la Obra.

C/Canteras:

En esta calle únicamente se renuevan la red de abastecimiento y el colector de fecales, ya que el colector de pluviales existente se encuentra en condiciones adecuadas para seguir en funcionamiento, pudiendo plantearnos más a futuro el enmangado del mismo.

El ramal de abastecimiento se ha dividido en dos tramos: el AB5, que discurre desde la conexión con la red existente 1 hasta el nudo 2, y el AB1, que se extiende desde el nudo 2 hasta el nudo 4. El ramal AB5 se conecta a la red existente mediante un manguito de unión; se trata de una tubería de 300 mm de diámetro, a la que se incorpora un ramal procedente de calle Ezcaba de 150 mm, y que presenta un punto bajo en el nudo 1, donde se proyecta un desagüe hacia el pozo PL2.4 existente, finalizando su trazado en el nudo 2 con una cruceta.

Por su parte, el ramal AB1 consiste en una tubería de 150 mm, que presenta un punto bajo en el nudo 2.1 (PK0+012.59), con desagüe igualmente dirigido al pozo PL2.4 existente. A continuación, el trazado alcanza un punto alto (PK0+081.88) en la acometida C.3, de 50 mm de diámetro, que actúa como ventosa en la red. En este tramo se incorpora también el ramal AB2, y el conjunto finaliza en el nudo 4, donde se dispone una válvula de retención que permitirá la instalación de una boca de riego y un desagüe.

El colector de fecales, FE1, se replantea siguiendo la configuración existente, respetando tanto los diámetros actuales como las cotas de los pozos. Además, se contempla que el primer pozo (FE 1.1) y el último (FE 1.6) no se renueven por completo, limitándose la actuación a la reparación de los desperfectos detectados, sin proceder a la instalación de nuevos elementos. No obstante, se incorpora un pozo adicional al estado actual entre los dos primeros con el fin de resolver el cruce con las líneas de telecomunicaciones identificadas en la información del PCCS, garantizando así una implantación compatible con los servicios existentes.

Esta calle consta de un gran numero de servicios existentes, tal y como se refleja en el correspondiente plano, donde destaca de manera importante la cámara de Telefónica situada en la esquina este de la intersección entre la calle Canteras y Arturo Campión.

En la calle Canteras existen dos puntos a los que se deberá prestar especial atención a la hora de ejecutar las obras. En las intersecciones con las calles Arturo Campión y Travesía canteras se producen varios cruces entre las redes de fecales, pluviales y abastecimiento. Estos cruces se han estudiado para que no se produzcan interferencias, pero apenas disponen de holgura por lo que si en alguno de los puntos coinciden las campanas de los tubos, es posible que no se puedan respetar las cotas de proyecto. Antes de ejecutar estas tuberías será necesario abrir las zanjas y realizar el replanteo correspondiente para evitar interferencias. Actualmente estos cruces están resueltos mediante la duplicación de tuberías, pasando de una tubería de diámetro 400mm a 2 de 250mm.

C/Lapurbide:

La renovación del ramal de abastecimiento AB6 consiste en una tubería de fundición nodular de 250 mm, que arranca en el nudo 3, donde se instala una válvula de retención para permitir la colocación de una boca de riego y un desagüe. El trazado se resuelve mediante varios codos de 22° y 45° para evitar el pozo PL5.1. La red presenta un punto alto (PK0+019.72) en la acometida C.37, de 32 mm, que actúa como ventosa, y finaliza en el nudo 2 conectando a la cruceta.

El colector de pluviales PL5 se ejecutará mediante un enmangado desde el pozo PL5.1 hasta el colector existente PL2.4, de la tubería de hormigón en masa de 500 mm.

En este tramo de calle no existe colector de fecales, por lo que no se prevé ninguna actuación en dicha red.

Trª Canteras:

Las redes se acumulan en el lado de los portales nº2, nº4 y nº6, dejando espacio en el otro margen de la vía para plantar vegetación.

La renovación del ramal abastecimiento AB2 comienza en la conexión con la red existente 3, desde donde, mediante codos de 45°, la conducción se aproxima progresivamente a la fachada. En el nudo 6 (PK0+011.15) se produce un cambio de diámetro, pasando de una tubería de fundición nodular de 150 mm, que recorre la plaza Euskal Herria, a otra de 100 mm. La red de abastecimiento discurre por la alineación más próxima a la fachada y, debido a la topografía de la acera, a la altura del portal n.º 6 es necesario retranquear la conducción mediante dos codos de 22°. Antes de llegar a calle Canteras, en el nudo 5 (PK0+076.93), se identifica un punto bajo en el que se proyecta la instalación de un desagüe, destinado a evacuar el agua hacia el pozo PL 1.4.

Los colectores de pluviales y fecales discurren paralelos a lo largo de todo el trazado. El colector de fecales FE2 está ejecutado en PVC de 315 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 1,8 %, y vierte finalmente en el pozo FE1.4 del colector FE1. Por su parte, el colector de pluviales PL1, también de PVC de 315 mm, presenta una profundidad media de 1,4 m y una inclinación media del 1 %, finalizando en el pozo PL1.4 existente, perteneciente al colector de pluviales que no se renueva en la calle Canteras.

C/Navarra:

La red de abastecimiento AB4 discurre por el mismo trazado que el actual y se trata de una tubería de 150 mm que comienza en el nudo 8 conectándose a la red existente y que se conecta al ramal AB3. Cuenta con el nudo 7 (PK0+086.10) con válvula de corte.

La red de saneamiento se divide en dos: la que se dirige hacia C/ Ezcaba y la que lo hace hacia C/ Arturo Campión. En el tramo hacia C/ Ezcaba, el ramal de fecales FE5 está formado por una tubería de hormigón en masa de 300 mm, con una profundidad media de 1,25 m y una inclinación del 0,74 %; únicamente se renueva el pozo FE5.1, finalizando el ramal en un pozo existente. El ramal de pluviales PL4, también de hormigón en masa de 300 mm, arranca en una arqueta de inicio debido a la escasa profundidad necesaria para alcanzar una inclinación del 0,66 % y llegar a la cota del pozo existente. Se incorpora un pozo intermedio para ejecutar la renovación dentro del ámbito previsto para la renovación del pavimento.

Las redes que continúan hacia C/ Arturo Campión se describen en el siguiente apartado y son los ramales FE4 y PL3.

C/Arturo Campion:

Las redes se concentran en el lado de los portales comprendidos entre los números 2 y 18, dejando libre el margen opuesto de la vía para la implantación de vegetación. Se desplaza por completo al lado contrario el ramal de abastecimiento, y se ajusta la red de saneamiento al margen seleccionado.

La red de abastecimiento AB3 está formada por una tubería de fundición nodular de 250 mm que discurre paralela a la fachada a lo largo de todo su trazado. Parte de la conexión con la red existente 2 y, mediante codos de 45° y 11°, se aproxima a la fachada. Presenta un punto bajo (PK0+073.35) en el nudo 9 y un punto alto (PK0+076.91) donde se ubica la acometida C.19, de 50 mm. A este ramal se incorpora el AB4 en el PK0+080.97, y el trazado continúa hasta el nudo 2.2 (PK0+166.80), donde, tras varios codos y deflexiones, finaliza en la válvula de la cruceta del nudo 2.

Existe un ramal denominado AB3.1 que arranca en la conexión con la red existente 2 y da servicio tanto al hidrante como a la boca de riego. El trazado se ejecuta con una tubería de fundición nodular de 100 mm hasta el hidrante, y con una tubería de PE de 50 mm hasta la boca de riego.

La red de saneamiento se divide en dos: la que discurre desde C/ Navarra hacia Av. Villava y la que se dirige hacia C/ Canteras. En el tramo procedente de C/ Navarra, el ramal de fecales FE4 está formado por una tubería de hormigón en masa de 400 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 0,7 %, y conecta con el pozo PL4.8 existente. El ramal de pluviales PL3 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre los pozos PL3.1 y PL3.3, y con tubería de 400 mm desde PL3.3 hasta el pozo existente PL3.8. Presenta una profundidad media de 1,86 m y una inclinación media del 0,45 %. Conviene mencionar que el pozo PL3.7 actúa como pozo de

resalto, ya que el ramal llega a una profundidad aproximada de 2,3 m, mientras que el pozo PL3.8 alcanza casi 5 m, generando un salto de cota significativo.

En cuanto a la red que se dirige hacia C/ Canteras, el ramal de fecales FE3 se compone de una tubería de PVC de 315 mm entre los pozos FE3.1 y FE3.3, y de hormigón en masa de 300 mm desde FE3.3 hasta su conexión final en el pozo FE1.3 del ramal FE1. Presenta una profundidad media de 1,94 m, con una inclinación del 1,14 % en el tramo de PVC y del 0,54 % en el tramo de hormigón. El ramal de pluviales PL2 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre PL2.1 y PL2.3, y con tubería de 400 mm desde PL2.3 hasta el pozo existente PL2.4, con una profundidad media de 1,44 m y una inclinación media del 0,66 %.

Dado que el proyecto contempla la reubicación completa de varios ramales de abastecimiento, los trazados antiguos podrán mantenerse en servicio de forma temporal hasta la finalización de las obras, garantizando así la continuidad del suministro. Paralelamente, se instalará una red de abastecimiento provisional, configurada de forma mallada, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el suministro a las viviendas situadas en aquellas calles donde todavía no haya reubicación del ramal de abastecimiento.

Como paso final se considera indispensable, y así se refleja en los precios de las correspondientes unidades de obra, que la línea de abastecimiento este limpia probada y desinfectada.

Previa a la recepción de la obra, tanto los registros como las conducciones de hormigón deberán ser probados según la normativa de la Mancomunidad, el coste de estas pruebas está contemplados en los precios de cada una de las unidades de obra. Todos los colectores deberán someterse a una inspección video gráfica completa. El coste de dicha inspección viene reflejado en el presupuesto. Las pruebas de presión y estanqueidad se deberán realizar de acuerdo con lo previsto en el PPTP de este proyecto, las ordenanzas o lo que indique el Director de las Obras según el caso

1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución del proyecto es de NUEVE (9) MESES.
La empresa contratista deberá presentar con carácter mensual una planificación de actividades desarrollada, describiendo con detalle las actuaciones que implique cada trabajo.

1.3. MARCO JURÍDICO

Como queda dicho, este estudio de seguridad y salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.

De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. Dicho plan desarrollará las medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. El plan de seguridad y salud constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones reglamentariamente establecidas.

La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio de seguridad y salud, establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior cumplimiento, sin perjuicio de las recogidas en el pliego de condiciones de este estudio.

2. MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES A DISPONER EN OBRA

2.1. MEDIDAS GENERALES

Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.

2.1.1. Medidas de carácter organizativo

2.1.1.1. Formación e información

En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador.

En su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo.

El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores.

2.1.1.2. Servicios de prevención y organización de la seguridad y salud en la obra.

La empresa constructora viene obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores, adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.

Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.

2.1.1.3. Modelo de organización de la seguridad en la obra

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al incorporarse a la obra de una organización preventiva que, de acuerdo con lo establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la Ley 31/1995, se ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, cada empresa deberá contar con las siguientes figuras:

Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la coordinación de actividades empresariales con las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) será el máximo representante de la organización preventiva del contratista en la obra debiendo garantizar la eficiencia de las actuaciones preventivas en la misma.

Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal obligación será la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan de seguridad y salud (cumpliendo la función de los antiguos vigilantes de seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. Cada empresario (contratista y subcontratistas) designará cuantos sean necesarios según las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes del organigrama preventivo del empresario en la obra, deberán, en su caso, participar en el resto de obligaciones empresariales de carácter general (coordinación de actividades empresariales, formación e información de trabajadores.....). Los nombramientos de dichos trabajadores deberán ser efectivos antes del inicio de los trabajos de modo que las empresas contratista y subcontratistas cumplan con su obligación de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Además, los nombramientos de los trabajadores en cuestión deberán ser convenientemente actualizados a lo largo de la obra.

De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como recursos preventivos del empresario contratista, deberán estar presentes en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en la misma. Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva de las empresas subcontratistas en la obra. La formación de estos recursos preventivos deberá adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo de Seguridad de su empresa en obra.

Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de desarrollar dicha tarea.

Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los Equipos de Protección Individual de todos sus trabajadores.

Señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, las figuras aquí recogidas, a excepción de la de Técnico de Prevención y los Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre un único trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la Seguridad en obra tendrán como principal condicionante la continua presencia en obra para así poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud.

2.1.1.4. Control de la Subcontratación.

De acuerdo con la Ley 32/2006 sobre subcontratación en el sector de la construcción, los empresarios participantes en la obra deberán atender a las siguientes indicaciones:

Se dispondrá del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, en el que se recogerá, desde el inicio de los trabajos, por orden cronológico todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el nivel de subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, el representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra hasta todas aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades empresariales).
En todo caso, y en cumplimiento de la legislación vigente y salvo las excepciones establecidas en la Ley 32/2006, el tercer subcontratista no podrá subcontratar, como tampoco los trabajadores autónomos ni las empresas cuya labor se realice básicamente empleando mano de obra y/o maquinas-herramientas ligeras. Sin perjuicio de lo anterior, se trasladará al coordinador de seguridad y salud la relación de empresas que se vayan a incorporar a la obra.
Tanto el contratista como los subcontratistas deberán vigilar el cumplimiento de las empresas por ellos subcontratadas en lo referente a las obligaciones de acreditación y registro reguladas para el régimen de la subcontratación, mediante la recopilación de las empresas subcontratadas de la documentación demostrativa de tal cumplimiento.
Cada empresa participante en la obra deberá disponer de la documentación o título acreditativo de la posesión de la maquinaria que emplee, y de cuanta documentación sea exigida por otras disposiciones legales.
Los representantes legales de cada una de las empresas deberán ser informados de todas las subcontrataciones que se realicen en la obra.
Finalmente, los distintos empresarios, acreditarán la formación de todos sus trabajadores en materia de preventiva, adecuada al trabajo a realizar, de manera que conozcan los riesgos y las medidas preventivas para prevenirlos.

2.1.2. Medidas de carácter dotacional

2.1.2.1. Servicio médico

La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El empresario contratista principal deberá acreditar que ha posibilitado la realización de los preceptivos reconocimientos médicos del personal de la obra. Dichos reconocimientos, atendiendo a lo establecido en la legislación vigente, deberán tener carácter específico para el puesto de trabajo. En todo caso, se deberá contar con los certificados de aptitud de los trabajadores empleados en la obra y, en caso de existir restricciones, adaptar al trabajador a un puesto de trabajo para el que resulte apto.

2.1.2.2. Botiquín de obra

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.
El botiquín de primeros auxilios contendrá el mínimo establecido en el Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados

- Gasas estériles
- Algodón hidrófilo
- Venda
- Esparadrapo
- Apósitos adhesivos
- Tijeras
- Pinzas
- Guantes desechables

El plan de seguridad y salud precisará la situación donde se encontrarán en la obra, el ó los botiquines.

2.1.2.3. Instalaciones de higiene y bienestar

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de las instalaciones necesarias de higiene y bienestar, suministro de energía eléctrica, suministro de agua potable, etc.

En cuanto a las instalaciones de higiene y bienestar, éstas deberán dimensionarse en función del número de trabajadores que se estime puedan intervenir en las actividades. En cuanto a la ubicación de las mismas, debe tenerse en cuenta que en las obras de renovación de redes los tajos (especialmente los de excavación en zanja y montaje de tubería) suelen encontrarse muy dispersos, y además enmarcarse en una superficie de importantes de dimensiones, lo cual determinará la necesidad de que los operarios puedan verse obligados a desplazarse a través de caminos y de carreteras secundarias importantes distancias hasta alcanzar las instalaciones. Por este motivo, resulta especialmente importante que en este tipo de obras no se realice un simple dimensionado basado en el número de trabajadores, sino que además se realice un estudio del área, sectorizando la zona de los trabajos, y determinando los lugares de montaje de forma que resulten accesibles para todos los trabajadores.

De forma general, dichas instalaciones de higiene y bienestar deberán estar formadas por vestuarios y aseos, planteándose la posibilidad de que el comedor pueda verse sustituido por un concierto entre la empresa contratista y los centros de hostelería próximos a la obra.

No obstante lo establecido, se debe considerar que en múltiples situaciones las obras de renovación de redes suelen aparejar la ejecución de actividades de larga duración y en tajos concentrados, muy especialmente en lo relacionado con la ejecución de las estructuras, como grandes arquetas para válvulas en balsas, estaciones de bombeo, depósitos, fosas sépticas... En estos casos, resultará necesario que la empresa disponga en los tajos instalaciones fijas que complementen a las anteriores, bien mediante aseos químicos o similar.

En cualquier caso, las instalaciones de higiene y bienestar deberán tener una revisión periódica de su estado de conservación, estar situadas fuera de la zona de acción de las obras, y disponer del correspondiente cerramiento y de señalización.

Durante el montaje de las instalaciones de higiene y bienestar, los riesgos serán los propios de la maquinaria utilizada y de la manipulación e izado de cargas. Por tanto, resultarán de aplicación las medidas preventivas contempladas en el presente documento para las citadas actividades, además de las correspondientes a la maquinaria a emplear (camión-grúa, escaleras de mano y herramientas manuales). Por otra parte, deberán tenerse en cuenta las posibles situaciones de riesgo de caída a

distinto nivel que podrían generarse, y muy especialmente durante su deslingado. De esta manera, los trabajos deberán realizarse desde escalera de mano, o bien disponerse los medios de acceso y las protecciones necesarias (escaleras de mano, barandillas sólidas y rígidas, líneas de vida, etc.) en el supuesto de que los trabajos se debieran realizar sobre la cubierta de las instalaciones (o cuando sobre las mismas se instalen depósitos de agua... u otras casetas).

Las instalaciones de higiene y bienestar deberán disponer de los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir.

Finalmente, debe ponerse de relevancia la obligación de que las instalaciones de obra se empleen de forma exclusiva para los fines con que inicialmente sean concebidas. Por tanto, por ejemplo, se prohibirá el almacenamiento de los materiales en zonas reservadas al uso de aseos o vestuarios. Además, todos los productos especialmente peligrosos por su toxicidad, inflamabilidad etc., se deberán almacenar en lugares específicamente habilitados para ello, independientes de las zonas generales de almacén, instalaciones de higiene, acopios, etc. Finalmente, todos estos productos se emplearán conforme a lo especificado en las fichas de seguridad facilitadas por sus respectivos fabricantes.

En cuanto a la instalación eléctrica provisional de obra, una de las cuestiones más relevantes se corresponde con la necesidad de designar formalmente a los operarios responsables de cada una de las instalaciones eléctricas, que en todo caso dispondrán de la formación correspondiente como “instalador autorizado”. Dichas instalaciones serán revisadas periódicamente, y se dejará constancia documental de las mismas (serán realizadas por el responsable de la instalación).

El responsable de la instalación se encargará de comprobar que cada una de ellas cumple con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y con las ITC´s complementarias que le sean de aplicación, en los siguientes casos:

- Antes de la puesta en marcha de la instalación.
- Cuando en la instalación se produzca aumento o reducción de circuitos.
- Cuando un grupo electrógeno se cambie de ubicación.
- Cualquier instalación eléctrica provisional deberá cumplir las siguientes prescripciones:
- Se prohibirán las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. Por lo tanto, no se permitirá "enganchar" a tuberías o a asimilables, como armaduras, etc.
- Se prohibirá el tránsito de los equipos y personas sobre mangueras eléctricas, ya que pueden pelarse y producir accidentes.
- Se prohibirá el tránsito bajo líneas eléctricas con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano,...). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.
- No se deberá permitir la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas.
- No se permitirán las conexiones directas cable-clavija de otra máquina.
- Se prohibirá que se desconecten las mangueras por el procedimiento del "tirón". La desconexión se realizará amarrando y tirando de la clavija enchufe.
- La ubicación de cuadros de distribución o de conexión eléctrica debe preverse en un lugar firme y seco.
- Deberá comprobarse diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales al inicio de la jornada y tras la pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test.

- Se dispondrá siempre en el almacén disyuntores de repuesto y de interruptores automáticos magnetotérmicos, con los que sustituir los que se pudieran averiar.

- Todas las instalaciones eléctricas se deberán señalizar advirtiendo del riesgo eléctrico a todos los trabajadores de la obra. Además, esta señalización se deberá mantener en perfecto estado de conservación y mantenimiento.

- Los cuadros eléctricos contarán con grado de protección mínimo IP-45. Estos cuadros deberán permanecer siempre cerrados, de modo que sólo se manipulen por el responsable de la instalación.

- Todas las conexiones se realizarán usando las clavijas adecuadas.

- Se preverán instalaciones de seguridad que se activen en caso de fallo de la alimentación normal de los circuitos y aparatos instalados.

En cuanto a la instalación eléctrica en las obras, debemos considerar que la práctica totalidad de los casos, el empleo de equipos y herramientas eléctricas se realizará en intemperie, motivo por el cual todos los cables y conexiones deberán contar con doble aislamiento. En este sentido, debemos tener en cuenta que en un buen número de situaciones el empleo de estas herramientas eléctricas (como sierras radiales, equipos de soldadura...) se realizará en el interior de excavaciones que, en función del tipo de material, profundidad del nivel freático, etc., podrán albergar agua en su interior. Por lo tanto, se deberán plantear medidas alternativas a estos supuestos (empleo de herramientas alimentadas mediante batería, etc.), prohibiéndose terminantemente el empleo de herramientas eléctricas en zonas húmedas o con presencia de agua.

Por último, todos los grupos electrógenos en la obra (para la alimentación de bombas de achique y todo tipo de herramientas eléctricas) deberán disponer de su oportuna pica de toma de tierra, hincada en el terreno la longitud especificada por su fabricante.

2.1.3. Medidas generales de carácter técnico

El plan de seguridad y salud de la obra establecerá con el detalle preciso los accesos y las vías de circulación y aparcamiento de vehículos y máquinas en la obra, así como sus condiciones de protección y balizamiento.

Las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de polietileno de alta densidad, tendrán una altura mínima de 100 cm, incorporarán una banda reflectante y serán de colores amarillo o naranja luminosos, manteniéndose en correcto estado de conservación y no debiendo presentar elementos doblados o rotos.

En relación con las instalaciones eléctricas de obra, la resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado, o sustituirlo cuando la desconexión no se produce. Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.

Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y adecuadamente señalizados.

Los medidores portátiles de gases estarán calibrados y deberán medir como mínimo el porcentaje de oxígeno, así como las partes por millón (ppm) de CO, CO2 y CH4.

El plan de seguridad y salud desarrollará detalladamente estas medidas generales a adoptar en el curso de a obra, así como cuantas otras se consideren precisas, proponiendo las alternativas que el contratista estime convenientes, en su caso.

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA, INSTALACIONES AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO

2.2.1. Medidas generales

Antes del inicio de los trabajos, el contratista comprobará que se cumplen las siguientes condiciones preventivas, así como las previstas en su propio plan de seguridad y salud, de las que mostrará, en su caso, comprobantes que el coordinador de seguridad y salud de la obra pueda requerir:

2.2.1.1. Recepción de la máquina

A su llegada a la obra, cada máquina debe llevar en su carpeta de documentación las normas de seguridad para los operadores.

A su llegada a la obra, cada máquina irá dotada de un extintor timbrado y con las revisiones al día.

Cada maquinista deberá poseer la formación adecuada para que el manejo de la máquina se realice de forma segura y, en caso contrario, será sustituido o formado adecuadamente.

Cada maquinista contará con autorización expresa para el manejo de la máquina que se trate.

La maquinaria a emplear en la obra irá provista de cabinas antivuelco y antiimpacto.

Las cabinas no presentarán deformaciones como consecuencia de haber sufrido algún vuelco.

La maquinaria irá dotada de luces y bocina o sirena de retroceso, todas ellas en correcto estado de funcionamiento.

2.2.1.2. Utilización de la máquina

Antes de iniciar cada turno de trabajo, se comprobará siempre que los mandos de la máquina funcionan correctamente.

Se prohibirá el acceso a la cabina de mando de la maquina cuando se utilicen vestimentas sin ceñir y joyas o adornos que puedan engancharse en los salientes y en los controles.

Se impondrá la buena costumbre de hacer sonar el claxon antes de comenzar a mover la máquina.

El maquinista ajustará el asiento de manera que alcance todos los controles sin dificultad.

Las subidas y bajadas de la máquina se realizarán por el lugar previsto para ello, empleando los peldaños y asideros dispuestos para tal fin y nunca empleando las llantas, cubiertas y guardabarros.

No se saltará de la máquina directamente al suelo, salvo en caso de peligro inminente para el maquinista.

Sólo podrán acceder a la máquina personas autorizadas a ello por el jefe de obra.

Antes de arrancar el motor, el maquinista comprobará siempre que todos los mandos están en su posición neutra, para evitar puestas en marcha imprevistas.

Antes de iniciar la marcha, el maquinista se asegurará de que no existe nadie cerca, que pueda ser arrollado por la máquina en movimiento.

No se permitirá liberar los frenos de la máquina en posición de parada si antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas.

Si fuese preciso arrancar el motor mediante la batería de otra máquina, se extremarán las precauciones, debiendo existir una perfecta coordinación entre el personal que tenga que hacer la maniobra. Nunca se debe conectar a la batería descargada otra de tensión superior.

Cuando se trabaje con máquinas cuyo tren de rodaje sea de neumáticos, será necesario vigilar que la presión de los mismos es la recomendada por el fabricante. Durante el relleno de aire de los neumáticos el operario se situará tras la banda de rodadura, apartado del punto de conexión, pues el reventón de la manguera de suministro o la rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo.

Siempre que el operador abandone la máquina, aunque sea por breves instantes, deberá antes hacer descender el equipo o útil hasta el suelo y colocar el freno de aparcamiento. Si se prevé una ausencia superior a tres minutos deberá, además, parar el motor.

Se prohibirá encaramarse a la máquina cuando ésta esté en movimiento.

Con objeto de evitar vuelcos de la maquinaria por deformaciones del terreno mal consolidado, se prohibirá circular y estacionar a menos de tres metros del borde de barrancos, zanjas, taludes de terraplén y otros bordes de explanaciones.

Se circulará con las luces encendidas cuando, a causa del polvo, pueda verse disminuida la visibilidad del maquinista o de otras personas hacia la máquina.

Estará terminantemente prohibido transportar personas en la máquina, si no existe un asiento adecuado para ello.

No se utilizará nunca la máquina por encima de sus posibilidades mecánicas, es decir, no se forzará la máquina con cargas o circulando por pendientes excesivas.

Las maniobras de marcha atrás y las maniobras en las que el conductor no tenga buena visibilidad serán guiadas por una persona distinta al conductor. El conductor sólo iniciará la maniobra una vez se lo indique el operario guía, habiendo verificado la ausencia de personas y de obstáculos en su trayectoria.

Está prohibido situarse en el radio de acción de la maquinaria y vehículos en toda la obra.

2.2.1.3. Reparaciones y mantenimiento en obra

En los casos de fallos en la máquina, se subsanarán siempre las deficiencias de la misma antes de reanudar el trabajo.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecerá siempre con el motor parado, el útil de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado y la maquina bloqueada.

No se guardará combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, para evitar riesgos de incendios.

No se levantará en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidráulico se efectuará siempre con el motor frío, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras y guantes impermeables.

En las proximidades de baterías se prohibirá fumar, encender fuego o realizar alguna maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterías deben ser aislantes, para evitar cortocircuitos.

Se evitará siempre colocar encima de la batería herramientas o elementos metálicos, que puedan provocar un cortocircuito.

Siempre que sea posible, se emplearán baterías blindadas, que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos.

Al realizar el repostaje de combustible, se evitará la proximidad de focos de ignición, que podrían producir la inflamación del gasoil.

La verificación del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presión interior antes de abrir totalmente el tapón.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la máquina, el operario deberá antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

Cuando deban soldarse tuberías del sistema hidráulico, siempre será necesario vaciarlas y limpiarlas de aceite.

2.2.1.4. Manipulación de cargas.

Previamente a la realización de los trabajos hay que asegurarse del buen estado y capacidad de carga de todos los equipos y elementos involucrados en la elevación (grúas, eslingas de sirga o cadenas o poliéster, etc.); en particular comprobar que los ganchos poseen pestillo de seguridad. Se prohibirá el uso de toda máquina o equipo auxiliar que esté defectuoso o incorrecto.

Antes de la entrada de los camiones, se deberá balizar con malla la zona de maniobra de los vehículos, de tal forma que no interfieran con sus maniobras en otros servicios.

Antes de la elevación completa de la pieza para su colocación se deberá tensar suavemente las eslingas y elevarla unos centímetros para verificar su amarre y equilibrio. Mientras se tensan las eslingas no se deberán tocar ni las eslingas ni la carga.

Los movimientos de las cargas deberán ser lo más progresivos y suaves posible, evitando los tirones y las maniobras bruscas.

No hay que colocarse en el radio de acción del movimiento de vehículos implicados en el transporte y manipulación de cargas.

Para evitar los atrapamientos en la colocación de material transportado con ayuda mecánica se evitará colocar las manos y brazos en los espacios entre las piezas. Para ello se utilizarán cuerdas o cabos de sujeción.

Los apilamientos de materiales deberán ser esmerados, estables y seguros contra los deslizamientos y derrumbamientos, para lo cual: evitar las alturas que hagan peligrar la estabilidad, hacer apilamientos compactos y a escuadra, apuntalar las piezas si es necesario y corregir los almacenamientos que se inclinen.

Igualmente, la colocación de materiales deberá ser estable y segura contra los deslizamientos y derrumbamientos, para ello fijar, calzar y apoyar las piezas adecuadamente y, si es necesario, apuntalarlas.

Cuando las condiciones meteorológicas no sean aceptables (tormenta eléctrica, viento, niebla…) se paralizarán los trabajos.

3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCION

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones.

El resumen del análisis de necesidades preventivas se desarrolla en las páginas anexas, mediante el estudio de las actividades y tajos del proyecto, la detección e identificación de riesgos y condiciones peligrosas en cada uno de ellos y posterior selección de las medidas preventivas correspondientes en cada caso. Se señala la realización previa de estudios alternativos que, una vez aceptados por el autor del proyecto de construcción, han sido incorporados al mismo, en tanto que soluciones capaces de evitar riesgos laborales. La evaluación, resumida en las siguientes páginas, se refiere obviamente a aquellos riesgos o condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de formalizar este estudio de seguridad y salud. Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse este estudio de seguridad y salud, fueron estimados como evitables y que, en consecuencia, se evitaron y han desaparecido, tanto por haber sido modificado el diseño o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, como por haberse introducido el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el proyecto actual la resuelve.

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas, se construyen las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas correspondientes, tal y como se detalla a continuación.

3.1. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LAS ACTIVIDADES QUE COMPONEN LA OBRA PROYECTADA.

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo largo de la ejecución de la obra proyectada, a continuación se describen las actividades que la componen, así como sus riesgos y medidas preventivas:

3.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1.1.1. Demoliciones – picado

Demolición y/o picado de pavimentos.

Medios para su ejecución: retroexcavadora con martillo picador, pala cargadora, camión bañera, martillo neumático, compresor.

Riesgos:

Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Sobreesfuerzos
Atropellos
Golpes con objetos o herramientas
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Proyección de fragmentos o partículas

Vibraciones
Polvo
Ruido

Medidas preventivas:

Cuando este trabajando la máquina, los operarios de a mano deberán estar fuera del radio de acción, tanto del radio de giro de la máquina como de la zona de caída de las estructuras. Si es necesario habrá operarios encargados de dirigir al maquinista.

El suelo sobre el que opera la máquina debe ser firme, llano y estar alejado de vacíos y/o pendientes. La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán a la máquina. Además no trabajará en pendientes superiores a las indicadas por el fabricante.

El entorno de la máquina deberá ser amplio y estar libre de obstáculos.

El maquinista y los trabajadores de mano que se encuentren en las proximidades utilizarán protecciones auditivas.

Siempre que el trabajador vaya a utilizar el martillo neumático utilizará también guantes de seguridad, gafas de protección y protecciones auditivas.

3.1.1.2. Excavaciones

Trabajos de excavación en vaciados, zanjas, cimentaciones, taluzados...

Medios para su ejecución:

Maquinaria para el movimiento de tierras (Retroexcavadoras, palas cargadoras, excavadora mixta, mini-excavadora, motoniveladora) y para el transporte del material (camiones, dúmperes, etc.)

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Atropellos y golpes por vehículos

Medidas preventivas:

En este apartado se especifican las medidas preventivas de aplicación en todo tipo de excavación. En siguientes apartados se especifican las medidas preventivas a disponer en excavación de vaciados, zanjas, cimentaciones.

Se recuerdan ciertas medidas preventivas que se deberán cumplir en dichos trabajos:

- Todos los equipos se emplearán para los usos y conforme a las condiciones de manejo establecidas en el manual de uso o instrucciones de su fabricante. Además, todos los operadores dispondrán de formación adecuada y específica y autorización del manejo de la maquinaria. Por otra parte, tanto los equipos, como los útiles, como el conjunto deberán cumplir el contenido de la normativa de aplicación (RR.DD. 1215/97 y 1435/92), destacándose la necesidad de que estén certificados.

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al conductor.

- En todas las maniobras marcha atrás o con visibilidad insuficiente, una persona dirigirá al conductor asegurando siempre que no existen obstáculos físicos ni personas en su trayectoria o radio de acción.

- Se cumplirá la prohibición de presencia de personal en el radio de acción de las máquinas durante su trabajo.

- Los trabajadores situados en las proximidades de los tajos de maquinaria utilizarán ropa de alta visibilidad con elementos reflectantes.

- Cuando la profundidad de una excavación sea igual o superior a dos metros se protegerán los bordes mediante barandilla reglamentaria instalada a un metro del borde. Para profundidades menores se delimitará todo el perímetro con malla tipo stopper colocada a metro y medio del borde.

- Se revisará el estado de los taludes en aquellos casos en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, etc., transitados por vehículos, y también por lluvias, en ese caso se efectuará el achique inmediato de las aguas en el interior de las excavaciones.

- Las pistas de acceso a los diferentes tajos, cuando no sean caminos existentes, serán de anchura suficiente, no superando las rampas el 8 % en tramos curvos y el 10 % en tramos rectos. El ancho de las pistas será el suficiente para que circulen dos vehículos (camiones o dumperes) o en su caso se preverán puntos de cruce.

- Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el movimiento de tierras.

- Se prohíbe la circulación de vehículos de obra a una distancia inferior a 3 metros del borde de excavaciones, zanjas…

Excavación de vaciado

Medios para su ejecución: Maquinaria pesada para el movimiento de tierras, del tipo bulldozer, retroexcavadoras, palas cargadoras, traíllas o mototraíllas, etc.; en el transporte del material intervendrán camiones basculantes, dúmperes, etc.

Riesgos:

Sepultamiento o hundimiento.
Caída de personas al mismo, distinto nivel o en altura.
Caída de cargas suspendidas.
Caída de materiales desde los bordes de excavación.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.
Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria.
Vuelcos de máquinas.
Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos y partículas.

Medidas preventivas:

Los trabajos se desarrollarán mediante retroexcavadora, para lo cual se respetarán las condiciones establecidas en anteriores apartados del presente documento. Además puesto que buena parte de las actividades requerirán la presencia de operarios en el interior de las excavaciones se respetarán escrupulosamente las medidas previstas en lo referente a taludes estables (conforme al Proyecto Constructivo), criterios de acceso al interior de la excavación, las distancias máximas de acopio de

tierras y de aproximación de maquinaria al borde de la misma, la señalización o protección de su perímetro, etc. Respecto a lo establecido, se indica que teniendo en cuenta la profundidad de las excavaciones a ejecutar y la necesidad de que se mantengan abiertas durante un periodo de tiempo prolongado, su perímetro se delimitará mediante cierres rígidos constituidos por valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón. Además, el responsable de los trabajos en el tajo o bien el recurso preventivo, deberán comprobar la ausencia en la zona delimitada de otros trabajadores de la obra no intervinientes en la ejecución de los trabajos, o de posibles terceros.

En algunos casos, la excavación de la cimentación de los depósitos y estaciones de bombeo se realiza a partir de una sección tipo que consta de una berma. En estas situaciones, el contratista debe definir la anchura de las plataformas intermedias y su altura desde la base de la excavación. Además, se indica que si con motivo de la ejecución se hiciera precisa la presencia de operarios sobre las plataformas intermedias de estas bermas, su perímetro se deberá proteger mediante barandillas sólidas y estables que eviten cualquier posibilidad de caída en altura.

Las mismas condiciones se plantearán para evitar caídas en altura de operarios desde la coronación de las excavaciones. Por último, se indica que durante el montaje de las protecciones citadas no se permitirá la presencia de trabajadores sujetos a riesgo de caída en altura, planteándose en su caso la obligación de que los operarios hagan uso de arnés de seguridad anclado a puntos estables previamente consolidados.

Teniendo en cuenta la profundidad de excavación, que como se ha dicho puede llegar a situarse entorno a los 9 m. el acceso al interior de las excavaciones se acondicionará mediante rampas (para estas alturas no resulta admisible el empleo de escaleras de mano), que dispondrán de una pendiente que las haga fácilmente transitables para los equipos y operarios. Estas rampas, y las restantes zonas de trabajo, se mantendrán en adecuado estado de orden y limpieza. Además, bien el responsable de los trabajos o el recurso preventivo gestionarán la circulación a través de las citadas rampas, de forma que éstas no sean empleadas simultáneamente por operarios y maquinaria. De igual forma, se prohibirá la presencia de trabajadores en el radio de acción de la maquinaria, que en todo momento circulará con los avisadores acústicos accionados en previsión de posibles atropellos.

Si por motivos de lluvia, nieve, etc., aparecen humedades o encharcamientos en las excavaciones, será imprescindible una revisión minuciosa de sus paredes, tomando las medidas oportunas de achique,... antes de comenzar o continuar los trabajos. Al igual que en las restantes excavaciones ejecutadas en la obra, el encargado de los trabajos o el recurso preventivo prohibirán la presencia de trabajadores en el interior de aquellas que denoten síntomas de inestabilidad, bien producidos por la presencia de agua o por otros factores. Todos los taludes, y especialmente aquellos en los que aparezca roca, serán saneados previamente al acceso de los operarios al interior de la excavación con el objeto de evitar la caída sobre los mismos de piedras, o materiales sueltos. Como en los restantes trabajos de excavación, se prohibirá la ejecución de trabajos simultáneos en el interior y el exterior de las excavaciones.

Para finalizar el apartado relacionado con la ejecución de la excavación, debe destacarse la prohibición de que se usen los encofrados como medio para ascender o descender hacia el interior de la misma.

Excavación de zanjas y pozos de registro

Incluye las diferentes excavaciones a realizar en ejecución de zanjas, cimentaciones, pequeños desmontes, emplazamiento de pequeñas obras de fábrica o la construcción de arquetas y pozos.

Medios para su ejecución: Maquinaria pesada para el movimiento de tierras, del tipo bulldozer, retroexcavadoras, palas cargadoras, traíllas o mototraíllas, etc.; en el transporte del material intervendrán camiones basculantes, dúmperes, etc. Además, en los rellenos participarán motoniveladoras, compactadores y cubas de agua.

Riesgos:

Sepultamientos o hundimientos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Interferencias con conducciones enterradas existentes en el subsuelo.
Caídas de personas o de cosas a distinto nivel, desde el borde de la excavación.
Vuelcos de las máquinas por la realización de trabajos en zonas con pendiente.
Desprendimiento del terreno, al realizar movimientos de tierra a media ladera.
Golpes o choques con objetos o entre máquinas. Atropellos.
Ruido.
Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.

Medidas preventivas:

Durante la realización de estos trabajos, los caminos de circulación de maquinaria deberán ser conocidos por todos los trabajadores que intervengan en los mismos. De igual forma las posibles interferencias que se produzcan con carreteras serán resueltas según marca la Norma de Señalización 8.3-IC, y en caso necesario se recurrirá al auxilio de señalistas de control de tráfico en los cruces con carreteras abiertas al tráfico rodado.

Deberán detallarse las zonas de tránsito de los equipos, sus condiciones de utilización y de mantenimiento (pendientes máximas en función de los equipos empleados, acondicionamiento en periodos de lluvia, balizamiento o incluso protección de las zonas con riesgo de caída o vuelco,...), las posibles interferencias derivadas de la existencia de líneas eléctricas, condiciones de circulación (velocidad máxima permitida, preferencia de la maquinaria pesada frente a los restantes equipos y vehículos de la obra, etc.)... De igual modo, deberá priorizarse la posibilidad de que el transporte del material se realice a través de caminos internos de la obra, de tal manera que se minimicen las citadas interferencias con terceros.

Con el fin de evitar interferencias con terceros, y teniendo en cuenta que durante la ejecución de los trabajos debe mantenerse el acceso a fincas o propiedades, resulta preciso priorizar el hecho de que se proceda al tapado de todos los tramos de zanja que hayan podido abrirse en una misma jornada de trabajo. En caso contrario, se dispondrán la señalización y balizamiento oportunos, así como los accesorios de iluminación que garanticen unas óptimas condiciones de visibilidad. Idénticas condiciones deberán plantearse en todos aquellos tajos en que se debieran realizar trabajos en horario nocturno.

En el caso de pozos u otras excavaciones localizadas, se procederá a su tapado mediante planchas metálicas resistentes y firmemente ancladas. Finalmente, en el caso de tramos de excavación abiertos en zonas próximas a núcleos poblados, resultará necesario que todos los tramos de zanja abiertos permanezcan delimitados mediante una protección rígida, bien a base de barandilla reglamentaria, valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón, etc.

Los productos de excavación y acopios no ocuparán las zonas de circulación de personas y vehículos.

Todos los caminos de circulación deberán señalizarse, de forma que los terceros conozcan que en la zona se vienen realizando trabajos de excavación y que por lo tanto existirá circulación de maquinaria y otros factores de riesgo: Se deberá señalizar la existencia de zanjas que pudieran estar abiertas, el límite máximo de velocidad establecido para los equipos, etc.

Los caminos de circulación interna en la obra se mantendrán cubriendo baches, eliminando blandones, compactando, y usando para resanar material adecuado al tipo de deficiencia del firme. Se evitarán los barrizales para accidentes.

Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos, debiéndose proceder a un regado periódico de la zona objeto de los trabajos.

Bajo ningún concepto los trabajos de excavación en zanja implicarán el menor grado de incertidumbre en relación a la estabilidad de estructuras próximas, tal es el caso de los canales, postes de electricidad o telefonía, conducciones de agua aéreas (como acequias, etc.) o enterradas (saneamientos...), edificaciones, etc.

Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces interfieran o hayan quedado al descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral.

Las excavaciones se ejecutarán mediante taludes estables para el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones establecidas en el Proyecto, pero siempre anteponiendo la premisa de que dichos taludes aseguren su condición de estabilidad para garantizar la seguridad de los trabajadores en el interior de las mismas. En el supuesto de excavaciones no previstas en el citado documento, o que modificaran las previsiones recogidas en el mismo, se justificará mediante cálculos la estabilidad de los taludes finalmente adoptados. En caso de no poder asegurar la estabilidad por este medio, se aplicarán otros procedimientos, como por ejemplo estabilización mediante bulonado, gunitado y malla, e incluso entibación, etc. Cualquier solución que se adopte deberá ser calculada para garantizar la estabilidad del talud adoptado, y analizada desde el punto de vista preventivo en la planificación preventiva de la obra.

Todas las actividades que se realicen en el interior de las excavaciones deberán realizarse en presencia de un recurso preventivo de la empresa contratista, ya que los citados trabajos implican un riesgo de especial gravedad.

El recurso preventivo solo autorizará el acceso de los trabajadores al interior de las zanjas cuando se compruebe que éstas reúnen las condiciones de estabilidad necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Todas las zanjas abiertas serán inspeccionadas por personal competente (bien el encargado de los trabajos, el recurso preventivo...) al comienzo y finalización de los trabajos.

Se prohibirá la presencia de operarios en el interior de la zanja en la zona de excavación, con el fin de evitar la presencia de operarios en el radio de acción de los equipos de excavación -de su cazo-.

En caso de presencia de agua se procederá a su achique inmediato mediante bombas, y posteriormente, éstas se revisarán minuciosa y detalladamente antes de reanudar los trabajos. Las bombas deben disponer de rejillas o de protecciones que eviten un atrapamiento o corte en su manipulación, y el grupo electrógeno que las alimente permanecerá fuera de la zanja, en una zona aislada del agua, y con la correspondiente pica de toma de tierra hincada en el terreno hasta la profundidad recomendada por su fabricante.

Frente a la existencia de agua en las zanjas, se vigilará si pueden aparecer cavernas u otras zonas que denoten una posible inestabilidad; en caso de que se produzcan, se prohibirá la presencia de personal en las zanjas hasta que no se hayan saneado, se asegure la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el encargado o recurso preventivo presente en el tajo.

La distancia mínima de los acopios de material respecto del borde de las excavaciones (especialmente de zanjas) y la de aproximación de los equipos y maquinaria a las mismas, será de 2,00 m aproximadamente o la profundidad de la propia excavación.

En lo relativo a la señalización y balizamiento de los bordes de excavación, como norma general todas las excavaciones deberán señalizarse con malla naranja de tipo stopper retranqueada respecto de su borde. No obstante, en las zonas con riesgo de caída en altura (más de 2 metros) se instalarán protecciones rígidas, a base de barandilla rígida y sólida (de 1 metro de altura) retranqueada una distancia que no afecte a la estabilidad de los taludes, valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón,... Además, estas protecciones resultarán obligatorias en todas las zanjas o excavaciones abiertas en que puedan producirse interferencias con otras actividades o con posibles terceros en proximidad de poblado, zonas de paso, proximidad de trabajos ajenos (ganaderías, fábricas, canteras, etc.), con total independencia de su profundidad. En los casos de pequeñas zanjas

o pozos, esta protección se podrá sustituir mediante la instalación de chapas metálicas resistentes y ancladas en el terreno mediante las cuales se tapen los huecos existentes y se evite el riesgo de caída en altura o a distinto nivel.

Frente al riesgo de atropello, se prohíbe la presencia de personal en el radio de acción de las máquinas. Además es obligatorio que toda la maquinaria disponga de bocina automática de marcha atrás. En el caso de maquinaria de movimiento de tierras de bastidor giratorio, el uso de la bocina de retroceso se ajustará a lo previsto en el manual de instrucciones de su fabricante. En el supuesto de que éste no lo exigiera, el empleo del avisador acústico será sustituido por otras medidas preventivas que eviten posibles atropellos, tales como el uso de la bocina acústica para advertir una maniobra, la obligación de que todas las maniobras que realicen estos equipos se realicen en todo momento en sentido de “marcha a la vista”, la presencia de señalistas que auxilien posibles maniobras en retroceso, etc. Además, todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad en previsión de posibles atropellos.

De forma general para cualquier excavación, pero muy especialmente en lo relacionado con la excavación en zanja, previamente al inicio de los trabajos deberán identificarse los posibles servicios que pudieran afectar a la ejecución de las actividades: Líneas eléctricas, conducciones enterradas de gas o eléctricas, explotaciones ganaderas o agrícolas, proximidad de zonas habitadas, etc.

Además, no solamente se deberán identificar los citados servicios de forma previa al inicio de las actividades, sino que los trabajos de excavación no se deberán iniciar hasta que no se planifiquen desde el punto de vista preventivo los procedimientos de trabajo, las medidas preventivas y las protecciones necesarias con el fin de evitar los riesgos derivados de la interferencia con el servicio en cuestión, o de su reposición.

Todos los trabajos de excavación que se encuentren en proximidad de líneas eléctricas, deberán ser analizados desde el punto de vista preventivo a partir de un estudio de gálibos mediante el que se determinen las alturas de las líneas eléctricas y de los equipos, ambos en su posición más desfavorable, los mecanismos de vigilancia que se dispondrán en cada uno de los tajos (recursos preventivos conforme al contenido del R.D. 604/2006), y las medidas preventivas que se adoptarán para evitar la invasión de la distancia de seguridad Dprox-2 que determina el R.D. 614/2001 en función de la tensión de la línea eléctrica en cuestión. Además de lo comentado, todos los cruces con líneas eléctricas se señalizarán mediante pórticos limitadores de gálibo instalados a una distancia tal a cada lado de la línea eléctrica que su presencia y montaje no generen ningún tipo de riesgo eléctrico, además de la señalización y los carteles mediante los que se advierta a los operarios del riesgo de contacto eléctrico.

Los riesgos que podrían generarse por concurrencia o interferencia entre los trabajos de excavación en zanja y las restantes actividades de la obra, especialmente las relacionadas con las comprobaciones de topografía y replanteos previos, el montaje de tubería, deben ser controlados por los mandos organizativos de la obra (encargado, jefes de producción, jefe de obra,...) y por el recurso preventivo, y la principal solución es evitar que dichos tajos concurran en el tiempo en un mismo espacio o punto de trabajo.

Por lo tanto, queda prohibido la ejecución de trabajos de manera simultánea y en niveles superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones.

Bajo ningún concepto podrán concurrir en la zona de trabajo las operaciones de replanteo u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores, con las de apertura de zanjas. Si por cualquier motivo se debieran solapar, se detendrá la maquinaria de excavación, que no reanudará su actividad hasta que se realicen las citadas labores.

Los trabajos de excavación deberán adelantarse al montaje de tubería, de tal forma que dichas actividades nunca puedan concurrir en un mismo tajo.

La anchura del fondo de las excavaciones será la suficiente para que se permita la introducción de la tubería, si procede, y la presencia de personas en el interior de la excavación, permitiéndose la movilidad de las mismas.

Se prohíbe permanecer en el interior de zanjas en la zona de influencia de la máquina que este realizando labores de excavación.

El acceso al interior de las excavaciones, cuando no exista rampa de acceso para los trabajadores, se realizará con escaleras de mano distribuidas en número suficiente en función de la longitud del tramo abierto; al menos, una escalera por cada 50 m. de zanja abierta. No se retirarán en ningún momento las escaleras mientras permanezcan personas en el interior de las excavaciones.

En todas las excavaciones y por lo tanto también en las zanjas, siempre que existan operarios trabajando en su interior, se mantendrá al menos uno de retén en el exterior que dará la alarma en caso de producirse una emergencia.

Además, se habilitará una vía de salida de la zanja para utilizar en caso de emergencia.

3.1.2. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

3.1.2.1. Ferrallado, encofrado, hormigonado y desencofrado

Los trabajos consisten en el ferrallado, encofrado, hormigonado y desencofrado de obras de hormigón armado (arquetas, depósitos, bombeos,...)

Medios para su ejecución: Durante el ferrallado y encofrado serán necesarios: Camión pluma, grúa autopropulsada, andamios y escaleras de mano. Durante los trabajos de hormigonado se usarán: camión hormigonera, bomba de hormigonado, vibrador, andamios.

Riesgos:

Sepultamiento o hundimiento.
Caída de personas al mismo, distinto nivel o en altura.
Caída de cargas suspendidas.
Caída de materiales desde los bordes de excavación.
Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.
Los derivados del montaje, utilización y desmontaje de medios auxiliares.
Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria.
Vuelcos de máquinas.
Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido.
Los derivados del contacto con el hormigón.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de la manipulación de productos químicos.
Proyección de fragmentos y partículas.

Medidas preventivas:

<u>Vertido del hormigón de limpieza</u>

Una vez concluida la excavación se procederá al vertido del hormigón de limpieza que constituirá la base de la solera. Independientemente de la técnica empleada (vertido mediante cubo o cangilón, mediante bomba, canaleta, etc.), durante la ejecución de las actividades se deberá dar un estricto cumplimiento a la prohibición de presencia de los trabajadores en el radio de acción de la maquinaria

y de las cargas suspendidas (tal es el caso del vertido mediante cubo o cangilón), la distancia máxima de aproximación de la maquinaria de hormigonado respecto de los bordes de talud, y la necesidad de que los camiones hormigonera cuenten con topes en todas aquellas maniobras de vertido en retroceso que impliquen un posible riesgo de vuelco. Además, en el caso de que los operadores de los camiones no dispongan de la visibilidad suficiente, las maniobras de aproximación serán dirigidas por un señalista.
Tanto en estos trabajos como en las restantes labores relacionadas con la ejecución de arquetas, depósitos y estaciones de bombeo se esmerarán las condiciones de orden y limpieza presentes en los tajos, de tal forma que se eviten accidentes derivados de posibles caídas al mismo nivel, resbalones, pisadas sobre objetos, etc. Para ello, no se caminará directamente sobre las parrillas de ferralla, sino que sobre éstas se dispondrán pasillos formados por tablones estables desde los que desarrollen su labor los trabajadores.
Finalmente, una vez vertido el hormigón de limpieza se ejecutarán las cimentaciones. Dichos trabajos implicarán labores de encofrado y desencofrado, ferrallado y hormigonado.

Ferrallado de los alzados

De forma general, el ferrallado de los muros se suele realizar a partir de parrillas de mallazo electrosoldado, que se deslingarán desde una escalera de mano o andamio, conforme a las condiciones que se especificarán más adelante.
En relación a los trabajos de ferrallado, se destaca la necesidad de que las esperas se protejan mediante setas o capuchones plásticos (con el fin de evitar heridas, etc.) y la obligación de cumplir las medidas preventivas que se han establecido en el presente documento (en el apartado sobre montaje de tubería) con el objeto de garantizar la total estabilidad de las cargas durante el proceso de izado.

De igual manera, las parrillas se eslingarán a dos puntos, guiadas siempre mediante cabos de gobierno, con ángulos en la argolla de cuelgue siempre inferiores a 90º, y con garantía de firmeza en el cuelgue para evitar la caída de la parrilla -a tal efecto, las barras desde las que se realice el eslingado dispondrán del oportuno refuerzo, prohibiéndose que éste se realice a alambre de atado-.
Los trabajos de ferrallado implicarán un posible riesgo de caída de cargas suspendidas. Por lo tanto, se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas, y se prohibirá rebasar la capacidad máxima de carga del equipo de elevación y sus accesorios, que serán revisados (las eslingas, cadenas, ganchos dotados de pestillo de seguridad, etc.) para garantizar sus óptimas condiciones de conservación y mantenimiento. Finalmente, las parrillas de ferralla se izarán desde los puntos y mediante los accesorios de izado que garanticen su total estabilidad durante la ejecución de los trabajos.

Durante la ejecución de las actividades se prohibirá que se deslinguen las parrillas hasta que éstas no se aten y aseguren debidamente, de tal manera que no generen un riesgo de caída sobre los operarios. En este sentido, se precisa que si el deslingado de las parrillas se realizara desde escalera de mano se cumplirá para ello lo previsto en la legislación vigente en cuanto al uso de los citados medios auxiliares: Para alturas sobre la escalera superiores a 3,50 m., resultará obligado que los trabajadores dispongan de arnés de seguridad, que anclarán a un punto estable y resistente de la estructura previamente consolidado -ajeno a la propia escalera-. Además, al menos uno de los extremos de las escaleras deberá anclarse de forma debida, y disponer de zapatas antideslizantes de tal modo que se garantice su total estabilidad. De igual forma, las escaleras de mano que se empleen durante la ejecución de todas las obras de fábrica sobresaldrán del punto de desembarco en al menos 1,00 m., prohibiéndose el empleo en obra de escaleras sobre las que no se tenga garantía de resistencia, especialmente si son de más de 5,00 m.

Por otra parte, debe contemplarse la posibilidad de que el deslingado de las parrillas de ferralla se realice mediante un módulo de andamio. Por lo tanto, deberemos tener en cuenta que durante el montaje, utilización y desmontaje de este andamio se cumplirán las normas previstas en las instrucciones de montaje que proporcione su suministrador o fabricante, así como en la legislación vigente (R.D. 2177/2004). En este sentido, se destacan muy especialmente las cuestiones siguientes:

- Las plataformas de trabajo de los andamios deberán estar protegidas frente al riesgo de caída en altura por medio de una barandilla perimetral reglamentaria formada por un listón

superior, intermedio y rodapié de 15 cm. Esta barandilla deberá proteger todos los huecos y zonas a través de los cuales se pudiera materializar el riesgo de caída en altura. La altura del listón superior será de al menos 100 cm.

- No se ejecutarán actividades en plataformas de trabajo cuyo montaje no se haya rematado, y que no dispongan de las protecciones establecidas.

- Se prohibirá encaramarse o trepar a través de los elementos de los andamios. Con el objeto de facilitar el acceso a las plataformas de trabajo, éstos deberán disponer de escaleras interiores integradas en cada altura.

- Los andamios deberán apoyarse y arriostrarse de acuerdo con las condiciones especificadas por su suministrador o fabricante, de tal forma que se garantice su total estabilidad.

- Durante el montaje de los distintos elementos de los andamios se prohibirá que los trabajadores se encuentren expuestos a riesgo de caída en altura. Para ello, se priorizará la posibilidad de que durante el montaje y el desmontaje se usen las barandillas provisionales de que disponen sus fabricantes.

- En función de la configuración del andamio, resultará necesario elaborar un Plan de montaje, empleo y desmontaje, pudiendo ser sustituido por las instrucciones de su suministrador o fabricante (en los supuestos que establece la legislación). Además, deberán llevarse a cabo las funciones de supervisión e inspección de los trabajos de montaje y desmontaje de los andamios conforme a lo establecido en el R.D. 2177/2004.

- No se usarán los andamios hasta que no se hayan certificado conforme a los criterios de inspección establecidos anteriormente.

- Los trabajadores que intervengan en las labores de montaje y desmontaje de los andamios dispondrán de formación específica en la materia.

- Durante el montaje, desmontaje y utilización de los andamios se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas que debieran elevarse. Además, se prohibirá la realización de trabajos al pie de andamios, con el fin de evitar las interferencias que pudieran darse entre éstos y los que se realizaran sobre las plataformas de trabajo de los andamios.

- Se prohibirá el izado de parrillas de ferralla sobre los andamios cuando éstos estén ocupados por trabajadores.

Por fin, para concluir el apartado reservado a los trabajos de ferrallado, se indica que se prohibirá que los operarios se encaramen sobre las parrillas de ferralla (usándolas como lugar de trabajo o como medio de acceso), independientemente de la altura a la que se encuentren.

Encofrado de alzados:

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída. Así para todas las zonas con riesgo de caída a distinto nivel (aletas e impostas en obras de fábrica, zunchos, …), el plan de seguridad y salud deberá precisar la ubicación de los puntos de anclaje (puntos fijos) que puedan utilizarse o prever la instalación de líneas de vida donde poder amarrar los operarios el arnés (con la cuerda del arnés de medida adecuada para que el trabajador no sufra en el caso de desequilibrio o caída, un desnivel de más de 50 cm. respecto del lugar de trabajo).

El ascenso y descenso de personas a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias, nunca trepando por el propio encofrado.

Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos.

Encofrado con paneles modulares:

La ejecución de alzados en los depósitos y estaciones de bombeo implicará el montaje de las oportunas chapas de encofrado. Durante los trabajos de encofrado y desencofrado se cumplirán las medidas que se han venido estableciendo en materia de izado de cargas, además de las indicadas antes para el montaje de parrillas de ferralla (sobre el riesgo de caída de cargas suspendidas, su estabilidad, y el riesgo de caída en altura). Además, se deberán cumplir las normas que a continuación se enumeran:

- Se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de cargas suspendidas, que serán izadas desde los puntos y mediante los accesorios de izado habilitados por el fabricante del encofrado para garantizar su estabilidad total durante el proceso. Además, las chapas de encofrado no se dirigirán de forma manual, empleándose para ello siempre cabos de gobierno.

- Los trabajos de encofrado y desencofrado se realizarán en todo momento de acuerdo a las instrucciones que proporcione su suministrador o fabricante, y por trabajadores que dispongan de formación específica en esta materia.

- Se prohibirá el deslingado de los encofrados hasta que éstos no se estabilicen de manera adecuada y dejen de ser fuente de riesgo por caída, atrapamiento, etc. Además, se prohibirá su deslingado hasta que no se apuntalen o anclen debidamente (en el caso de la primera cara en encofrarse) y se arriostren en sus distintos planos (se trataría del caso de la cara opuesta, que se arriostrará a la anterior mediante barras dywidag, mariposas, etc.). Durante el desencofrado se seguirá el mismo planteamiento, con la salvedad de que en este supuesto el eslingado se realizará siempre antes de la retirada de los medios de anclaje, de arriostramiento, apuntalamiento, etc.

- Todos los anclajes al terreno, los arriostramientos y las uniones entre chapas,..., se instalarán conforme a lo que establezca el suministrador o fabricante de los encofrados, siempre mediante los accesorios y elementos que éste especifique.

- En todo caso se garantizará la resistencia de la superficie sobre la que apoyen y apuntalen los encofrados, y por ende, la estabilidad de todas las chapas que se debieran instalar (tanto de forma individual, como en conjunto). Lo establecido resultará de aplicación, independientemente de cuál sea el orden conforme al cual se monten las chapas de encofrado (primero la cara exterior, la interior, o bien alternativamente).

- En relación al riesgo de caída en altura durante el deslingado y eslingado, se cumplirá lo indicado anteriormente para las escaleras de mano. Además, se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre los encofrados, bien como lugar de trabajo o como medio de acceso, con independencia de la altura a la que se encuentren.

- En el supuesto de que el deslingado y eslingado de las chapas de encofrado se realizara desde andamio (siempre conforme a lo indicado para los trabajos de ferrallado), se prohibirá que aquéllas se suspendan sobre los andamios, y muy especialmente cuando se encuentren operarios sobre los mismos. Por lo tanto, durante el encofrado las chapas serán guiadas mediante cabos de gobierno y los trabajadores accederán al andamio sólo cuando éstas dejen de ser fuente de riesgo por golpes, desplome, caídas, etc. De igual manera, en el desencofrado se realizará la maniobra inversa: Desde el andamio se retirarán los anclajes, las uniones entre chapas,..., y sólo cuando los trabajadores abandonen el andamio y se encuentren en una zona segura se elevarán las mismas. En ambos casos, los andamios estarán debidamente arriostrados con el objeto de garantizar su estabilidad.

- La secuencia de trabajos durante el desencofrado tendrá en consideración las prescripciones establecidas por el suministrador o fabricante, de modo que si no se autoriza expresamente por éste, se prohibirá la retirada simultánea de varias chapas en un mismo paño, pues los elementos de unión como cuñas, cangrejos, etc., podrían no estar concebidos para soportar los esfuerzos que se deriven de tales maniobras.

- No se iniciarán los trabajos de hormigonado hasta que no se haya comprobado el montaje del encofrado, sus uniones y anclajes, su correcto apuntalamiento, etc.

Encofrado de alzados: encofrado con madera

Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán. Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en un lugar establecido para su posterior retirada.

Cuando los tableros estén izados en el aire, no se circulará ni se permanecerá debajo de los mismos.

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado.

Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán para su utilización o eliminación.

Hormigonado de los alzados

El hormigonado y el vibrado de los muros se deben realizar sobre ménsulas o consolas de hormigonado instaladas en las caras exteriores o interiores de los encofrados. El montaje de estas consolas debe realizarse de forma que se minimice la exposición de los trabajadores a un riesgo de caída, motivo por el cual los soportes se instalarán junto con las propias chapas de encofrado, completándose el montaje de las plataformas de trabajo y las barandillas reglamentarias desde andamio, escalera de mano. Además, no se deberá permitir el acceso de trabajadores hacia las plataformas de hormigonado en tanto en cuanto éstas no se hayan arriostrado y estabilizado debidamente, no existan huecos en o entre las mismas, dispongan de 60 cm. de anchura mínima, y cuenten con una barandilla reglamentaria (listón superior a 100 cm., intermedio y rodapié) dotada de cierres en las esquinas con el objeto de evitar caídas a través de todos los huecos. El acceso a estas ménsulas o consolas de hormigonado se realizará mediante escalera de mano o torre de acceso desde el exterior de la arqueta.

Por otra parte, deberá tenerse en cuenta que durante la realización de trabajos sobre las consolas (hormigonado y vibrado de los muros…), y aunque se hayan dispuesto las consolas de hormigonado con su oportuna barandilla reglamentaria, podría persistir el riesgo de caída en altura hacia el lado opuesto al que se hayan montado las consolas. Para evitar este riesgo se plantean dos alternativas:

Por un lado, que todos los trabajadores que intervengan en el hormigonado y vibrado anclen su arnés de seguridad a puntos estables y resistentes que se hayan consolidado previamente sobre la ménsula de hormigonado.

En cualquier caso, y con el fin de anteponer la protección colectiva frente a la individual, se priorizará la posibilidad de recrecer el encofrado hasta una altura mínima de 100 cm. respecto de la cota de trabajo de los operarios, de manera que éstos cuenten con una protección adecuada frente a dicho riesgo de caída en altura.

Además, se prohibirá que durante el hormigonado y el vibrado los operarios accedan al interior de los muros.

Vertido de hormigón mediante canaleta.

Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado+armadura).
Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros (como norma general) del borde de un corte.

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

En las zonas próximas a desniveles y con riesgo de caída a distinto nivel se seguirán las instrucciones recogidas en los apartados anteriores.

La maniobra de vertido será dirigida por un operario que vigilará que no se realicen maniobras inseguras.

Se dispondrá de un recipiente próximo al tajo con agua limpia para utilizar en caso de salpicaduras.

Vertido de hormigón con cubilotes.

Antes de proceder al hormigonado, se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado+armadura).
La capacidad del cubilote estará de acuerdo con la carga máxima admisible del camión grúa.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca que tiene, con las manos protegidas con guantes impermeables.

Del cubo penderán cabos guía para facilitar su posicionamiento para su vertido. Se prohíbe guiarlo directamente.

Se dispondrá de un recipiente próximo al tajo con agua limpia para utilizar en caso de salpicaduras.

En las zonas próximas a desniveles y con riesgo de caída a distinto nivel se seguirán las instrucciones recogidas en los apartados anteriores.

Se suspenderán los trabajos cuando haga viento superior a 50 km/h y/o condiciones meteorológicas adversas.

Será obligatoria la utilización de los equipos de protección individual: casco, guantes de seguridad, calzado de seguridad, gafas y arnés de seguridad donde existe riesgo de caída a distinto nivel.

3.1.2.2. Montaje de prefabricados

Montaje de elementos prefabricados que constituyen el conjunto o parte de los depósitos o estaciones de bombeo. En el plan de ejecución de las obras se indicará la persona o personas responsables de las operaciones de montaje de las estructuras prefabricadas, se describirán y analizarán los procesos a realizar, sus posibles interrelaciones o interferencias con otros trabajos, así como las características de los equipos, materiales y personal necesarios.

Medios para su ejecución: Grúa autopropulsada, camión pluma, plataforma elevadora, escalera, andamios.

Riesgos:

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Sobreesfuerzos
Atropellos
Golpes con objetos o herramientas
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel

Medidas preventivas:

Serán de aplicación los criterios básicos, relacionados con el montaje de las piezas y su izado mediante grúa móvil autopropulsada, así como con el riesgo de caída en altura que se podría producir durante su recepción y deslingado. De esta forma, se deberán cumplir las siguientes cuestiones:

- El izado de los prefabricados se realizará desde los puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante. De igual forma, los útiles o accesorios de izado que se empleen serán también los específicos para cada tipo de pieza, y estarán debidamente certificados; además, el sistema de cada útil dispondrá de accesorios que eviten la caída fortuita de las cargas suspendidas, tal es el caso de los pestillos de seguridad en los ganchos, etc. Los puntos de eslingado de todos los prefabricados y los útiles y accesorios que se empleen dispondrán de garantía de resistencia y estabilidad.

- Se deberá garantizar la total estabilidad de los prefabricados suspendidos, así como la de los equipos de izado que se empleen.

- Se garantizará la total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello, las cargas se eslingarán desde puntos y mediante útiles que garanticen su equilibrio estable durante el izado. Se prohibirá el empleo de grúas autopropulsadas bajo regímenes de viento superiores a los especificados en el manual del fabricante de los equipos. Para garantizarlo, todas las grúas autopropulsadas deberán disponer de un anemómetro en perfectas condiciones de funcionamiento.

- No solamente se garantizará la estabilidad de las cargas, sino también la de las grúas. Para ello se analizarán las condiciones que deberá reunir el terreno sobre el que operen frente a los esfuerzos que transmita el equipo. Se debe prohibir que las grúas autopropulsadas operen en las zonas próximas a bordes de talud, excavaciones (las asociadas a cimentaciones, etc.) u otras zonas susceptibles de hundimientos.

- Se prohibirá el deslingado de prefabricados hasta que no se haya asegurado su total estabilidad y se hayan completado las uniones correspondientes (bien a base de tornillería en el caso de prefabricados de hormigón, mediante trabajos de soldadura a placas de anclaje en estructuras metálicas, etc.).

- Se dispondrá de un cálculo justificativo de resistencia y estabilidad firmado por un técnico competente, mediante el cual se garantizarán las citadas condiciones para todos los prefabricados objeto de montaje. Este cálculo justificativo se hará extensivo tanto a los prefabricados como a sus puntos de izado (orejetas, etc.) y abarcará las condiciones de servicio de las estructuras, y por extensión, las de la fase de montaje de cada prefabricado.

- En ningún caso se rebasará la máxima capacidad de carga, ni de la grúa, ni de los accesorios de izado que se emplearan en cada momento (de eslingas, cadenas, ganchos dotados de pestillo de seguridad, grilletes, etc.). Para ello, entre otras cuestiones, la grúa deberá disponer del avisador de carga admisible en perfectas condiciones de funcionamiento.

- El uso de las grúas autopropulsadas se desarrollará en todo momento conforme a las instrucciones de su fabricante, el contenido del presente documento, y el de la normativa de aplicación (R.D. 837/2003). Así, el operador de la grúa dispondrá del correspondiente carné de operador de grúa móvil autopropulsada, en función de la capacidad del equipo. Además, todas las maniobras deberán ser dirigidas y supervisadas por un jefe de maniobras, que igual que los trabajadores encargados de las labores de estrobaje y señalización, dispondrán de formación adecuada y suficiente para el desempeño de dichas tareas.

- Previamente al izado de las piezas el responsable del estrobaje comprobará que se cumplen todos los puntos anteriores, y que por lo tanto se pueden comenzar las maniobras de izado del prefabricado.

- El operario de la grúa que aproxime y presente el elemento tendrá que ver en todo momento a los operarios que coloquen el mismo; en caso contrario, se auxiliará de un señalista.

- Se prohibirá la presencia de los trabajadores en la zona de influencia de los prefabricados suspendidos, que sólo se dirigirán mediante cabos de gobierno. De esta manera, los trabajadores sobre las cestas de las plataformas elevadoras sólo se aproximarán a las cargas

cuando éstas se posicionen en su punto de montaje y dejen de ser fuente de riesgo por desplome, golpes, atrapamientos, etc.

- Todos los trabajos que se deban desarrollar en altura con motivo del montaje de las piezas prefabricadas se deben realizar desde el interior del recinto protegido por la barandilla de las plataformas elevadoras de personal. De esta manera, se prohibirá terminantemente que durante las labores los operarios se encaramen sobre la barandilla o que incluso salgan fuera de la cesta.

3.1.3. REDES DE ABASTECIMIENTO

3.1.3.1. Instalación de tubos, piezas especiales y válvulas

Estos trabajos comprenden la colocación de tubos de diferentes diámetros y materiales en el interior de la zanja ya abierta, así como la instalación de piezas especiales y válvulas.

Medios para su ejecución: Camión pluma o grúa autocargante, retroexcavadora, camión de transporte.

Riesgos:

Sepultamiento o hundimiento.
Caída de personas al mismo, distinto nivel o en altura.
Caída de cargas suspendidas.
Caída de materiales desde los bordes de excavación.
Atrapamientos y golpes con cargas suspendidas.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Los derivados de interferencias con conducciones eléctricas, gas, etc.
Atropellos, colisiones, atrapamientos, y golpes con la maquinaria. Choques entre máquinas y vehículos.
Vuelcos de máquinas en proximidad de bordes de excavación.
Los derivados del ambiente pulvígeno, vibraciones, y ruido.
Los derivados del contacto con el hormigón.
Sobreesfuerzos.
Los derivados de la manipulación de productos químicos.
Proyección de fragmentos y partículas.

Medidas preventivas generales para tuberías de hormigón, fundición, PVC y PE:

Puesto que los trabajos de montaje de tubería y sus correspondientes accesorios de forma general suelen implicar la presencia de operarios en el interior de excavaciones, resultarán de aplicación todos los criterios establecidos en el apartado anterior (sobre la estabilidad de las mismas, el riesgo de atropello, medidas de emergencia y evacuación, caídas a distinto nivel o en altura, coordinación y organización de las actividades, etc.), motivo por el cual omitimos referirnos nuevamente a las citadas cuestiones.

Para empezar, la empresa contratista deberá identificar los equipos que se emplearán para el montaje de tubería y sus accesorios. El análisis citado deberá considerar todos los factores condicionantes, derivados tanto del entorno en que se realizarán los trabajos, del tipo de material que debiera instalarse, del peso de las tuberías en función de su longitud -6,00 ó 12,00 m.-, etc.
El uso de los citados equipos se deberá corresponder con lo establecido en las normas y las instrucciones de manejo que para cada uno facilite su respectivo fabricante. Conforme a lo indicado, estos equipos siempre se emplearán para los usos y conforme a las condiciones previstas por su fabricante.

De esta forma, no se permitirá el empleo de retroexcavadoras para el izado de las cargas en la medida en que esta circunstancia no se avale en las normas de manejo de su fabricante.
Los equipos empleados para el montaje de tubería cumplirán el contenido de la normativa de aplicación (RR.DD. 1215/1997 y 1644/08) y estarán debidamente certificados. Esta norma se aplicará tanto a los equipos y los útiles de izado que se empleen, como al conjunto formado por los mismos.
Cumplidas las condiciones anteriores, la empresa contratista determinará los mecanismos y sistemas de protección que se emplearán con el fin de garantizar la seguridad de las maniobras, tanto en lo relacionado con la total estabilidad de las cargas suspendidas (máquinas dotadas con válvulas anti-rotura de las mangueras del hidráulico, etc.) y del propio equipo (instalación de las patas estabilizadoras de la máquina, análisis de las condiciones del terreno sobre el que se empleará el equipo, etc.).

Además, para el caso concreto de los trabajos de montaje de tubería mediante retroexcavadora, mixta, etc., la empresa contratista deberá incorporar a su Plan de Seguridad una doble evaluación de riesgos, mediante la cual se analicen los riesgos, medidas preventivas y protecciones asociadas al empleo del equipo de maquinaria de excavación como maquinaria para el izado de cargas.
Deberá existir una total coordinación y correspondencia entre los equipos de montaje propuestos y el peso de las tuberías y piezas a instalar (tipo de material, peso, longitud y diámetro,...), de manera que en ningún caso se rebase la máxima capacidad portante de los equipos y útiles de izado empleados en las condiciones de uso que se propongan.

Los camiones-grúa o grúas autocargantes son equipos concebidos para labores de carga y descarga desde el propio equipo, motivo por el cual en principio no deberían emplearse para los trabajos de montaje. En todo caso, si finalmente debieran emplearse para los trabajos objeto de este apartado resultará preciso que la empresa contratista justifique técnicamente en su Plan de Seguridad las razones que motivan dicho uso, que obligatoriamente se dará solamente en situaciones puntuales debidamente razonadas. Además, deberán cumplirse dos condiciones adicionales: Primero, que dicho uso esté previsto en las normas e instrucciones de manejo del fabricante de la máquina; en segundo lugar, y por asimilación de la misma a una grúa móvil autopropulsada, deberá darse cumplimiento al contenido del R.D. 837/2003 que regula el manejo de este último equipo, y, entre otras cuestiones, se designará un jefe de maniobras que se responsabilizará de la supervisión y dirección de las mismas.

En lo relacionado con el izado de cargas durante el montaje de tuberías se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Para empezar, todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con pestillo de seguridad…) se deberán revisar diariamente para que se garanticen sus adecuadas condiciones de conservación y de mantenimiento. La empresa contratista determinará quién realizará las revisiones y cómo se justificarán y registrarán éstas de forma documental.
Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios de izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado.
Los útiles que se empleen para el izado de cargas, en este caso de las tuberías, deberán disponer de los elementos necesarios para impedir una posible caída accidental de las mismas por descuelgue o cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, por ejemplo, todos los ganchos deberán disponer de pestillo de seguridad.
Muy especialmente durante el montaje de las tuberías y otras piezas mediante retroexcavadora, se deberá prohibir que el izado se realice desde puntos que no hubieran sido concebidos por el fabricante de la máquina para dichos trabajos.
Durante cualquier trabajo de izado de cargas (tuberías, piezas especiales, válvulas...) queda terminantemente prohibido permanecer o circular bajo las cargas en suspensión.
El eslingado de las tuberías se deberá realizar de manera que se garantice la total estabilidad de las cargas suspendidas. Para ello (y especialmente en tubos de 12 m.), todas las tuberías deben ser eslingadas desde dos puntos. Además, la empresa deberá analizar la longitud de eslingas necesarias para evitar que el ángulo que éstas formen en el gancho se encuentre comprendido entre los 60º y 90º. Los accesorios de izado deberán seleccionarse en función de las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la configuración del amarre.

En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante el que se desarrollen los trabajos de izado de cargas, o de sus accesorios (como las eslingas, etc.).
Todas las maniobras de izado de cargas (de tuberías, etc.) se realizarán previa comprobación por parte del responsable del estibaje de que la carga ha sido eslingada debidamente y reúne las condiciones necesarias para garantizar su estabilidad durante las mismas.
Si en la revisión previa al izado se detectase alguna deficiencia (las tuberías no se han eslingado debidamente o no se han usado los útiles adecuados, éstos presentan fallos de funcionamiento -como podría tratarse del muelle recuperador de algún gancho de seguridad-), el responsable del estibaje prohibirá que las maniobras prosigan, y sólo autorizará su reanudación cuando se subsanen las deficiencias detectadas. Bajo ningún concepto se emplearán puntos sueltos o que no formen parte del elemento a elevar para realizar su eslingado.
Durante los trabajos de montaje de los distintos componentes de la red (tuberías y válvulas, piezas especiales y arquetas, etc.) mediante grúa autopropulsada las maniobras deberán ser supervisadas y dirigidas por un jefe de maniobras. Esta designación se hará igualmente efectiva en las situaciones excepcionales que se comentaron anteriormente en relación al montaje mediante camión-grúa.
En el supuesto de que el operador del equipo mediante el que se realizara el montaje no dispusiera de la visibilidad necesaria, las maniobras se auxiliarán por parte de un señalista, que al igual que el responsable del estibaje dispondrá de una formación adecuada y suficiente para el correcto desempeño de su labor. Este señalista deberá realizar su trabajo sin verse sujeto a ninguna situación de riesgo por caída de las cargas suspendidas, o incluso caída en altura o a distinto nivel desde el borde de las excavaciones.
Se suspenderán los trabajos cuando haga viento superior a 50 km/h y/o condiciones meteorológicas adversas.

En cuanto a la manipulación manual de cargas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
Se cumplirá el contenido del R.D. 487/1997 sobre manipulación manual de las cargas y el de la Guía técnica del INSHT que lo desarrolla.

En la manipulación de cargas, se antepondrá el movimiento de la carga con medios mecánicos frente a los medios manuales.

No se manipularán cargas por parte de un trabajador con un peso superior a los 25 Kg. Con el objeto de aportar un criterio práctico, no se manipularán de forma manual tuberías que no sean de PVC de diámetro inferior a ∅ 160 mm.

La manipulación manual de las cargas se realizará sobre superficies estables, limpias y ordenadas, de forma que no sea fácil perder el equilibrio.

En cuanto al montaje de tuberías se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Todos los tajos en que se realicen estas labores de colocación de tuberías, se deberán delimitar, señalizándose mediante cartelería el riesgo de caída de cargas que se producirá en la zona. Además, no se deberá permitir la presencia en dichas zonas de trabajadores que no intervengan de manera directa en las actividades, operarios que no dispongan de formación específica para realizar los trabajos, terceros... Esta prohibición, así como el cumplimiento de la planificación preventiva que elabore la empresa contratista, deberá ser vigilada por sus recursos preventivos, que se personarán en los tajos durante todas las situaciones de especial riesgo.

Por tanto, se prohíbe la manipulación manual de todas las cargas en suspensión en tanto en cuanto éstas puedan representar un riesgo para los trabajadores, bien por caídas, golpes, atrapamientos, empujones por movimientos incontrolados etc. En caso preciso, los tramos de tubería (y las restantes piezas objeto de izado) serán dirigidos, alineados con el eje de la excavación y descendidos al fondo de la misma mediante el uso de cabos de gobierno o elementos semejantes. No se iniciará la manipulación de las cargas por parte de los trabajadores hasta que éstas no dejen de representar los riesgos antes citados.

Del mismo modo, queda prohibido que los operarios permanezcan en el interior de las zanjas cuando existe maquinaria efectuando trabajos en ellas, salvo en el momento de encajar los tubos donde

deberá existir coordinación entre el maquinista y el operario encargado de encajar el tubo. Para evitar el riesgo de atrapamiento durante este proceso, se prohíbe que durante la unión de tramos de tubería los trabajadores se sitúen entre el extremo del tubo colocado y el de la tubería que se pretende instalar. Del mismo modo, durante el montaje de tubería se prohibirá la presencia de operarios entre el tubo suspendido y las paredes de la excavación. Por lo tanto, los trabajadores que intervengan en el montaje se distribuirán en dos zonas: Por un lado, en el extremo libre de la tubería suspendida, retirándose de su zona de influencia sin aproximarse a la misma hasta que no deje de representar una fuente de posible riesgo, y prohibiendo su presencia entre el tubo suspendido y las paredes de la zanja. En el extremo opuesto, en la zona de unión entre tubos, se adoptarán las medidas oportunas con el objeto de garantizar que los trabajadores siempre se sitúen en una zona segura. Finalmente, durante la unión de los tubos se prohibirá que los operarios introduzcan sus miembros entre los mismos, de forma que no se vean expuestos a nuevas situaciones de riesgo por atrapamiento.

En ningún caso, se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar o salir de la zanja, aunque esté totalmente inmovilizado.

La empresa contratista deberá determinar las medidas que se adoptarán con el fin de organizar debidamente las actividades y evitar los riesgos que se pudieran producir por interferencia entre el montaje de tubería y de piezas especiales y las restantes actividades de excavación en zanja, vertido del lecho de arena, tapado de la excavación, etc. Este análisis deberá partir de las premisas que siguen:

Se organizarán debidamente los tajos con el fin de evitar los riesgos por posibles interferencias.

Se prohibirá la ejecución de actividades de manera simultánea y en niveles superpuestos en el fondo y el exterior de las zanjas.

Se prohibirá también la presencia de operarios en el interior de las zanjas, en la zona de influencia de la descarga del árido o de material de relleno de la tubería.

Durante el tapado de la excavación, y muy especialmente durante el vertido del material granular que constituya el lecho de la tubería, no solamente se prohibirá la presencia de operarios en la zona de influencia de los trabajos, sino también del polvo que se pudiera producir durante el vertido.

En cuanto a las uniones entre tuberías, debemos tener en cuenta que en función de su material podremos encontrarnos distintas situaciones:

Así por ejemplo, en tuberías de acero las uniones se realizan mediante soldadura de tipo eléctrico bien con electrodo celulósico, rutílico, etc. Este tipo de tuberías de fundición de diámetros pequeños, usadas en abastecimiento, se acoplan mediante una unión machihembrada, como las de poliéster y PVC (este tipo de unión se comenta más adelante). Por otro lado, en el caso de las tuberías de polietileno la unión se realiza mediante equipo de soldadura a tope y electrofusión. Finalmente, si nos referimos a las uniones de tubería de poliéster y PVC, deben comentarse varias cuestiones. De inicio, la conexión entre este tipo de tuberías se realiza mediante una unión machihembrada, de tal manera que el macho se corresponde con la tubería en suspensión y la hembra con la ya instalada (en algunos casos el montaje se realiza en la forma inversa). Además, tanto las tuberías de poliéster como las de PVC se suelen montar por lo general con un marcado mediante el cual se indica a los trabajadores la longitud exacta que se debe introducir el macho para garantizar la estanqueidad y el correcto funcionamiento del conjunto. En este sentido, debe precisarse que en el caso del poliéster la entrada de la tubería se realiza mediante el empuje suministrado por la retroexcavadora a través de una o de las dos eslingas (suele resultar necesario retirar una de ellas para facilitar las maniobras). En estas situaciones, resultará fundamental que se garantice la ausencia de trabajadores en el radio de acción de la máquina (y de forma muy especial de su brazo) y de las eslingas, que también podrían ser fuente de riesgo por posibles proyecciones en caso de rotura. Para el caso del PVC, mucho más ligero que el poliéster, la aplicación de este procedimiento de trabajo implicaría la rotura de los tubos. Por este motivo, las tuberías de PVC se suelen introducir mediante el empuje que transmite el cazo de la máquina desde el extremo de la tubería. Sin embargo, este empuje podría dañar la tubería motivo por el cual entre ella y el cazo suele interponerse una barrera protectora, bien

a base de tableros de madera o similar. Como en el caso anterior, resultará preciso que durante el empuje del cazo los operarios permanezcan en todo momento fuera de su zona de influencia, destacándose muy especialmente la obligación de que la protección que se emplee para no dañar la tubería sea autoestable es decir, que no requiera de la ayuda de los trabajadores para mantenerla en posición (en caso contrario, los operarios deberían situarse en el radio de acción del cazo de la máquina).

En cuanto al acceso al interior de las tuberías de hormigón ya colocadas se aplicará lo siguiente:
En las situaciones en que resulte necesario el acceso de trabajadores al interior de las tuberías ya colocadas, la empresa contratista deberá determinar las cuestiones siguientes:

Para empezar, la presencia de operarios en el interior de los tubos se entiende como en un espacio confinado, y por tanto serán de aplicación las medidas que la legislación y las normas de referencia específicas plantean en esta materia. El acceso al interior de los tubos se realizará en presencia de un recurso preventivo. La empresa determinará el diámetro mínimo a partir del cual se permitirá el acceso (como mínimo ∅ 1000 mm.), la longitud máxima de entrada (como máximo, hasta la primera junta, es decir, 6,00 ó 12,00 m.), y los medios de evacuación y de comunicación que se emplearán con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores (se debe garantizar la presencia de operarios de retén que observen desde el exterior todo lo que suceda en el interior de las tuberías, deberá darse una perfecta comunicación con el exterior, bien directamente o mediante emisora, se garantizarán y comprobarán las perfectas condiciones de ventilación en el interior de las tuberías), precisando que el acceso se limitará a meras inspecciones visuales (por lo tanto se debe prohibir la ejecución de cualquier tipo de actividad en el interior de las tuberías), que se realizarán coordinadas con las restantes labores en el tajo, motivo por el cual durante el acceso se paralizarán las restantes labores de excavación, montaje de tubería, tapado, etc.

Medidas preventivas para tuberías de PE:

El montaje de tuberías de polietileno presenta variantes respecto a lo que se ha venido indicando, fundamentalmente relacionadas con la forma en que se realiza la unión de los tubos y cómo éstos se introducen en el interior de las excavaciones. Para empezar, el equipo de trabajo estará formado por una retroexcavadora que ejecutará la excavación, y un equipo denominado de soldadura a tope o electrofusión, mediante el cual se realizará la unión de las tuberías. El equipo de soldadura a tope está formado por una unidad hidráulica y la máquina básica, una fresa eléctrica, el espejo calefactor, y un soporte para los mismos (fresa y espejo). De forma general, el funcionamiento del equipo de soldadura a tope será el siguiente: De inicio, se enfrentarán los extremos de las tuberías de polietileno que se pretenden soldar, y se embridarán sobre la máquina básica. A continuación se accionará la fresadora, mediante la cual se eliminará toda la suciedad y restantes defectos que pudieran mermar la calidad de la soldadura. Una vez fresados los extremos de las tuberías entrarán en funcionamiento la unidad hidráulica y el espejo calefactor, la primera aplicando a las tuberías enfrentadas un valor de presión preestablecido, y el segundo generando el calor necesario para realizar la unión. Por fin, pasado un tiempo también predeterminado, se habrá completado la unión de las dos tuberías de polietileno.

Los principales riesgos asociados al empleo del equipo de soldadura a tope guardan relación con posibles cortes o quemaduras, además de los derivados del empleo de una herramienta eléctrica. Por lo tanto, además de todo lo indicado para el empleo de las herramientas eléctricas en ambientes húmedos o con agua, deberán adoptarse las medidas necesarias con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores durante el manejo de la fresa y el espejo calefactor (cuando no se estén empleando, tanto la fresa como el espejo deberán permanecer sobre su soporte; en todo caso, de forma general las fresadoras disponen de un sistema de enclavamiento, de tal manera que una vez retiradas de su soporte solamente pueden accionarse cuando se hayan situado sobre la máquina básica). Además, se tienen que coordinar debidamente las operaciones, de forma que se eviten atrapamientos de manos durante el accionamiento de la central hidráulica (para ello, el operario que la maneje comprobará la ausencia de trabajadores en su zona de influencia, siempre previamente a su puesta en marcha).

Por otra parte, el empleo del polietileno presenta grandes ventajas desde el punto de vista de la seguridad y salud de los trabajadores ya que su montaje no requiere la presencia de operarios en el interior de las zanjas. De esta forma, el polietileno se suelda en el exterior de las excavaciones y cuando se dispone de la longitud de tubería necesaria, ésta se introduce al interior de la zanja mediante el empuje que suministre la máquina retroexcavadora que ha venido realizando los trabajos de excavación. Por lo tanto, el montaje de polietileno evita la presencia de trabajadores en el interior de las zanjas (y con ello el riesgo de sepultamiento, etc.), el izado de las tuberías (y el riesgo asociado de caída de cargas suspendidas), el extendido del lecho de arena, y múltiples riesgos derivados de situaciones de interferencia entre actividades (atropellos, etc.); se insiste nuevamente en que el equipo de trabajo estará formado por la retroexcavadora, que permanecerá suficientemente distancia de los operarios que manipulen el equipo de soldadura a tope. Para ello, la retroexcavadora deberá adelantarse lo suficiente respecto del equipo de soldadura con el fin de que no puedan interferir en el espacio (y producirse atropellos...), garantizándose una comunicación permanente mediante emisora entre un puesto de trabajo y otro.

3.1.3.2. Pruebas de tubería (estanqueidad y presión)

Son todos aquellos trabajos necesarios para la comprobación de la ausencia de fugas en las tuberías.

Medios para su ejecución: Bombas, manómetros, compresores, obturadores.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos y golpes por vehículos
Exposición a agentes químicos (polvo) y físicos (ruido)

Medidas preventivas:

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración.
Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja:

1. Prueba de presión interior.
2. Prueba de estanqueidad.

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.

<u>Prueba de presión interior.</u>

Antes del inicio de cada prueba se delimitarán de forma visible todas las arquetas o zonas de excavación abiertas que se encuentren dentro del tramo de tubería a probar, y no se dará orden de aplicar presión hasta que se haya comprobado la total ausencia de personas (tanto trabajadores de la obra como personas ajenas a la misma) en toda la longitud del tramo de conducción a comprobar. Además, se deberá prohibir la presencia en dichas zonas (dentro de las excavaciones abiertas y en las zonas delimitadas, que serán señalizadas mediante malla naranja stopper) de personal durante el desarrollo de las pruebas. De igual modo, la señalización citada se complementará mediante carteles de advertencia que adviertan del riesgo derivado de la existencia de zonas con una elevada carga de presión. Por otra parte, la empresa contratista deberá adoptar las medidas de vigilancia y

organización precisas, de modo que se dispongan trabajadores en todo el tramo (en sus accesos, etc.) mediante los cuales se prohíba la presencia en el mismo de otros trabajadores de la obra y de terceros, y se coordinen debidamente las actividades de la obra de forma que ninguna otra concurra o interfiera con la realización de las pruebas de presión.

Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas, en caso excepcional, si no se ha podido rellenar, se apuntalaran u hormigonarán las tuberías provisionalmente antes de comenzar con la prueba. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y sus fábricas con la resistencia debida.

Por otra parte, todos los equipos empleados, y fundamentalmente los utilizados para la medición de presiones, se encontrarán en perfecto estado de conservación y permitirán una lectura clara de la presión aplicada en cada momento. Esta lectura será objeto de continua comprobación mediante un segundo manómetro. Con el objeto de cumplir lo establecido en el párrafo anterior, tanto los manómetros como las llaves mediante las que se abra y cierre el circuito de agua, se situarán fuera de la zona delimitada (en el propio motor de bombeo del agua,...). Los manómetros utilizados estarán debidamente calibrados, con el fin de asegurar que la presión aplicada se corresponde exactamente con la lectura facilitada.

Antes del inicio de las pruebas, deberá comprobarse la correcta conexión entre las mangueras del motor de bombeo y la tubería a probar, así como el correcto anclaje y la total estabilidad de las piezas especiales y la valvulería en todo el sector objeto de las mismas. Muy especialmente, se garantizará el perfecto apuntalamiento de los puntos en que la valvulería fuera sustituida por tapones, que se unirán a la tubería mediante junta Gibault o manguito.

Además, debemos considerar la necesidad de que la aplicación de presión se realice de forma progresiva y continuada hasta alcanzar los niveles de presión deseados, y que, concluida la prueba se reduzca progresivamente la presión aplicada, quedando terminantemente prohibido desconectar las mangueras que unen el motor y la tubería mientras exista presión en la misma. Conforme a lo indicado, se prohibirá la ejecución de actividades (tanto por parte de trabajadores de la obra como de personas ajenas a la misma) en las zonas anteriormente delimitadas hasta que los equipos de medición no determinen la ausencia total de presión en el tramo de tubería a comprobar.

Por último, en casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía.

Prueba de estanqueidad.

Debemos tener en cuenta que no todas las tuberías son objeto de esta prueba, ya que se realiza fundamentalmente para comprobar el correcto funcionamiento de las uniones de tubería a base de junta elástica.

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un bombín tapado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire.

Con respecto a estas pruebas, se tomarán las mismas medidas preventivas que las indicadas para las pruebas de presión.

3.1.3.3. Desinfección de tubería

Son todos aquellos trabajos necesarios para la desinfección de las tuberías de abastecimiento y depósitos.

Medios para su ejecución: Agua, lejía y sosa cáustica.

Riesgos:

Atropellos por maquinaria de obra o vehículos ajenos
Caídas de distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Quemaduras

Medidas preventivas:

Para la desinfección de las tuberías se empleará cloro diluido en agua.
El cloro es un gas irritante de las mucosas y del aparato respiratorio que puede producir hiperactividad bronquial en individuos susceptibles. El primer síntoma de exposición es la irritación de las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta, que va en aumento hasta producir un dolor agudo. Esta irritación afecta también a las vías respiratorias inferiores, produciendo una tos refleja que puede provocar el vómito y en casos extremos edema pulmonar. Las personas expuestas durante largos periodos de tiempo a bajas concentraciones de cloro pueden presentar una erupción que se conoce como cloracné.

La exposición a concentraciones de cloro de 45 mg/m3 provoca irritación de las membranas mucosas del ojo y de la nariz y, especialmente, de la garganta y los pulmones. Concentraciones de 150 mg/m3 o más son muy peligrosas incluso en exposiciones de corta duración. Las exposiciones agudas a altas concentraciones pueden provocar inflamación en los pulmones con acumulación de líquido. Dichos síntomas pueden manifestarse de forma retardada hasta dos días después de la exposición al gas. El edema pulmonar se desarrolla más rápidamente en las personas que se hallaban realizando un trabajo más fuerte. El contacto del cloro con la piel también produce quemaduras. El nivel más bajo al que se detectan sus efectos se asocia habitualmente a su umbral olfativo (< 0.3 mg/m3). Cuando se precisa movilizar una gran cantidad de aire, como ocurre durante el ejercicio físico, se produce una bronco dilatación y, por el contrario, cuando se pretende limitar este aporte de aire, como cuando tiene lugar una exposición a gases irritantes, aparece la tos y bronco constricción.

Para reducir los riesgos para la salud y aumentar la seguridad de los trabajadores en trabajos en los que haya actividad con agentes químicos como el cloro, se debe reducir al mínimo necesario, la cantidad de agentes químicos presentes en el lugar de trabajo. En este sentido, el reactor fotocatalítico UBE presenta ventajas obvias ya que no implica ni el empleo ni la emisión de sustancia química alguna (tratamiento físico). Por el contrario, permite la reducción de la concentración de cloro residual por debajo de 0.4 mg/l, que está obligado por ley para garantizar el efecto desinfectante residual.

Su utilización permite reducir en un 99.99 % la concentración bacteriana, así como el contenido de materia orgánica del agua tratada (DQO), lo cual también contribuye a limitar el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. Además permite reducir la turbidez del agua, el contenido en urea y, de manera paralela, la concentración de cloraminas secundarias (formadas por reacción del cloro con el amoníaco en disolución) que producen los olores a cloro.

3.1.4. REDES DE SANEAMIENTO

3.1.4.1. Colocación de arquetas y pozos prefabricados

Medios para su ejecución: Camión pluma o grúa autocargante, retroexcavadora, camión de transporte, escaleras de mano...

Riesgos:

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Caídas a distinto nivel
Sobreesfuerzos
Atropellos
Vuelco de vehículos
Golpes con objetos o herramientas

Medidas preventivas:

Como en el caso de las tuberías, el principal factor de riesgo asociado a estas actividades guarda relación con el izado de cargas suspendidas. Punto que está desarrollado en el apartado de montaje de tuberías (prohibición de presencia de operarios en la zona de influencia de las cargas suspendidas, guiado mediante cabos de gobierno, delimitación y señalización de las zonas de trabajo...), todo lo indicado en el citado apartado será de aplicación para este.
No obstante, se concretan varios aspectos especialmente relevantes en el montaje de este tipo de prefabricados:

- En primer lugar, los útiles de izado y los puntos desde los que se realice el eslingado de las cargas serán los específicamente previstos por el fabricante de las piezas, de manera que se garantice la estabilidad de las cargas durante el proceso de izado. Además, todos estos útiles deberán estar certificados y cumplir lo establecido en el apartado sobre montaje de tuberías; de esta manera, entre otras cuestiones, los útiles de izado deberán disponer de los mecanismos de seguridad mediante los que se evite una caída accidental de las cargas por descuelgue de las mismas durante su izado (ganchos con pestillo de seguridad, etc.).

- Tal como se indicó para las tuberías, el montaje de todos estos prefabricados deberá realizarse en presencia de un recurso preventivo de la empresa contratista.

- Se tendrá en cuenta lo establecido en materia de excavación en zanja, y la necesidad de que se verifique durante todo el periodo de ejecución de los trabajos (desde que se abre una excavación y hasta que se completa el montaje de tubería, piezas especiales, etc.) que los taludes de las excavaciones a las que debieran acceder los trabajadores se corresponden con las condiciones de estabilidad previstas en este documento (las necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores por parte del empresario, bien a base de los taludes estables previstos en el Proyecto Constructivo, los nuevos taludes amparados en un cálculo justificativo, etc.).

- Por último, y tal como se expuso para los trabajos de excavación en zanja, se deberán planificar los trabajos que impliquen riesgos por interferencias con servicios afectados (líneas eléctricas, conducciones de gas, canales, carreteras abiertas al tráfico rodado,...), como son los de montaje de tubería, válvulas y piezas especiales, arquetas y cualquier otro elemento correspondiente con la red de tuberías proyectada.

También se tendrá en cuenta las siguientes medidas concretas:

- Toda arqueta estará dotada de una tapa definitiva o provisional en el momento de su construcción y se rodeará la zona de riesgo de caída con malla de balizamiento. Siempre que una arqueta sea destapada por necesidades de trabajo, será protegida con barandilla y señalizada con malla de balizamiento y restituida la tapa, una vez que el trabajo finalice.

- Se suspenderán los trabajos de izado, cuando haga viento superior a 50 km/h y/o condiciones meteorológicas adversas

- Será obligatorio la utilización de los equipos de protección individual: casco, calzado de seguridad, ropa de alta visibilidad con elementos reflectantes, guantes de seguridad, (además de los específicos relacionados con los equipos de trabajo).

En cuanto al acopio de estas piezas prefabricadas se tendrá en cuenta lo siguiente, además de lo establecido en el apartado de acopios y descarga de materiales:

- Las piezas de hormigón se dejarán almacenadas directamente sobre el suelo, apiladas en forma de pirámides. Para garantizar que no vayan a deslizar se colocarán unos topes.

- Las bases de hormigón se almacenan en el suelo en sentido vertical. Se prohíbe apoyarlas en sentido horizontal.

- Los recrecidos se colocan apoyados en el suelo en sentido vertical pudiéndose apilar hasta una altura máxima de 2,5 metros. Se prohíbe apoyarlos en sentido horizontal.

- Los conos se colocan apoyados en el suelo en sentido vertical. Se prohíbe apoyarlos en sentido horizontal o apilarlos.

3.1.4.2. Colocación de pates en obras de fábrica

Se realizan una serie de perforaciones en las paredes de las obras de fábrica y se anclan en ellas los pates.

Medios para su ejecución: martillo perforador, grupo electrógeno, herramienta manual.

Riesgos:

Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Caídas a distinto nivel
Sobreesfuerzos
Atropellos
Golpes o cortes con objetos o herramientas
Proyección de fragmentos o particulas
Posturas forzadas
Polvo
Ruido

Medidas preventivas:

El trabajo consiste en realizar una serie de perforaciones en las paredes de las obras de fábrica con un martillo perforador anclando posteriormente los pates en dichas perforaciones. Se distinguen dos tipos de pates, para zonas rectas y para zonas curvas, no afectando dicha diferencia en el procedimiento de ejecución.

Los pates se irán colocando de abajo hacia arriba apoyándose en el pate inmediatamente anterior. Un operario realizará labores secundarias, como suministro de material, ayuda en el montaje de los

elementos de seguridad, etc. mientras que otro operario realizará las perforaciones y colocará los pates sujetado por un sistema anticaída y apoyándose en los pates anteriormente colocados.

Se vallará y señalizará correctamente la zona de trabajo, impidiendo el tránsito de cualquier tipo de vehículo y/o persona a menos de 2 metros de distancia.

Para bajar a la obra de fábrica se utilizará una escalera normalizada, al no haber todavía pates colocados.

3.1.4.3. Inspección de tubería con cámara

Son todos aquellos trabajos necesarios para la comprobación de la ausencia de fugas en las tuberías

Medios para su ejecución: cámara.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos y golpes por vehículos
Atmósferas nocivas y/o tóxicas
Contaminantes biológicos

Medidas preventivas:

El procedimiento a seguir será, en principio, el siguiente:

- Se balizará y señalizará el pozo o arqueta donde se va a actuar.
- Se verificará por medio de un detector de gases la existencia de gases tóxicos y explosivos en la instalación de tuberías a inspeccionar.
- Se montará el sistema de cámara y se adaptará a la tubería a inspeccionar.
- Se establecerá el suministro de energía (alimentación de red).
- Se realizará la prueba de seguridad del sistema.
- Se probará el interruptor de parada de emergencia.
- Si fuese necesario entrar en el interior del pozo, colector, fosa, etc. se considerarán estas actividades como trabajos en espacios confinados, por lo que se tendrán en cuenta en todo momento las medidas preventivas consideradas en este documento en el apartado de espacios confinados.
- Se recomiendan vacunaciones a consultar con el servicio de vigilancia de la salud de la empresa.
- Sólo personal especializado e instruido debe realizar el mantenimiento y la conservación de los sistemas.
- Antes de abrir o mantener los equipos se desconectará el sistema y todos los equipos accesorios y se protegerán de la conexión eléctrica.

- Después de cada utilización en la alcantarilla deben limpiarse y desinfectarse todos los equipos.

3.1.5. AFIRMADOS Y PAVIMENTOS

3.1.5.1. Pavimentación, aceras y bordillos

Medios para su ejecución: hormigonera, tronzadora manual, rotaflex, herramientas manuales.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Cortes con tronzadora o rotaflex
Sobreesfuerzos
Atropellos y golpes por vehículos
Polvo

Medidas preventivas:

El acopio de material se realizará según lo especificado en el apartado de acopios y descarga de materiales, comentado anteriormente.

Cuando se esté empleando la tronzadora para cortar el adoquín, se emplearán gafas de seguridad y protecciones auditivas.

En caso de generación de polvo durante el corte de material, se emplearán mascarillas con filtro.

A la hora de manipular el adoquín se emplearán guantes de seguridad y además se tendrán en cuenta las indicaciones para la manipulación manual de cargas que especifica el RD 487/1997.

Se dotará al equipo de colocación de adoquín de pinzas o de equipos neumáticos por si tienen que manipular adoquines pesados.

Estos equipos neumáticos se usarán de acuerdo con el manual del fabricante.

Si se va a manipular material entre dos o más operarios, uno de ellos será el que guíe al resto para coordinar los movimientos.

Si los trabajadores van a estar de rodillas, utilizarán rodilleras, para amortiguar la fatiga muscular.

Se recomienda que cada dos horas de trabajo seguidas colocando baldosa o adoquín, se descansen 10 minutos o se alternen con otros trabajos en los que se trabajen distintos grupos musculares.

3.1.5.2. Mezclas bituminosas

Medios para su ejecución: extendedora de aglomerado, compactadores, rodillos, fresadoras, barredoras, camiones, dúmperes.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Atropellos y golpes por vehículos
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Caída de objetos durante su manipulación
Choques contra objetos móviles e inmóviles
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Contactos térmicos
Contacto con productos cáusticos y/o nocivos
Sobreesfuerzos

Medidas preventivas:

La prevención de accidentes en los trabajos de afirmado y pavimentación se concreta, mayoritariamente, en la adopción y vigilancia de requisitos y medidas preventivas relativas a la maquinaria de extendido y compactación, tanto intrínsecos a los diversos elementos de las máquinas como a la circulación de éstas a lo largo del tajo. Junto a ellos, los riesgos de exposición a ambientes pulvígenos y a humos y vapores de los productos bituminosos, así como las altas temperaturas del aglomerado en caliente, definen la necesidad de empleo de equipos de protección individual así como de organización y señalización adecuadas de los trabajos.

Esta puesta en obra incluye el extendido y compactación de la mezcla en caliente. Así, deben observarse las siguientes normas mínimas, sin perjuicio de la obligación de que deban ser desarrolladas y concretadas en el preceptivo plan de seguridad y salud:

Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la obra y durante el desarrollo de la misma se llevarán a cabo revisiones periódicas, a fin de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad.

No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo.

Se regarán los tajos convenientemente y con la frecuencia necesaria para evitar la formación de ambiente pulvígeno.

En cuanto a los riesgos derivados de la utilización de maquinaria, serán de aplicación las directrices establecidas en los apartados correspondientes a maquinaria, instalaciones provisionales y equipos de trabajo, pues los riesgos derivados de la circulación de maquinaria pesada son idénticos en ambos casos.

No se permitirá la presencia sobre la extendedora en marcha de ninguna otra persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída.

Las maniobras de aproximación y vertido de producto desde camión estarán dirigidas por un especialista, en previsión de riesgos por impericia, como atropellos, choques y aplastamientos contra la extendedora.

Para el extendido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas maniobras utilizará única y exclusivamente las plataformas de las que dicha máquina dispone y se mantendrán en perfecto estado las barandillas y protecciones que impiden el contacto con el tornillo sin fin de reparto de aglomerado.

Durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de riesgos de atrapamiento y atropello, el resto de personal quedará situado en la cuneta o en zona de la calzada que no sea pavimentada en ese momento, por delante de la máquina.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados con bandas pintadas en colores negro y amarillo alternativamente.

Se prohibirá expresamente el acceso de personal a la regla vibrante durante las operaciones de extendido de aglomerado.

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquéllos con riesgo específico se adherirán las siguientes señales:

“Peligro, substancias calientes"

“No tocar, alta temperatura"
Se vigilará sistemáticamente la existencia de extintores de incendios adecuados a bordo de la máquina, así como el estado de éstos, de forma que su funcionamiento quede garantizado.

El personal de extendido y los operadores de la extendedora y de las máquinas de compactación irán provistos de mono de trabajo, guantes, botas de seguridad y faja antivibratoria, así como polainas y peto cuando puedan recibir proyecciones o vertidos de aglomerado en caliente, con independencia de los equipos de protección individual de uso general en la obra.

A efectos de evitar deshidrataciones, dado que estas actividades suelen desarrollarse en tiempo caluroso y son necesarias las prendas de protección adecuadas a las temperaturas de puesta en obra (superiores a los 100 ºC), habrá que disponer en el tajo de medios para suministrar bebidas frescas no alcohólicas. Del mismo modo, será obligatorio el uso de gorras u otras prendas similares para paliar las sobreexposiciones solares.

3.1.6. ACTIVIDADES DIVERSAS

3.1.6.1. Acopios y descargas de materiales

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, y descargas de los mismos.

Medios para su ejecución: Camión pluma, plataforma elevadora, escalera.

Riesgos:

Aplastamiento por caída de cargas suspendidas
Heridas con herramientas u otros objetos punzantes
Sobreesfuerzos
Atropellos
Golpes con objetos o herramientas
Caídas a distinto nivel
Caídas al mismo nivel

Medidas preventivas:

Tal como se ha establecido para las instalaciones de higiene y bienestar, todos los acopios en la obra se deberán definir y localizar de forma que se eviten todos los riesgos, tanto desde el punto de vista de las actividades realizadas en los mismos, como también en relación a las posibles interferencias que se pudieran generar con las restantes actividades de la obra.

Respecto a los primeros, los principales riesgos asociados al acondicionamiento de los acopios se relacionan con los derivados del izado de cargas, la estabilidad del material en el acopio, y el posible riesgo de caída a distinto nivel o incluso en altura durante las descargas. Por lo tanto, deberá cumplirse lo siguiente:

- El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos y no superará la altura que para cada caso especifique el suministrador o fabricante de los mismos. Se prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes de excavación (bordes de zanjas, terraplenes, etc.) o en situaciones semejantes que aporten inestabilidad para el acopio.

- Como se ha dicho, la altura del acopio será la definida por el suministrador o fabricante para garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con posterioridad una vez se precise el transporte o la utilización de los materiales acopiados. En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen sobre las alturas de material acopiado en la medida en que la situación comentada implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o distinto nivel.

- En caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el terreno, los trabajadores harán uso de escaleras de mano. De igual manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado en que no haya elementos que sobresalgan.

- En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en función del peso del material a acopiar. En función de su tamaño, los materiales se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas.

- Durante la manipulación de cargas suspendidas se garantizará su estabilidad durante su izado (empleándose los útiles y realizándose el eslingado desde los puntos específicamente habilitados para ello por su suministrador o fabricante), y prohibirse terminantemente la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas suspendidas. Para ello, si la dirección de las cargas fuera precisa solo se realizará mediante cabos de gobierno, prohibiéndose la manipulación manual de las cargas hasta que éstas no dejen de representar un riesgo por caída, atrapamientos, etc.

Durante el acondicionamiento de acopios también deberán preverse las condiciones de orden y limpieza necesarias para evitar los riesgos asociados a los mismos. Por lo tanto, resultará imprescindible la correcta iluminación en las zonas de paso y trabajo. De igual forma, en los acopios se deberán señalizar las zonas de tránsito de vehículos, además de facilitarse el movimiento de los materiales y el proceso productivo. De esta manera, las zonas de paso estarán limpias de restos de materiales y de los mismos acopios, deberán ser claras y bien definidas, y señalizarse debidamente. Los pasillos en los acopios deberán disponer de la anchura necesaria para facilitar el tránsito de los trabajadores y/o equipos a través de los mismos.

Se deberá prohibir el acopio de materiales en zonas que por interferencia o cualquier otra circunstancia implicaran un riesgo adicional a los intrínsecamente asociados con la descarga y manipulación de los materiales. Por tanto, por ejemplo deberá prohibirse el acondicionamiento de acopios en zonas próximas a líneas eléctricas.
Durante la descarga de cualquier tipo de material desde camión, plataforma, etc., se prohibirá que los trabajadores se encaramen sobre las cargas durante el proceso de modo que se vean expuestos a un posible riesgo de caída a distinto nivel o en altura. Esta cuestión presenta una especial relevancia durante las descargas de tubería, ya que éstas se suelen presentar sujetas a un buen número de variables. A continuación destacamos algunas de ellas:

- El tipo de tubería a descargar. Así, los tubos de PVC suelen suministrarse en paquetes flejados, mientras que las tuberías de poliéster se suministran sobre durmientes de madera sin flejar (hasta el extremo de que los grandes diámetros de poliéster -a partir de ∅ 1000 mm.- se suelen facilitar sin durmientes y sin flejes). De igual forma, el tipo de tubería y por

tanto su peso, condicionará las características de las máquinas y de los útiles empleados durante la descarga.

- La longitud de la tubería a descargar. Lógicamente, la dimensión de los tubos condicionará tanto los útiles como la longitud de las eslingas a emplear. En este sentido, debe destacarse la obligación de que, con independencia de los útiles que se usen durante la descarga, éstos se encontrarán certificados y además cumplirán el contenido de la normativa específica de aplicación (RR.DD. 1215/97 y 1435/92). Además será preciso que esta certificación abarque tanto útil que se emplee -considerado individualmente- como al conjunto máquina-útil.

- El equipo empleado durante las descargas, bien retroexcavadora, camión-grúa, etc.

- Las condiciones bajo las cuales se suministren las tuberías, bien en camiones, plataformas, etc. En este sentido, debe precisarse que las plataformas pueden presentarse abiertas o cerradas, es decir, con o sin cartola en los laterales y en el techo de la misma. Se recomienda que en las obras la empresa contratista adopte las medidas necesarias de forma que el suministro de tubería siempre se realice en plataformas abiertas, que facilitan en gran medida el eslingado (bien desde el propio terreno o desde escalera de mano) sin necesidad de que los trabajadores se deban encaramar sobre las cargas.

- Las tuberías en el exterior de la zanja permanecerán en todo momento calzadas para evitar que puedan rodar. Además, las tuberías se distanciarán del borde de las excavaciones al menos 2,00 m aproximadamente o la profundidad de la propia excavación.

En cuanto a las posibles interferencias con las restantes actividades realizadas en la obra, se deberán señalizar todos los almacenes y lugares de acopio, disponiéndose la señalización informativa que sea necesaria (riesgo de caída de cargas suspendidas...), y dotando a los mismos de cerramiento perimetral.

3.1.6.2. Almacenamiento de pinturas, disolventes y combustibles

Riesgos:

Caída de objetos por desplome o en manipulación
Incendios o explosiones
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas
Dermatosis

Medidas preventivas:

Se preverá la ubicación del almacén, cubierto y separado, para los productos combustibles o tóxicos que hayan de emplearse en la obra y que deban quedar en la misma. A estos almacenes no podrá accederse fumando ni podrán realizarse labores que generen calor intenso, como soldaduras. Si existan materiales que desprendan vapores nocivos, deberán vigilarse periódicamente los orificios de ventilación del recinto. Además, los trabajadores que accedan a estos recintos dispondrán de filtros respiratorios.

Si los productos revisten toxicidad ecológica intensa, el punto de almacenamiento no se ubicará en vaguadas o terrenos extremadamente permeables para minimizar los efectos de un derrame ocasional.

Los almacenes estarán equipados con extintores adecuados al producto inflamable en cuestión en número suficiente y correctamente mantenidos. En cualquier caso, habrá de tenerse en cuenta la normativa respecto a sustancias tóxicas y peligrosas, en lo referente a la obligatoriedad de disponer de un consejero de seguridad en estos temas.
Se tendrán identificados todos los recipientes con el producto que contienen, junto con las instrucciones de uso, conservación y almacenamiento de cada uno de ellos.

3.1.6.3. Replanteo, topografía y arqueología

Medición de los trabajos realizados, marcado de "parches" y demás actuaciones.

Medios para su ejecución: Aparatos de topografía, retroexcavadoras o mixtas para la realización de catas durante los trabajos de arqueología, cintas, etc.

Riesgos:

Atropellos por maquinaria de obra o vehículos ajenos.
Sobreesfuerzos.
Caída de personas a distinto nivel (replanteos en obras de fábrica, estructuras, taludes…)
Caída de personas al mismo nivel.
Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas:

Los trabajos de replanteo engloban aquéllos que se realizan desde el inicio de las obras hasta su finalización, por los equipos de topografía, definiendo por medio de los replanteos todos los datos geométricos y medidas referenciadas en el terreno para poder realizar las actividades de los elementos constructivos que componen la obra. Estos trabajos han sido múltiples veces excluidos de los estudios y planes de seguridad y salud de las obras, lo que resulta improcedente, dado que son fuente de numerosos accidentes de gravedad variable.

Además de los riesgos relacionados con los equipos y la maquinaria empleada en la ejecución de estas actividades (aparatos de topografía, retroexcavadoras o mixtas para la realización de catas durante los trabajos de arqueología, etc.), los principales riesgos asociados con este tipo de labores guardan relación con los derivados del entorno en el que se realicen, así como con las posibles interferencias que se pudieran dar durante su ejecución con las restantes actividades de la obra. Por lo tanto, se deberán cumplir las prescripciones que a continuación de enumeran:

- La localización de las bases de replanteo se realizará teniendo en cuenta la orografía del terreno, de modo que el acceso y permanencia del personal en la zona no suponga un riesgo.

- Los puntos de medida se determinarán de modo que los ayudantes y peones no tengan que exponerse a riesgos.

- Se mantendrán las distancias de seguridad con líneas eléctricas aéreas (en el caso de utilizar jalones deberán ser de material dieléctrico) e incluso con torres o postes de estas instalaciones, no debiendo servir éstos en ningún momento como bases o puntos de medida.

- Todo el personal de topografía deberá evitar situarse en el radio de acción de la maquinaria, señalizar la zona de trabajo en caso de situarse en zonas de tráfico, y circular por la traza de acuerdo a las normas marcadas. Se organizarán los tajos de manera que se evite la presencia de trabajadores a pie en la zona de afección de la maquinaria en movimiento.

- Debe evitarse la estancia durante los replanteos en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se avisarán a los equipos de trabajo para que eviten acciones que puedan dar lugar a proyección de objetos o herramientas mientras se esté trabajando en esa zona.

- Para clavar las estacas con ayuda de los punteros largos se utilizarán guantes y punteros con protector de golpes en manos. Deberá evitarse el uso de los punteros que presenten deformaciones en la zona de golpeo, por presentar el riesgo de proyección de partículas de acero en cara y ojos. Se usarán gafas antiproyecciones durante estas operaciones.

- Especial precaución se deberá tener a la hora de realizar mediciones sobre estructuras o a borde taludes o desniveles. En este caso, resultará obligado que todos los operarios que deban acceder a zonas con riesgo de caída en altura hagan uso de arnés de seguridad anclado a puntos estables y resistentes previamente fijados, siempre y cuando no exista previamente una protección colectiva que combata el citado riesgo. Además, idénticas medidas se adoptarán durante la toma de datos desde bordes de excavaciones.

- Se prohibirá realizar mediciones al borde de zanjas con riesgo de caída en altura (2,0 m.) sin la protección necesaria: Barandilla rígida reglamentaria retranqueada del borde de la excavación al menos 1,00 m., o bien un punto fijo y estable previamente consolidado al que los trabajadores puedan anclar su arnés de seguridad.

- Los replanteos en zonas de tráfico se realizarán con la colocación previa de la señalización de obras y corte al tráfico del carril que se vaya a ocupar. Se llevarán chalecos reflectantes.

- El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo todo terreno o furgoneta, dependiendo de las condiciones del terreno. Este vehículo deberá ir equipado con un botiquín, será revisado con periodicidad y conducido normalmente por un mismo operario, que vendrá obligado a circular de forma ordenada por los viales de obra. Cuando sea necesario alejarse del vehículo de obra, éste habrá de ser aparcado en un lugar visible para el resto de personas de la obra.

- Se colocarán adecuadamente los equipos de topografía en los vehículos de transporte, evitando que puedan moverse y sean causa de lesiones a los propios ocupantes del vehículo.

Por otra parte, la empresa contratista deberá organizar los tajos de la obra de tal forma que en ningún caso se de concurrencia de actividades entre las labores de topografía, replanteo y arqueología con los restantes trabajos realizados en la obra.

3.1.6.4. Actuaciones en la obra de los servicios técnicos

Riesgos:

Accidentes de tráfico "in itinere"
Atropellos por maquinaria o vehículos ajenos

Medidas preventivas:
Todas las obras son objeto de inspecciones y controles periódicos o esporádicos por parte de los servicios técnicos (directores de obra, inspectores, proyectistas, coordinador en materia de seguridad y salud, equipos de control de calidad, etc.). Estas visitas han de hacerse bajo las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que han de adoptarse ciertas normas preventivas al respecto.
El plan de seguridad y salud de la obra deberá prever específicamente la forma, condiciones y medios a utilizar para asegurar que las visitas de obra se lleven a cabo bajo las adecuadas condiciones de seguridad. Para ello, cabe dar unas normas generales, las cuales serán concretadas y complementadas en el plan de seguridad y salud:
Antes de que un técnico o profesional de dirección y control se desplace al lugar de visita, deberá velarse por que esté perfectamente informado de los riesgos a que va a estar expuesto en obra. Sobre todo, deberá ser informado de todas aquellas condiciones específicas que se den en la obra y sin cuyo conocimiento previo podrían ser causa de riesgos importantes. Aún así, el visitante será acompañado en todo momento por alguna persona que conozca las peculiaridades del entorno.
Todos los visitantes a la obra deberán llevar las protecciones individuales adecuadas que sean necesarias para protegerles adecuadamente.
Las protecciones colectivas suelen ser eliminadas, lógicamente, de aquellos lugares donde cesa el trabajo, pero si dichas zonas han de ser visitadas por los servicios técnicos, las citadas protecciones deben ser repuestas, pudiendo, en caso contrario, negarse el visitante a acceder a dichos lugares o adoptar las decisiones que estime oportunas.

3.1.6.5. Colocación de carteles

Medios para su ejecución: camión grúa para transporte del material, medios de excavación y hormigonado (para la realización de cimentaciones), escaleras de mano.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Atropellos y golpes por maquinaria o vehículos ajenos
Caídas de personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Ruido

Medidas preventivas:
Se incluyen dos procedimientos para las labores de instalación de carteles y retirada de los mismos:

Procedimiento 1:

- Para el montaje: Se procederá al montaje de todas las piezas en el suelo. Una vez finalizado el montaje se procederá al izado mediante camión pluma y será embebido sobre la cimentación preparada a tal efecto, fijándolo a la misma.

- Desmontaje: Mediante camión grúa se sujetará el elemento a retirar, y se procederá a desmontarlo desde la base. Una vez soltado y depositado en el suelo se procederá al desmontaje de las diferentes piezas que lo componen.

Procedimiento 2:

- Para el montaje: Si no fuera posible realizar lo dispuesto en el primer método, se montarán los perfiles mediante camión pluma, y una vez montados estos se colocarán las lamas o elementos restantes empezando por la parte de abajo para terminar en la parte de arriba del cartel. Estas operaciones se pueden realizar en las alturas inferiores desde el suelo, y en las lamas de la parte superior del cartel utilizando escalera de mano sujeta al poste vertical del cartel, de manera que el operario pueda trabajar en condiciones firmes y seguras. En el caso en que las dimensiones del cartel superen los 3,5 metros (desde el punto de apoyo en la cimentación del poste hasta la parte superior de las lamas del cartel), se utilizará plataforma elevadora y arnés de seguridad.

- Desmontaje: Si no fuera posible realizar lo dispuesto en el primer método, se irá desmontando por piezas, de igual modo y con los mismos medios dispuestos en este 2º procedimiento para el montaje.

3.1.6.6. Soldadura

Medios de ejecución: equipo de soldadura oxiacetilénica, y eléctrica.

Riesgos:

Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas

Sobreesfuerzos
Exposición a radiaciones
Contactos térmicos
Explosiones, incendios
Exposición a contactos eléctricos
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas (humos y gases)

Medidas preventivas:

El plan de seguridad y salud deberá definir el tipo de soldadura a utilizar, recogiendo las medidas preventivas, protecciones colectivas y teniendo en consideración el lugar y tajo donde se realizarán estos trabajos, ya que la zona de trabajo influye en la implementación de los riesgos de la propia soldadura o en la aparición de nuevos riesgos (trabajos en altura, en el interior de zanjas, etc.).
Deberá especificar además la localización de las zonas de almacenamiento de los equipos peligrosos y recoger la señalización de riesgos que se deberá establecer.
Otro aspecto importante a considerar en la ejecución de los trabajos de soldadura son los riesgos generados por las condiciones climatológicas adversas (chispas trasladadas por el viento, afección de la lluvia y nieve para las soldaduras de tipo eléctrico…).
Se deberá evitar en las zonas de trabajo la confluencia con otras actividades. En caso de que fuese necesario la realización de otros trabajos en las proximidades de las zonas de soldadura se deberá prever la disposición de protecciones colectivas (apantallamientos).
Como normas básicas de seguridad se deberán cumplir las siguientes:

<u>Soldadura eléctrica.</u>

Puede haber derivaciones desde el circuito primario de la máquina a la carcasa. Por esta razón se debe conectar a una red eléctrica con toma de tierra, protegida por interruptores diferenciales. Si el grupo no va conectado a la red es conveniente situarlo sobre una banqueta distante para dificultar el cierre del circuito si se produce una derivación.
Es imprescindible vigilar el estado de los cables de conexión y las proyecciones de partículas incandescentes sobre los mismos. También se debe vigilar que su aislamiento y sección sean adecuados a la cantidad de corriente que transportan. Se los protegerá si cruzan zonas de paso y en ningún caso se permitirá el paso de vehículos por encima de los mismos.
La operación de cambio de electrodos debe hacerse con guantes y con las manos, ambos perfectamente secos, pues el cuerpo del trabajador puede cerrar el circuito eléctrico.
Como medida de seguridad complementaria conviene que exista un interruptor que permita cortar la corriente en las proximidades de la máquina y que tanto el operador como los trabajadores de puestos próximos tengan formación en primeros auxilios y sepan como proceder en caso de accidentes en presencia de la corriente eléctrica.
Antes de efectuar un cambio de intensidad desconectar el equipo.
Las conexiones con la máquina deben tener las protecciones necesarias y como mínimo fusibles automáticos y relé diferencial de sensibilidad media (300 mA), así como una buena toma de tierra.
La superficie exterior de los portaelectrodos y los bornes de conexión para circuitos de alimentación de los aparatos de soldadura, deberán estar cuidadosamente dimensionados y aislados.
Comprobar que los terminales de llegada de corriente no están al descubierto.
En lugares húmedos, aislar el lugar de trabajo sobre una base de madera seca o alfombra aislante.
No tocar la pinza y apoyarse en la mesa al mismo tiempo.
No apoyar las piezas sobre suelos sin aislarlas convenientemente de ellos.
No tocar el electrodo una vez conectado al equipo.
No introducir jamás el electrodo en agua para enfriarlo. Puede causar un accidente eléctrico.
Disponer junto al soldador de un recipiente o cubeta resistente al fuego para recoger los cabos de electrodo calientes al objeto de evitar incendios y quemaduras al personal.
Utilizar los parámetros de soldadura adecuados evitando someter al electrodo y a la pieza a intensidades superiores a las habituales, para finalizar antes la tarea. Deben existir extintores adecuados cerca de la zona de soldeo. En caso de incendio éste se encuadraría dentro de los de clase E, por lo que nunca se debe tratar de apagar con agua.

Soldadura oxiacetilénica.

Un proceso de soldadura implica elevadas temperaturas y chispas por lo que puede constituir un foco de ignición. No deben almacenarse materiales combustibles en las proximidades de los puestos de soldadura. No deben realizarse actividades que impliquen el uso de materiales inflamables como disolventes, pinturas o gasolinas.
Disponer alrededor del puesto de trabajo pantallas cortachispas que eviten que lleguen a las zonas no deseadas.
En las botellas de oxígeno las válvulas y la reductora de presión deben estar limpias de grasas y aceites.
No se utilizará nunca oxígeno ni aire para desempolvar o limpiar ropa y otros objetos. No aplicar sobre piel desnuda.
Nunca se deben situar debajo del lugar en que se esté soldando para evitar la caída de chispas y proyecciones sobre las botellas.
Ante un incendio fortuito en el equipo de soldadura antes de intentar sofocarlo se procederá a cerrar rápidamente las válvulas de alimentación, si es posible.
Nunca se soldarán o cortarán bidones que hayan contenido líquidos o gases inflamables.
Las botellas de gases se colocarán y fijarán para mantenerlas siempre en posición vertical, lejos de los focos de calor o llamas. (Espuma)
Las bocas de los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben apuntar en direcciones opuestas.
Para el transporte se utilizará un carro porta botellas. Transportarlas con los grifos cerrados y las caperuzas puestas. Deben tener las válvulas cerradas.
Válvulas de seguridad contra retrocesos en las botellas y en el soporte.
Las mangueras para la conducción de gas acetileno u otro gas combustible serán de diferente color que las usadas para conducir oxígeno.
Revisar el estado de las mangueras eliminando las que se encuentren agrietadas o en mal estado.
Para buscar las fugas de gas en mangueras o válvulas utilizar agua jabonosa, jamás mediante llama.
No estrangular una manguera para detener temporalmente el flujo de gas, por ejemplo para cambiar un soplete o una boquilla.
Las mangueras deben ser, excepto casos anormales, de una sola pieza. Si fuera necesario hacer empalmes, estos se realizarían con los racores de conexión standard, prohibiéndose el uso de tubo a tal fin. La fijación de la manguera sobre los diversos racores se hará con abrazaderas, prohibiendo el uso de alambre.
Después de una parada larga o en el inicio del trabajo se purgarán las conducciones y el soplete antes de aplicar la llama.
Si se trata de soldadura en el exterior, las corrientes de aire facilitan la dispersión por lo que no es obligatorio el uso de protecciones respiratorias.
Protección de la vista con pantallas provistas de cristales inactínicos. Se utilizarán cristales conforme a la Norma Técnica Reglamentaria MT-18, en unos escalones de opacidad que fijan los valores de transmisión en porcentaje de las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojos producidos en la operación de la soldadura.
El tipo de cristal recomendado va en función de la intensidad con la que se realiza el soldeo, pero como norma es conveniente que su opacidad no sea excesiva ya que en ese caso el soldador debe acercarse demasiado al cordón de soldadura y aspira mayor cantidad de humos.
Uso de prendas de protección de la piel contra las radiaciones no ionizantes.

3.1.6.7. Trabajos en espacios confinados

Son todos aquellos trabajos que se realicen en cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos y/o inflamables y/o tener una atmósfera deficiente en oxígeno.

Medios para su ejecución: los necesarios según la actividad a realizar en el espacio confinado.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Atmósferas nocivas y/o tóxicas
Contaminantes biológicos
Aprisionamiento
Riesgos posturales
Electrocución
Problemas de comunicación
Ambiente físico agresivo (ruido, vibraciones, frío o calor, iluminación deficiente)
Los derivados de las tareas a realizar y de la maquinaria empleada.

Medidas preventivas:

Un espacio o recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida, y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente de oxígeno, y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.
Conforme al contenido de la NTP-223, para trabajos en espacios confinados, se precisan una serie de indicaciones particulares para dichos trabajos:

- Se elaborará una autorización de entrada al recinto, válida para una sola jornada de trabajo mediante la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por los trabajadores durante su actuación en el interior del espacio: Medios de acceso, medidas preventivas a adoptar (ventilación, control de la atmósfera interior,...), equipos de protección individual a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de seguridad…), medios de vigilancia y control de las operaciones desde el exterior, etc. Es decir, se realizará un procedimiento específico de trabajo para cada situación concreta.

- Siempre que exista el riesgo de caída en altura, se protegerán los huecos de entrada al recinto con barandillas periféricas.

- Previamente al acceso de los trabajadores, y de forma continuada mientras se encuentren en el interior del recinto confinado, se realizarán mediciones de la atmósfera interior con instrumental adecuado y debidamente calibrado. Estas mediciones se iniciarán desde una zona segura en el exterior del recinto confinado, avanzando las mismas paulatinamente desde zonas totalmente controladas por parte de los propios trabajadores que accedan a la misma.

- Ante cualquier duda o incoherencia en la lectura de resultados, se deberán repetir las mediciones. Ningún trabajador podrá entrar hasta que los niveles de contaminante medidos estén por debajo de los límites de peligrosidad. Cuando se alcance cualquier nivel de alarma se abandonará inmediatamente el recinto y se avisará al encargado (recurso preventivo), al jefe de obra y al responsable de seguridad de la empresa. Los datos obtenidos en las mediciones continuas se registrarán y se archivarán, siendo imprescindible su anotación cuando estas sean desfavorables.

  Los valores admisibles de las mediciones, para los gases más comunes en recintos confinados (como colectores, pozos, arquetas...) se exponen en el siguiente cuadro:

O_2	< 20,5 % (Equipos de respiración autónoma o semiautónoma)	
CO_2	5.000 ppm	VLA-ED
CO	25 ppm	VLA-ED
H_2S	10 ppm	VLA-ED
CH_4	1.000 ppm	

VLA: Valor Límite Ambiental
ED: Exposición Diaria

- Si fuera necesario utilizar un generador eléctrico, éste siempre se ubicará en el exterior del espacio confinado. En ningún caso, se introducirá en espacios confinados equipos con motor de combustión interna tales como compresores, motosierras, etc.

- En ningún caso se permitirá el acceso de los trabajadores sin hacer uso de equipos de respiración autónoma, en caso de que la medición de oxígeno resulte inferior al 20,5%.

- Si la atmósfera es potencialmente explosiva todos los equipos, herramientas, EPIs, etc. que se utilicen en el interior del recinto deberán contar con la protección EX correspondiente, para que no puedan producirse chispas que den lugar a un foco de ignición.

- Por otra parte, los operarios accederán al interior de la conducción con equipos portátiles de iluminación, de modo que sus niveles garanticen que los trabajos se desarrollen en condiciones seguras.

- Se establecerá un control total de los trabajos desde el exterior. Las personas que permanezcan en el exterior del recinto estarán perfectamente instruidas para mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz (emisoras, walkie-talkies, etc.) con el trabajador que ocupe el espacio interior. Estas personas tienen la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto adviertan algo anormal. El personal en el interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, donde se dispondrán medios de sujeción y rescate adecuados (línea de vida con arnés de seguridad, trípode de rescate con arnés,...) y elementos de protección respiratoria de emergencia.

- Se formará a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes. Para estos trabajos se elegirá personal adecuado, joven, que no sea claustrofóbico, ni temerario, y con buenas condiciones físicas y mentales.

3.1.6.8. Operaciones con tuberías de fibrocemento

Son todos aquellos trabajos que se realicen con elementos que contengan partículas de amianto (tuberías de fibrocemento, uralitas…), sobre todo si hay que cortar o demoler dichos elementos, ya que desprenderían las fibras de amianto.

Medios para su ejecución: los necesarios según la actividad a realizar.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas

Atrapamiento por o entre objetos
Proyección de partículas de amianto
Exposición a agentes físicos (ruido)
Los derivados de las tareas a realizar y de la maquinaria empleada.

Medidas preventivas:

El principal riesgo en las tuberías de fibrocemento es la utilización del amianto como material base (fibra que le da resistencia estructural), lo cual ha provocado su prohibición, en base a la incidencia en el desarrollo de enfermedades cancerígenas, por inhalación de los operarios en las labores de instalación y mantenimiento de la red, como corte, torneado y refrentado de los tubos. El mayor riesgo nos lo vamos a encontrar cuando tengamos que realizar cortes en el tubo y se desprenda polvo.
En todo caso se deberá seguir lo especificado en el RD 396/2006 por el que establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. A continuación se enumeran ciertas indicaciones recogidas en dicho Real Decreto, para estos trabajos:

- En primer lugar, se realizarán las mediciones necesarias para saber si la atmósfera respirable contiene una concentración superior al límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED). Si se sobrepasa dicho límite, y no puedan utilizarse medidas preventivas colectivas frente a dicho riesgo, se deberán utilizar equipos de protección individual para las vías respiratorias. En ningún caso un mismo operador podrá superar las 4 horas diarias de trabajo, con un equipo de respiración.

- Antes de dar comienzo a las actividades con riesgo de exposición al amianto, la empresa encargada de ejecutar el trabajo, elaborará un plan de trabajo que será presentado ante la autoridad laboral.

- Todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones con riesgo de exposición al amianto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por Amianto.

- Los trabajadores estarán siempre protegidos frente al riesgo que ocasiona respirar partículas de amianto, por lo que se dispondrán las medidas colectivas necesarias para paliar dicho riesgo, en caso de que no puedan utilizarse medidas preventivas colectivas, los trabajadores tendrán a su disposición los equipos de protección individual que fuesen necesarios (como por ejemplo: traje de un solo uso de polietileno, guantes de nitrilo, mascarilla antipolvo FFP3, equipos de respiración autónoma...).

- Hay que tener en cuenta que los desechos de los tubos de fibrocemento, el traje usado, los guantes y las mascarillas tendrán que ser recogidos y retirados de la obra adecuadamente, para ser llevados a empresas especializadas en su tratamiento.

3.1.6.9. Jardinería, poda y tala

Medios para su ejecución: maquinaria agrícola, herramienta manual.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas

Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos, vuelcos, atrapamientos.
Sobreesfuerzos.
Condiciones climatológicas adversas.
Los derivados de las tareas a realizar y de la maquinaria empleada.

Medidas preventivas:

Los trabajos de jardinería pueden consistir en: excavación de hoyos y zanjas; preparación del terreno; siembra (hidrosiembra) y plantación; tratamientos del terreno (fertilizantes)…
Todo trabajador debe tener instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas, de forma que no se utilicen para operaciones distintas a las que estén destinadas. Las herramientas manuales deben ser las más apropiadas por sus características y tamaño a las operaciones a realizar.

Las herramientas deben mantenerse bien afiladas y sus partes cortantes y punzantes se deben mantener debidamente aisladas.

Las herramientas deben estar en buen estado de limpieza y conservación y durante su uso deben estar libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

Las herramientas cortantes o punzantes se guardarán y transportarán en cajas o fundas adecuadas.

Deben utilizarse guantes de protección específica para manipular herramientas de corte.

La maquinaria utilizada durante los trabajos de jardinería deberá tener marcado CE o estar adecuada al RD 1215/97. Ésta se utilizará siempre de acuerdo a lo indicado por el fabricante. Nunca se modificarán las condiciones, resguardos y protecciones de las máquinas.

Cuando se trabaje con maquinaria ruidosa se utilizarán protecciones auditivas.

Durante la hidrosiembra, agarrar las mangueras por el asa y comenzar a dar caudal de forma progresiva para evitar tirones.

Se mantendrá una distancia mínima de seguridad de dos metros con personas que trabajen con palas, picos, azadas o herramientas similares.

Para la manipulación manual de cargas seguir lo establecido en el RD. 487/1997.
Durante el abonado se tendrá en cuenta lo siguiente:

> Los trabajadores deberán ser conocedores de las instrucciones de uso y aplicación que indica el fabricante y se debe seguir todo lo indicado en la etiqueta o el envase. Así mismo se conocerán las fichas de seguridad de los productos.
> No fumar, ni comer, ni beber durante la utilización de estos productos.
> Si hay que pulverizar el producto, se realizará en días poco ventosos y siempre evitando colocarse contra el viento.

La tala, poda y retirada de árboles, se realizará con motosierra. Para la poda en zonas de difícil acceso se utilizará plataforma elevadora.

A la hora de utilizar la motosierra los trabajadores deberán utilizar pantalones y botas de motoserrista, guantes de seguridad y casco con protector facial y protecciones auditivas.

Cuando se realicen las labores de poda con motosierra, se utilizará una plataforma elevadora. En ella los trabajadores utilizarán cinturón de seguridad amarrado a la misma, así como gafas de seguridad, guantes y protecciones auditivas.

En las labores de tala, las operaciones de derribo se dirigirán por una única persona a la que deberán atender todos los implicados. Cuando se vaya a abatir un árbol se notificará verbalmente a todas las personas que se encuentren en el tajo para que tomen las debidas precauciones y se mantengan a una distancia de seguridad suficiente.

Cuando sea necesario derribar árboles de más de 4 metros de altura, el proceso consistirá en acotar la zona afectada, atirantar el árbol por su copa, abatirlo mediante corte en cuña en la base con motosierra. Para la labor de atirantado se elevará a un trabajador en la plataforma que eslingará adecuadamente el árbol en su tercio superior. Si sopla viento fuerte se suspenderán los trabajos.
Una vez talado y derribado el árbol, este se troceará en el suelo con la motosierra y se cargará con la mixta en el camión.

3.1.7. SERVICIOS AFECTADOS

3.1.7.1. Conducciones

Medidas preventivas:

Durante la ejecución de las obras de construcción se puede interferir con múltiples servicios, que pueden ser conocidos a priori, como ocurre siempre con las líneas aéreas de energía eléctrica o las acequias de riego, pero también pueden permanecer ocultos, incluso a pesar de tener noticias sobre su existencia.

Las actividades que pueden interferir con los citados servicios pueden ser todas las desarrolladas en la obra, pero presentan especial peligrosidad las de excavación, tanto de desmontes, en general, como las zanjas, a causa del frecuente desconocimiento exacto de la ubicación e incluso existencia de los servicios. Aún siendo elementos perfectamente conocidos, las líneas aéreas de energía eléctrica provocan innumerables accidentes laborales en las obras y siempre con terribles consecuencias. Por esto, no es posible reducir el presente estudio a los servicios afectados únicamente a las excavaciones.

Antes de empezar a excavar, se deberán conocer los servicios públicos subterráneos que puedan atravesar la zona, tales como agua, gas, electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con los departamentos a los que pertenecen y proceder en consecuencia.

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias habrán de ser correctamente ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán las siguientes medidas preventivas, entre otras que puedan ser dispuestas en el plan de seguridad y salud y aceptadas por el coordinador y por el director de la obra:

Localización y marcaje.
Nadie permanecerá alrededor de la maquina encargada de descubrir dichos servicios subterráneos hasta que se localicen los mismos.
Si es necesario, por su ubicación y peligrosidad, se descubrirán manualmente.
Una vez descubiertos se protegerán y señalizarán.

Los operarios que realicen trabajos en la zona afectada por dichos servicios conocerán la presencia de los mismos y sus riesgos y medidas preventivas específicas.

3.1.7.2. Líneas de transporte de energía eléctrica

Riesgos:

Contactos eléctricos directos de la maquinaria
Contactos eléctricos indirectos de la maquinaria
Quemaduras

Medidas preventivas:

Líneas aéreas:

El punto de partida para el análisis de cualquier actividad en el entorno de líneas eléctricas consiste en la elaboración de un estudio de gálibos previo a partir de cual se identifiquen las alturas de las líneas y el alcance de las máquinas que se empleen, todas ellas en la situación más desfavorable. Por ello, la empresa contratista realizará una precisa previsión de los equipos que se emplearán durante la ejecución de los trabajos, de forma que no se produzcan contradicciones entre las alturas de trabajo de la maquinaria que se integren en el Plan de Seguridad y las que se den en la práctica.

Tras conocer los datos de partida, se tomará como referencia lo establecido en el R.D. 614/2001, que determina la distancia de seguridad a respetar en función de la tensión de la línea eléctrica, conforme al contenido de una tabla.

Respecto a las actividades que nos ocupan, y con el objeto de incrementar en todo lo posible la seguridad de los operarios en relación al riesgo eléctrico, se adoptará como distancia de seguridad la indicada en la tabla anterior como Dprox-2.

Una vez conocida la diferencia entre la altura de la línea eléctrica y la de la maquinaria (como se ha dicho, ambas en su posición más desfavorable) y el valor de la Dprox-2 (establecida en función de la tensión de las líneas por el R.D. 614/2001), se podrán dar dos circunstancias: Que la primera resulte mayor que la segunda, y entonces podrán realizarse las actividades sin la necesidad de incorporar medidas complementarias (con la excepción de lo que se comentará más adelante en relación a la señalización del riesgo eléctrico, la necesaria coordinación de actividades empresariales, la presencia de los recursos preventivos de la empresa contratista, etc.).

En caso contrario, la planificación preventiva de la empresa contratista deberá integrar las medidas oportunas para garantizar que en la situación más desfavorable ninguna máquina invade la distancia de afección establecida. En este sentido, existen diversas soluciones mediante las que dar cumplimiento a lo establecido, proponiéndose algunas de ellas a continuación:

- Como se ha establecido anteriormente la solución prioritaria radicará en el hecho de realizar los trabajos con la instalación fuera de funcionamiento, en nuestro caso, con corte de tensión.

- Empleo de equipos de dimensiones más reducidas a las inicialmente previstas de forma que en su posición de trabajo más desfavorable sí permitan respetar la distancia de seguridad correspondiente. En cualquier caso, bajo este supuesto la empresa contratista deberá analizar y acreditar que el empleo de estos nuevos equipos de trabajo bajo ningún concepto comprometa el cumplimiento de las restantes prescripciones articuladas en el Plan de Seguridad.

- Uso de dispositivos que bien limiten el gálibo de los equipos, o bien adviertan mediante señales de tipo acústico y luminoso que se ha rebasado la altura de trabajo pre-establecida. En cuanto al uso de los citados dispositivos, se destaca que nos podremos encontrar limitadores mecánicos, electromecánicos. Por otra parte, los avisadores podrán ser de tipo acústico, luminoso, o una combinación de ambos.

El uso de los dispositivos comentados anteriormente introduce otra cuestión relevante: Podremos encontrarnos dispositivos limitadores de altura instalados “de serie” es decir, que se comercializan junto con la máquina de tal forma que el conjunto dispone de la correspondiente certificación. Sin embargo, en otros casos este dispositivo se incorpora posteriormente a la comercialización de la máquina, lo cual implica una modificación de la misma que deberá tener en cuenta la empresa contratista en su planificación preventiva, de forma que el equipo cumpla el contenido de la normativa de referencia.

Además de todas las cuestiones que se han planteado en relación al empleo de los limitadores de altura y de los avisadores acústicos y luminosos, el Plan de Seguridad de la empresa contratista integrará un procedimiento o protocolo que articule su implantación y empleo en la obra. Este protocolo tendrá como base de mínimos las siguientes premisas:

Identificación previa de la altura máxima de trabajo que se puede alcanzar con el objeto de respetar en todo momento la distancia de seguridad establecida (recordando que ésta se deberá mayorar cuando se empleen los avisadores acústicos y luminosos).

Información del procedimiento a los operarios que realicen los trabajos, y muy especialmente a los operadores de los equipos en los que se instalen estos dispositivos.

Comprobación del funcionamiento del sistema antes del inicio de los trabajos, y entrenamiento del procedimiento de trabajo.

Regulación del dispositivo para cada situación de interferencia.

Prueba de funcionamiento del dispositivo en cada punto, fuera de la zona de interferencia.

Para concluir, se pone de manifiesto la existencia de otros sistemas mediante los cuales garantizar la no invasión de la distancia de proximidad: Instalación de resguardos, montaje de pórticos, etc.

Tras determinar las medidas preventivas y las protecciones necesarias para garantizar la imposibilidad de que los equipos invadan la distancia de proximidad establecida, será necesario que la empresa contratista integre en su planificación preventiva otra serie de cuestiones:

La primera de ellas se relaciona con los medios de vigilancia mediante los que se garantice el cumplimiento de la misma. En este sentido, todos los trabajos en la proximidad de líneas eléctricas se catalogan conforme a la normativa en vigor como sujetos a un riesgo de especial gravedad, motivo por el cual se deberán desarrollar bajo la permanente presencia y vigilancia de un recurso preventivo. Entre otras cuestiones, este recurso preventivo velará por el cumplimiento de los protocolos establecidos, comprobará que los equipos empleados (y por lo tanto su altura de trabajo más desfavorable) se corresponde con la determinada en el estudio de gálibos incluido en el Plan de Seguridad, etc. Resulta especialmente importante subrayar además la necesidad de que previamente al comienzo de los trabajos se realice una comprobación de altura de la línea eléctrica con el fin de garantizar que ésta también se corresponde con la del estudio de gálibos.

El procedimiento a aplicar en materia de coordinación de actividades durante la ejecución de trabajos en proximidad de líneas eléctricas. Para ello, la empresa contratista deberá considerar la necesidad de informar por escrito a todas las empresas que realicen trabajos de esta índole, tanto a nivel de subcontratistas como de posibles suministradores, de forma que todos los trabajadores puedan ser formados con carácter específico en relación a los riesgos derivados de los mismos y las medidas y protecciones establecidas para evitarlos. Además, la empresa deberá identificar los equipos que se han autorizado para la ejecución de los trabajos en el entorno de las líneas eléctricas, así como el responsable de impartir las debidas instrucciones en el tajo y coordinar la actividad de cada una de las empresas.

Las condiciones bajo las cuales se desarrollará el tránsito de maquinaria en la obra en relación a la presencia de líneas eléctricas, especificando que éste se realizará en mínima extensión, tras

comprobar que para cada una de las líneas dichas condiciones permiten garantizar el respeto de la distancia de proximidad determinada (Dprox-2).

El protocolo de emergencia y de evacuación a aplicar en el supuesto de que se produjera un accidente por contacto o arco eléctrico.

Los dispositivos de señalización a emplear con el fin de controlar el gálibo de los equipos y señalizar en los tajos el riesgo eléctrico asociado a las actividades que se realicen en los mismos. Así, resultará necesario que en todos los tajos en los que se realicen trabajos en proximidad de líneas eléctricas se instalen pórticos limitadores de gálibo (a un lado y otro de la línea, y a una distancia tal que su montaje en ningún caso interfiera con la presencia de la línea eléctrica, al menos 10 m.), integrándose en la planificación preventiva de la empresa contratista el procedimiento de montaje de los pórticos, las condiciones mediante las que se asegurará su total estabilidad, y los medios que se instalarán en sus dinteles con el fin de que resulten visibles para los trabajadores con independencia de las condiciones ambientales existentes -banderolas, conducciones de PVC de tipo canalización eléctrica con colores llamativos, etc.-. De igual manera, en los tajos se deberán disponer carteles informativos que adviertan del riesgo eléctrico existente en la zona de los trabajos, que determinen la altura máxima de las máquinas autorizadas para la ejecución de las actividades, etc.

Si nos encontraremos situaciones de afección con líneas eléctricas que impliquen que los trabajos se deban desarrollar en paralelo al servicio, sin que haya puntos de cruce bajo el mismo (paralelismos con líneas eléctricas), se resuelven señalizando debidamente (mediante malla naranja de tipo stopper, cinta de balizamiento, etc.) una zona de seguridad determinada mediante la proyección horizontal sobre el terreno del conductor más cercano a la zona objeto de los trabajos, más una distancia igual a Dprox-2. De esta manera, el recurso preventivo que vigile el desarrollo de los trabajos comprobará que los equipos empleados durante los mismos en ningún caso invaden la zona de seguridad establecida. Por lo tanto, se deberá prohibir que en la zona delimitada se ejecute actividad alguna que implique el empleo de medios mecánicos. En caso contrario, se entendería este supuesto como el de cruce con líneas eléctricas, y resultaría por parte de aplicación lo establecido en el apartado anterior.

Líneas enterradas:

Tal y como sucede con las líneas eléctricas aéreas, en el caso de las conducciones enterradas se pueden plantear igualmente los supuestos de que los trabajos impliquen el cruce de la misma, o bien la realización de actividades en una alineación paralela al servicio. Analizaremos a continuación las dos posibilidades planteadas:

En cualquiera de los supuestos, el planteamiento inicial no varía con respecto a lo establecido para la ejecución de trabajos en el entorno de líneas eléctricas aéreas, es decir, se deberá priorizar la posibilidad de realizar las correspondientes gestiones para conseguir el descargo de la línea eléctrica.

En caso de que no sea posible el descargo, o existan dudas razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía o el particular propietario de la línea eléctrica (indefinición del comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización del descargo, etc.) se considerará que a todos los efectos la línea sigue en tensión. Llegados a este punto, pueden darse dos posibilidades:

Que sean conocidos con exactitud tanto la tensión, profundidad, trazado, como el sistema de protección de la línea. Entonces se podrá excavar mecánicamente con una retroexcavadora dotada de un cazo de limpieza, hasta una profundidad aproximada de 30 cm., eliminando así la capa superficial del terreno. En todo caso, la profundidad de excavación mediante medios mecánicos, o incluso el empleo de los mismos, se circunscribirá al hecho de que en ningún caso se pueda rebasar la distancia de proximidad establecida para este tipo de trabajos, definida como Dprox-1 conforme al contenido del R.D. 614/2001. Posteriormente se seguirá cavando mediante herramientas manuales aislantes, hasta acceder a la protección de la conducción eléctrica (bien de fábrica de ladrillo, tubo, o bien la cubierta aislante en caso de cubrición con arenas o tierras), que indica que a 20 cm.

aproximadamente está ubicado el tubo corrugado en cuyo interior se encuentra la línea eléctrica enterrada.

Tras alcanzarse mediante medios manuales el tubo corrugado que albergará a la línea eléctrica, se prohibirá que se empleen medios mecánicos (tanto durante la ejecución de las actividades -montaje de tubería,...- como más tarde durante el tapado de la excavación) que puedan invadir una zona de seguridad cifrada en al menos la Dprox-1 establecida en función de la tensión de la línea eléctrica por el R.D. 614/2001.

Durante la ejecución de los trabajos no se generará ningún tipo de afección para con la conducción eléctrica. De este manera, en el caso de que por ejemplo se debiera instalar tubería bajo el interior de la misma, ésta sería introducida en el interior de la zanja a distancia suficiente de la línea eléctrica, al menos la Dprox-1 citada, y sería posteriormente empujada de manera que nunca una máquina golpee a la conducción eléctrica durante la ejecución de los trabajos. Del mismo modo, la excavación mediante medios manuales se efectuaría hasta alcanzar la cota precisa con el objeto de permitir que la tubería deslice bajo la conducción eléctrica sin ponerla en riesgo o afectarla en ningún momento.

Si no se conociera con exactitud la localización de la línea eléctrica (en los parámetros anteriormente indicados) se solicitará a la compañía eléctrica que mediante un detector de campo defina las coordenadas de trazado de la línea en la zona a operar. Tras localizar con precisión la línea se procederá conforme a lo previsto en el punto anterior.

Tanto en una como en otra situación resultará obligado el uso de protecciones individuales específicas para el riesgo de contacto eléctrico: Guantes dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de cuero, casco, protección ocular y calzado de seguridad aislante.

En otro orden de cosas la empresa contratista deberá integrar en su Plan de Seguridad las oportunas consideraciones (puestas de manifiesto en relación a los trabajos en el entorno de líneas eléctricas) sobre vigilancia y presencia de recursos preventivos, en materia de coordinación de actividades empresariales (compañía suministradora o los propietarios de las líneas eléctricas, condiciones bajo las cuales se compruebe el corte de tensión, equipos y trabajadores autorizados para la ejecución de las actividades, traslado de la oportuna información y de las correspondientes instrucciones a todas las empresas intervinientes en las mismas, etc.). En cuanto a la primera de las cuestiones se indica que todos los trabajos que se realicen en el entorno de las líneas eléctricas enterradas deberán ser vigilados por un recurso preventivo, y desarrollarse además en presencia de un trabajador autorizado de acuerdo con el contenido del R.D. 614/2001. Por otra parte, la empresa contratista integrará en su Plan de Seguridad las medidas de emergencia y evacuación necesarias para garantizar una rápida y efectiva intervención en el supuesto de que se produjera un accidente de tipo eléctrico. Además, en el tajo se dispondrán los correspondientes carteles informativos mediante los que se advierta a todos los trabajadores del riesgo eléctrico inherente a las actividades.

En el caso de paralelismos con líneas eléctricas enterradas pueden darse nuevamente dos posibilidades, siempre en función de que sean conocidos con absoluta precisión la tensión, profundidad, traza y sistema de protección de la línea eléctrica.

Si dichos valores fueran conocidos conforme a lo establecido, se delimitaría mediante la oportuna señalización una zona de seguridad del lado de la línea eléctrica en el que se ejecuten posteriormente los trabajos (excavación en zanja, montaje de tubería y tapado de las excavaciones...) Además, dicha zona será señalizada mediante carteles de riesgo de contacto eléctrico, impartiéndose a todos los operadores de maquinaria las correspondientes instrucciones en el sentido de prohibir su actividad en el perímetro señalizado y delimitado. Como en el caso de las líneas aéreas, el recurso preventivo vigilará que en la zona que se ha delimitado no se realicen trabajos de excavación o similares.

La zona se seguridad delimitada (con la malla naranja, cinta de balizamiento,...) se definirá a una distancia de la línea eléctrica igual a la Dprox-1 que determina el R.D. 614/2001 en función de la

tensión de la línea. Finalmente, sólo se retirará la señalización dispuesta en el tajo hasta que conforme avancen los trabajos cese el riesgo de contacto eléctrico.

En el caso de que dichos valores no fueran conocidos se usarán equipos especiales de detección para realizar el levantamiento de la línea eléctrica y conocer con exactitud su profundidad y trazado. Los equipos que se empleen en estos trabajos de detección estarán perfectamente calibrados con el objeto de garantizar la eficacia en la detección. Una vez definida la localización exacta de la línea se actuará de acuerdo con lo previsto en el párrafo anterior.

3.1.7.3. Interferencias con vías en servicio (desvíos, cortes...)

Colocación y retirada de señalización provisional, realización de cortes de carril, desvíos, balizamiento de las zonas de trabajo…

Medios para su ejecución: Equipo de señalización de obras de carretera (juegos de señalización), presencia de peones señalistas y banderas (equipados con radiotransmisores), carros de señalización y vehículos de preaviso y distintos elementos de balizamiento (conos, paneles, new jersey...)

Riesgos:

Atropellos y golpes por vehículos
Caída de objetos en manipulación
Sobreesfuerzos
Golpes y cortes por objetos y herramientas

Medidas preventivas:

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos con la calzada en servicio, el plan de seguridad y salud definirá detalladamente las medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de paso y acceso a cada tajo de los operarios y de la maquinaria y vehículos de obra. Las señales y elementos de balizamiento a utilizar cumplirán las especificaciones de la Norma 8.3 de la Instrucción de Carreteras del Ministerio de Fomento, así como del Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y de la Señalización móvil de obras del Ministerio de Fomento.

En ningún caso se invadirá un carril de circulación, aunque sea para trabajos de poca duración, sin antes colocar la señalización y el balizamiento adecuados. En carreteras con más de un carril asignado a un sentido de circulación, se evitará en lo posible el cierre de más de uno de ellos y siempre se empezará por cerrar el situado más a la izquierda según dicho sentido.

Ningún vehículo, maquinaria, útiles o materiales serán dejados en la calzada durante la suspensión de las obras.

Normalmente, un trabajador con la bandera roja se colocará en el arcén adyacente al carril cuyo tráfico está controlado o en el carril cerrado al tráfico. A veces puede colocarse en el arcén opuesto a la sección cerrada. Bajo ninguna circunstancia se colocará en el carril abierto al tráfico. Debe ser claramente visible al tráfico que está controlado desde una distancia de 150 m. Por esta razón debe permanecer sólo, no permitiendo nunca que un grupo de trabajadores se congregue a su alrededor. Para detener el tráfico, el trabajador con la bandera hará frente al mismo y extenderá la bandera horizontalmente a través del carril en una posición fija, de modo que la superficie completa de la bandera sea visible. Para requerir una mayor atención puede levantar el brazo libre, con la palma de la mano vuelta hacia el tráfico portando siempre en la otra mano el disco de “STOP” o “prohibido el paso”.

Cuando se permita a los vehículos continuar en su marcha, el hombre se colocará paralelamente al movimiento de tráfico, con el brazo y la bandera mantenidas en posición baja, indicando el

movimiento hacia delante con su brazo libre, no debe usarse la bandera roja para hacer la señal de que continúe el tráfico, se utilizará el disco azul de “paso permitido”.

Los señalistas se colocarán después de las señales de manera que los conductores hayan pasado, antes de encontrarse el señalista, toda la señalización de obra.

El señalista estará atento al radiotransmisor para coordinarse con el compañero situado al otro extremo del tajo, y atento también al tráfico.

Los señalistas se colocarán lo más próximo posible a la zona de la cuneta y nunca detrás o en medio de curvas sin visibilidad, sino en tramos rectos. Si se tienen que desplazar lo harán por el arcén o lo más próximo posible a él.

Las desviaciones deberán proyectarse para que puedan ser recorridas a velocidades que no produzcan retenciones.

Medidas para la colocación y retirada de la señalización provisional.
La señalización provisional de obra a colocar durante la ejecución de los trabajos se describe en el Anejo correspondiente del Proyecto, definiendo en este apartado el proceso de colocación y retirada de la misma. Para ello se planificarán los tajos de tal manera que la primera actividad a ejecutar antes de cualquier trabajo sea la colocación de la señalización correspondiente para desviar el tráfico de la zona a ocupar, de acuerdo con la 8.3-IC.

La señalización de obra está prevista para que dadas las condiciones de la obra, y la necesidad de mantener el tráfico rodado por la calzada, existan las mínimas situaciones de riesgo tanto para los trabajadores de la obra como para los usuarios de la vía.

Antes de iniciar los trabajos en un tajo próximo a la calzada, esta deberá estar debidamente señalizada. De igual forma, cuando deje de existir la causa de la señalización, esta se retirará inmediatamente.

La señalización a colocar deberá estar en perfectas condiciones de conservación y limpieza.

Cuando se mantenga la señalización durante la noche o en otras condiciones de escasa visibilidad todos los elementos que compongan la señalización deberán ser reflectantes y deberán ser complementados con balizas luminosas.

Todas las señales y paneles direccionales se colocarán siempre perpendiculares al eje de la vía, nunca inclinadas o giradas.

Toda señal que implique una prohibición u obligación deberá ser repetida a intervalos de 1 minuto y anulada en cuanto sea posible.

Las señales se irán colocando en el mismo orden en que vaya a encontrárselas el usuario, de modo que el personal que las coloque esté siempre precedido de las señales ya colocadas.

Se colocará un remolque de señalización previo a la zona donde se vaya a colocar la primera señal (remolque de señalización con chasis equipado, como mínimo, con un bastidor trasero TB-14 según reglamento del Ministerio con tres focos de xenón flash sincronizados y un bastidor para señales en la parte inferior amarrado al chasis).

Mediante un vehículo dotado de señalización luminosa circulando por el arcén se descarga la señalización. El vehículo estacionará en el arcén antes de la zona a señalizar, y con la señalización luminosa en funcionamiento.

Para la colocación definitiva de las señales, los operarios andarán por fuera de la calzada, si no es posible, lo harán por el arcén, siempre lo más alejado posible de la zona de circulación. Colocarán las

señales en zona visible, perpendicularmente al eje de la vía y en el sentido en el que la circulación se las encuentre.

En el caso de corte de carril, para la colocación de los paneles y los elementos de balizamiento se situarán dos señalistas que cortarán el tráfico, y que estarán dotados de comunicación entre ellos así como de paletas de señalización.

Al retirar la señalización y los elementos de balizamiento, una vez despejada la vía y restauradas las condiciones de la misma, se procederá en el orden inverso al de su colocación.

Primero se retirarán los elementos de balizamiento cargándolos en el vehículo estacionado en el arcén, se desplazarán a continuación las señales de forma que no sean visibles para el tráfico, de donde serán recogidas por un vehículo. Deberán tomarse las mismas precauciones que en el caso de la colocación, permaneciendo siempre el operario en la parte de la calzada aislada al tráfico, y con el remolque de señalización previo a la zona de trabajo.

Siempre que en la ejecución de una operación hubiera que ocupar parcialmente el carril de marcha normal, se colocará previamente la señalización prevista en el caso de trabajos en este carril ocupándolo en su totalidad, evitando dejar libre al tráfico un carril de anchura superior a las que establezcan las marcas viales, ya que podría inducir a algunos usuarios a eventuales maniobras de adelantamiento.

Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico.

Queda terminantemente prohibido el atravesar las vías abiertas al tráfico por lugares no permitidos para ello.

Una vez delimitada físicamente la zona de trabajo, todo el personal y maquinaria de la obra estarán en dicha zona. Siempre que sea necesario entrar o salir de ella, se informará a los señalistas que podrán indicar cuándo se puede realizar la maniobra.

En el plan de seguridad se deberá establecer el procedimiento para organizar la entrada y salida, así como la zona de aparcamiento, para los vehículos y maquinaria que accedan a la zona de obra.

Todo el personal que se dedica a las tareas de señalización deberá llevar un chaleco con bandas reflexivas de alta visibilidad, según la norma UNE-EN-471.

Para el mantenimiento y reposición de la señalización existente en obra, se dispondrá un servicio especial de vigilancia. Dicho servicio estará compuesto por un operario con vehículo-furgoneta, convenientemente identificado y equipado (extintor, botiquín, etc) y diverso material para reposición de señalización y balizamiento.

Los trabajos aquí tratados serán ejecutados por personal especializado.

Se prohíbe que ningún operario transporte una señal atravesando zonas abiertas al tráfico.

3.2. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que pueden ser utilizadas durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de trabajo peligrosas o riesgos para los trabajadores, se relacionan a continuación. Las condiciones de seguridad de dichas máquinas y equipos o de aquéllos que, efectivamente, sean finalmente utilizados por el contratista, serán exigibles en la obra y, como tales, figuran en el pliego de condiciones del presente estudio. Para cada una de las máquinas, equipos de trabajo e instalaciones previstos en las diferentes fases de la obra proyectada, se identifican y relacionan sus riesgos y medidas preventivas:

3.2.1. Maquinaria de movimiento de tierras

3.2.1.1. Retroexcavadoras, excavadora mixta, miniexcavadora (bob – cat), pala cargadora, buldózer.

Tipo de máquina: Excavadoras (de cadenas o de ruedas) y retrocargadoras

Tajos en los que se prevé usarla: Excavación de cimentaciones, reparación de obras de fábrica, construcción de escolleras.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación o desprendidos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamientos por partes móviles
Atropellos y golpes por vehículos
Exposición a contactos eléctricos
Vibraciones
Proyección de fragmentos o partículas

Medidas preventivas:

Además de las medidas generales de maquinaria, las cuales deberán ser concretadas con más detalle por el plan de seguridad y salud, se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras que vayan a emplearse en la obra, la normativa de acción preventiva y, específicamente, la que recoja las siguientes normas mínimas:

Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de retroceso en correcto estado de funcionamiento.

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas. Esta zona se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. Conforme vaya avanzando la retroexcavadora, se delimitará con cinta la zona de seguridad. Estas precauciones deberán extremarse en presencia de otras máquinas, en especial, con otras retroexcavadoras trabajando en paralelo. En estos casos será recomendable la presencia de un señalista.

La retroexcavadora deberá llevar apoyada la cuchara sobre la máquina durante los desplazamientos, con el fin de evitar balanceos.

Los ascensos o descensos de las cucharas en carga se realizarán siempre lentamente.

Se prohibirá el transporte de personas sobre la retroexcavadora, en prevención de caídas, golpes y otros riesgos.

Se prohibirá utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder así a trabajos elevados y puntuales.

Se prohibirá realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.

Antes de abandonar la máquina deberá apoyarse la cuchara en el suelo.

Quedará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.

Si, excepcionalmente, se utiliza la retroexcavadora como grúa, deberán tomarse las siguientes precauciones:

La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues.

El cuelgue se efectuará mediante ganchos o mosquetón de seguridad incorporado al balancín.
Los tubos se suspenderán siempre de los extremos (dos puntos), en posición paralela al eje de la zanja, con la máquina puesta en la dirección de la misma y sobre su directriz. Puede emplearse una uña de montaje directo.

La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios y la maniobra será dirigida por un especialista.

El cambio de posición de la retroexcavadora se efectuará situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).

Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de seguridad del alcance del brazo de la retroexcavadora. Esta señal se irá desplazando conforme avance la excavación.

Se prohibirá verter los productos de la excavación con la retroexcavadora a menos de 2 m del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los riesgos por sobrecarga del terreno.

Con objeto de evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, el maquinista deberá apoyar primero la cuchara en el suelo, parar el motor, poner en servicio el freno de mano y bloquear la máquina. A continuación, podrá ya realizar las operaciones de servicio que necesite

3.2.1.2. Motoniveladora

Tipo de máquina: Niveladoras

Tajos en los que se prevé usarla: Nivelación de terrenos, perfilar taludes en terraplenes y desmontes, cunetas en caminos.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación o desprendidos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamientos por partes móviles
Atropellos y golpes por vehículos
Exposición a contactos eléctricos
Vibraciones
Proyección de fragmentos o partículas

Medidas preventivas:

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado y debidamente instruido, con una formación específica adecuada.

No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra sentado en el puesto del operador.

Estacione siempre que pueda la máquina en un terreno nivelado.

Inspeccione visualmente alrededor de la máquina antes de subir a ella.

Examine el mando de la tornamesa para ver si tiene fugas. Si hay fugas, corríjalas.

Examine la hoja y las cantoneras para ver si están desgastadas, dañadas, flojas o si faltan. Haga las reparaciones necesarias.

Examine la hoja para ver si está dañado, flojo o si le faltan pernos. Haga las reparaciones necesarias.

Examine el punto de pivote para ver si se ha acumulado tierra o basura. Si hay, retírela.

Examine las cajas del tándem para ver si hay fugas o si se ha acumulado basura. Corrija las fugas y saque la basura.

Observe el indicador del filtro de aire.

Examine el sistema de enfriamiento por si hay fugas o acumulación de suciedad, el sistema hidráulico por si hay fugas, los neumáticos para asegurarse que están inflados correctamente y que no tienen daños importantes. (Comprobar la presión), el tablero de instrumentos que funcionen todos los indicadores correctamente.

Vea si las escaleras y pasamanos están en buen estado y limpios.

Mantenga limpia la cabina del operador.

Mantenga el nivel de aceite en el motor, del sistema del tren de fuerza y de los implementos hidráulicos entre las marcas que indican ADD (MIN) y FULL (MAX), en la varilla.

Mantenga el refrigerante del motor por encima de la marca que señala el nivel bajo.

Abrir las válvulas de drenaje de combustible, quitar condensaciones de agua y sedimentos.

Comprobar funcionamientos de frenos, dispositivos de alarma y señalización.

Ajuste el retrovisor superior y el retrovisor del lado derecho antes de operar la máquina. Le proporcionan mejor visibilidad de la parte trasera de la máquina.

Si durante la utilización de la máquina, observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior.

Arranque el motor solo sentado en el puesto del operador.

Ajústese el cinturón de seguridad y el asiento.

En el entorno de la máquina, se prohibirá la realización de trabajos o la permanencia de personas.

Cerciórese que no hay nadie trabajando en la máquina, debajo o cerca de la misma.

Ponga todos los controles de los implementos en su posición FIJA.

Ponga la palanca de control en posición NEUTRAL y conecte el freno de estacionamiento.

No lleve otras personas en la maquinaria a no ser que esté preparada para ello.

Lleve los implementos a unos 40 cm, del suelo, y permanezca a una distancia prudencial de voladizos, barrancos, etc.

Cuando sea posible en las laderas avance hacia arriba y hacia abajo, nunca en sentido transversal.

3.2.1.3. Pisones y compactadores

Tipo de máquina: Rodillos vibrantes de pequeño y gran tamaño

Tajos en los que se prevé usarla: Compactación de rellenos y baches.

Riesgos:

Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Vibraciones

Medidas preventivas:

Al objeto de evitar accidentes, antes de poner en funcionamiento un pisón, el operario deberá asegurarse de que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras.

El pisón deberá guiarse en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales.

Se exigirá siempre la utilización de botas con puntera reforzada.

Será obligatorio utilizar cascos o tapones antirruido para evitar posibles lesiones auditivas.

Para el uso de compactadores más grandes se seguirán las siguientes indicaciones:

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

No habrá personal en la zona de trabajo del compactador.

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa.

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria.

3.2.1.4. Rodillo Lanza (rana)

Tipo de máquina: Equipo de trabajo compactador con uno o más cilindros metálicos. Los equipos de desplazamiento, dirección, frenado y vibración están dispuestos de manera que la máquina funciona asistida por un operario.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación.
Golpes contra objetos inmóviles.

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.

Hay que cargar el combustible con el motor parado.

Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.

Evitar inhalar vapores de gasolina.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

3.2.1.5. Camiones y dúmperes

Tipo de máquina: Camión de transporte

Tajos en los que se prevé usarla: Retirada de productos a vertedero (fresados, excavación…)

Riesgos:

Atropello y golpes por vehículos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Exposición a contactos eléctricos
Proyección de fragmentos o partículas
Vibraciones

Medidas preventivas:

El conductor de cada camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con respeto a las normas del código de circulación y cumplirá en todo momento la señalización de la obra.

El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se describa en los planos del plan de seguridad y salud de la misma.

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los lugares señalados en los planos para tal efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de inmovilización de lar ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, serán gobernadas desde la caja del camión por un mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso.

El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.

Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de la manera más uniformemente repartida posible.

El gancho de la grúa auxiliar, si existe, estará siempre dotado de pestillo de seguridad

El maquinista deberá utilizar guantes o manoplas de cuero para evitar lesiones en las manos.

El maquinista deberá emplear botas de seguridad para evitar aplastamientos o golpes en los pies.

El acceso a los camiones se realizará siempre por la escalerilla destinada a tal fin.

El maquinista cumplirá en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.

Quedará prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave.

A los conductores de los camiones, cuando traspasen la puerta de la obra se les entregará la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):

“Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del señalista. Si desea abandonar la cabina del camión utilice siempre el casco de seguridad que se le ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga.”

Los camiones dúmper a emplear en la obra deberán ir dotados de los siguientes medios en correcto estado de funcionamiento:

Faros de marcha hacia delante

Faros de marcha de retroceso

Intermitentes de aviso de giro

Pilotos de posición delanteros y traseros

Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja

Servofrenos

Frenos de mano

Bocina automática de marcha retroceso

Cabinas antivuelco

Pueden ser precisas, además: cabinas dotadas de aire acondicionado, lonas de cubrición de cargas y otras.

Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocinas, neumáticos, etc. en prevención de los riesgos por mal funcionamiento o avería.

El trabajador designado de seguridad será el responsable de controlar la ejecución de la inspección diaria, de los camiones dúmper.

A los conductores de los camiones dúmper se les hará entrega de la siguiente normativa preventiva:

Suba y baje del camión por el peldañeado del que está dotado para tal menester, no lo haga apoyándose sobre las llantas, ruedas o salientes. Durante estas operaciones, ayúdese de los asideros de forma frontal.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar atrapado.

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deban realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso mediante enclavamiento.

No permita que las personas no autorizadas accedan al camión, y mucho menos que puedan llegar a conducirlo.

No utilice el camión dúmper en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero. Luego, reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha instalado el freno de mano.

No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión dúmper, pueden producir incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente la tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío.

No fume cuando manipule la batería ni cuando abastece de combustibles, puede incendiarse.

No toque directamente el electrolito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, hágalo protegido con guantes de goma o de PVC.

Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión dúmper por alguna causa, desconecte el motor y extraiga la llave de contacto totalmente.

No libere los frenos del camión en posición de parada si antes no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables.

Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido en la que el camión se va. De esta forma conseguirá dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo más suave posible, o bien, introdúzcase en terreno blando.

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del camión, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitará graves accidentes.

Evite el avance del camión dúmper con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehículo con la caja levantada.

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja.

Si establece contacto entre el camión dúmper y una línea eléctrica, permanezca en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin tocar tierra y camión de forma simultánea, para evitar posibles descargas eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy peligroso.

Se prohibirá trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones dúmper.

Aquellos camiones dúmper que se encuentren estacionados, quedarán señalizados mediante señales de peligro.

La carga del camión se regará superficialmente para evitar posibles polvaredas que puedan afectar al tráfico circundante.

Los caminos de circulación interna para el transporte de tierras serán los que se marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.

Se prohibirá cargar los camiones dúmper de la obra por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

Todos los camiones dúmper estarán en perfectas condiciones de conservación y de mantenimiento, en prevención del riesgo por fallo mecánico.

Tal y como se indicará en los planos del plan de seguridad y salud, se establecerán fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un mínimo de dos metros del borde de los taludes, en prevención del vuelco y caída durante las maniobras de aproximación para vertido.

Se instalarán señales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los lugares de vertido de los dúmperes, en prevención de accidentes al resto de los operarios.

Se instalará un panel ubicado a 15 m del lugar de vertido de los dúmperes con la siguiente leyenda: “NO PASE, ZONA DE RIESGO. es posible que LOS CONDUCTORES NO LE VEAN; APÁRTESE DE ESTA ZONA”.

3.2.2. Medios de hormigonado

3.2.2.1. Camión hormigonera

Tipo de máquina: Para transporte y vertido de hormigón.

Tajos en los que se prevé usarla: Hormigonado en general

Riesgos:

Atropellos y golpes por vehículos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamiento
Caída de personas a distinto nivel
Contacto con sustancias nocivas, caústicas
Proyección de partículas

Medidas preventivas:

La circulación de este camión en el interior de la obra se atendrá escrupulosamente a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la señalización en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20º.

La puesta en estación y todos los movimientos del camión hormigonera durante las operaciones de vertido serán dirigidos por un señalista, que cuidará de la seguridad de atropellos o golpes por maniobras súbitas o incorrectas.

Las operaciones de vertido de hormigón a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se efectuarán de forma que las ruedas del camión hormigonera no sobrepasen una franja de dos metros de ancho desde el borde.

Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.

La maniobra de vertido será dirigida por un operario que vigilará que no se realicen maniobras inseguras.

Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos.

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocación y vibrado del hormigón tendrán la obligación de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado), gafas de seguridad y guantes de cuero (en vertido).

3.2.2.2. Camión Bomba de Hormigón

Tipo de máquina: Equipo de trabajo que impulsa, a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión.

Tajos en los que se prevé usarla: Hormigonado de zonas con especial dificultad para acceder con camión hormigonera.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

El encargado del manejo del equipo será siempre especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba, en prevención de accidentes por impericia.

Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento prohibiéndose expresamente su modificación o manipulación para evitar accidentes.

El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado su diseño, prohibido usar ésta como grúa o elevador de personas para la realización de trabajos puntuales.

Las bombas para hormigón estarán previstas del certificado de su revisión anual en los talleres indicados por el fabricante.

Su posición en la obra será siempre horizontal, y distará al menos un metro de la zona señalizada de seguridad que servirá de pasillo de servicio medidos desde el punto de apoyo de los estabilizadores.

Antes del bombeo se revisarán los siguientes puntos: se comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y que los gatos estabilizadores estén completamente extendidos. Así mismo se verificará que la zona donde se coloque el camión es horizontal y que no dista menos de 3 m del borde de un talud, zanja o corte del terreno (2m de seguridad + 1m de paso de servicio como mínimo).

Durante el bombeo, la zona donde se ejecutan los trabajos debe quedar debidamente aislada del resto.

Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación, en prevención de accidentes por tapones de hormigón.

Antes de iniciar el suministro asegúrese que todos los acoplamientos de palanca tienen posición de inmovilización los pasadores. Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará accidentes.

No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha, si debe de efectuar trabajos en la tolva o el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera.

No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería o semiavería, detenga el servicio de la máquina, efectúe la reparación y sólo entonces debe seguir suministrando hormigón.

Compruebe diariamente, antes del inicio de suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de tuberías pueden ocasionar accidentes de seriedad. Desconfíe de su buen tino a medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Utilice el medidor de espesores, es más seguro.

Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo de presión. Invierta el Bombeo y podrá comprobar sin riesgos.

La manguera de salida del hormigón será manejada como mínimo por dos operarios.

3.2.2.3. Hormigonera eléctrica

Riesgos:

Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atropamientos por o entre objetos
Caída de personas al mismo nivel
Contactos eléctricos
Proyección de partículas y fragmentos
Exposición a agentes químicos y físicos

Medidas preventivas:

Se utilizarán hormigoneras eléctricas con el marcado CE o adecuación al RD 1215/97.

Se repararán por personal autorizado.

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

Se seguirán las instrucciones del fabricante.

Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Antes de empezar a trabajar se limpiarán los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Se evitará la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.

La hormigonera dispondrá de freno de basculación del bombo.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.

No se abandonará el equipo en funcionamiento.

Se desconectará el equipo de la red eléctrica cuando no se esté utilizando.

Se realizarán mantenimientos periódicos de los equipos.

Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico.

Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas…deben estar protegidas.

En la vía pública esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.

Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones protectores.

Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco, gafas, guantes contra agresiones químicas, protectores auditivos, calzado de seguridad y ropa de trabajo.

3.2.2.4. Vibrador de hormigón

Tipo de máquina: Se trata de una herramienta manual con la que se vibra el hormigón. Funciona con un grupo electrógeno.

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Exposición a sustancias nocivas (cáusticas o corrosivas)
Exposición a contactos eléctricos
Posturas forzadas
Exposición a agentes físicos: vibraciones

Medidas preventivas:

Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.

El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde plataformas de trabajo.

Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte y lluvia.

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco, gafas, guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones, calzado de seguridad (botas de goma) y ropa de trabajo.

3.2.3. Medios de fabricación y puesta en obra de firme y pavimentos

3.2.3.1. Camión cisterna de riegos

Tipo de máquina: Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de fluidos.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por vuelco de la máquina.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado.

El regador de betún usará el equipo de regador que le proteja de gases y quemaduras.

En las operaciones del regador, tener muy presente la dirección del viento.

En caso de quemadura, no use disolvente para quitar el betún de la zona quemada.

Usar ropa y prendas que eviten el contacto con los materiales bituminosos.

Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina.

El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin.

No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento.

Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos.

En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar.

No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto.

Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de un señalista experto que lo guíe.

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra.

Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes.

Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han extraído.

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección adecuados.

En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la batería en posición de desconexión.

Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina estacionada.

Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en contenedores.

Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

3.2.3.2. Extendedora de aglomerado asfáltico

Tipo de máquina: Equipo de trabajo que se utiliza para extender las diferentes capas de mezclas bituminosas en caliente.

Riesgos:

Atropellos y golpes por vehículos
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Quemaduras

Medidas preventivas:

No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos.

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras.

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas.

Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., desmontables para permitir una mejor limpieza.

Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la máquina.

Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de extendido, en prevención de accidentes.

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se adherirán las siguientes señales:

“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”.

Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”.

3.2.3.3. Compactador de neumáticos

Tipo de máquina: Equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas bituminosas en caliente tras su tendido.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica de marcha atrás.
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las normas de circulación y a las señales de tráfico.
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del trabajo diario.
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.

3.2.3.4. Rodillo vibrante autopropulsado

Tipo de máquina: Equipo de trabajo que se utiliza para compactar

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina.

Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta.

La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta tendrán revestimiento antideslizante.

El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de aglomerado.

Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina.

Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina.

Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de faja antivibratoria.

3.2.3.5. Camión basculante

Tipo de maquina: Equipo de trabajo de gran capacidad de carga utilizado preferentemente en el transporte de materiales en canteras y en operaciones de movimiento de tierra en las obras.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo momento la señalización de la obra.

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso.

Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha.

Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de comenzar la elevación de la caja.

El plan de seguridad definirá las medidas a establecer para bascular en estas zonas.

Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante enclavamiento.

3.2.3.6. Fresadora

Tipo de maquina:

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del firme de una carretera.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

Se entregarán al operador las siguientes instrucciones:

Circulará siempre a velocidad moderada.

Hará uso del claxon cuando sea necesario apercibir de su presencia y siempre que vaya a iniciar el movimiento de marcha atrás, iniciándose la correspondiente señal acústica para este tipo de marcha.

Al abandonar la marcha se asegurará de que esté frenada y no pueda ser puesta en marcha por persona ajena.

Usará casco siempre que esté fuera de la cabina.

Cuidará adecuadamente la máquina, dando cuenta de fallos o averías que advierta, interrumpiendo el trabajo siempre que estos fallos afecten a frenos o a dirección hasta que la avería quede subsanada.

Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

Se suministrarán al operador las siguientes instrucciones adicionales:

Extreme las precauciones ante taludes y zanjas

En los traslados, circule siempre con precaución

Vigile la marcha atrás y accione la bocina

No permita el acceso de personas, máquinas y vehículos a la zona de trabajo de la máquina, sin previo aviso

3.2.3.7. Barredora

Tipo de maquina: Barrer y limpiar las superficies de los diferentes pavimentos.

Riesgos:

Caída de personas a diferente nivel.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por vuelco de máquinas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos y golpes por vehiculos
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones.

Medidas preventivas:

El operario a los mandos de la barredora empleará mascarilla frente a la inhalación del polvo levantado por el cepillo en su movimiento giratorio.

Este trabajador estará debidamente formado y expresamente autorizado en el y para el manejo de este tipo de maquinaria.

Al abandonar la máquina quitar la llave de contacto.

La máquina sólo puede ser ocupada por una persona.

La máquina barredora solamente puede utilizarse para realizar trabajos de barrido y limpieza de calzadas firmes para el tráfico rodado.

Antes de poner en funcionamiento la máquina barredora es preciso comprobar los puntos siguientes:

Verificar la perfecta visión de la barredora y de la calzada.

Verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de alerta (bocina, alumbrado de precaución, etc.) y comprobar sus condiciones de seguridad.

Comprobar la hermeticidad de las conducciones hidráulicas y el correcto apriete de las conexiones.

Verificar la ausencia de cualquier tipo de deterioro en las mangueras.

Compruebe los niveles de combustibles, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor.

No ponga en funcionamiento el motor en locales cerrados, sin la instalación del tubo de escape con salida al exterior.

Inspeccionar alrededor de la máquina observando si hay alguien debajo, y mirando si hay manchas de aceite u otros líquidos en el suelo para detectar posibles fugas.

Si durante la utilización de la máquina observa cualquier anomalía, comuníquelo inmediatamente a su superior.

El motor no debe mantenerse en funcionamiento en sitios cerrados sin sistemas de ventilación apropiados.

La eliminación de la basura recogida deberá realizarse conforme a las normas de protección del medio ambiente.

El operador deberá disponer de protectores auditivos, no se deberá barrer en zonas donde el polvo sea peligroso para la salud.

En la máquina deben mantenerse siempre bien legibles y completas todas las indicaciones de seguridad y protección.

Para quitar de la máquina objetos que quedan enredados (por ejemplo, alambres) deberá utilizarse la herramienta apropiada (por ejemplo, un gancho adecuado) y guantes de trabajo.

Antes de abrir cualquier conducción hidráulica es preciso primero eliminar la presión.

En la manipulación de baterías es preciso tener en cuenta las normas especiales. (Guantes de trabajo y gafas protectoras)

Antes de realizar cualquier tipo de intervención en el sistema eléctrico, desconectar la batería.

Cierre bien la máquina y asegúrela contra la utilización de personal no autorizado y vandalismo.

Durante su funcionamiento llevará conectado el rotativo luminoso.

3.2.4. Maquinaria y herramientas diversas

3.2.4.1. Camión grúa-pluma

Tipo de maquina: Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma.

Riesgos:

Atropellos y golpes por vehículos
Caída de objetos en manipulación
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Vuelco
Atropamiento por o entre objetos
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:
Con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud, se tendrán en cuenta las siguientes:

Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un especialista.

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de pestillos de seguridad

Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión.

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.

Estará terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados de la misma

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.

Todas las zanjas, desniveles así como la existencia de líneas eléctricas aéreas, habrán sido tenidas en consideración antes de la llegada al tajo del camión grúa, y estarán señalizadas y balizadas de manera que se asegure que no interfieren en los trabajos.

Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.

Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno para evitar golpes y balanceos.

Se prohíbe la permanencia de personas en la zona de influencia de los movimientos de la grúa. Asimismo se prohíbe el paso o la permanencia de personas bajo cargas en suspensión.

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista, así como abandonar el camión con una carga suspendida.

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje sus mandos.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.

3.2.4.2. Grúa autopropulsada

Tipo de maquina: Equipo de trabajo instalado en una plataforma sobre ruedas o cadenas, con un sistema motor que le permite desplazarse de manera autónoma, dotado de un aparato de elevación.

Riesgos:

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Vuelco
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Antes de iniciar las maniobras de carga se estabilizará adecuadamente el vehículo mediante la correcta extensión de los gatos estabilizadores.

Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.

Siempre deberán aplicarse las instrucciones marcadas por el fabricante (ver el diagrama de cargas del equipo). Particularmente se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante.

Las rampas de acceso a los tajos no superarán las pendientes indicadas en el manual del fabricante para cada máquina en prevención de vuelcos.

No realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

Las cargas en suspensión se guiarán mediante cabos de gobierno para evitar golpes y balanceos.

Se prohíbe la permanencia de personas en la zona de influencia de los movimientos de la grúa. Asimismo se prohíbe el paso o la permanencia de personas bajo cargas en suspensión.

Evitar pasar el brazo de la grúa y la carga por lugares donde haya personas o donde una caída de la carga pueda causar graves daños materiales.

Subir y bajar de la grúa por los lugares previstos para ello.

Asegurar la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar un desplazamiento.

No permitir que nadie se encarame sobre la carga.

Limpiar los zapatos de grasa, aceite, grava o barro que pudieran tener antes de subir a la cabina.

Mantener la carga a la vista. Si esto no es posible ayudarse en las maniobras de uno o más señalistas.

No abandonar la máquina ni en marcha ni con la carga suspendida.

Antes de poner en servicio la máquina comprobar el buen estado de todos los dispositivos de seguridad del vehículo.

Todas las zanjas, desniveles así como la existencia de líneas eléctricas aéreas, habrán sido tenidas en consideración antes de la llegada al tajo de la grúa, y estarán señalizadas y balizadas de manera que se asegure que no interfieren en los trabajos.

Respecto al Art. 8 del Real Decreto 837/2003 por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas, se exigirá al contratista la confirmación por escrito de haber realizado la comprobación de que el terreno sobre el que vaya a trabajar la grúa tiene la resistencia suficiente, copia del carné oficial de operador de grúa móvil del gruista y la designación por escrito del Jefe de Maniobra.

3.2.4.3. Grúa torre

Tipo de maquina: Equipo de trabajo consistente en un aparato de elevación electromecánico, de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir, en el espacio, las cargas suspendidas de un gancho o de cualquier otro accesorio de aprehensión, suspendido a la vez de una pluma o de un carro que se desplaza a lo largo de una pluma orientable.

Tipología: Por la variación o no del ángulo de inclinación de la pluma: de pluma horizontal y pluma inclinada hasta un determinado ángulo.

Según su movilidad: fijas, trepadoras y desplazables en servicio.

Según su sistema de montaje: grúa torre desmontable por obra y grúa torre autodesplegable.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos en manipulación
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Vuelco
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamientos por o entre objetos
Exposición a contactos eléctricos
Incendios

Medidas preventivas:

Se utilizarán grúas torre con el marcado CE o adecuación al RD 1215/97.

Es necesario carnet de operador de grúa torre para la utilización de este equipo.

Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante.

Deben cumplirse todas las condiciones de seguridad exigibles para el montaje y utilización de las grúas torre para obras u otras aplicaciones, de acuerdo con la norma UNE 58-101-90 parte 2.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y en especial los raíles.

Debe instalarse un anemómetro para las grúas que se emplacen en lugares donde se prevé que los vientos son superiores a los vientos límite para el servicio de la misma.

El operador de la grúa torre debe disponer del manual de instrucciones para realizar sus consultas.

Al acabar el trabajo hay que subir el gancho hasta el máximo sin cargas suspendidas, y acercarlo al mástil de la grúa.

Antes de empezar a trabajar se limpiarán los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.
Levantar la carga verticalmente.

Asegurarse que el gancho disponga de pestillo de seguridad y las eslingas estén bien colocadas.

Hay que verificar en todo momento que se encuentra en equilibrio estable, es decir, que el conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad y las eslingas estén bien colocadas.

Comprobar la existencia de placas informativas instaladas en un lugar visible.

Comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra.

Comprobar que la botonera no contraindique las órdenes antes del inicio de la jornada de trabajo.

Efectuar su mantenimiento y revisión cada 4 meses, según lo que establece el RD 836/2003 y la UNE 58-101-92 parte 2.

Se ha de instalar en terreno compacto.

Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga.

En ningún momento puede entrar en contacto con líneas eléctricas y por lo tanto tienen que respetarse las distancias de seguridad.

Al finalizar la jornada tiene que dejarse la grúa en posición veleta.

Evitar almacenar productos inflamables en torno al equipo y muy especialmente en su armario eléctrico.

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

Estos equipos tienen que ser reparados por personal autorizado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

Las grúas instaladas sobre raíles tienen que cumplir, entre otras, las siguientes especificaciones: tener vías perfectamente horizontales y alineadas, una base bien fundamentada (balasto u hormigón) y una correcta unión de los carriles.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.

No se abandonará el puesto de trabajo con cargas suspendidas.

No se abandonará el equipo en funcionamiento.

Controlar visualmente las cargas suspendidas durante las maniobras.

Se prohíbe la utilización de la escalera grúa para acceder a las diferentes plantas de la obra.

Realizar la toma a tierra del cuadro eléctrico y de la estructura metálica de la grúa. En el caso de utilización de grúas sobre raíles, se realizará también la conexión a tierra de la vía.

Respetar las distancias mínimas de seguridad entre la grúa y otros elementos que indica el RD 836/2003.

Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y esfuerzo.

Se revisará el estado de los cables, cadenas y ganchos, y se anularán las eslingas de cables de acero que estén aplastadas o tengan hilos rotos.

Es necesario saber cual es la carga máxima admisible, no sólo de la grúa, sino también de los medios auxiliares que se utilicen para elevar las cargas (cables, ganchos, eslingas…)

Debe estudiarse previamente el recorrido que tiene que hacerse con la carga hasta su situación definitiva para evitar interferencias en este recorrido.

Ésta prohibido el transporte de personas con las grúas.

Los movimientos de arranque, parada o cualquier otra maniobra, deben realizarse con suavidad.

No se deben utilizar las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas adheridas u operaciones extrañas.

Ésta prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para descargarlas más lejos de su alcance.

Si alguna de las maniobras y las operaciones queda fuera del alcance visual del gruísta, este deberá ser acompañado por un señalista que conozca la norma UNE 58000.

Situar la grúa en zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando ésta supere los valores recomendados por el fabricante.

Verificar la existencia de cable fiador de la pluma de la grúa cuando se transite.

Verificar que la grúa torre dispone de una escalera de ascensión a la corona protegida con anillas de seguridad.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

El gruísta debe realizar inspecciones periódicas del estado de la grúa y lo debe anotar en el “comunicado de control mensual”.

No transportar cargas por encima del personal.

Dotar de protecciones colectivas o individuales necesarias en cualquier operación de mantenimiento que implique riesgo de caída a distinto nivel.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco, calzado de seguridad y arnés (cuando sea necesario).

3.2.4.4. Compresor

Tipo de maquina: Equipo de trabajo cuya misión consiste en producir un caudal de aire a una determinada presión según las necesidades de las máquinas que ha de accionar. Si es móvil, que es el caso más frecuente, puede transportarse fácilmente de un lugar a otro gracias a su montaje sobre chasis con ruedas.

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento
Explosiones
Incendio
Contactos térmicos
Ruido

Medidas preventivas:

El compresor será siempre arrastrado a su posición de trabajo cuidándose que no se rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de coronación de taludes y quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal, con lo que el aparato estará nivelado, y con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de pivote de nivelación, se adaptará éste mediante suplementos firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible serán realizadas siempre con el motor parado. Las carcasas protectoras del compresor estarán siempre instaladas y en posición de cerradas.

Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se señalizará claramente y se advertirá el elevado nivel de presión sonora alrededor del mismo, exigiéndose el empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.

Se comprobará sistemáticamente el estado de conservación de las mangueras y boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos

3.2.4.5. Grupo electrógeno

Tipo de maquina: Equipo de trabajo accionado por un motor diesel o de gasolina, destinado a abastecer a consumidores fuera del alcance de una red eléctrica pública.

Riesgos:

Golpes y cortes por objetos y herramientas
Atrapamiento
Explosiones
Incendio
Exposición a contactos eléctricos
Ruido

Medidas preventivas:

Es un equipo autónomo alimentado con un motor de gasoil que se utiliza para obtener energía eléctrica en aquellos puntos en los cuales no se puede acceder a la red.

Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su manejo.

El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de atmósferas tóxicas o explosivas.

El neutro ha de esta puesto a tierra en su origen.

La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado.

Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán los requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y la selectividad de las protecciones.

Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso.

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc…deberán hacerse a máquina parada y únicamente por personal especializado.

3.2.4.6. Martillo neumático

Tipo de maquina: Equipo de trabajo de conexión eléctrica, con mecanismo de golpeo por accionamiento neumático, que puede ser:

Martillo picador: utilizado para cincelar y arrancar hormigón, cimentaciones y firmes de calles, para compactar, apisonar y compactar en la fabricación de piezas.

Martillo perforador: con útiles giratorios y percutor incorporado para realizar perforaciones. Si se puede desconectar el percutor, puede utilizarse como taladradora, y si se puede desconectar el accionamiento giratorio, como martillo picador.

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Ruido
Vibraciones
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Los trabajadores que deban utilizar martillos neumáticos poseerán formación y experiencia en su utilización en obra. Los martillos se conservarán siempre bien cuidados y engrasados, verificándose sistemáticamente el estado de las mangueras y la inexistencia de fugas en las mismas. Cuando deba desarmarse un martillo, se cortará siempre la conexión del aire, pero nunca doblando la manguera.

Antes de iniciarse el trabajo, se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales a demoler, a fin de detectar la posibilidad de desprendimientos o roturas a causa de las vibraciones transmitidas por el martillo. En la operación de picado, el trabajador nunca cargará todo su peso sobre el martillo, pues éste podría deslizarse y caer. Se cuidará el correcto acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo y nunca se harán esfuerzos de palanca con el martillo en marcha.

Se prohibirá terminantemente dejar los martillos neumáticos abandonados o hincados en los materiales a romper. El paso de peatones cerca de la obra se alejará tanto como sea posible de los puntos de trabajo de los martillos neumáticos.

Los operadores utilizarán preceptivamente calzado de seguridad, guantes de cuero, gafas de protección contra impactos, protectores auditivos, mascarilla antipolvo y arnés antivibratorio.

3.2.4.7. Herramientas manuales

Tipo de maquina: Herramientas de mano para diversos trabajos

Riesgos:

Golpes y cotes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos

Medidas preventivas:
Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier sitio o por los suelos.

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.

3.2.4.8. Motosierra

Tipo de maquina: Equipo de trabajo consistente en una cadena flexible dentada unida por sus extremos y guiada por dos poleas, que movida por un motor, generalmente de explosión y guiada a través de un espadín guía, sirve para serrar.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel
Golpes y cotes por objetos y herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Sobreesfuerzos
Ruido

Medidas preventivas:

La puesta en marcha se hará en lugar distinto a donde se efectúa el abastecimiento de combustible.

El arranque de la motosierra se efectuará colocando esta en el suelo verificando que la cadena no esté en contacto con ningún obstáculo.

Mantener las piernas separadas, consiguiendo una máxima proximidad con la máquina, repartiendo el poso de la forma más favorable posible.

Antes de aproximar la sierra al tronco revolucionar el motor lo más posible con el fin de evitar que los diente4s se traben en la madera y arrastren consigo a la máquina.

En el desramado emplear el tronco como protección, para evitar posibles cortes con la cadena en las piernas.

Se tendrán en consideración las instrucciones recogidas en el Manual de Seguridad editado por el Instituto Navarro de Salud Laboral.

3.2.4.9. Tronzadora

Tipo de maquina: Se denomina tronzadora o ingletadora a la máquina utilizada en obra para el corte de madera a un ángulo determinado a derecha e izquierda del plano normal de contacto del disco con la madera, pudiendo cortar asimismo a bisel.

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Exposición a agentes químicos (polvo) y físicos (ruido y vibraciones).
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Utilizar tronzadoras con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

Se sustituirá el disco de corte en cuanto se desgaste más allá de la zona marcada.

Se evitará cualquier empuje perpendicular a las caras del disco, para evitar que se rompa y salte al girar.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: protectores auditivos, gafas o pantallas de protección con cristal transparente, mascarilla, calzado de seguridad y guantes contra agresiones mecánicas.

3.2.4.10. Radial

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Exposición a agentes químicos (polvo) y físicos (ruido y vibraciones).
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Utilizar radiales con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.

Se mantendrán todos los resguardos de la máquina en perfectas condiciones, y bajo ningún concepto se modificarán o retirarán los mismos.

Se trabajará con el disco adecuado a cada tipo de material.

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.

Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: protectores auditivos, gafas, mascarilla, calzado de seguridad y guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.

3.2.4.11. Taladro

Tipo de maquina: Taladro sin percusión: herramienta eléctrica destinada a taladrar diferentes materiales como metales, madera, materiales sintéticos, etc.

Taladro con percusión: herramienta eléctrica destinada a taladrar especialmente hormigón, piedra y otros materiales duros similares (específicamente sobre piedra, mampostería, materiales duros y trabajos ocasionales de perforación en hormigón). Dispone de un mecanismo de carraca o engranajes dentados de impulsión de efecto axial, que se superpone al rotativo realizado por el husillo de accionamiento.

Riesgos:

Caída de objetos por manipulación.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

Posturas forzadas.
Exposición a agentes químicos (polvo) y físicos (ruido y vibraciones).

Medidas preventivas:

Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997.

Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

Seguir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir.

Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación.

Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se pare la máquina de manera automática.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica o de la batería.

Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma correcta los pies.

Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que agujerear.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o agrietadas.

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando no se utilice.

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado.

Hay que verificar que los accesorios están en perfecto estado antes de su colocación.

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación.

Se han de almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso y preferiblemente con su embalaje original.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco (, protectores auditivos, gafas, mascarilla, calzado de seguridad, ropa de trabajo, y guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones.

3.2.4.12. Cortadora de pavimentos

Tipo de maquina: Equipo de trabajo que se utiliza para cortar pavimentos mediante el movimiento rotatorio de un disco abrasivo.

Riesgos:

Atropamientos por las correas de transmisión
Proyección de fragmentos o partículas
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Sobreesfuerzos
Exposición a agentes químicos (polvo) y físicos (ruido y vibraciones).
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Esta máquina estará siempre a cargo de un especialista en su manejo que, antes de iniciar el corte, se informará de posibles conducciones subterráneas o de la existencia de mallazos o armaduras en el firme, procediéndose al replanteo exacto de la línea de sección a ejecutar, a fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la cortadura. Los órganos móviles de la cortadora estarán siempre protegidos con la carcasa de origen de fabricación.

El corte se realizará en vía húmeda, mediante conexión al circuito de agua, para evitar la creación de un ambiente pulvígeno peligroso.

El manillar de gobierno de la cortadora estará correctamente revestido de material aislante eléctrico.

Se prohibirá terminantemente fumar durante la operación de carga de combustible y ésta se efectuará con la ayuda de embudo, para evitar derrames innecesarios.

Los trabajadores ocupados en la labor de corte de pavimento utilizarán protectores auditivos, guantes y botas de goma o de P.V.C., así como gafas de seguridad y mascarillas de filtro mecánico o químico, si la operación ha de realizarse en seco, con independencia de los equipos individuales de protección de uso general en la obra.

3.2.4.13. Sierra circular de mesa

Tipo de maquina:

Sierra de disco de diamante: Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas cerámicas compuesto por una mesa fija y un disco de sierra accionado por un motor dotado de un movimiento longitudinal.

Sierra de disco: Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas de madera, formado por una mesa y un disco de sierra fija y accionado por un motor.

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Contactos eléctricos.
Posturas forzadas.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo.
Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos.

Medidas preventivas:

Este equipo únicamente debe ser utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica adecuada.

Antes de poner en marcha el equipo: compruebe que la máquina está nivelada y sobre una base estable; compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de la máquina; compruebe el correcto estado de conexiones, cables y toma de tierra; compruebe que el disco tiene todos los dientes en perfectas condiciones y que es el adecuado para el material a cortar; compruebe que las revoluciones de la máquina y del disco son compatibles.

Compruebe bien la fijación del disco y que gira en sentido correcto.

Compruebe que el diámetro del disco es el adecuado para la carcasa protectora.

No trabajar nunca si no está colocado el protector del disco.

No retire nunca el cuchillo divisor.

Antes de cortar una pieza cerciórese de que no tiene nudos, clavos o cualquier defecto que pueda hacer peligroso el corte.

El corte debe hacerse con las manos separadas del disco.

Para cortar las piezas pequeñas utilice un empujador apropiado, nunca lo haga con los dedos pulgares de las manos extendidos.

No retire los trozos residuales ni las virutas con el disco en funcionamiento.

Haga todas las operaciones de limpieza y mantenimiento con el equipo desconectado.

Compruebe que todas las protecciones de los elementos móviles están instaladas.

Si tiene que trabajar con piezas muy pesadas manéjelas siempre con elementos mecánicos.

Al terminar de cortar desconecte la máquina.

Conecte siempre la sierra a un cuadro normalizado provisto de protección diferencial y toma de tierra.

Mantenga seco el lugar de trabajo.

No lave nunca la máquina con agua a presión.

Procure que en su zona de trabajo el suelo esté limpio de aceite, grasas, trozos de madera o cualquier elemento que pueda potenciar un riego de caída.

3.2.4.14. Batidora para mortero

Tipo de maquina: Se trata de una herramienta manual con la que se realiza la mezcla de agua, cemento y aditivos para su posterior inyección. Funciona con un grupo electrógeno.

Riesgos:

Proyección de fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos

Exposición a sustancias nocivas
Exposición a contactos eléctricos

Medidas preventivas:

Se trata de una herramienta manual con la que se realiza la mezcla de agua, cemento y aditivos para su posterior inyección. Funciona con un grupo electrógeno.

Las batidoras de mortero sólo se deben utilizar para los fines para los cuales están diseñadas.

El manejo, mantenimiento y conservación de la máquina solamente se debe encargar a personas que hayan sido instruidas y autorizadas por la empresa.

Antes de cualquier puesta en funcionamiento se debe verificar el estado general de la máquina y la seguridad de funcionamiento.

Las reparaciones, ajustes o sustituciones de componentes de la máquina solamente deben ser realizados por personal competente.

Nunca se debe introducir la mano en las partes móviles de la máquina, encontrándose ésta en marcha o desconectada. Siempre se debe desconectar primero el interruptor principal.

Antes de conecta la máquina se ha de asegurar que nadie pueda ser perjudicado por la máquina en la fase de arranque.

3.2.5. Equipos de trabajo diversos

3.2.5.1. Plataforma elevadora

Equipo de trabajo móvil dotado de una plataforma de trabajo, la cual puede subir, bajar o desplazarse transportando personas o materiales, gracias a una estructura extensible.

Tipología: Tijera, brazo articulado, brazo telescópico y elevador vertical.

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamiento por o entre objetos
Atropellos y golpes por vehículos

Medidas preventivas:

En el momento de la recepción del equipo y antes de su primera utilización, el responsable a pie de obra efectuará un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos la plataforma.

Todo el personal usuario será conocedor de las normas e instrucciones dadas por el fabricante, especialmente los límites de carga admisible y capacidad de movimiento.

Diariamente se deberán comprobar los indicadores de nivel, las luces y los avisadores acústicos de bajada y desplazamiento. Muy importante es comprobar que no existen fugas de aceite bajo la máquina, el estado de las ruedas y el buen estado general de la máquina.

Emplazar la plataforma en lugar seguro y nivelado, utilizar los estabilizadores. En pisos blandos poner tablones bajo los estabilizadores.

Avisar a los compañeros de la zona de influencia antes de ponerla en marcha.

No se permite el uso de plataformas con falta de barandillas o con la cadena del acceso sin poner, con los dispositivos de seguridad anulados y/o sin utilizar los estabilizadores.

No se debe elevar ni conducir la plataforma en condiciones meteorológicas adversas.

Trabajar con los dos pies firmemente apoyados en la plataforma. No intentar alcanzar puntos alejados, en este caso mover la plataforma lo que sea necesario para alcanzar dicho punto sin necesidad de adoptar postura peligrosa.

No se permite trabajar subido a las barandillas, subido a cajas o tablas, ni usar borriquetas o escaleras sobre la plataforma. El ocupante deberá estar sujeto en todo momento a la misma mediante su arnés de seguridad.

No se permite trabajar a terceras personas cerca de la plataforma.

Queda prohibida la elevación de cargas con estos equipos.

Está prohibido iniciar la actividad desde la plataforma si el puesto del mano de emergencia no está ocupado por una persona experta. Salvo en caso de emergencia, la plataforma debe ser maniobrada desde el puesto de mando de la cesta.

La cesta debe nivelarse correctamente a 0º antes de su utilización.

Si fuera necesario acceder a la superficie de cualquier elemento fuera de la plataforma, de forma previa se habrán previsto los puntos fijos o líneas de vida para amarrar el arnés de seguridad. En estos casos además, se llevará un arnés de doble cuerda de manera que el operario permanezca amarrado a la plataforma mientras se amarra con la segunda cuerda al punto fijo o línea de vida instalada (siempre deberá estar amarrado a un punto, no se podrá desembarcar de la plataforma sin amarrar).

3.2.5.2. Escaleras de mano

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación

Medidas preventivas:
Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas n suponga un riesgo de caída, por rotura o deslizamiento de las mismas. En particular, las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 m de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

Antes de usar una escalera de mano, deberá asegurarse su estabilidad. La base de la escalera deberá quedar sólidamente asentada. En el caso de escaleras simples, la parte superior se ajustará, si es necesario, al paramento sobre el que se apoya, y cuando esto no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazadera u otros dispositivos equivalentes.

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas.

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas.

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneas.

Las escaleras de mano cumplirán las disposiciones específicas detalladas en el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

3.2.5.3. Andamios

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Aplastamientos

Medidas preventivas:

Se tendrá en cuenta que durante el montaje, utilización y desmontaje de los andamios se cumplirán las normas previstas en las instrucciones de montaje que proporcione su suministrador o fabricante, así como en la legislación vigente (R.D. 2177/2004). En este sentido, se destacan muy especialmente las cuestiones siguientes:

- Las plataformas de trabajo de los andamios deberán estar protegidas frente al riesgo de caída en altura por medio de una barandilla perimetral reglamentaria formada por un listón superior, intermedio y rodapié de 15 cm. Esta barandilla deberá proteger todos los huecos y zonas a través de los cuales se pudiera materializar el riesgo de caída en altura. La altura del listón superior será de al menos 100 cm.

- No se ejecutarán actividades en plataformas de trabajo cuyo montaje no se haya rematado, y que no dispongan de las protecciones establecidas.

- Se prohibirá encaramarse o trepar a través de los elementos de los andamios. Con el objeto de facilitar el acceso a las plataformas de trabajo, éstos deberán disponer de escaleras interiores integradas en cada altura.

- Los andamios deberán apoyarse y arriostrarse de acuerdo con las condiciones especificadas por su suministrador o fabricante, de tal forma que se garantice su total estabilidad.

- Durante el montaje de los distintos elementos de los andamios se prohibirá que los trabajadores se encuentren expuestos a riesgo de caída en altura. Para ello, se priorizará la posibilidad de que durante el montaje y el desmontaje se usen las barandillas provisionales de que disponen sus fabricantes (o sino es posible se usará arnés de seguridad anclado a puntos fijos).

- En función de la configuración del andamio, resultará necesario elaborar un Plan de montaje, empleo y desmontaje, pudiendo ser sustituido por las instrucciones de su suministrador o fabricante (en los supuestos que establece la legislación). Además, deberán llevarse a cabo

las funciones de supervisión e inspección de los trabajos de montaje y desmontaje de los andamios conforme a lo establecido en el R.D. 2177/2004.

- No se usarán los andamios hasta que no se hayan certificado conforme a los criterios de inspección establecidos anteriormente.

- Los trabajadores que intervengan en las labores de montaje y desmontaje de los andamios dispondrán de formación específica en la materia.

- Durante el montaje, desmontaje y utilización de los andamios se prohibirá la presencia de trabajadores en la zona de influencia de las cargas que debieran elevarse. Además, se prohibirá la realización de trabajos al pie de andamios, con el fin de evitar las interferencias que pudieran darse entre éstos y los que se realizaran sobre las plataformas de trabajo de los andamios.

- Se prohibirá el izado de parrillas de ferralla sobre los andamios cuando éstos estén ocupados por trabajadores.

3.2.5.4. Entibación

Riesgos:

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación o por desplome
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Aplastamientos

Medidas preventivas:

Cualquier entibación, por sencilla que sea, deberá ser realizada y dirigida por personal competente y con la debida experiencia y formación.

La entibación de cada zanja deberá ser determinada por la Dirección Facultativa a propuesta de la Jefatura de obra, en función de las características del terreno deducidas del análisis geológico del mismo.

En los trabajos de excavación de zanjas, y por tanto también durante la entibación, será necesaria la presencia de uno o varios recursos preventivos, ya que durante estos trabajos existen riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura.

El montaje de la entibación se deberá realizar conforme al manual de instrucciones del fabricante.

Los trabajadores deberán extremar las precauciones no permaneciendo dentro del radio de acción de giro cuando la máquina esté izando y transportando los módulos de entibación para evitar así golpes y atrapamientos.

Se revisarán diariamente las entibaciones antes de comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales cuando se hayan aflojado. Se comprobará, además, que estén expeditos los cauces de agua superficiales, en caso de existir.

No se permitirá la retirada de las medidas de protección de una zanja mientras permanezcan operarios trabajando en su interior.

Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas.

Se evitará golpear la entibación durante operaciones de excavación. Los codales o elementos de la misma no se utilizarán para el descenso o ascenso ni se usarán para la suspensión de conducciones o cargas, debiendo suspenderse de elementos expresamente calculados y situados en la superficie.

En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, empezando por la parte inferior del corte, siendo realizados y vigilados estos trabajos por personal competente.

Aún cuando los paramentos de una zanja sean aparentemente estables, se entibarán siempre que se prevea el deterioro del terreno, como consecuencia de una larga duración de la apertura.


Siempre es necesario entibar a tiempo y el material previsto para ello debe estar a pie de obra en cantidad suficiente, con la debida antelación, habiendo sido revisado y con la garantía de que se encuentra en buen estado.

La anchura de las zanjas se realizará en función de su profundidad obedeciendo a los siguientes criterios:


Hasta 1,50 m de profundidad, anchura mínima de 0,65 m.
Hasta 2,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,75 m.
Hasta 3,00 m de profundidad, anchura mínima de 0,80 m.
Hasta 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 0.90 m.
Para más de 4,00 m de profundidad, anchura mínima de 1,00 m.

Pueden utilizarse diversos sistemas de entibación en función de las características del terreno, entre los que, como más comunes, se citan a continuación:

a) Sistema de montaje de módulos metálicos o cajones de entibación:
1.- Montaje de los módulos arriostrados por codales adaptables al ancho de la zanja.
2.- Colocación del módulo en la zanja excavada.
3.- Colocación del tramo de tubo o colector en la zona de zanja protegida.
4.- Relleno parcial de la zanja y recuperación del módulo correspondiente.




ESQUEMA DE MONTAJE
DE MÓDULOS METÁLICOS



SECUENCIA DEL PROCESO DE ENTIBACIÓN

b) Marcos cabeceros con paneles metálicos hincados, en el proceso siguiente:
1.- Montaje de los cabeceros acoplados al ancho de la zanja.
2.- Hinca de paneles protectores, simultánea con la excavación de la zanja.
3.- Excavación finalizada. Si es necesario, codales intermedios para evitar pandeos.
4.- Relleno de la zanja y retirada simultánea de los paneles metálicos.

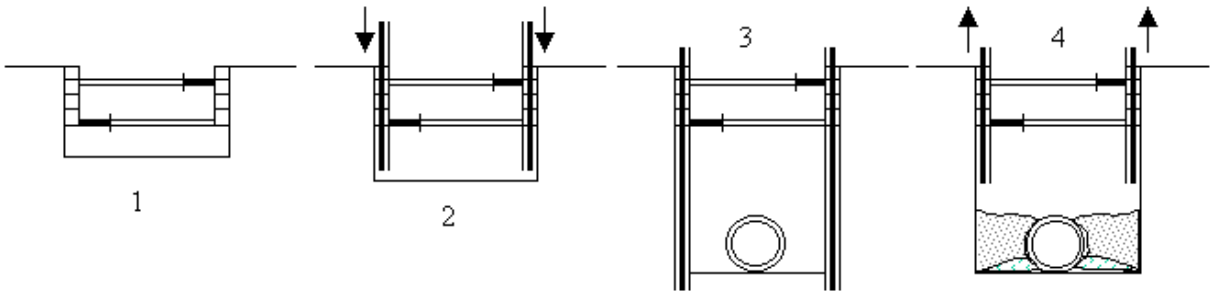

PROCESO DE ENTIBACIÓN CON CABECEROS Y PANELES HINCADOS

3.2.5.5. Puntales

Riesgos:

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Sobreesfuerzos.
Golpes y cortes por objetos y herramientas
Aplastamientos

Medidas preventivas:

Colocarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Se tienen que acopiar los puntales de forma adecuada y fuera de los lugares de paso.

Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Los puntales han de estar en perfectas condiciones de mantenimiento.

Se ha de evitar la colocación de puntales en mal estado o con pasadores improvisados.

Se tienen que colocar de forma segura y proporcional a la carga que tienen que soportar.

Una vez se ha hormigonado, hay que verificar que los puntales trabajen de forma homogénea y ajustarlos si fuese necesario.

Hay que verificar que los puntales se han colocado de forma perfectamente vertical. En caso de que se tengan que colocar de forma inclinada, hay que calzarlos con tablones o similares.

En la fase de desmontaje de los puntales es necesario cerrar la zona de trabajo para evitar el acceso de personal ajeno a la operación.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco, guantes contra agresiones mecánicas, calzado de seguridad y arnés (cuando sea necesario).

3.2.5.6. Eslingas, cadenas, cuerdas y cables.

Riesgos:

Caída de objetos en manipulación
Golpes y cortes por objetos y herramientas

Aplastamientos

Caída de personas a diferente nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome.

Medidas preventivas:

Planificar debidamente su ubicación en los puestos de trabajo para favorecer su efectividad y evitar interferencias de estos elementos con otros trabajadores.

Seguir y contemplar las instrucciones del fabricante en su uso y mantenimiento.

Asegurar su sustitución después de un incidente o siniestro.

Es necesario que todos los elementos, con la excepción de las cuerdas y de los propios sistemas de anclaje, dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.

La utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas será limitada a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede realizarse de forma segura y que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no está justificada.

Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de soporte o sujeción, o ambas, para que cuando se usen en las condiciones para las cuales se han diseñado no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

Teniendo en cuenta la evaluación de riesgos y especialmente en función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento con accesorios adecuados. La silla debe tener una anchura mínima de 45cm y debe disponer de cinturón de una anchura mínima 5cm para que el trabajador pueda atarse.

Los aparatos de izado, anclajes, soportes deben disponer, de manera visible, de la indicación del valor de su carga máxima, que nunca podrá sobrepasarse.

Estos elementos no pueden utilizarse con finalidades diferentes a las previstas por el fabricante.

En la utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se deben cumplir, además, las siguientes condiciones:

El sistema debe constar como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de soporte (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).

En circunstancias excepcionales en las que, en la evaluación de riesgos, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, se admite la utilización de una sola cuerda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.

Facilitar a los trabajadores unos arneses adecuados, que deben utilizarse y conectarse a la cuerda de seguridad.

La cuerda de trabajo debe estar equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y debe disponer de un sistema de bloqueo automático con la finalidad de impedir la caída en el caso de que

el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad debe estar equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.

Las herramientas y demás accesorios que tenga que utilizar el trabajador deben estar sujetas al arnés o al asiento del trabajador o sujetados por otros medios adecuados.

El trabajo se debe planificar y supervisar de forma correcta, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador.
Impartir a los trabajadores afectados una formación adecuada y específica para las operaciones previstas.

Verificar el estado de estos elementos antes de su utilización.

Es necesario comprobar la caducidad del producto antes de su utilización.

Debe evitarse el contacto con bordes afilados o cortantes.

En caso de elementos de izado, sujetar debidamente las cargas y evitar la presencia de personas bajo las mismas.

Se utilizarán los siguientes equipos de protección individual: casco, guantes contra agresiones mecánicas, calzado de seguridad, arnés y ropa de trabajo.

4. PREVISIÓN DE RIESGOS EN LAS FUTURAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO

Bajo este epígrafe se agrupan aquellas medidas preventivas cuya adopción va encaminada a reducir y controlar los riesgos que puedan aparecer en la ejecución de los trabajos posteriores a ejecutar en el ámbito de la obra. Asimismo será necesario incluir en el estudio la obligación de recoger, con la finalización de las obras, toda aquella información que pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores. Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Deberán dejarse los medios necesarios para facilitar las operaciones de mantenimiento necesarias tanto el las arquetas y pozos. Dichas medidas son las siguientes:

- Acceso a pozos y arquetas mediante la colocación de pates en su interior.
- Puntos de anclaje de arneses de seguridad para todos trabajos de mantenimiento que sean necesario realizar a una altura superior a dos metros y no fuera posible el empleo de andamios homologados.

5. CONCLUSIÓN

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final del estudio.

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como presentación y


justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra.

En relación con tal función y aplicaciones, SCPSA del presente estudio de seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar.


ESS: PLANOS

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

ALZADO




PLANTA

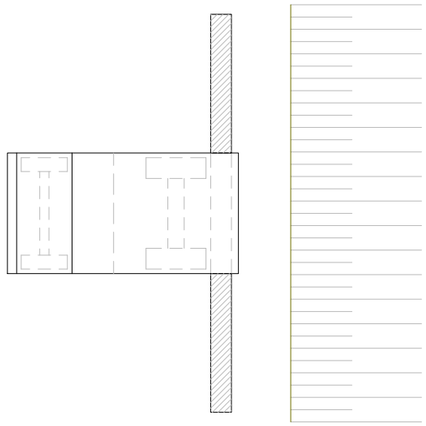

DESCARGA DE TIERRAS EN VERTEDERO

PASARELA PEATONAL

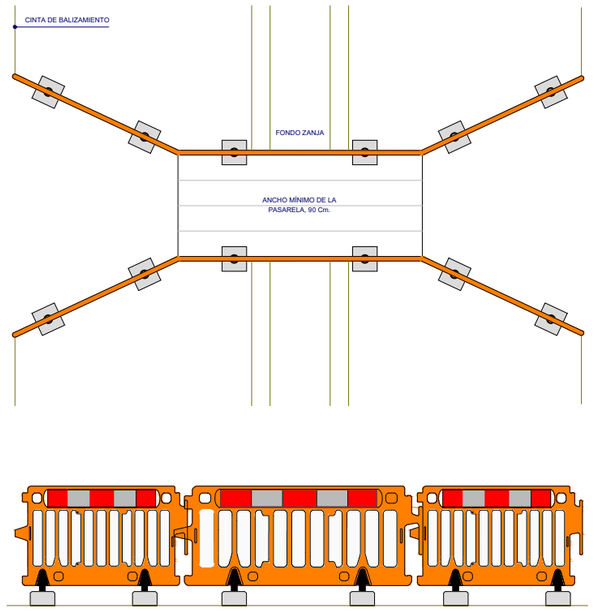



* EL Nº. MÍNIMO DE VALLAS SERÁ DE 2 Uds EN CADA LADO

* LAS PROTECCIONES DEBERÁN PERMANECER HASTA EL RELLENO DEFINITIVO DE LA ZANJA

* LA ESTRUCTURA DE LA PASARELA SE CALCULARÁ CONFORME AL ANCHO DE ZANJA Y LA CARGA PREVISTA


RELLENO Y VERTIDO EN ZANJAS

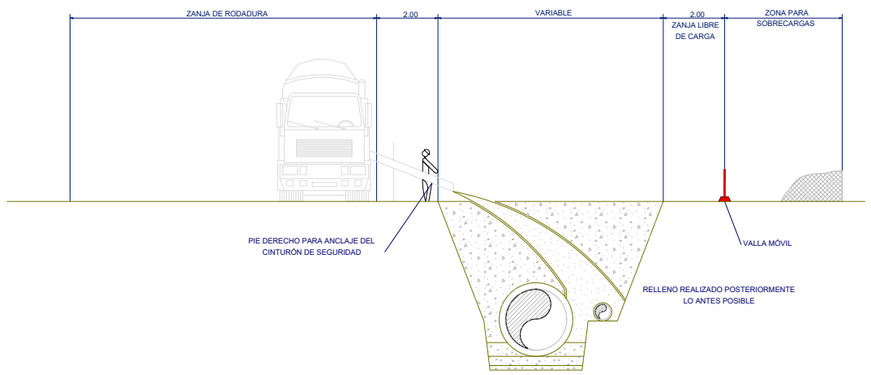


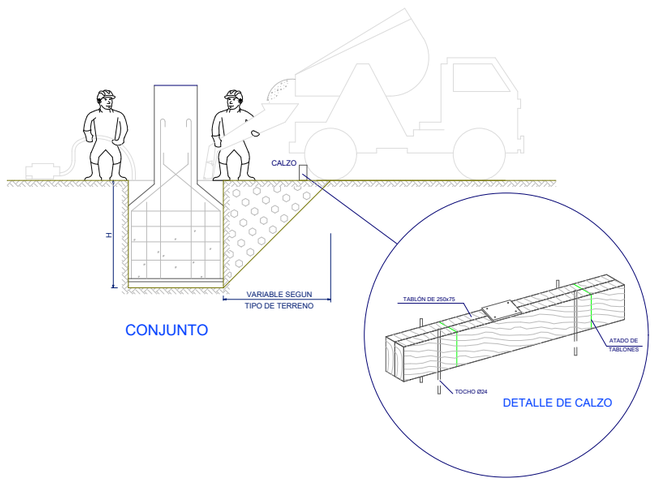


CONJUNTO


COLOCACIÓN DE VALLA PLÁSTICA AUTÓNOMA



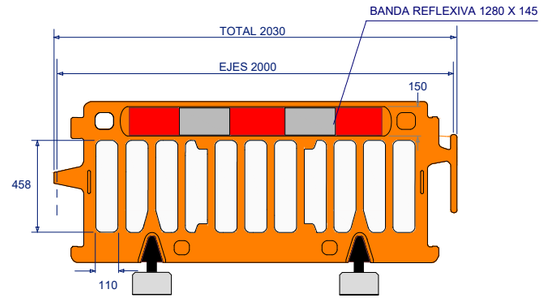


COLOCACION DE SENALES DE TRAFICO






COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO



VALLA DE CERRAMIENTO DE MALLAZO

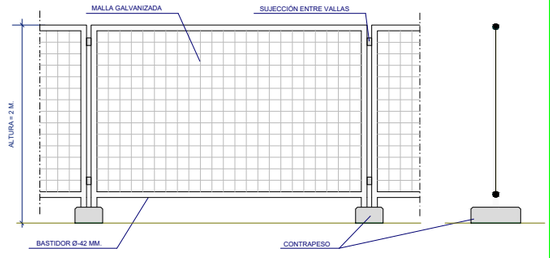


SEÑALIZACIÓN Y VALLADO


NOTA: Todas las vallas y señales se dotarán de pies , preferentemente plásticos, de masa suficiente para contrarrestar los esfuerzos.
En caso de emplearse pies de hormigón, estos deben mantener permanentemente su integridad, sin roturas ni defectos, reponiéndose ante el más mínimo deterioro.

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Iruñerria Nafarroa Mankomunitatea — Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO: 00001190	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: ESS:PLANOS	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 1 de 6
				CODIGO DWG: 00001190 esssplanos.dwg			


PASARELA PEATONAL

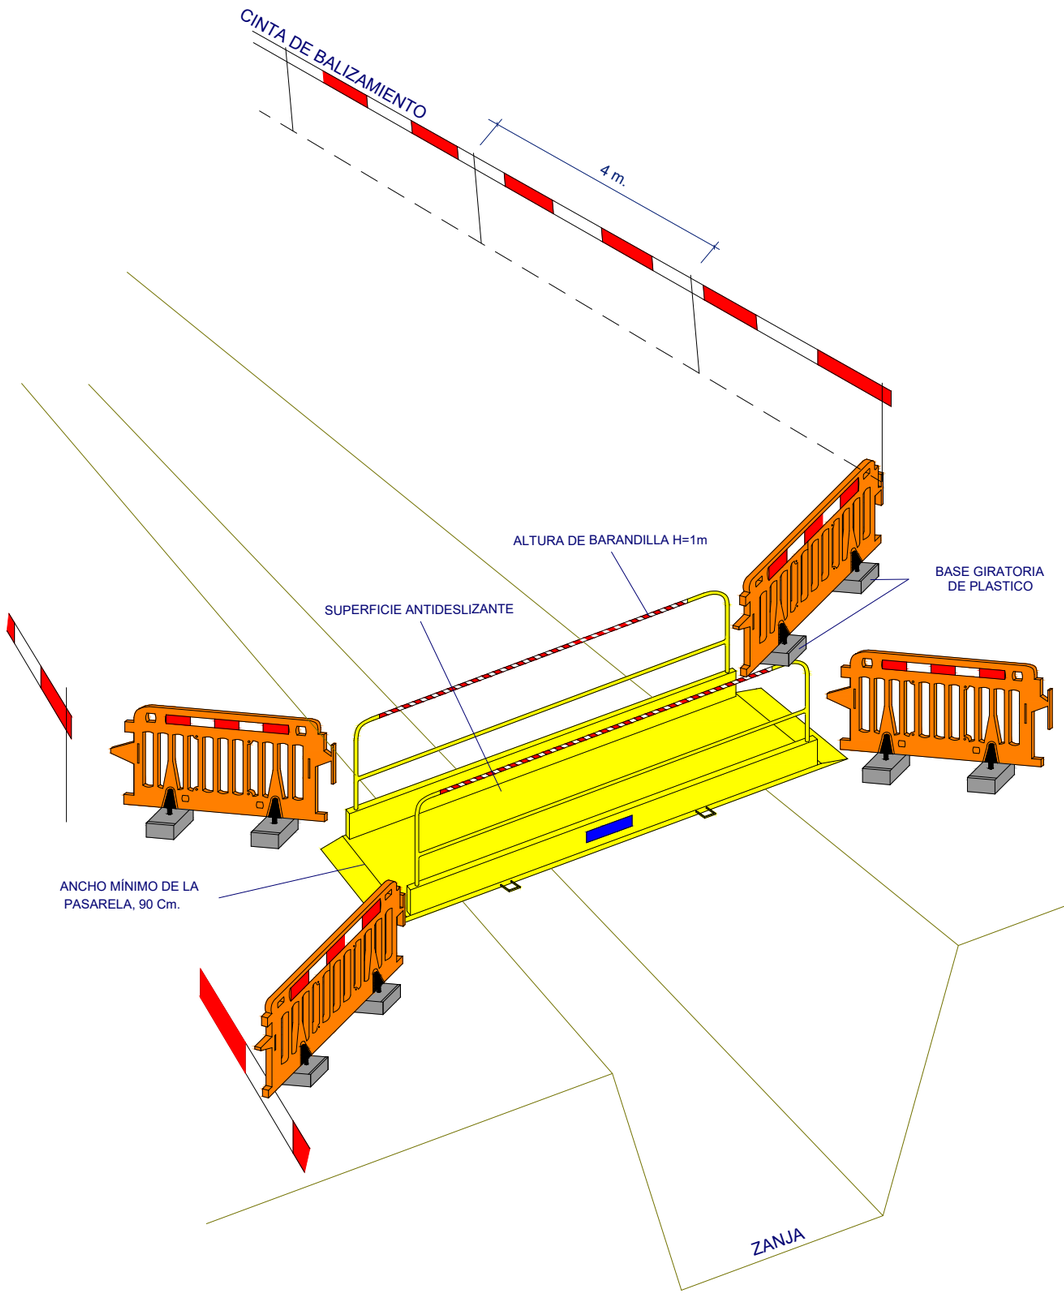

* EL N. MINIMO DE VALLAS SERA DE 2 Uds DE 2,50 M. EN CADA LADO
* LAS PROTECCIONES DEBERAN PERMANECER HASTA EL RELLENO DEFINITIVO DE LA ZANJA
* LA ESTRUCTURA DE LA PASARELA SE CALCULARA CONFORME AL ANCHO DE ZANJA Y LA CARGA PREVISTA

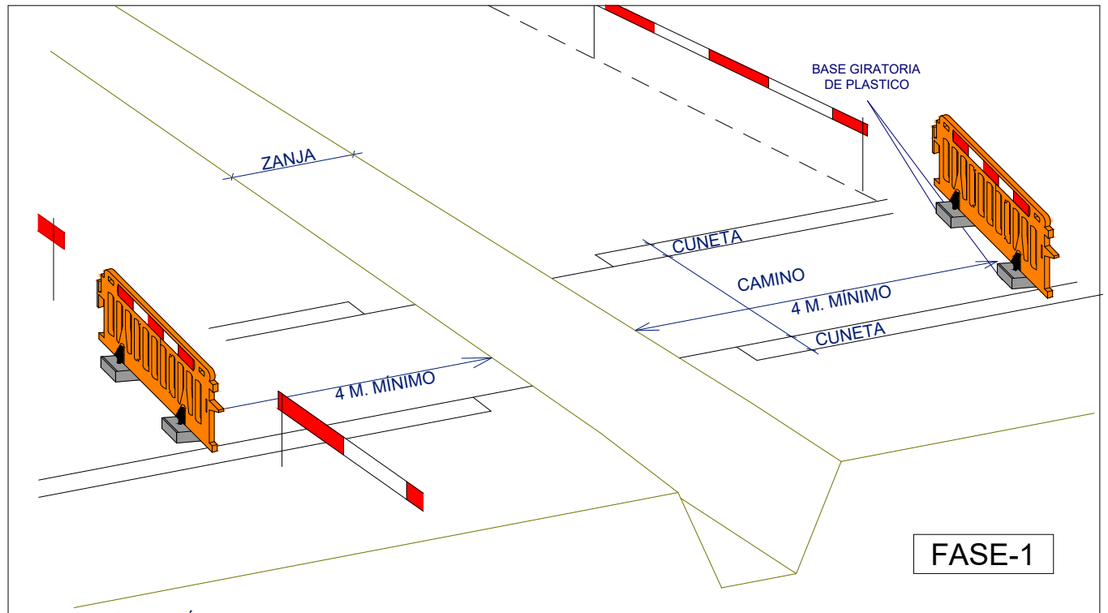


* DEBERÁ COLOCARSE CARTEL INDICATIVO DE "CAMINO CORTADO"
* LAS PROTECCIONES DEBERÁN PERMANECER HASTA EL RELLENO DEFINITIVO DE LA ZANJA

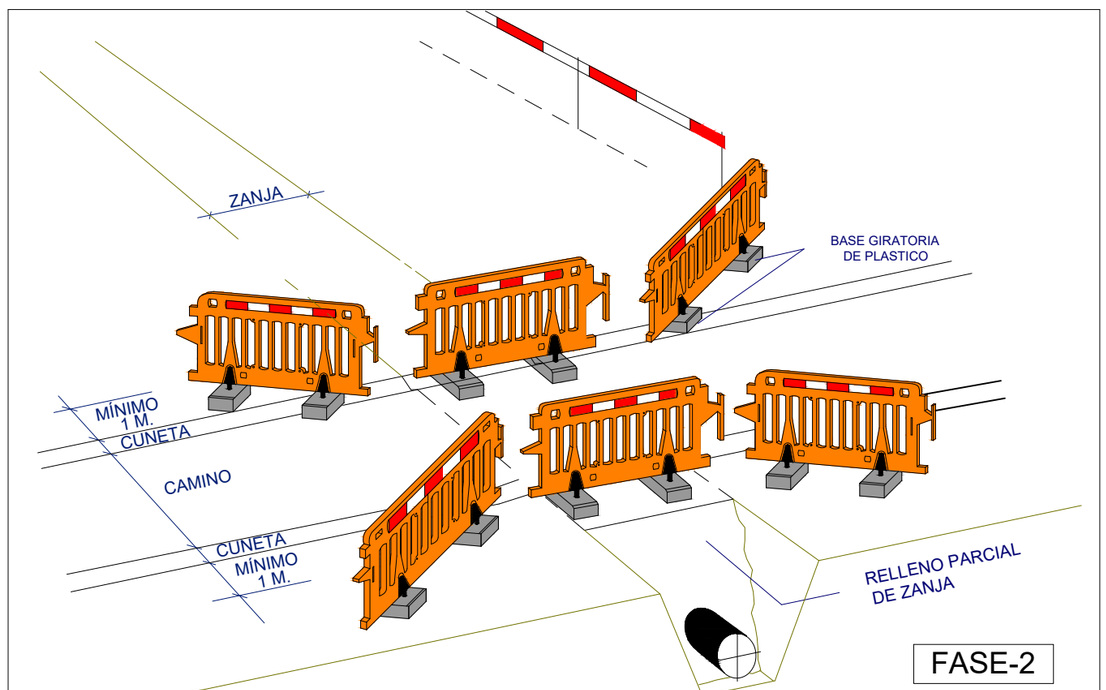

* EL Nº. MÍNIMO DE VALLAS SERA DE 3 Uds DE 2,50 M. EN CADA LADO
* LAS PROTECCIONES DEBERÁN PERMANECER HASTA EL RELLENO DEFINITIVO DE LA ZANJA

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. · Iruñerria Mankomunitatea · Iruñerria Zerbitzuak s.a.


TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial		00001190	JUNIO 2026		ESS:PLANOS	2 de 6
			CODIGO DWG	00001190 essplanos.dwg				Nº DE HOJA

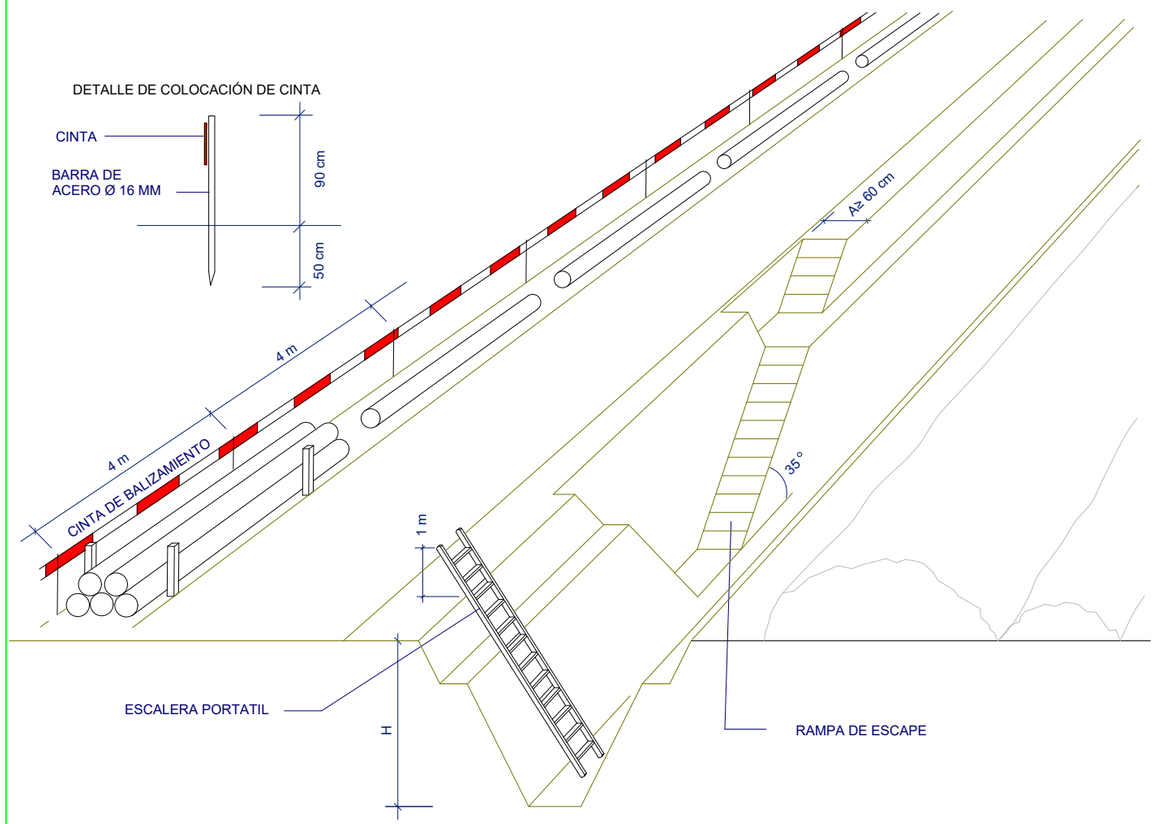




NOTA: TALUDES, ANCHO DE BERMAS Y ANCHO Y ALTURA DE ZANJA, SEGUN SECCIONES DE PROYECTO

APERTURA DE ZANJAS EN CAMPO ABIERTO

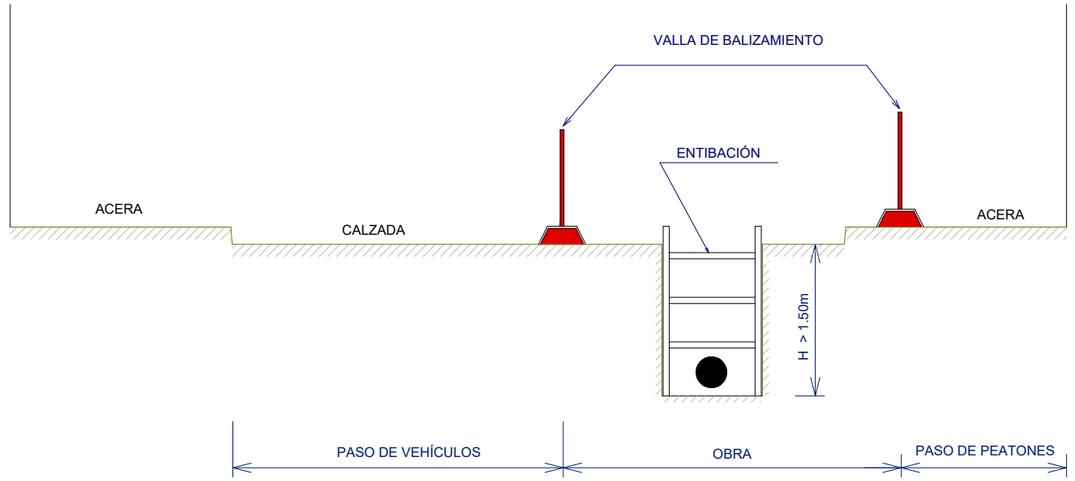


APERTURA DE ZANJA CON ENTIBACIÓN EN CALZADA

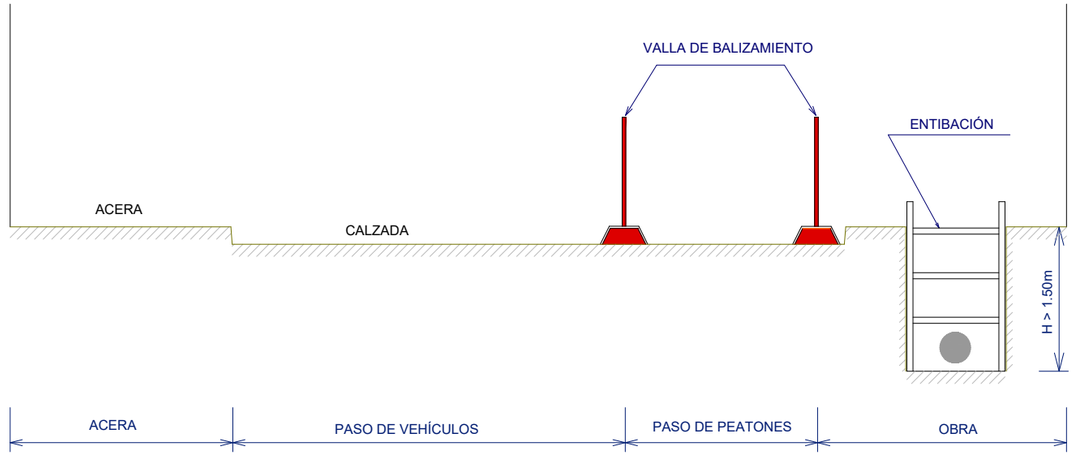


APERTURA DE ZANJA CON ENTIBACIÓN EN ACERA

APERTURA DE ZANJAS EN ZONA URBANA


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO: 00001190	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: ESS:PLANOS	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 3 de 6
				CODIGO DWG: 00001190 esssplanos.dwg			

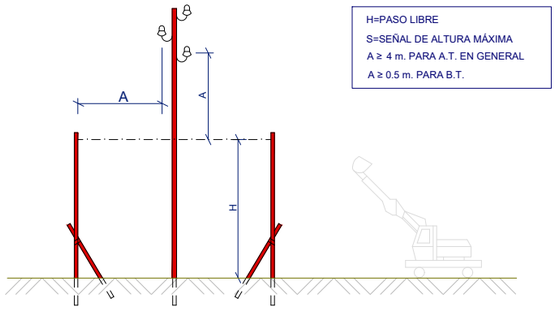


H=PASO LIBRE
S=SEÑAL DE ALTURA MÁXIMA
A ≥ 4 m. PARA A.T. EN GENERAL
A ≥ 0.5 m. PARA B.T.

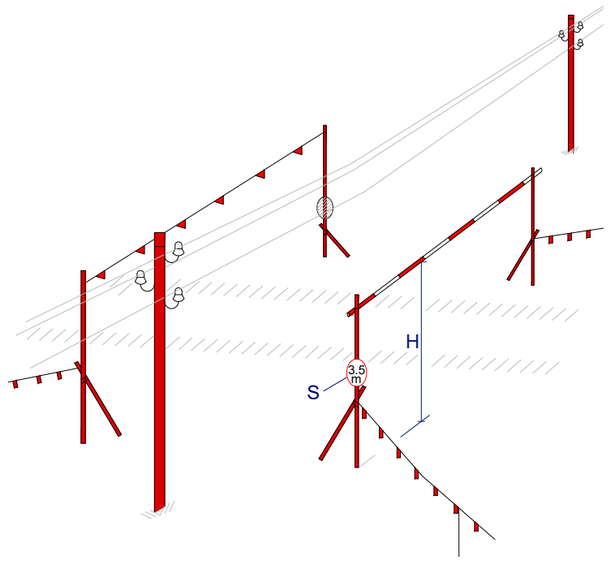


PASO BAJO LÍNEAS ELÉCTRICAS

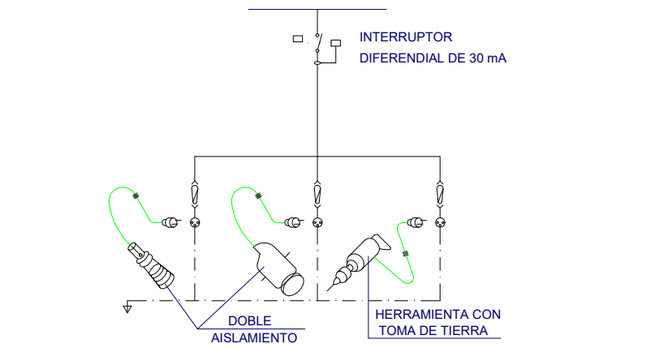


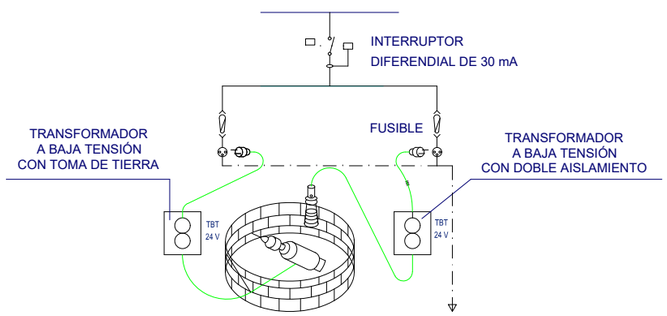






DETALLES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

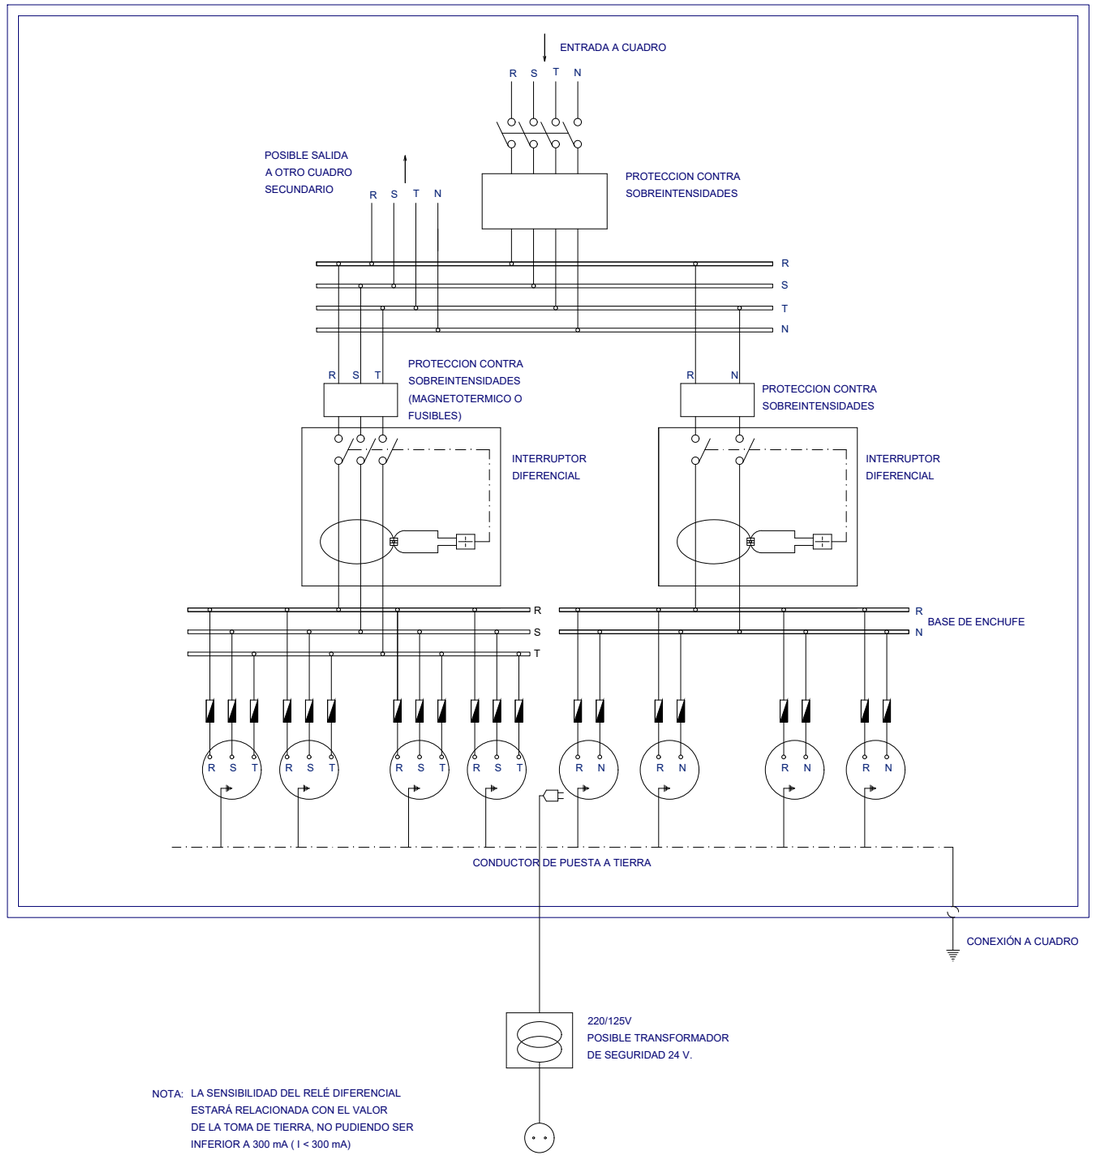

NOTA: LA SENSIBILIDAD DEL RELÉ DIFERENCIAL ESTARÁ RELACIONADA CON EL VALOR DE LA TOMA DE TIERRA, NO PUDIENDO SER INFERIOR A 300 mA (I < 300 mA)


CUADRO DE ALIMENTACIÓN A OBRA: ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Iruñerria Mankomunitatea — Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO: 00001190	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: ESS:PLANOS	Nº DE PLANO
				CODIGO DWG: 00001190 esssplanos.dwg				Nº DE HOJA: 4 de 6

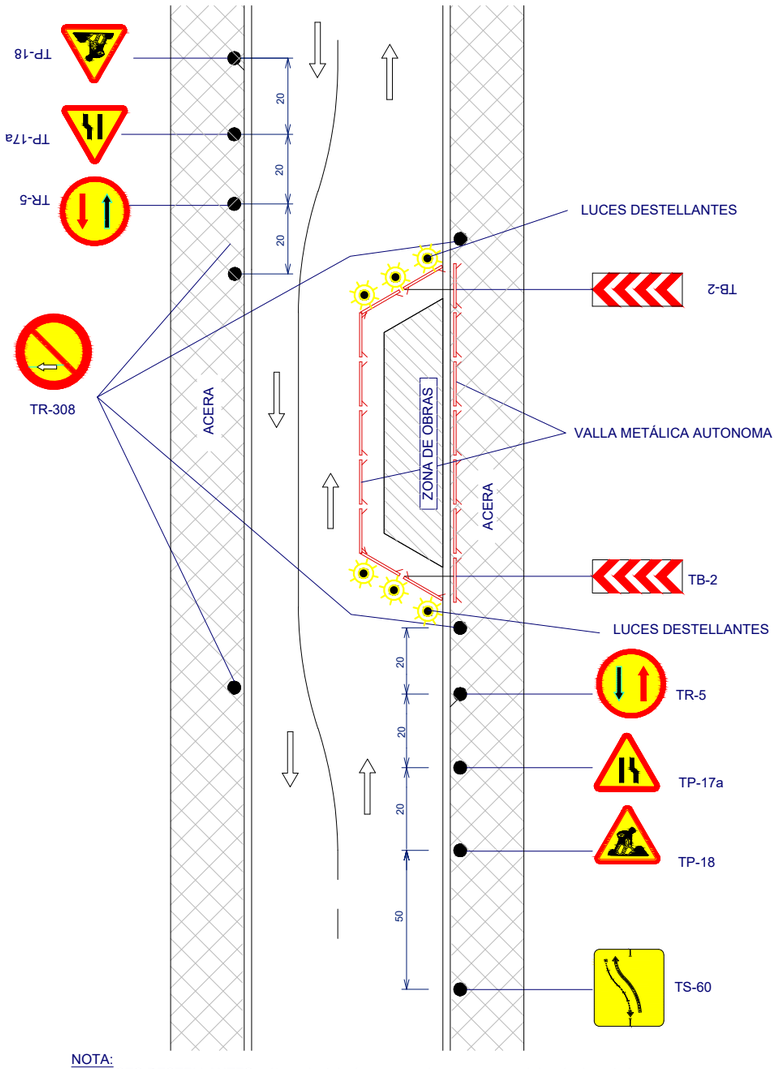


NOTA:
Las LUCES DESTELLANTES, sólo se instalarán en caso de permanecer el desvío durante la noche.

APERTURA DE ZANJA EN ZONA URBANA CON OCUPACIÓN PARCIAL DE CALZADA. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

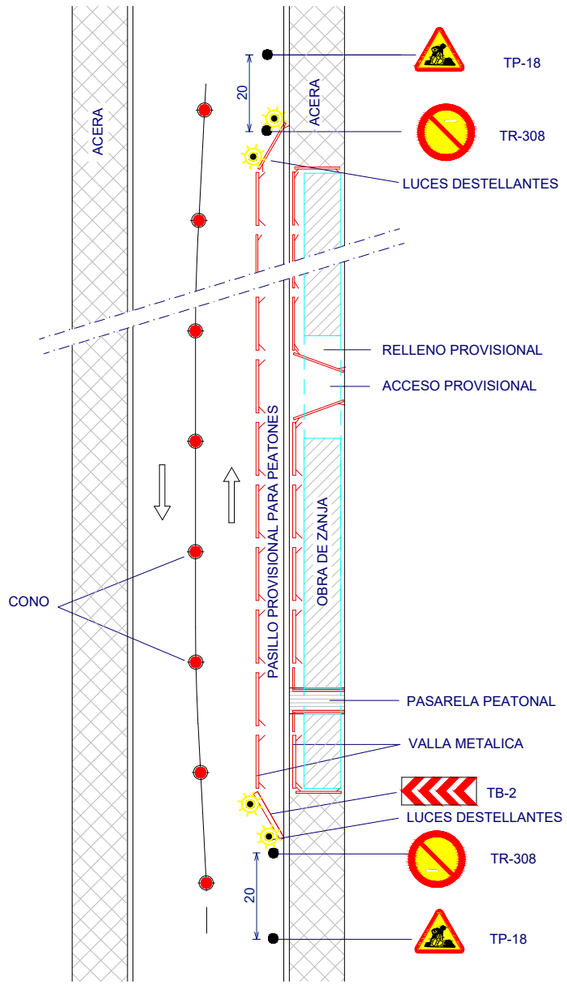

NOTA:
Las LUCES DESTELLANTES, sólo se instalarán en caso de permanecer el desvío durante la noche.


APERTURA DE ZANJA EN ZONA URBANA EN ACERA, CON PASOS PEATONALES. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

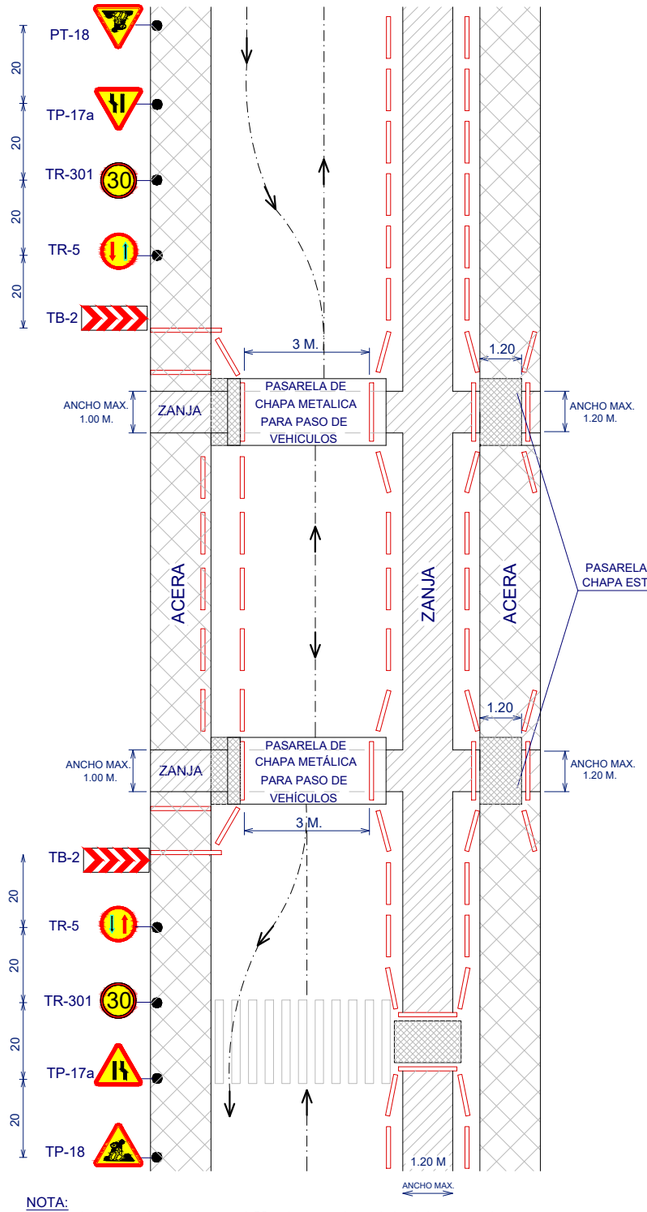


NOTA:
Para anchos de zanja superiores a 1.20m, la pasarela será de plataforma sobre estructura de madera o metálica con barandillas.

APERTURA DE ZANJA EN ZONA URBANA EN CALZADA Y CRUCES DE ACOMETIDAS. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Ingeruntia Mankomunitatea / Ingeruntia Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO: 00001190	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: ESS:PLANOS	Nº DE PLANO / Nº DE HOJA: 5 de 6
				CODIGO DWG: 00001190 esplanos.dwg				

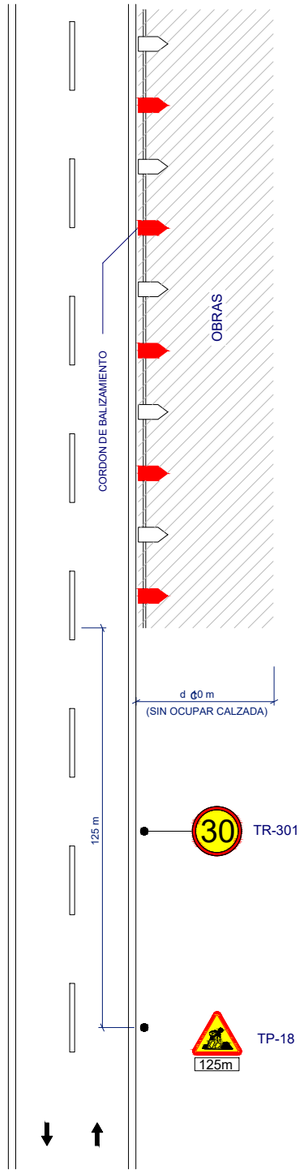

TRABAJOS DENTRO DE LA FRANJA DE 10m. JUNTO A LA CARRETERA. SEÑALIZACIÓN

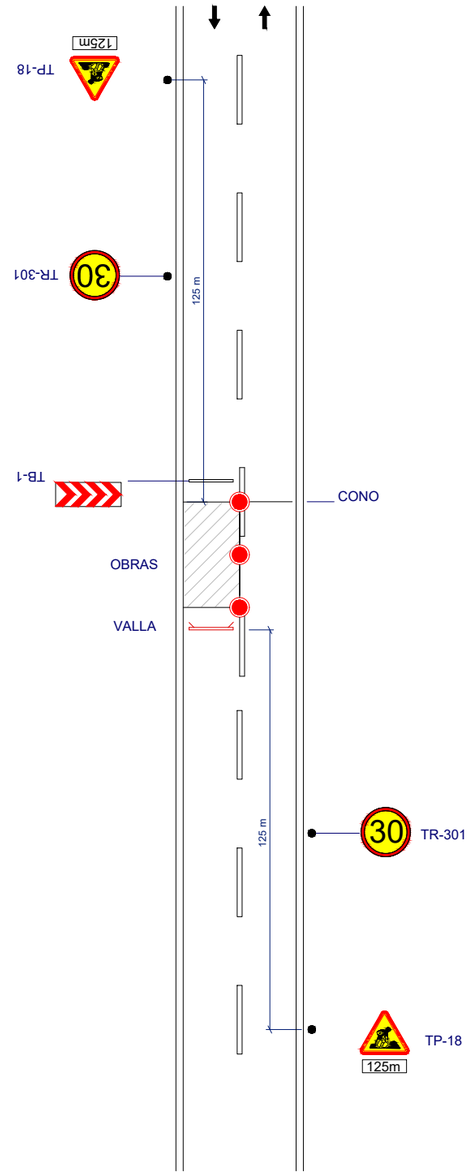

CRUCE DE CARRETERA PRIVADA CON INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE UN CARRIL. BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DIURNA

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Iruñerria Nerkomunitatea — Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. / Iruñerria Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO: 00001190	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: ESS:PLANOS	Nº DE PLANO
				CODIGO DWG: 00001190 esplanos.dwg				Nº DE HOJA: 6 de 6

ESS: PPTP

ÍNDICE

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

4. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

- **4.1. PROMOTOR**
- **4.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD**
- **4.3. CONTRATISTA DE LA OBRA**
- **4.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN**

5. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA

6. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

7. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

8. LIBRO DE INCIDENCIAS

9. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

10. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO

11. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

12. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del estudio de seguridad y salud del Proyecto de construcción "00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA", cuyo promotor es Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A.

Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud, en todo lo que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variada condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre y en la Ley 54/2003 de 13 de diciembre.
- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (B.O.E. 19-10-06)
- R.D. 1109/2007, que desarrolla la ley de subcontratación en el sector de la construcción.
- Orden Foral 170/2008, por la que se crea el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de la Construcción.
- Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo)
- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-01-97)

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98)
- Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97)
- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
- Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)
- Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97)
- Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97)
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
- Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales
- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria <MIE-AEM-4> del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero de desarrollo reglamentario del artículo 24 de la Ley 31/1995.
- Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus).

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 09-03-71, B.O.E. 16-03-71; vigente el capítulo 6 del título II)
- Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, B.O.E. 09-09-70), utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.2.
- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)
- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al Ruido durante el trabajo (B.O.E. 02-11-89)
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:

- Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, B.O.E. 26-07-92)
- Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (B.O.E. 20-05-88)
- Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 21-07-86) y Reales Decretos 590/1989 (B.O.E. 03-06-89) y 830/1991 (B.O.E. 31-05-91) de modificación del primero.
- O.M. de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados (B.O.E. 15-04-88).
- Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).
- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.

- Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias.
- Decreto 2413/1973, d 20 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (B.O.E. 09-10-73) e Instrucciones técnicas complementarias
- Decreto 3115/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. 27-12-68)
- Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (B.O.E. 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo.
- Guía Técnica para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico editada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Guía para la elaboración del procedimiento en estabilización de taludes editada por OSALAN
- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas y de señalización móvil de obras, del Ministerio de Fomento.

3. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptando el presente Estudio a sus propios sistemas y medios de ejecución.

El Plan deberá recoger como disposiciones mínimas de seguridad y salud todas aquellas instrucciones, normas legales y reglamentarias recogidas en el presente Pliego, que junto con lo indicado en los planos del Estudio, afecten a los sistemas y métodos de ejecución en que se base el Plan de Seguridad y Salud.

De igual forma deberá considerar todas las disposiciones legales vigentes que no estando enunciadas en el texto de este Pliego, sirvan de complemento a las previsiones en él contenidas.
Dicho Plan será presentado antes del inicio de las obras, para su informe por el Coordinador de Seguridad y Salud en la ejecución de la obra y la aprobación por parte del Promotor.

Este Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias que puedan surgir a lo largo de la misma. Estas modificaciónes requerirán idéntico trámite de informe por el Coordinador de Seguridad y Salud y aprobación expresa por parte del Promotor, así como con la necesaria información y comunicación al Comité de Seguridad y Salud, y en su defecto, a los representantes de los trabajadores.

Las modificaciones propuestas por el Contratista en el Plan no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el presente Estudio. Tampoco supondrá disminución del importe total recogido en el presupuesto.

4. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se establecen las obligaciones de las diversas partes intervinientes en la obra.

4.1. PROMOTOR

Corresponde a Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A. la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como, aprobar el plan de seguridad y salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta del coordinador, así como sus modificaciones posteriores si las hubiere.

4.2. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:
  - Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.
  - Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.
- Informar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

4.3. CONTRATISTA DE LA OBRA

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de los trabajos, el plan de seguridad y salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. Dicho plan contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el plan expresará las medidas preventivas previstas en el presente estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de seguridad y salud. El plan presentado por el contratista deberá hacer referencia concreta a los contenidos del estudio y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos desarrollados en el plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.

Las normas y medidas preventivas contenidas en este estudio y en el correspondiente plan de seguridad y salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el plan de seguridad y salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley.

Además, y de manera concreta, el empresario contratista principal deberá:

Exigir y vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud por parte de todos y cada uno de sus subcontratistas o autónomos, sean del nivel que sean (todo ello según los art. 15, 16, 17. 24.3, 32 bis y la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995 y el art. 10 del R.D. 1627/1997).

Informar específicamente a los subcontratistas y trabajadores autónomos, en el momento de su contratación, de los siguientes aspectos:

a) De la parte del plan de seguridad y salud que afecte al trabajo que van a realizar en la obra, explicándoles los riesgos laborales que previsiblemente van a aparecer, su naturaleza y las medidas previstas para evitarlos o protegerse frente a los mismos, aclarándoles la manera en que tales medidas habrán de ser provistas antes del inicio de los trabajos. En los supuestos de discrepancias entre el contratista principal y alguno de los subcontratistas, ambos deberán acordar las modificaciones que proponen al plan de seguridad y salud de la obra y proponer las mismas al coordinador de seguridad y salud, según el procedimiento establecido en el número 2 del artículo 7 del RD 1627/1997.

b) De la organización preventiva de la obra que ha adoptado el contratista principal y de la necesidad de que cada subcontratista designe un responsable de seguridad en la obra para que, coordinado con la citada organización del contratista, pero subordinado a la misma, realice la función de vigilancia sobre los trabajadores de su empresa y las medidas que les afectan, en cumplimiento de la parte del plan de seguridad y salud que corresponda.

c) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a sus trabajadores, a sus empresas subcontratistas y a sus trabajadores autónomos tanto sobre las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra como de lo tratado en las Reuniones de Coordinación.

d) Informar a las empresas concurrentes en el centro de trabajo que no desarrollen actividades del proyecto de la obra (asistencias técnicas, vigilantes, visitantes y en general todo tipo de terceros a la obra) de los riesgos y medidas preventivas de aplicación en la obra.

e) Formar a los trabajadores a su cargo en los aspectos preventivos relacionados con las actividades a ejecutar en la obra.

f) El empresario contratista principal deberá mantener todas las medidas preventivas en correcto estado, siendo el responsable de la disposición de las mismas en el momento adecuado, de forma que se eviten los riesgos antes de que aparezcan. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier actividad algún miembro del Organigrama Preventivo del empresario comprobará que las medidas de seguridad están realmente dispuestas o preparadas para ser colocadas. Dicha comprobación deberá repetirse de manera periódica para garantizar el correcto estado de las medidas dispuestas durante la ejecución de la obra.

g) En los trabajos de especial riesgo, y en aquéllos en los que los riesgos puedan modificarse o verse agravados a lo largo de su ejecución, los recursos preventivos del contratista y de los subcontratistas que intervienen en dichos trabajos deberán comprobar en persona la correcta ejecución de los trabajos.

h) En relación a la maquinaria y equipos de trabajo, éstos deberán contar con el marcado CE (o documento de puesta en conformidad), ser manejados por trabajadores debidamente formados y autorizados para ello y además, respecto a su utilización deberá respetarse lo establecido en el manual del fabricante.

i) El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. Estas comprobaciones serán efectuadas por personal competente.

j) En el caso de equipos de trabajo para la realización de trabajos temporales en altura (andamios, escaleras de mano, sistemas de acceso mediante cuerdas,...) se cumplirá lo establecido en el R.D. 1215/1997, sobre disposiciones mínimas para la utilización de equipos de trabajo (modificado y actualizado por el R.D. 2177/2004).

k) El empresario contratista principal adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas de funcionamiento. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de utilización y cualquier otra circunstancia que pueda influir en su deterioro o desajuste. Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello previa definición de las correspondientes medidas preventivas en el plan de seguridad y salud.

l) En relación a los Equipos de Protección Individual, el empresario contratista principal será el responsable de que todos los trabajadores de la obra cuenten con todos los equipos recogidos en el plan de seguridad o cuya utilización venga exigida por las condiciones de riesgo de la obra.

m) El empresario contratista principal determinará los puntos de acceso a la obra tanto de personal como de maquinaria que irá modificando de acuerdo a la evolución de los trabajos, definiendo los recursos necesarios para no permitir el acceso a la obra a personas no autorizadas.

n) El empresario contratista principal deberá, en virtud de lo establecido en los art. 16 y 20 de la Ley 31/1995, concretar las medidas de emergencia a considerar en el centro de trabajo de la obra. Dichas medidas establecerán, para los diferentes tipos de emergencias, los medios disponibles en la obra, la información y los medios de coordinación que se establecerán con los servicios de emergencia de la zona (planos de las rutas de acceso y evacuación, puntos de encuentro, personal cualificado para la realización de primeros auxilios...).

o) El empresario contratista principal deberá concretar, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, el mecanismo que articulará para llevar a cabo la coordinación, participación y consulta en materia preventiva, de todas las empresas que participen en la obra y, por extensión, de sus trabajadores (comisión de seguridad y salud u órgano similar).

p) El empresario contratista principal deberá facilitar mensualmente al coordinador los índices de siniestralidad e investigar todos los accidentes independientemente de su gravedad o si han causado baja laboral en el accidentado.

q) Disponer del Libro de Subcontratación, que permanecerá en la obra, en el que recogerá, desde el inicio de los trabajos, por orden cronológico todas y cada una de las subcontrataciones que realice, el nivel de subcontratación y la empresa comitente, el objeto del contrato, el representante de la subcontrata y si existen, los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Plan de Seguridad y Salud que les afecte, así como la referencia a las instrucciones que imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra hasta todas aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades empresariales).

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este estudio o en el plan de seguridad y salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el plan de seguridad y salud o en documentos jurídicos particulares.

Independientemente de lo que le competa en relación con las anteriores obligaciones, las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos deberán, antes de iniciar su trabajo en la obra:

a) Acreditar documentalmente al contratista principal que sus trabajadores han recibido las informaciones relativas al plan de seguridad y salud que les afectarán en la obra y que poseen la formación específica necesaria para su trabajo y que su salud es compatible con el puesto a desempeñar en los trabajos subterráneos a desempeñar.

b) Acreditar documentalmente el nombre y la formación técnica recibida por el responsable de seguridad que propone para la obra.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del plan de seguridad y salud de la obra y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

4.4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997 citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el plan de seguridad y salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado.

Tanto la empresa contratista principal como las posibles empresas subcontratistas nombrarán a un trabajador de la empresa, cuya presencia sea permanente en la obra, para el desempeño de las labores de vigilancia del cumplimiento del plan de seguridad y salud presentado por el contratista principal.

En relación a la obligación de contar con recursos preventivos debidamente formados para vigilar la aplicación del plan en la obra, se estará a lo dispuesto en el art. 32 bis y la disposición adicional 14 de la Ley 31/95 exigiendo la presencia de dichos recursos también a las empresas subcontratistas.

Otro aspecto que deberá definir el contratista en el plan de seguridad y salud, es la forma en que realizará la coordinación con las empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra, utilizando para ello, en virtud de la disposición adicional primera del Real Decreto 171/04 a los ya citados recursos preventivos.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado.

El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.

Se informará a la Dirección Facultativa del modo de organización de la actividad preventiva de la empresa, así como de la manera en que esta estructura intervendrá en el desarrollo de los trabajos

(técnicos prevencionistas, especialidades propias y ajenas, asistencia a la obra, grado de dedicación...).

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

5. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA EN LA OBRA

Será necesario que cada empresario, contratista o subcontratista, disponga al incorporarse a la obra de una organización preventiva que, de acuerdo con lo establecido en los art. 16, 32 bis y la disposición adicional 14ª de la Ley 31/1995, se ocupe de poner en práctica la acción preventiva de la empresa, facilitar las correspondientes medidas preventivas y de vigilar su cumplimiento. Para ello, cada empresa deberá contar con las siguientes figuras:

- Técnico(s) de prevención, miembro(s) de la Organización Preventiva del Contratista, designado(s) por su empresa para la presente obra que deberá planificar las medidas preventivas, formar e informar a sus trabajadores, investigar los accidentes e incidentes y desarrollar la coordinación de actividades empresariales con las diferentes empresas concurrentes en el centro de trabajo de la obra. Dicho(s) técnico(s) será el máximo representante de la organización preventiva del contratista en la obra debiendo garantizar la eficiencia de las actuaciones preventivas en la misma.

- Trabajador(es) Responsable(s) de la Seguridad en obra: su principal obligación será la de vigilar el cumplimiento de lo prescrito en el plan de seguridad y salud (cumpliendo la función de los antiguos vigilantes de seguridad) en lo concerniente a la actividad desarrollada por su empresa. Cada empresario (contratista y subcontratistas) designará cuantos sean necesarios según las actividades que se lleven a cabo. Como integrantes del organigrama preventivo del empresario en la obra, deberán, en su caso, participar en el resto de obligaciones empresariales de carácter general (coordinación de actividades empresariales, formación e información de trabajadores.....). Los nombramientos de dichos trabajadores deberán ser efectivos antes del inicio de los trabajos de modo que las empresas contratista y subcontratistas cumplan con su obligación de vigilar el cumplimiento de lo establecido en el plan de seguridad y salud. Además, los nombramientos de los trabajadores en cuestión deberán ser convenientemente actualizados a lo largo de la obra.

- De acuerdo con lo establecido en el art. 32 bis y en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, cualquiera de las anteriores figuras, como recursos preventivos del empresario contratista, deberán estar presentes en la obra, al menos, cuando se desarrollen trabajos de especial riesgo en la misma. Dichas obligaciones se harán extensivas a los trabajadores designados para desarrollar la acción preventiva de las empresas subcontratistas en la obra. La formación de estos recursos preventivos deberá adecuarse a lo establecido en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

- Trabajador responsable de mantener actualizado y completo el Archivo de Seguridad de su empresa en obra.

- Trabajador responsable de controlar el acceso de personas autorizadas a la obra y forma de desarrollar dicha tarea.

Trabajador responsable de la entrega y mantenimiento del estado de los Equipos de Protección Individual de todos sus trabajadores.
Hay que señalar que, dependiendo de la magnitud de la actividad a desarrollar, las figuras aquí recogidas, a excepción de la de Técnico de Prevención y los Trabajadores Responsables de Seguridad, podrán recaer sobre un único trabajador. Asimismo, es importante resaltar que los Trabajadores Responsables de la Seguridad en obra tendrán como principal condicionante la continua presencia en obra para así poder vigilar el cumplimiento del plan de seguridad y salud.

6. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS

La Ley 54/2003 establece la obligación de designar los recursos preventivos que sean necesarios durante la ejecución de actividades o procesos que sean considerados reglamentariamente como peligrosos o con riesgos especiales, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y comprobar la eficacia de estas.

7. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Ante el acaecimiento de cualquier tipo de incidente o accidente relacionado con la seguridad y salud durante la ejecución de la obra, así como el sucedido en las inmediaciones de la obra y susceptible de ser derivado de las interferencias producidas por las obras a terceros, deberá ponerse con la mayor brevedad posible en conocimiento de la Dirección Facultativa y del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Si ocurriera algún accidente con baja médica en obra se cumplimentará el parte oficial de accidentes que se enviará a la Mutua o Entidad Gestora antes de 5 días de la fecha del accidente.

Los calificados de graves, muy graves o mortales, o los que hubieran afectado a varios trabajadores, se comunicarán a la Autoridad Laboral competente, en el plazo máximo de 24 horas, debiendo quedar constancia documental de esta comunicación.

Aparte de estas actuaciones administrativas, en cada accidente con lesión y en cada incidente que pudiera haberse ocasionado lesión grave, el contratista redactará un informe en el que conste:

* Parte de accidente/incidente y sus causas.
* Identificación de la obra, fecha y hora del accidente.
* Nombre del accidentado.
* Categoría profesional del accidentado.
* Lesiones que se produjo (en incidente, lesiones posibles).
* Relato del accidente/incidente y del trabajo que realizaba el trabajador/es.
* Instrucciones del Plan S Y S sobre el trabajo realizado.
* Acciones preventivas.

8. LIBRO DE INCIDENCIAS

Existirá un Libro de Incidencias habilitado para la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
Este libro constará de hojas duplicadas que deberán identificarse con los datos correspondientes a la obra en concreto y el contratista de la misma y se destinará a:

* Hoja A: Original que queda permanentemente en el libro de incidencias.
* Hoja B: Copia para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Navarra.

Tendrán acceso y podrán hacer anotaciones en dicho libro:

* El Coordinador en materia de seguridad y salud.
* La Dirección Facultativa.
* Los servicios de prevención del Contratista, Subcontratistas y Trabajadores autónomos.
* Los miembros del Comité de Seguridad y Salud o los representantes de los trabajadores.
* Los Técnicos de la Inspección Provincial de Seguridad y Salud.

9. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Dado que es práctica generalizada en este tipo de trabajos que los operarios acudan a restaurantes cercanos a la obra, la empresa pondrá a su disposición vehículos para el traslado a los establecimientos que se designen.
El plan de seguridad y salud definirá las condiciones y lugar de ubicación de los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas de que dispondrán los trabajadores de la obra, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra.

El botiquín de primeros auxilios contendrá el mínimo establecido en el Real Decreto 486/97, de 14 de abril:

- Desinfectantes y antisépticos autorizados
- Gasas estériles
- Algodón hidrófilo
- Venda
- Esparadrapo
- Apósitos adhesivos
- Tijeras
- Pinzas
- Guantes desechables

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de seguridad y salud, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su

adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones.

Los residuos no deben permanecer en los locales utilizados por las personas sino en el exterior de estos y en cubos con tapa.

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a cargo del contratista, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

10. CONDICIONES A CUMPLIR POR LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Todos los equipos de trabajo dispondrán de marcado CE o en su defecto cumplirán lo establecido en el RD 1215/1997, no admitiéndose el trabajo en la obra de maquinas o herramientas que no cumplan estas especificaciones.

Toda la maquinaria de obra será manejada por personal con formación y experiencia.

En todo caso se seguirán las especificaciones del manual del fabricante en cuanto al uso y mantenimiento de la maquinaria y equipos de trabajo.

En evitación de peligro de vuelco, ningún vehículo irá sobrecargado, especialmente los dedicados al movimiento de tierras y todos los que han de circular por caminos sinuosos.

Toda la maquinaria de obra, estará pintada en colores vivos y tendrá los equipos de seguridad reglamentarios en buenas condiciones de funcionamiento.

Para su mejor control deben llevar bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga máxima, y la presión sobre el terreno de la maquinaria que se mueve sobre cadenas.

También se evitará exceso de volumen en la carga de los vehículos y su mala repartición.

Se refiere a máquinas Retroexcavadora, Pala Cargadora, Buldozer, Motoniveladora, Trailla, Maquinaria de Compactación, Vehículos de Transporte, Extendedoras de firme, etc.

- El equipamiento será como mínimo el siguiente:

    1. Señalización acústica automática para la marcha atrás.
    2. Faros para desplazamientos hacia delante o hacia atrás.
    3. Servofrenos y frenos de mano.
    4. Cabina anti-vuelco ROPS.
    5. Retrovisores de cada lado.

- Para su utilización se seguirán las siguientes reglas:

    1. Selección de la máquina más apropiada para cada tipo de trabajo. No se usarán maquinas o equipos para actividades distintas a las especificadas en las instrucciones del fabricante.

2. Cuando una máquina de movimiento de tierras esté trabajando, no se permitirá el acceso a la zona comprendida dentro de su radio de acción; si permanece estática, se señalizará su zona de peligrosidad actuándose en el mismo sentido.
3. Ante la presencia de conductores eléctricos bajo tensión se impedirá el acceso de la máquina a puntos donde pudiese entrar en contacto.
4. Diariamente se inspeccionará el motor, frenos, dirección, chasis, sistema hidráulico, transmisiones y pernos, luces y neumáticos o cadenas, dando cuenta de su estado al Jefe de Obras.
5. Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de grasa, barro y aceite.
6. No se permitirá el transporte de personas sobre estas máquinas.
7. Irán equipadas con extintor.
8. No se procederá a reparaciones sobre la máquina con el motor en marcha.
9. Los caminos de circulación interna se señalizarán con claridad para evitar colisiones o roces, poseerán la pendiente máxima autorizada por el fabricante para la máquina o vehículo.
10. No deberá sobrepasar la carga máxima establecida por el fabricante, para cada máquina o vehículo.
11. Se señalizará con topes de seguridad el lugar de aproximación a borde de zanja o de vaciado para las operaciones de carga o descarga indirecta o por basculación.
12. Todas las máquinas que disponen de brazos de estabilización, deben utilizarlos en la ejecución de su trabajo, empleando además las bases de apoyo adecuados a la capacidad portante del terreno.
13. Al cargar de material los camiones, la cuchara nunca debe pasar por encima de la cabina del camión.
14. Se verificara periódicamente y corregirá en caso necesario, el tensado de las cadenas o la comprobación de presión de los neumáticos.
15. Las motoniveladoras no debe nunca utilizarse como bulldozer ni sobrepasar pendientes laterales superiores al 40%.
16. Al efectuar reparaciones, con el basculante levantado, deben utilizarse mecanismos que impidan su desblocaje: puntales de madera, perfiles calzados, cadenas de sustentación, etc., que impidan con la caída de la misma, el atrapamiento del mecánico o del conductor que realiza esta labor.
17. Hay que prestar atención especial al tipo y uso de neumáticos, realizar revisiones periódicas y sustituir los gastados o deteriorados.
18. En el transporte con camión hormigonera, y dado que los elementos principales son cemento y hormigón es frecuente la dermatosis producida por el contacto o salpicadura, por lo que se tomaran medidas preventivas al respecto.

11. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra dispondrán de marcado CE y tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, por el que se regulan los requisitos que deben cumplir los elementos de Protección Personal (BOE 28.12.1992). Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por los anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74).

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados como medios auxiliares, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra, y necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, por lo que deben ser considerados incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE CAÍDA, CLASE “C”, TIPO “2A”

Cinturón de seguridad utilizado para frenar y detener la caída libre en un individuo, de forma que al final de aquella, la energía que se alcance sea absorbida en gran parte por los elementos integrantes del cinturón, manteniendo los esfuerzos transmitidos a la persona por debajo de un valor prefijado.
Esta constituido fundamentalmente por un arnés extensivo al tronco y piernas, con o sin faja y un elemento de amarre, además, va provisto de un amortiguador de caída. Con marca CE, según normas EPI.

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas formado por fja con hebilla de cierre, bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE, según normas EPI.

CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos reflectantes o catadióptricos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas “velkro”.

GAFAS DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA Y OXICORTE

Gafas de seguridad para soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros recambiables y abatibles sobre cristales neutros anti-impactos. Con marca CE, según normas EPI.

GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

Se usarán en todas las operaciones que pudieran producirse proyecciones de partículas. Con marca CE, según normas EPI.

GUANTES DE CUERO FLOR

Par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables a la muñeca de las manos mediante tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con marca CE, según normas EPI.

PANTALLA DE SEGURIDAD DE SUSTENTACIÓN MANUAL, CONTRA LAS RADIACIONES DE SOLDADURA ELÉCTRICA, OXIACETILÉNICA Y OXICORTE

Pantalla de protección de radiaciones y chispas de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, de sustentación manual, con un peso máximo entre 200 y 600 gr; dotada con un doble filtro, uno neutro contra los impactos y el otro contra las radiaciones, abatible; resistentes a la perforación y penetración por objetos incandescentes o sólidos proyectados violentamente. Con marca CE, según normas EPI.

TRAJES DE TRABAJO (MONOS O BUZOS DE ALGODÓN)

No son EPI´s según el RD773/97.

BOTAS IMPERMEABLES PANTALÓN DE GOMA O PVC

Par de botas pantalón de protección para trabajos en barro o de zonas inundadas, hormigones o pisos inundados con riesgo de deslizamiento. Fabricadas en PVC o goma. Comercializadas en varias tallas. Forradas de loneta resistente y dotadas con suelas dentadas contra los deslizamientos. Con marca CE, según normas EPI.

BOTAS DE PVC, IMPERMEABLES

Par de botas de seguridad, fabricadas en PVC, o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con suela y puntera reforzada. Con marca CE, según normas EPI.

PROTECCIONES AUDITIVAS

Cuando el nivel de ruido sobrepase los 80 decibelios, que establece el RD 1316/89 como límite, se utilizarán elementos de protección auditiva. Estos serán cascos antirruido o tapones, según los casos, con el marcado CE y la atenuación adecuada al tipo de ruido existente.

CASCO DE SEGURIDAD CLASE “N”

Casco de seguridad clase “N”, no metálico, aislante para baja tensión, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente. En caso necesario, deben disponer de barbuquejo, que evite su caída en ciertos tipos de trabajo. Tendrán el preceptivo marcado CE.

12. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS

CONDICIONES GENERALES

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud.
Figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.

Siempre que sea posible, se utilizará la protección colectiva frente a la individual, ya que representa una mejor protección ante el riesgo.

VALLAS DE CERRAMIENTO PERIMETRAL

Se instalará perimetralmente a la zona de apertura de zanja, instalación de tubería, vertido de hormigón y posterior relleno de zanja, avanzando conforme lo haga la obra, con una altura de 2,00 sobre el terreno, impidiendo los accesos en la zona acotada; será a base de malla metálica galvanizada de simple torsión, sobre poste de acero galvanizado, empotrados en dados de hormigón prefabricado.

VALLAS AUTÓNOMAS

Se instalarán vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura de al menos 100 cm. y estarán construidas de polietileno de alta densidad, de rigidez suficiente y una resistencia al empuje lateral de 150 kg./ml. Su longitud será de 2,50 m. Serán de colores amarillo o naranja luminosos, manteniendose en correcto estado de conservación y no presentando elementos doblados o rotos en ningún momento. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad, así como elementos adecuados para su unión con la contigua, de forma que permitan la formación de una valla continua.

INSTALACIONES ELECTRICAS DE OBRA

En previsión de posibles accidentes, se observarán las normas que se enumeran a continuación y las que preve la legislación vigente.

Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que puedan ser afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos.

Deberá realizar el Contratista un estudio previo en el que se determinen las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su actuación, así como las protecciones necesarias de las personas, las máquinas y la propia instalación.

Cuadros eléctricos:

Cada cuadro eléctrico irá provisto de su toma de tierra correspondiente.

Irán montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre soportes o colgados de la pared, tendrán puerta y cierre total.

El cuadro eléctrico general se accionara subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra.

Cables y empalmes:

Los calibres de los cables serán los adecuados para la carga que han de soportar.

La funda de los hilos será perfectamente aislante.

La distribución a partir del cuadro general de corrientes de distribución, se hará con cable manguera antihumedad perfectamente protegido; siempre que sea posible irá enterrado, señalizándose con tablones su trayecto en los lugares de paso. Los tablones tienen el doble objeto de señalizar y repartir cargas.

Los empalmes provisionales y alargaderas, se harán con empalmes especiales antihumedad, de tipo estanco.

Los empalmes definitivos se harán mediante caja de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación de temperatura igual a la admitida para los conductores.

Siempre que sea posible, los cables del interior del edificio, irán colgados, los puntos de sujeción estarán perfectamente aislados.

Interruptores:

Los interruptores serán protegidos, de tipo blindado, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Tomas de corriente:

Las tomas de corriente serán blindadas, provistas de neutro y siempre que sea posible, con enclavamiento.

Interruptores automáticos:

Se colocarán todos los que la instalación requiera, pero de un calibre tal que "salten" antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima.

Con ellos se protegerán todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado.

Disyuntores diferenciales:

Los circuitos destinados para fuerza y alumbrado serán independientes disponiendo en todo caso en su cabeza de interruptores diferenciales de 0,3 A como máximo para fuerza y 0,03 A de sensibilidad para alumbrado.

Todos los receptores eléctricos no dotados de toma de tierra, pero con protección diferencial 0,3 A, dispondrán de un conductor de protección, de características técnicas reglamentarias (R.E.B.T.), que concreta a tierra las carcasas de sus motores, a excepción de los receptores que dispongan de doble aislamiento.

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.

Tomas de tierra:

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

En caso de ser necesaria la instalación de un transformador, se le dotará de la toma de tierra adecuada, ajustándose a los Reglamentos.

Las grúas, plantas de hormigonado y hormigoneras, llevarán toma de tierra independiente cada una.

Todos los cuadros y máquinas eléctricas fijas dispondrán de tomas de tierra de manera que se garantice que la resistencia de tierra sea tal que de acuerdo con la sensibilidad del interruptor, garantice una tensión máxima de 24 voltios.

La conductividad del terreno en el que se ha instalado la toma de tierra (pica o placa), se aumentará añadiendo periódicamente una solución salina. A pesar de todo será muy conveniente regar todos los días las tomas de tierra.

Lamparas electricas portatiles:

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de circuitos.

Maquinas electricas:

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.

Elementos electricos:

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Mantenimiento y reparaciones:

Todo el equipo eléctrico se revisará periódicamente, especialmente las tomas de tierra y los conductores de protección, comprobándose el perfecto estado y funcionamiento de su disposición.
Las nuevas instalaciones, reparaciones, conexiones, etc. únicamente las realizarán los especialistas electricistas.

Las reparaciones jamás se harán bajo corriente, antes de realizar una reparación se quitarán los interruptores de sobreinstensidad, colocando en su lugar una placa de " NO CONECTAR.

Señalización:

Si en la obra hubiera diferentes voltajes (220 V., 380 V., etc.), en cada toma de corriente se indicará el voltaje a que corresponda.

EXTINTORES
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados. Se revisarán periódicamente, cumpliendo las condiciones específicamente señaladas en la Normativa vigente, y muy especialmente en la NBE/CPI-91.

MEDIDORES PORTATILES DE GASES

Los medidores portátiles de gases estarán calibrados y deberán medir como mínimo el porcentaje de oxígeno, así como las partes por millón (ppm) de CO, CO_2 , CH_4 y H_2S.

SEÑALIZACIÓN

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica.

PROTECCION DE EXCAVACIONES

Los acopios de tierras y/o materiales al borde de excavaciones se realizarán conforme a lo establecido en los correspondientes planos, es decir, manteniendo una franja de resguardo. Esto es válido también para la circulación de vehículos y maquinaria.

Todos los bordes de excavación de zanjas quedarán señalizados conforme a lo establecido en los correspondientes planos. Se colocaran topes de desplazamiento de vehículos en maniobras de espera en carga como en descarga, se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo o de otra forma eficaz.
Cuando se trabaje en la proximidad de desniveles o zonas peligrosas, es indispensable colocar balizas de forma visible en los limites de la zona de evolución.

Las excavaciones que puedan interferir el tránsito de vehículos o peatones, estarán debidamente protegidas con barandillas y señalizadas. Por la noche o con escasa visibilidad, tendrán señales luminosas intermitentes, guirnaldas o cualquier otro sistema que las haga fácilmente visibles. Todos aquellos elementos eléctricos que se encuentren en tensión estarán suficientemente alejados de las zonas de tránsito de personas además de protegidos de modo que no puedan producirse contactos directos o indirectos.

PROTECCION Y CUBRICION DE HUECOS

En obras de tipo más localizado y menos extensas, como arquetas, pozos de registro etc., deberá vallarse el perímetro de la obra y los accesos estarán señalizados y en buenas condiciones de uso.

Las bocas de arquetas, pozos u otras construcciones de dimensiones reducidas, deberán estar dotadas de cubiertas resistentes de chapa o madera, provistos de tocas u otros dispositivos en su cara inferior que impidan su deslizamiento.

La protección de estos huecos también podrá efectuarse con mallazo de resistencia y malla adecuada en los casos posibles.

PROTECCION DE ZONAS ELEVADAS

La protección del riesgo de caída al vacío por el borde perimetral se podrá hacer mediante la utilización de barandillas o cualquier otro sistema de garantía.

Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas.

Los huecos interiores se protegerán con mallazo de resistencia y malla adecuada o barandillas perimetrales.

Los cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

Las plataformas voladas tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas y dotadas de barandillas.

Para la ejecución de la cubierta se colocará en su borde una plataforma volada o apoyada desde el suelo con andamio, capaz de retener la posible caída de personas y materiales.

PLATAFORMAS DE TRABAJO Y ANDAMIOS:

Las plataformas de trabajo y andamios tanto fijos cómo móviles estarán constituidos por materiales sólidos y su estructura y resistencia serán acordes a las cargas que hayan de soportar, según las instrucciones facilitadas por el fabricante de los mismos.

Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 mm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. Además estarán formadas por módulos metálicos o tablones de madera sana y sin nudos.

ESCALERAS DE MANO:

Estarán en buen estado de conservación, serán de longitud suficiente para rebasar en 1 metro la altura a salvar y estarán provistas de zapatas antideslizantes en la base y de elementos de fijación o amarre en cabeza. No se usarán para alturas mayores a 5 metros. Se utilizarán siguiendo en todo momento las instrucciones y limitaciones impuestas por el fabricante.

BARANDILLAS DE PROTECCION:

Las barandillas de protección deberán ser certificadas, cumpliendo la norma UNE 13374:2004. Estas tendrán la suficiente resistencia para garantizar la retención de las personas que se vayan a encontrar bajo su protección. Tendrán una altura de 1 metro sobre el suelo, siendo la altura mínima del plinto o rodapié de 15 cm. Será necesaria su instalación en todos los bordes donde exista riesgo de caída en altura de más de 2 metros. El montaje y desmontaje se hará con cinturón de seguridad amarrado a puntos fijos.

LÍNEAS DE VIDA:

Las líneas de vida que se empleen deberán ser certificadas. Al igual que las barandillas, será necesaria su instalación en los trabajos donde exista riesgo de caída en altura de más de 2 metros. El montaje y desmontaje de la misma se hará con cinturón de seguridad amarrado a puntos fijos. Tendrán la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, de acuerdo con su función protectora. Además se vigilará la superficie de anclaje, para que sea adecuada en cuanto a su resistencia y al elemento que forma el anclaje. La longitud del cable será tal que permita moverse, pero no caídas que supongan riesgo por ceder tanto que supere la distancia a la superficie de recogida.

PASARELAS METÁLICAS CON BARANDILLAS PARA ZANJAS

Pasarela peatonal sobre zanja de ancho superior a 1,20 metros, para uso público en general, con plataforma de 1,20 m, de ancho mínimo, para una sobrecarga de 800kg/ml, con barandillas laterales, listón intermedio y rodapié. Poseerán rampas de acceso y se colocarán de manera horizontal.

ACCESOS A LA ZONA DE OBRAS

Para el acceso de peatones y de maquinaria, el cerramiento estará dotado de dos pasos uno para los primeros y otro para la segunda, todos ellos permanecerán cerrados en el horario fuera de jornada.

En los accesos se colocará los carteles de PROHIBICION DE ACCESO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA y demás señalización de seguridad pertinente.

AFECCIONES A VIALES

El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos, y el movimiento del personal en la obra debe quedar estableciendo itinerarios obligatorios.

Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las excavaciones. La señalización a utilizar estará de acuerdo con la normativa vigente del Ministerio de Fomento.

Conos de separación en carreteras. Se colocarán lo suficientemente próximos para delimitar en todo caso la zona de trabajo ó de peligro.

Se colocarán bandas de separación en carreteras de gran tráfico, con pies derechos metálicos bien empotrados en el balasto o en el terreno.

La banda será de plástico de colores amarillo y negra en trozos de unos diez cm. de longitud. Podrá ser sustituida por cuerdas o varillas metálicas con colgantes de colores vivos cada diez cm. En ambos casos la resistencia mínima a tracción será de 50 Kg.

Se deberán señalizar las zonas de peligro de voladuras y anunciar, mediante señales acústicas, el comienzo y final de las mismas.

Si se utilizan explosivos se tomarán las precauciones necesarias para evitar desgracias personales y daños en las cosas. Para ello debe señalizarse convenientemente el área de peligro, se pondrá vigilancia en la misma y se harán señales acústicas al comienzo de la voladura y una vez terminada. Debe tenerse muy presente que no se iniciará esta operación hasta que se tenga plena seguridad de que en el área de peligro no queda ninguna persona ajena a la voladura y a los agentes de vigilancia y que estos están suficientemente protegidos.

INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS

Se señalizarán las líneas enterradas de comunicaciones, telefónicas, de transporte de energía, etc., al igual que las conducciones de gas, agua, etc. que pueda ser afectadas durante los trabajos de movimiento de tierras, estableciendo las protecciones necesarias para respetarlas.

En las zonas en las que existan líneas aéreas de energía eléctrica sobre la zona de trabajo o de circulación, con riesgo de poder ser alcanzadas por la maquinaria empleada en la obra o de no mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad requerida, se instalarán a ambos lados de la línea un pórtico de limitación de altura, con señalización mediante banderolas, carteles indicadores de gálibo máximo y sensor para accionamiento de señal luminosa y acústica.

GALIBOS:

Los gálibos que se empleen deberán estar correctamente cimentados, mediante dados de hormigón o elementos de similar resistencia. Así mismo deberán poseer elementos metálicos que adviertan a los maquinistas, cuando cualquier elemento de una máquina les golpee, de que sobrepasan dichos gálibos.

ALMACENAMIENTO Y SEÑALIZACION DE PRODUCTOS

Todo material inflamable se mantendrá almacenado independientemente del resto de material con carteles indicativos de "Prohibido fumar" y " Prohibido encender fuego", colocándose el extintor de polvo polivalente.

El almacenamiento de botellas de oxígeno y acetileno, se hará independiente, manteniendo las botellas en vertical, se colocará además un tejadillo que impida la acción directa de los rayos del sol.

Todos los materiales químicos, se mantendrán perfectamente etiquetados, cumpliendo las condiciones de almacenamiento, establecidas por el fabricante.

SEGURIDAD FRENTE A TERCEROS

Los riesgos ocasionados a terceras personas pueden venir derivados de varias causas; circulación de vehículos, excavación de zanjas y pozos, trabajos en altura, pasos peatonales y deficiente señalización en zonas de peligro, etc.

Para evitar los riesgos motivados por la circulación se deberá contar con una señalización adecuada, vallado de las zonas de trabajo, indicación de la salida de camiones a vía pública, STOP a la salida de vehículos de obra, desvíos provisionales con piso en buen estado, señales de limitación de velocidad, obreros trabajando, etc.

ORDEN Y LIMPIEZA DE OBRA

En todo momento la obra, deberá mantenerse en correcto estado de orden y limpieza, en todos y cada uno de sus tajos. Se asignarán personas que se encarguen de dicho mantenimiento respecto a las zonas de trabajo, vías de acceso y asignación de las zonas de acopio de materiales

ESS: DESGLOSE DE PRESUPUESTO

ESS: MEDICIONES

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES		
			DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	00001190_RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN				
1	**PROTECCIONES COLECTIVAS**				
1.1	**PROTECCION ELECTRICA E INCENDIOS**				
1.1.1	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.				
	Total partida				8,00
1.1.2	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.				
	Total partida				4,00
1.1.3	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR.				
	Total partida				4,00
1.1.4	Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según norma UNE-23110 totalmente instalado.				
	Total partida				8,00
1.1.5	Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.				
	Total partida				4,00
1.1.6	Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.				
	Total partida				10,00
1.2	**PROTECCION ESPACIOS CONFINADOS**				
1.2.1	Ud Medidor portátil de gases de cuatro gases con protección ATEX, calibrado, incluye batería pero no cargador (amortizable en 5 obras).				
	Total partida				3,00
1.2.2	Ud Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 3.600 m3/h y presiones superiores a 345 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suminstro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras).				
	Total partida				6,00
1.2.3	Ud Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 4.900 m3/h y presiones superiores a 600 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suministro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras).				
	Total partida				2,00

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.2.4	Ud Walkie-talkies para trabajos en espacios confinados, con certificado ATEX, incluida bateria (amortizable en 5 obras).				
	Total partida				8,00
1.3	**PROTECCIÓN TRABAJOS EN ZANJA**				
1.3.1	Ud Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.				
	Total partida				10,00
1.3.2	Ud Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales. A disposición de la obra, incluye montaje, desmontaje, traslado entre tajos, p.p. de reposición y mantenimiento.(amortizable en 2 obras)				
	Total partida				4,00
1.3.3	Ud Rampa de escape, excavada lateralmente en el talud de la zanja principal, con una inclinación no superior a 30º y anchura no inferior a 60 cm, incluso mantenimiento y limpieza adecuados a las características y vigencia de su empleo.				
	Total partida				2,00
1.4	**PROTECCIÓN ANTICAÍDAS**				
1.4.1	m Barandilla de protección certificada de 1,10 m. de altura, para aberturas verticales en huecos, de clase A, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de 0,20 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje, según Norma UNE EN 13374 (amortizable en 5 usos).				
	Total partida				100,00
1.5	**CARTELES DE RIESGO**				
1.5.1	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.				
	Total partida				10,00
1.5.2	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.				
	Total partida				10,00
1.5.3	Ud Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.				
	Total partida				4,00
1.5.4	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. (3 usos)				
	Total partida				10,00

N.º Orden		DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2		**EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**				
2.1		**E.P.I. ANTICAÍDAS**				
2.1.1	m	Línea de vida horizontal temporal portátil, homologada, con elemento bloqueador, certificada para cuatro usuarios simultáneos, conforme a la norma EN 795. Con indicador de desgaste, regulable en longitud, tensor, conectores a adaptador giratorio. Incluso colocación y retirada y medios auxiliares. Amortizable en 4 usos				
		Total partida				6,00
2.1.2	Ud	Anclaje estructural, de clase A1 según UNE-EN 795, de acero inoxidable AISI 304, fijado a la estructura de forma permanente, certificado para dos personas, incluso tornillería de acero inoxidable, fijación y medios auxiliares, totalmente terminada.				
		Total partida				10,00
2.1.3	Ud	Dispositivo anticaídas retráctil para ascensos y descensos verticales, según UNE EN 360, con tope amortiguador de impactos, cable de acero galvanizado de 9 m de longitud, con mosquetón e indicador de carga que alerta de que ha sido expuesto a una caída y debe dejar de utilizarse. (Amortización en 5 usos)				
		Total partida				4,00
2.1.4	Ud	Absorbedor de energía, con gancho o mosquetón, según UNE-EN 355				
		Total partida				4,00
2.1.5	Ud	Arnés de seguridad homologado según EN 361, con cinturón acolchado integrado, con punto de sujeción en zona dorsal y otro para ascenso y descenso en la zona abdominal, con hombreras regulables con bucles en los hombros para el rescate, perneras acolchadas regulables, cuerda de dos metros regulable y dos mosquetones en los puntos de enganche.				
		Total partida				8,00
2.2		**E.P.I. PROTECCIÓN RESPIRACIÓN**				
2.2.1	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante con línea de aire comprimido o con manga de aire fresco de ventilación asistida con capucha, homologado según UNE-EN 14594 (amortizable en 5 obras).				
		Total partida				2,00
2.2.2	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante autónoma, de circuito abierto de aire comprimido, con máscara completa, para uso industrial, homologado según UNE-EN 137 (amortizable en 5 obras).				
		Total partida				2,00
2.2.3	Ud	Medias Máscaras filtrantes para la protección contra gases y vapores, según UNE-EN 405, con filtros recambiables según UNE-EN 141, con arnés de sujeción ajustable. Incluído el filtro de gases (amortización de la máscara en 5 obras)				
		Total partida				20,00

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
3	**EQUIPOS DE RESCATE ESPACIOS CONFINADOS, POZOS, ARQUETAS**				
3.1	Ud Trípode profesional para acceso y rescate en espacios confinados, fabricado en aluminio, apto para hasta 3 personas (2 en anclaje anticaídas y 1 en rescate), cabezal con poleas integradas, tacos de goma pivotantes en patas, con rescatador retráctil y polipasto para izado de carga y materiales hasta 300kg (Certificado EN795 Clase B). Incluso montaje y desmontaje. Amortizado en 4 obras				
	Total partida				1,00
3.2	Ud Pescante para el acceso y rescate de personas en espacios confinados o lugares de difícil acceso, como tanques, pozos, arquetas, y estructuras similares. Con base de anclaje en el extremo del pescante anclado a estructura o contrapesado (certificado sg. EN 795 Tipo A), apto para la elevación y descenso carga de hasta 250 kg (certificado sg. Directiva de máquinas 2006/42/CE) o para acceso o rescate de hasta 2 usuarios de forma simultánea (certficación TS 16415:2013) y que permita el giro del poste, con pescante ajustable en altura, con instalación de dispositivos de rescate tipo torno de recuperación y/o anticaídas con recuperador, con certificado ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Amortizado en 4 obras				
	Total partida				1,00
3.3	Ud Camilla de Rescate de Emergencia, con cesta desmontable, para transporte de pacientes, de aleación de aluminio (amortizable en 5 obras).				
	Total partida				1,00
3.4	Ud Cabrestante manual con una reducción mínima de 3: 1, para instalar directamente en el trípode o brazo de rescate. Con palanca de frenado para bloqueo de la cuerda y regulador para un control preciso de la velocidad de descenso. . Con cuerpo y polea de aluminio y cordón de 9 mm. Para carga máxima de 150 kg. Según EN 1496 clase B.				
	Total partida				2,00

ESS: CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
1	USEV010	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,79
2	USEV012	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	12,79
3	USEV015	Ud	Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,79
4	USEV020	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. (3 usos) CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	101,97
5	USSCA020	m	Barandilla de protección certificada de 1,10 m. de altura, para aberturas verticales en huecos, de clase A, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de 0,20 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje, según Norma UNE EN 13374 (amortizable en 5 usos). QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	15,14
6	USSCC010	Ud	Medidor portátil de gases de cuatro gases con protección ATEX, calibrado, incluye batería pero no cargador (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	201,61
7	USSCC030	Ud	Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 3.600 m3/h y presiones superiores a 345 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suminstro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	247,88
8	USSCC035	Ud	Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 4.900 m3/h y presiones superiores a 600 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suministro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	265,88
9	USSCC040	Ud	Walkie-talkies para trabajos en espacios confinados, con certificado ATEX, incluida bateria (amortizable en 5 obras). ONCE EUROS	11,00
10	USSCC055	Ud	Cabrestante manual con una reducción mínima de 3: 1, para instalar directamente en el trípode o brazo de rescate. Con palanca de frenado para bloqueo de la cuerda y regulador para un control preciso de la velocidad de descenso. . Con cuerpo y polea de aluminio y cordón de 9 mm. Para carga máxima de 150 kg. Según EN 1496 clase B. TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	350,00
11	USSCE010	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	39,89
12	USSCE020	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	43,89
13	USSCE030	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR. SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	63,89
14	USSCE110	Ud	Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según norma UNE-23110 totalmente instalado. SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	67,96

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
15	USSCE120	Ud	Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	135,89
16	USSCE160	Ud	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	164,06
17	USSCZ100	Ud	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada. DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	18,40
18	USSCZ130	Ud	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales. A disposición de la obra, incluye montaje, desmontaje, traslado entre tajos, p.p. de reposición y mantenimiento.(amortizable en 2 obras) DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	276,28
19	USSCZ140	Ud	Rampa de escape, excavada lateralmente en el talud de la zanja principal, con una inclinación no superior a 30º y anchura no inferior a 60 cm, incluso mantenimiento y limpieza adecuados a las características y vigencia de su empleo. SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	62,90
20	USSIC015	m	Línea de vida horizontal temporal portátil, homologada, con elemento bloqueador, certificada para cuatro usuarios simultáneos, conforme a la norma EN 795. Con indicador de desgaste, regulable en longitud, tensor, conectores a adaptador giratorio. Incluso colocación y retirada y medios auxiliares. Amortizable en 4 usos QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	15,11
21	USSIC020	Ud	Anclaje estructural, de clase A1 según UNE-EN 795, de acero inoxidable AISI 304, fijado a la estructura de forma permanente, certificado para dos personas, incluso tornillería de acero inoxidable, fijación y medios auxiliares, totalmente terminada. SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	65,32
22	USSIC030	Ud	Dispositivo anticaídas retráctil para ascensos y descensos verticales, según UNE EN 360, con tope amortiguador de impactos, cable de acero galvanizado de 9 m de longitud, con mosquetón e indicador de carga que alerta de que ha sido expuesto a una caída y debe dejar de utilizarse. (Amortización en 5 usos) SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	69,23
23	USSIC040	Ud	Absorbedor de energía, con gancho o mosquetón, según UNE-EN 355 TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	13,23
24	USSIC060	Ud	Arnés de seguridad homologado según EN 361, con cinturón acolchado integrado, con punto de sujeción en zona dorsal y otro para ascenso y descenso en la zona abdominal, con hombreras regulables con bucles en los hombros para el rescate, perneras acolchadas regulables, cuerda de dos metros regulable y dos mosquetones en los puntos de enganche. TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	36,23
25	USSIR020	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante con línea de aire comprimido o con manga de aire fresco de ventilación asistida con capucha, homologado según UNE-EN 14594 (amortizable en 5 obras). CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	154,44
26	USSIR025	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante autónoma, de circuito abierto de aire comprimido, con máscara completa, para uso industrial, homologado según UNE-EN 137 (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	252,28
27	USSIR030	Ud	Medias Máscaras filtrantes para la protección contra gases y vapores, según UNE-EN 405, con filtros recambiables según UNE-EN 141, con arnés de sujeción ajustable. Incluído el filtro de gases (amortización de la máscara en 5 obras) TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	33,43
28	USSR010	Ud	Trípode profesional para acceso y rescate en espacios confinados, fabricado en aluminio, apto para hasta 3 personas (2 en anclaje anticaídas y 1 en rescate), cabezal con poleas integradas, tacos de goma pivotantes en patas, con rescatador retráctil y polipasto para izado de carga y materiales hasta 300kg (Certificado EN795 Clase B). Incluso montaje y desmontaje. Amortizado en 4 obras MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	1.806,14

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
29	USSR020	Ud	Pescante para el acceso y rescate de personas en espacios confinados o lugares de difícil acceso, como tanques, pozos, arquetas, y estructuras similares. Con base de anclaje en el extremo del pescante anclado a estructura o contrapesado (certificado sg. EN 795 Tipo A), apto para la elevación y descenso carga de hasta 250 kg (certificado sg. Directiva de máquinas 2006/42/CE) o para acceso o rescate de hasta 2 usuarios de forma simultánea (certficación TS 16415:2013) y que permita el giro del poste, con pescante ajustable en altura, con instalación de dispositivos de rescate tipo torno de recuperación y/o anticaídas con recuperador, con certificado ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Amortizado en 4 obras TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3.880,88
30	USSR030	Ud	Camilla de Rescate de Emergencia, con cesta desmontable, para transporte de pacientes, de aleación de aluminio (amortizable en 5 obras). CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	187,50

En Pamplona, Junio de 2026

ESS: PRESUPUESTO

Nº Orden	Descripción de las Unidades de Obra	Uds	Dimensiones	Subtotal	Medición	Precio	Importe
	00001190_RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN						
1	**PROTECCIONES COLECTIVAS**						
1.1	**PROTECCION ELECTRICA E INCENDIOS**						
1.1.1	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.						
	Total partida				8,00	39,89	319,12
1.1.2	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR.						
	Total partida				4,00	43,89	175,56
1.1.3	Ud Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR.						
	Total partida				4,00	63,89	255,56
1.1.4	Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según norma UNE-23110 totalmente instalado.						
	Total partida				8,00	67,96	543,68
1.1.5	Ud Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.						
	Total partida				4,00	135,89	543,56
1.1.6	Ud Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.						
	Total partida				10,00	164,06	1.640,60
	capítulo 1.1						**3.478,08**
1.2	**PROTECCION ESPACIOS CONFINADOS**						
1.2.1	Ud Medidor portátil de gases de cuatro gases con protección ATEX, calibrado, incluye batería pero no cargador (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				3,00	201,61	604,83
1.2.2	Ud Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 3.600 m3/h y presiones superiores a 345 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suminstro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				6,00	247,88	1.487,28

Nº Orden	Descripción de las Unidades de Obra	Uds	Dimensiones	Subtotal	Medición	Precio	Importe
1.2.3	Ud Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 4.900 m3/h y presiones superiores a 600 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suministro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				2,00	265,88	531,76
1.2.4	Ud Walkie-talkies para trabajos en espacios confinados, con certificado ATEX, incluida bateria (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				8,00	11,00	88,00
	capítulo 1.2						**2.711,87**
1.3	**PROTECCIÓN TRABAJOS EN ZANJA**						
1.3.1	Ud Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada.						
	Total partida				10,00	18,40	184,00
1.3.2	Ud Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales. A disposición de la obra, incluye montaje, desmontaje, traslado entre tajos, p.p. de reposición y mantenimiento.(amortizable en 2 obras)						
	Total partida				4,00	276,28	1.105,12
1.3.3	Ud Rampa de escape, excavada lateralmente en el talud de la zanja principal, con una inclinación no superior a 30º y anchura no inferior a 60 cm, incluso mantenimiento y limpieza adecuados a las características y vigencia de su empleo.						
	Total partida				2,00	62,90	125,80
	capítulo 1.3						**1.414,92**
1.4	**PROTECCIÓN ANTICAÍDAS**						
1.4.1	m Barandilla de protección certificada de 1,10 m. de altura, para aberturas verticales en huecos, de clase A, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de 0,20 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje, según Norma UNE EN 13374 (amortizable en 5 usos).						
	Total partida				100,00	15,14	1.514,00
	capítulo 1.4						**1.514,00**
1.5	**CARTELES DE RIESGO**						
1.5.1	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.						
	Total partida				10,00	10,79	107,90
1.5.2	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.						
	Total partida				10,00	12,79	127,90
1.5.3	Ud Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.						
	Total partida				4,00	15,79	63,16
1.5.4	Ud Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. (3 usos)						

Nº Orden	Descripción de las Unidades de Obra	Uds	Dimensiones	Subtotal	Medición	Precio	Importe
	Total partida				10,00	101,97	1.019,70
	capítulo 1.5						**1.318,66**
	capítulo 1						**10.437,53**
2	**EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**						
2.1	**E.P.I. ANTICAÍDAS**						
2.1.1	m Línea de vida horizontal temporal portátil, homologada, con elemento bloqueador, certificada para cuatro usuarios simultáneos, conforme a la norma EN 795. Con indicador de desgaste, regulable en longitud, tensor, conectores a adaptador giratorio. Incluso colocación y retirada y medios auxiliares. Amortizable en 4 usos						
	Total partida				6,00	15,11	90,66
2.1.2	Ud Anclaje estructural, de clase A1 según UNE-EN 795, de acero inoxidable AISI 304, fijado a la estructura de forma permanente, certificado para dos personas, incluso tornillería de acero inoxidable, fijación y medios auxiliares, totalmente terminada.						
	Total partida				10,00	65,32	653,20
2.1.3	Ud Dispositivo anticaídas retráctil para ascensos y descensos verticales, según UNE EN 360, con tope amortiguador de impactos, cable de acero galvanizado de 9 m de longitud, con mosquetón e indicador de carga que alerta de que ha sido expuesto a una caída y debe dejar de utilizarse. (Amortización en 5 usos)						
	Total partida				4,00	69,23	276,92
2.1.4	Ud Absorbedor de energía, con gancho o mosquetón, según UNE-EN 355						
	Total partida				4,00	13,23	52,92
2.1.5	Ud Arnés de seguridad homologado según EN 361, con cinturón acolchado integrado, con punto de sujeción en zona dorsal y otro para ascenso y descenso en la zona abdominal, con hombreras regulables con bucles en los hombros para el rescate, perneras acolchadas regulables, cuerda de dos metros regulable y dos mosquetones en los puntos de enganche.						
	Total partida				8,00	36,23	289,84
	capítulo 2.1						**1.363,54**
2.2	**E.P.I. PROTECCIÓN RESPIRACIÓN**						
2.2.1	Ud Equipo de protección respiratoria aislante con línea de aire comprimido o con manga de aire fresco de ventilación asistida con capucha, homologado según UNE-EN 14594 (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				2,00	154,44	308,88
2.2.2	Ud Equipo de protección respiratoria aislante autónoma, de circuito abierto de aire comprimido, con máscara completa, para uso industrial, homologado según UNE-EN 137 (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				2,00	252,28	504,56
2.2.3	Ud Medias Máscaras filtrantes para la protección contra gases y vapores, según UNE-EN 405, con filtros recambiables según UNE-EN 141, con arnés de sujeción ajustable. Incluído el filtro de gases (amortización de la máscara en 5 obras)						
	Total partida				20,00	33,43	668,60
	capítulo 2.2						**1.482,04**
	capítulo 2						**2.845,58**

Nº Orden	Descripción de las Unidades de Obra	Uds	Dimensiones	Subtotal	Medición	Precio	Importe
3	**EQUIPOS DE RESCATE ESPACIOS CONFINADOS, POZOS, ARQUETAS**						
3.1	Ud Trípode profesional para acceso y rescate en espacios confinados, fabricado en aluminio, apto para hasta 3 personas (2 en anclaje anticaídas y 1 en rescate), cabezal con poleas integradas, tacos de goma pivotantes en patas, con rescatador retráctil y polipasto para izado de carga y materiales hasta 300kg (Certificado EN795 Clase B). Incluso montaje y desmontaje. Amortizado en 4 obras						
	Total partida				1,00	1.806,14	1.806,14
3.2	Ud Pescante para el acceso y rescate de personas en espacios confinados o lugares de difícil acceso, como tanques, pozos, arquetas, y estructuras similares. Con base de anclaje en el extremo del pescante anclado a estructura o contrapesado (certificado sg. EN 795 Tipo A), apto para la elevación y descenso carga de hasta 250 kg (certificado sg. Directiva de máquinas 2006/42/CE) o para acceso o rescate de hasta 2 usuarios de forma simultánea (certficación TS 16415:2013) y que permita el giro del poste, con pescante ajustable en altura, con instalación de dispositivos de rescate tipo torno de recuperación y/o anticaídas con recuperador, con certificado ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Amortizado en 4 obras						
	Total partida				1,00	3.880,88	3.880,88
3.3	Ud Camilla de Rescate de Emergencia, con cesta desmontable, para transporte de pacientes, de aleación de aluminio (amortizable en 5 obras).						
	Total partida				1,00	187,50	187,50
3.4	Ud Cabrestante manual con una reducción mínima de 3: 1, para instalar directamente en el trípode o brazo de rescate. Con palanca de frenado para bloqueo de la cuerda y regulador para un control preciso de la velocidad de descenso. . Con cuerpo y polea de aluminio y cordón de 9 mm. Para carga máxima de 150 kg. Según EN 1496 clase B.						
	Total partida				2,00	350,00	700,00
	capítulo 3						**6.574,52**
	Total presupuesto						**19.857,63**

Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
1	PROTECCIONES COLECTIVAS	10.437,53
2	EQUIPOS ESPECIALES DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	2.845,58
3	EQUIPOS DE RESCATE ESPACIOS CONFINADOS, POZOS, ARQUETAS	6.574,52

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**19.857,63 €**
10 % Gastos Generales	1.985,76 €
6 % Beneficio Industrial	1.191,46 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	**23.034,85 €**
21 % I.V.A.	4.837,32 €
TOTAL PRESUPUESTO	**27.872,17 €**

Asciende el presupuesto proyectado a la expresada cantidad de:
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

En Pamplona, Junio de 2026

ANEJO Nº5 ESTUDIO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

ÍNDICE

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

2. DATOS DE LA OBRA

3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS

4.1. CODIFICACIÓN DE LOS RCD

4.2. CUANTIFICACIÓN

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

5.1. PREVENCIÓN

5.2. REUTILIZACIÓN

5.3. VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN

6. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS. MANEJO, ALMACENAJE, SEPARACIÓN, ETC…

7. PLIEGO DE CONDICIONES

7.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

7.2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

7.3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD

8.1. CONCEPTOS DE ABONO

8.1.1. Costes de segregación de residuos

8.1.2. Transporte a vertedero/gestor

8.1.3. Tasas de Gestión de Residuos

8.1.3.1. Tasa de vertido (D5) de tierras y piedras no contaminadas

8.1.3.2. Tasa de gestión de residuos no peligrosos

8.1.3.3. Tasa de gestión de residuos peligrosos

8.2. MEDICIÓN

8.3. PRESUPUESTO

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (en adelante RCD) tiene por objeto la clasificación, codificación y cuantificación de los RCD generados en la ejecución de las unidades de obra, así como las previsiones respecto a las medidas de prevención, reutilización, valorización o eliminación.

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora, que deberá preparar y presentar el Plan de Gestión de RCD correspondiente.

En dicho Plan se concretará como se aplicará el estudio de gestión del proyecto, adaptado a sus propios sistemas y medios de ejecución, conforme al cumplimiento del Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo.

2. DATOS DE LA OBRA

Título. 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA
Promotor. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Productor de los Residuos. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Poseedor de los Residuos. El contratista adjudicatario

3. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el DF 23/2011, se redacta el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1- Identificación y estimación de los residuos que se van a generar codificados con arreglo al Anejo 2A.
2- Medidas para la prevención, reutilización, valoración o eliminación de estos residuos.
3- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc.
4- Prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto.
5- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCD, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

4. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo ejecutado.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, se decidirá si se pueden reducir, reutilizar y/o reciclar.

Se deberá elaborar un inventario de los residuos peligrosos que sean previsibles.

4.1. CODIFICACIÓN DE LOS RCD

Por RCD se entiende cualquier residuo que se genera en una obra y que figure en la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero) (BOE nº43 de 19-02-02 y BOE nº61 de 12-03-02),

exceptuando las tierras no contaminadas con sustancias peligrosas que sean reutilizadas en la misma obra o en otra autorizada.

La identificación y codificación de los residuos de la obra según esta lista es el primer paso en la gestión de los mismos.

Se trascribe aquí el capítulo 17 de esta lista, que agrupa la mayoría de los residuos que se generan en una obra.

17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas)

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos.
- 17 01 01 Hormigón.
- 17 01 02 Ladrillos.
- 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.
- 17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que contienen sustancias peligrosas.
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06.

17 02 Madera, vidrio y plástico.
- 17 02 01 Madera.
- 17 02 02 Vidrio.
- 17 02 03 Plástico.
- 17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados.
- 17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cód. 17 03 01
- 17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)
- 17 04 01 Cobre, bronce, latón.
- 17 04 02 Aluminio.
- 17 04 03 Plomo.
- 17 04 04 Zinc.
- 17 04 05 Hierro y acero.
- 17 04 06 Estaño.
- 17 04 07 Metales mezclados.
- 17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas.
- 17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas.
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje.
- 17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.
- 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas

		en el código 17 05 03.
	17 05 05*	Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.
	17 05 06	Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05.
	17 05 07*	Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas.
	17 05 08	Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07.
17 06	Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto.	
	17 06 01*	Materiales de aislamiento que contienen amianto.
	17 06 03*	Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas.
	17 06 04	Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.
	17 06 05*	Materiales de construcción que contienen amianto [6].
17 08	Materiales de construcción a partir de yeso.	
	17 08 01*	Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
	17 08 02	Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01.
17 09	Otros residuos de construcción y demolición.	
	17 09 01*	Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio.
	17 09 02*	Residuos de construcción y demolición que contienen PCB [por ejemplo, sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB].
	17 09 03*	Otros residuos de construcción y demolición [incluidos los residuos mezclados] que contienen sustancias peligrosas.
	17 09 04	Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

Los residuos que aparecen con un * asterisco se consideran RESIDUOS PELIGROSOS de acuerdo a la Directiva 2008/98/CE.

4.2. CUANTIFICACIÓN

Los RCD se generan en una obra tanto en fase de almacenaje como en fase de ejecución.

Para esta obra el origen esperado de los RCD durante la ejecución es:

I. Tierras y pétreos no contaminados sobrantes de excavaciones
II. Residuos de demoliciones de pavimentos
III. Residuos mixtos procedentes de:
    a. Residuos de demoliciones de obras de fábrica, pavimentos, ejecuciones defectuosas, etc.
    b. Envases y auxiliares de transporte.
    c. Sobrantes (mermas, pérdidas, etc.) de productos
IV. Materiales de construcción que contienen amianto

Las condiciones generales de la obra pueden incidir en una mayor o menor producción de RCD, como son una organización inadecuada, que conlleva aumentos de sobrantes, mermas, ejecuciones defectuosas, etc.

La densidad de los RCD es un valor que depende de la composición y granulometría del residuo. Esta densidad varía entre valores de 0,5 y 1,5 Tn/m3.

De acuerdo a la clasificación expuesta, los criterios de medición por tipo de residuo esperado son:

I. Cálculo de tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación (Código LER 17 05 04)

De acuerdo a las mediciones del proyecto, los excedentes son:

Designación	*Volumen Zanja (m3)*	*Volumen Registros (m3)*
Abastecimiento	1301,21	93,04
Fecales	2915,38	304,47
Pluviales	1371,97	110,82
Total	**5588,56**	**508,33**

II. Cálculo de residuos procedentes de demolición de pavimentos.

De acuerdo a las mediciones del proyecto, la cantidad esperada es:

- Cálculo de Mezclas bituminosas (Código LER 17 03 02)

Designación	*Superficie MBC (m²)*	*Espesor (m)*	*V. Total (m³)*
Abastecimiento	1703,25	0,12	**204,39**
Fecales	1278,76	0,12	**153,45**
Pluviales	966,51	0,12	**115,98**
Total mezclas bituminosas (Código LER 17 03 02)			**473,82**

- Cálculo de pav. hormigón (Código LER 17 01 01)

Designación	*Superficie Hormigón(m²)*	*Espesor (m)*	*V. Total (m³)*
Abastecimiento	38,40	0,1	**3,84**
Fecales	58,89	0,1	**5,89**
Pluviales	41,83	0,1	**4,18**
Total Pav. hormigón (Código LER 17 01 01)			**13,91**

III. Cálculo de RCD mixtos

No existiendo información muy precisa sobre los residuos generados por el sector de la construcción, y ante la necesidad de disponer de datos para elaborar las actuaciones a realizar, existen diversos estudios que tratan de dar un índice global de producción de RCD mixtos/m2 ó m construido, según sea obra nueva u obra de demolición.

En base a la bibliografía y experiencia propia en este tipo de obras, se establecen los siguientes índices para el tipo de obras de instalación y/o renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en entornos urbanos o periurbanos:

Saneamiento PVC/HA

V. Unitario (m³/ml)	Densidad (Kg/m³)
0,015	1200

Abastecimiento FN

V. Unitario (m³/ml)	Densidad (Kg/m³)
0,01	1200

En base a ello, aplicando la longitud de la conducción a establecer:

Vol. RCD mixtos en red saneamiento (fecales y pluviales):

Longitud (m)	V. Unitario (m³/ml)	V. Total Saneamiento (m³)
1575	0,015	23,63

Vol. RCD mixtos en red abastecimiento:

Longitud (m)	V. Unitario (m³/ml)	V. Total Abastecimiento (m³)
1008	0,01	10,08

Peso residuos mixtos:

	Volumen (m³)	Densidad (Kg/m³)	Peso (Kg)
Saneamiento (Fec y Pluv)	23,63	1200	**28.356,00**
Abastecimiento	10,08	1200	**12.096,00**
			40.452,00

Con idénticos criterios la composición en peso estimada de los mismos se ha considerado según:

Residuo	% en peso	Residuo	% en peso
Madera	20	Aridos	25
Metales	10	Hormigón	25
Papel	5	Basura (asimilable a RSU)	5
Plástico	5	Peligrosos	5

En la siguiente tabla se indican las cantidades de RCD previstas en la obra:

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC	% de peso	Toneladas RDC	Densidad Tn/m³	Volumen m³
RCD: Naturaleza no pétrea				
1. Madera	20	8,09	0,70	11,56
2. Metales	10	4,05	7,00	0,58
3. Papel/cartón	5	2,02	0,40	5,05
4. Plástico	5	2,02	0,90	2,24
TOTAL estimación	**40%**	**16,18**		**19,43**
RCD: Naturaleza pétrea				
1. Arena, grava y otros áridos	25	10,11	2,00	5,06
2. Hormigón	25	10,11	2,00	5,06
TOTAL estimación	**50%**	**20,22**		**10,12**

RCD: Otros				
1. Basuras (Residuos asimilables a urbanos)	5	2,02	1,00	2,02
2. Potencialmente Peligrosos	5	2,02	1,00	2,02
TOTAL estimación	**10%**	**4,04**		**4,04**

IV. Cálculo materiales de construcción que contienen amianto (Código LER 17 06 05)

En el proyecto se ha considerado el desmontaje de algún tramo de tubería de fibrocemento existente. Los trabajos deberán realizarse desmontando manualmente los tramos de tubería afectada, e intentando que los cortes realizados sean mínimos.

Una vez desmontados se embolsarán en bolsas apropiadas y se llevarán a Gestor autorizado RPs que se encargará de trasferirlo a un depósito de seguridad homologado., en el presupuesto de proyecto se ha considerado una cantidad de residuo estimada, basándose en que pudiera ir mezclada con restos de tierras.

Todas las operaciones con los materiales que contengan fibrocemento deberán realizarse por personal especializado y acreditado para este tipo de trabajos.

Se ha considerado que se desmontarán pequeños tramos alternos afectados por las conexiones en acometidas y las conexiones de las nuevas tuberías, calculándose en un total de 12 m lineales de tubería de fibrocemento afectada.

El peso de este material contaminante se estima contemplando el tubo y el material de excavación próximo contenido en un área de 0.14 m2 de sección alrededor del tubo y en función de 1,5 Tn/m3

Longitud de tubería de FC: 12 m
Volumen de material con amianto: 12 m x 0,14 m2 = 1,68 m3
Peso del material con amianto: 1,68 m3 x 1,5 Tn/m3 = 2,52 Tn

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN

Los objetivos de toda gestión de residuos deben ser la prevención de la producción de residuos para mejorar su gestión y el fomento, por este orden, de su reutilización, reciclado y otras formas de valorización.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tiRG
po y el volumen de residuos que se producirán, planificar en cada fase del proceso la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

5.1. PREVENCIÓN

Se establecen los siguientes objetivos, a los que deberá adecuarse el poseedor de los residuos en las estrategias a plasmar en el Plan de Gestión de Residuos.

Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero.

En particular debe evitarse la mezcla de tierras y piedras sobrantes no contaminadas, que impidan su posterior reutilización.

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición.

Disponer de un directorio de las empresas gestoras y transportistas de residuos autorizadas por la comunidad autónoma.

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

5.2. REUTILIZACIÓN

El objetivo es incorporar los RCD al proceso constructivo sin tratamiento físico químico.
En el caso de las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas que se generan en las actividades de excavación en obra, pueden y deben ser reutilizadas:

En la misma obra, cuando el proyecto o la dirección de obra así lo autoricen.

En una obra distinta: el contratista deberá indicar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización en otras obras en las que sea adjudicatario.

En una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, cuando el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo haya declarado.

En caso que sean reutilizadas en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

En el caso de zahorras artificiales (01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 1 04 07) obtenidas en la excavación de zonas pavimentadas, debe preverse su reutilización en posteriores rellenos de zanjas.

El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización de estos materiales.

5.3. VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN

Está prohibido el depósito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a algún tratamiento previo.

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).

Independientemente de la cantidad generada, debe hacerse una separación de los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, debiendo ser incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.
Posteriormente, y en base al artículo 5.4 del DF 23/2011, los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón	80,00 T
Ladrillos, tejas, cerámicos	40,00 T
Metales	2,00 T
Madera	1,00 T
Vidrio	1,00 T
Plásticos	0,50 T
Papel y cartón	0,50 T

En este caso, las cantidades de residuos generadas no superan el límite establecido, por lo que no es obligatoria la separación en fracciones.

Aún así, por la tipología de la obra, se considera que no existen razones técnicas que imposibiliten o hagan excesivamente gravoso la segregación en obra de los residuos. Por tanto, la separación en fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los RCD dentro de la obra.
El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión cuales han de ser los medios y los métodos organizativos que aseguren el correcto cumplimiento de la obligación de segregación de los residuos en obra.
La separación de fracciones por un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de RCD externa a la obra, se considera una mala práctica. Dicha práctica sólo podrá llevarse a cabo previa justificación técnica y autorización expresa de la Dirección Facultativa. En cualquier caso correrá a cuenta del poseedor.

Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo)

	OPERACIÓN PREVISTA
X	No hay previsión de valorización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán transportados a gestor autorizado
	Opciones de valorización indicadas en el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ".

Los RCD se valorizan mediante el reciclado en una instalación autorizada. El poseedor estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos autorizado por la comunidad autónoma.
La entrega de los RCD a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los RCD efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los RCD por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
La eliminación del rechazo (material tratado no apto para su reutilización o reciclaje) se produce por depósito en un vertedero autorizado. Está prohibido el depósito en vertedero de RCD que no hayan sido sometidos a algún tratamiento previo.

Se indican a continuación las características y el tratamiento de cada tipo de residuos.

	1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN		**Tratamiento**	**Destino**
x	17 05 04	Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03	Sin tratamiento esp.	Restauración / Vertedero

	RCD: NATURALEZA NO PETREA		**Tratamiento**	**Destino**
	1. Asfalto			
x	17 03 02	Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01	Reciclado	Planta de reciclaje RCD
	2. Madera			
x	17 02 01	Madera	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
	3. Metales			
x	17 04 05	Hierro y Acero	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
	17 04 06	Metales mezclados	Reciclado	
	17 04 11	Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10	Reciclado	
	4. Papel			
x	20 01 01	Papel	Reciclado	Gestor autorizado RNPs
	5. Plástico			
x	17 02 03	Plástico	Reciclado	Gestor autorizado RNPs

	RCD: NATURALEZ PETREA		**Tratamiento**	**Destino**
	1. Arena Grava y otros áridos			
*	01 04 08	Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07	Reciclado	Planta de reciclaje RCD
	2. Hormigón			
x	17 01 01	Hormigón	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RCD

	RCD: OTROS		**Tratamiento**	**Destino**
	1. Basuras			
x	20 02 01	Residuos biodegradables	Reciclado / Vertedero	Planta de reciclaje RSU

	2. Potencialmente peligrosos			
x	15 01 11	Aerosoles vacíos	Depósito/Tratamiento	Gestor autorizado RPs
x	15 01 10	Envases contaminados	Depósito/Tratamiento	Gestor autorizado RPs

6. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS. MANEJO, ALMACENAJE, SEPARACIÓN, ETC…

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos.

Deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. Así hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo se facilitará su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores.

En el Plan de Gestión deberán figurar los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

En los planos se debe especificar la situación y dimensiones de:

x	Acopios y/o contenedores de los distintos RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones…
x	Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
x	Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
x	Contenedores para residuos urbanos
x	Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos.

7. PLIEGO DE CONDICIONES

7.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

DECRETO FORAL 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2002; Corrección de errores BOE 61, de 12 de marzo de 2002)

7.2. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

El poseedor de los residuos presentará ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que

únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

7.3. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

Mientras se encuentren los residuos en su poder, el poseedor los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Esta segregación debe ser asumida por el poseedor y ser realizada en obra. Sólo previa justificación y aprobación expresa de la Dirección Facultativa, puede ser realizada por el Gestor final, debiendo obtener igualmente por parte del mismo un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

Facilitará la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Informará a la Dirección de la Obra acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

No sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCD

8.1. CONCEPTOS DE ABONO

La medición y abono de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición incluye los siguientes conceptos:

8.1.1. Costes de segregación de residuos

Se consideran como costes indirectos los gastos de segregación de residuos, independientemente que esta se realice por el poseedor en la misma obra o se encargue la misma a Gestor autorizado. Estos costes incluyen la instalación y gestión de acopios e instalaciones de segregación de residuos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

8.1.2. Transporte a vertedero/gestor

Se abonarán por metro cúbico y kilómetro (m^3.km) al precio indicado en el cuadro de precios del presupuesto.
Dicho precio se ajustará a la menor distancia por carretera desde el origen del residuo hasta la localización del vertedero o gestor indicado en el Plan de Gestión de Residuos aprobado.
La medición se realizará sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio de transporte.
Serán válidas todas las indicaciones al respecto del pliego general del proyecto.

8.1.3. Tasas de Gestión de Residuos

El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión sus previsiones de elección de gestores autorizados para cada tipo de residuo. Los criterios de selección se guiarán por los principios de idoneidad, eficiencia y economía. Cualquier cambio en obra con respecto a lo indicado en el Plan de Gestión aprobado, deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.
La medición se realizará sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio del canon.

8.1.3.1. Tasa de vertido (D5) de tierras y piedras no contaminadas

Se abonará en el caso de que el destino final sea el vertido en vertedero de inertes autorizado. La elección de vertedero será la que figure en el Plan de Gestión de Residuos aprobado o en su caso otro admitido por la Dirección de Obra a propuesta del contratista. El canon de vertido será el que figura en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

Cuando el contratista, en su Plan de Gestión, contemple la utilización de estos materiales en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, propuesta por él mismo y declarada como tal por el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, el canon de vertido será el que figure en el Plan de Gestión de residuos aprobado, previa justificación por parte del contratista.
El contratista debe indicar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización de estos materiales en otras obras en las que sea adjudicatario. En este caso no se abonará ningún precio en concepto de canon de vertido, entendiéndose que el vertido y los acopios intermedios son sufragados por el canon de tierras de préstamo de la obra receptora de dichos materiales.

8.1.3.2. Tasa de gestión de residuos no peligrosos

No se considerará la tasa de gestión de aquellos materiales reutilizables para los que ya existe un mercado, como son las fracciones de residuos ya segregadas de madera, vidrio, metal, plástico y papel o cartón. En este caso sólo será aplicable el coste del transporte al gestor autorizado aprobado en el Plan de Gestión.

La tasa de gestión de residuos inertes o de residuos no peligrosos asimilables a urbanos en vertedero será la que figure en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

8.1.3.3. Tasa de gestión de residuos peligrosos

Se abonará la tasa de gestión de fracciones de residuos peligrosos ya segregados. La elección de gestor autorizado será la que figure en el Plan de Gestión de Residuos aprobado o en su caso otro admitido por la Dirección de Obra a propuesta del contratista.

La tasa de gestión de residuos peligrosos será el que figura en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

8.2. MEDICIÓN

La medición de materiales a transportar se realizará sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio de transporte y de canon.

El desglose de las mediciones se encuentra desarrollado en el capítulo correspondiente del presupuesto del proyecto.


8.3. PRESUPUESTO

El presupuesto del presente Estudio de Gestión de RCD está desarrollado en el correspondiente capítulo del presupuesto del proyecto.


DOCUMENTO Nº2 PLANOS

INDICE


PLANO Nº1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
PLANO Nº2 CONJUNTO DE REDES.PLANTA ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº3 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº4 ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº5 ABASTECIMIENTO. NUDOS.
PLANO Nº6 ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.
PLANO Nº7 SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.
PLANO Nº8 SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES.
PLANO Nº9 ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.
PLANO Nº10 SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO

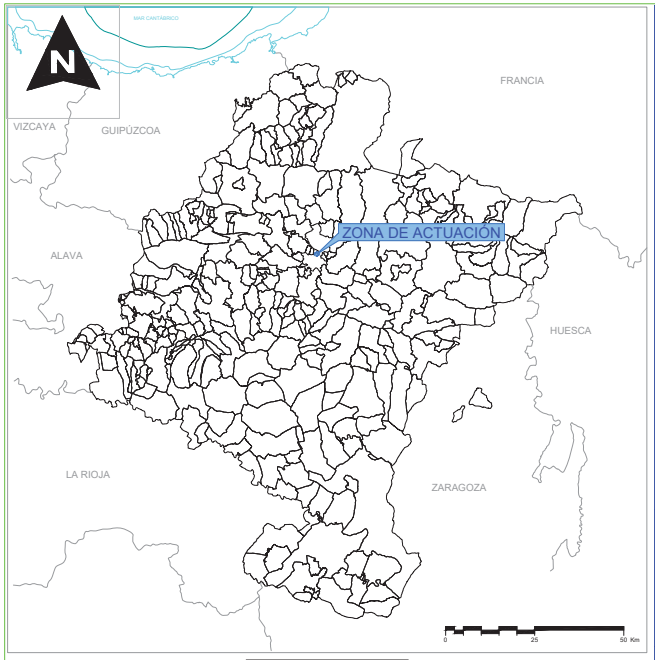

NAVARRA

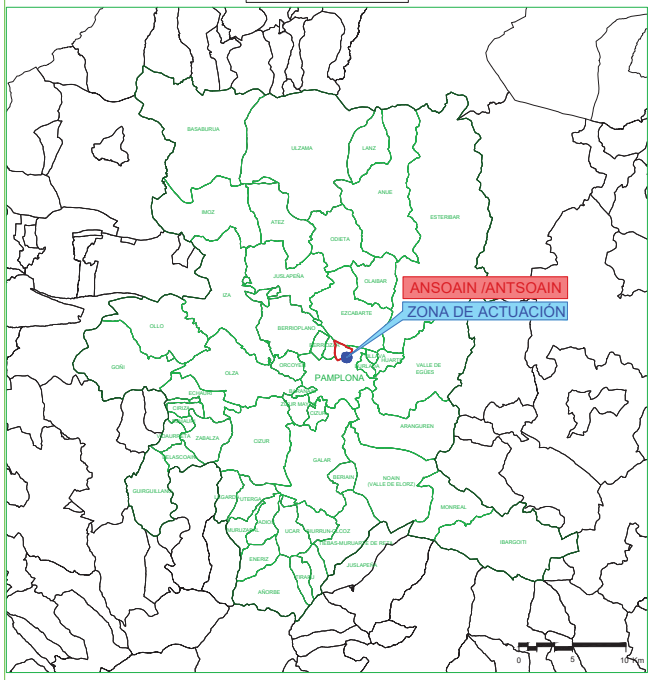


COMARCA

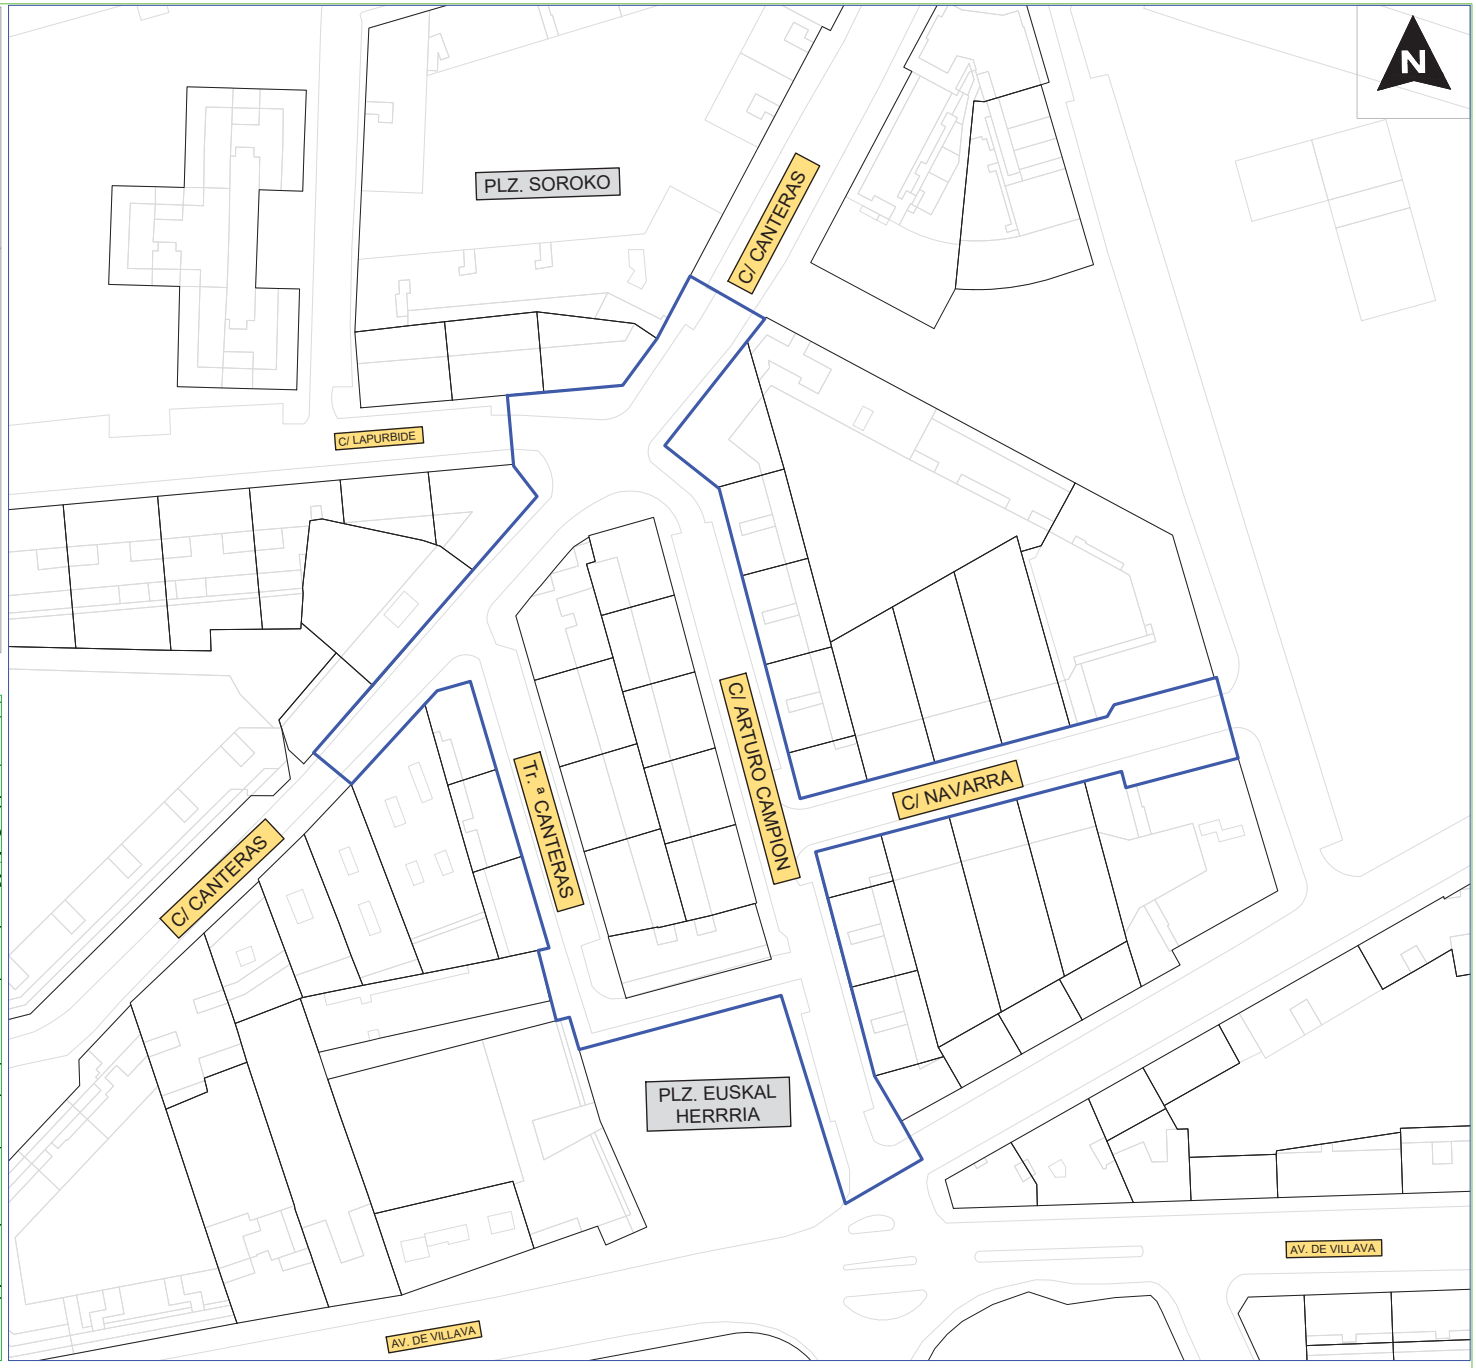

ZONA DE ACTUACION

Mancomunidad Comarca de Pamplona Instituto Mankomunitatea / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. Instituto Zerbitzuak s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosituacionyemplazamiento.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO: SITUACION Y EMPLAZAMIENTO.	Nº DE PLANO: 1 / Nº DE HOJA: 1 de 1

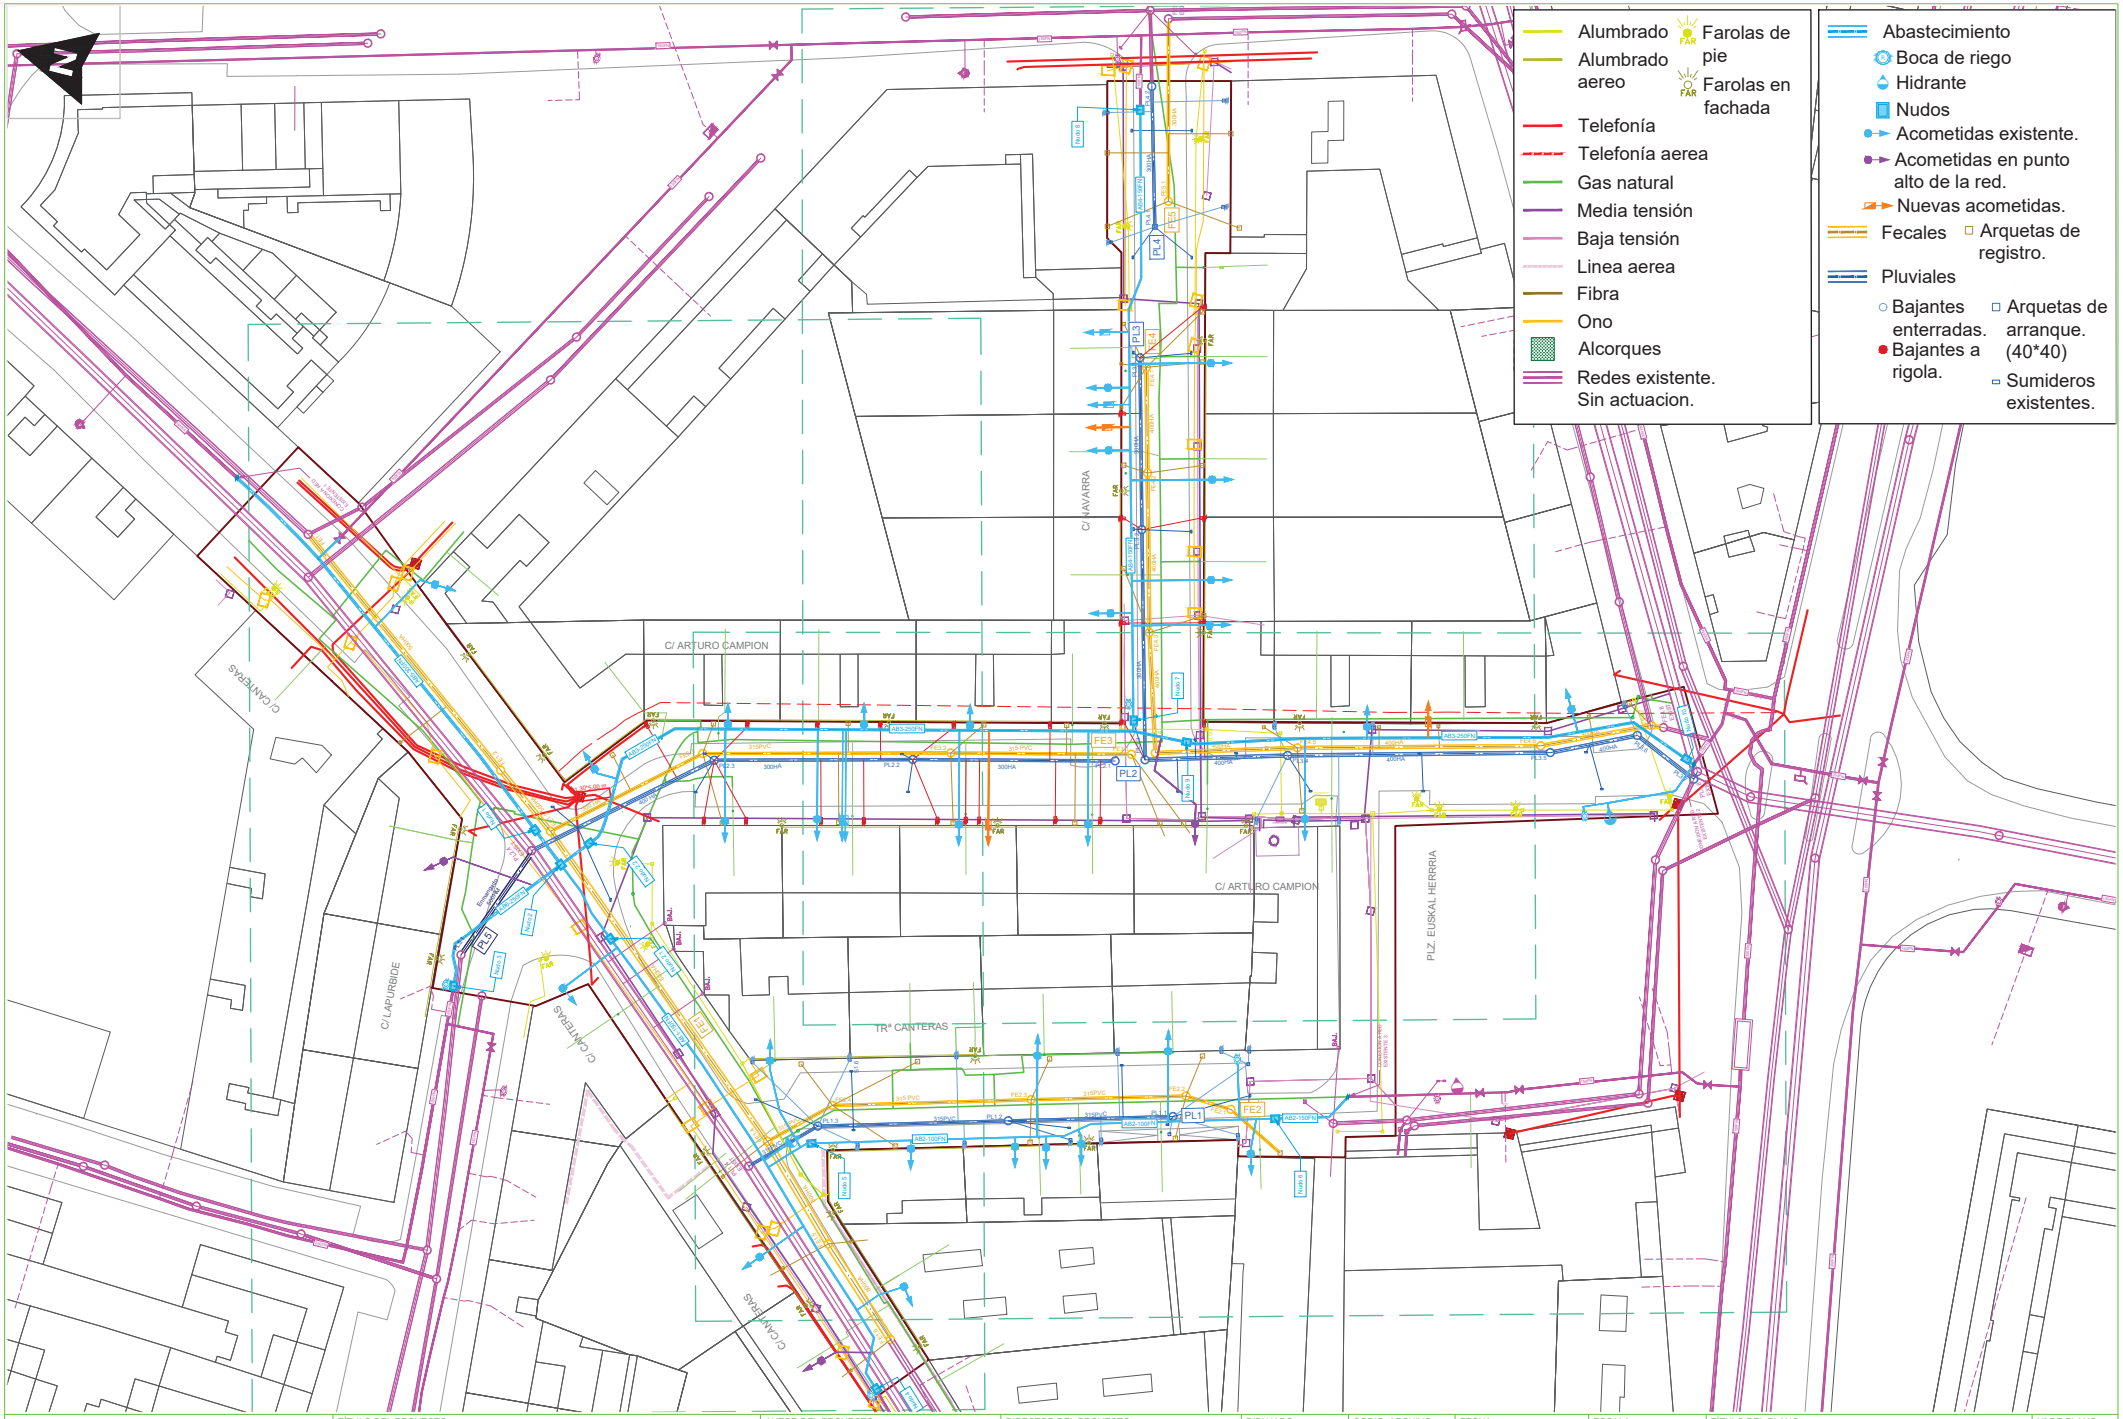

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Servicios de la Comarca de Pamplona

TÍTULO DEL PROYECTO

00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA

AUTOR DEL PROYECTO

Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

DIRECTOR DEL PROYECTO

Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

DIBUJADO

CODIG. ARCHIVO

CODIGO DWG

00001190 planoconjuntoderedesplantadeestadodefinitivo.dwg

FECHA

JUNIO 2026

ESCALA

A3 = 1/750
A1 = 1/325

TÍTULO DEL PLANO

CONJUNTO DE REDES.
PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.

Nº DE PLANO

2

Nº DE HOJA


1 de 4




Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoconjuntoderedesplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: CONJUNTO DE REDES. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 2 / Nº DE HOJA: 2 de 4



Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoconjuntoderedesplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: CONJUNTO DE REDES. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 2 / Nº DE HOJA: 3 de 4

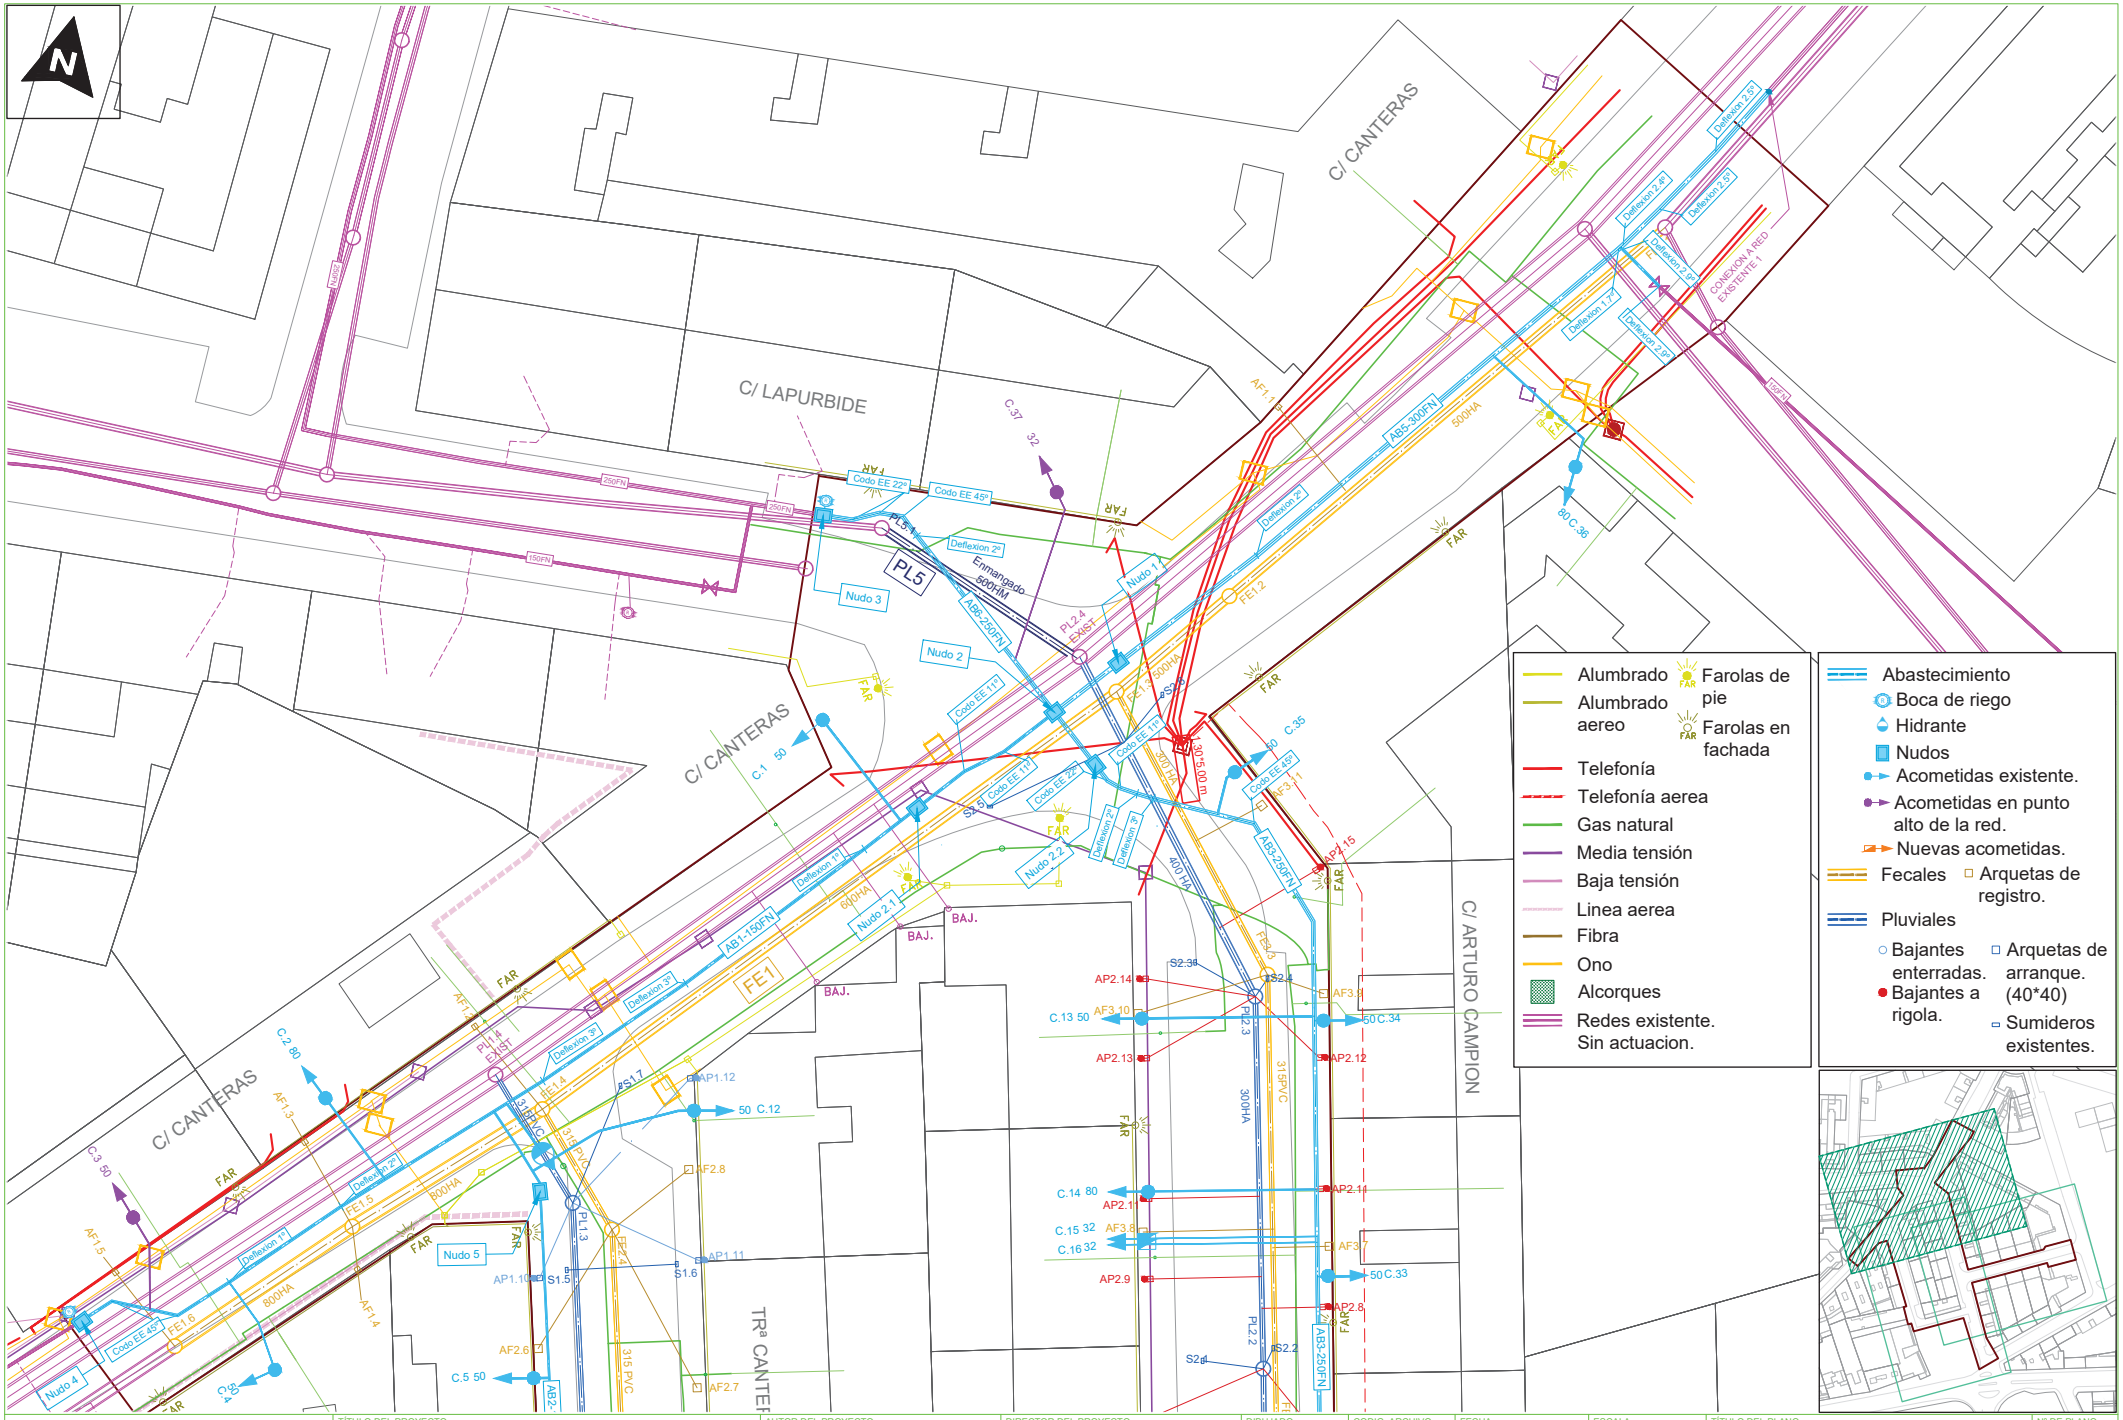

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoconjuntoderedesplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: CONJUNTO DE REDES. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 2 / Nº DE HOJA: 4 de 4

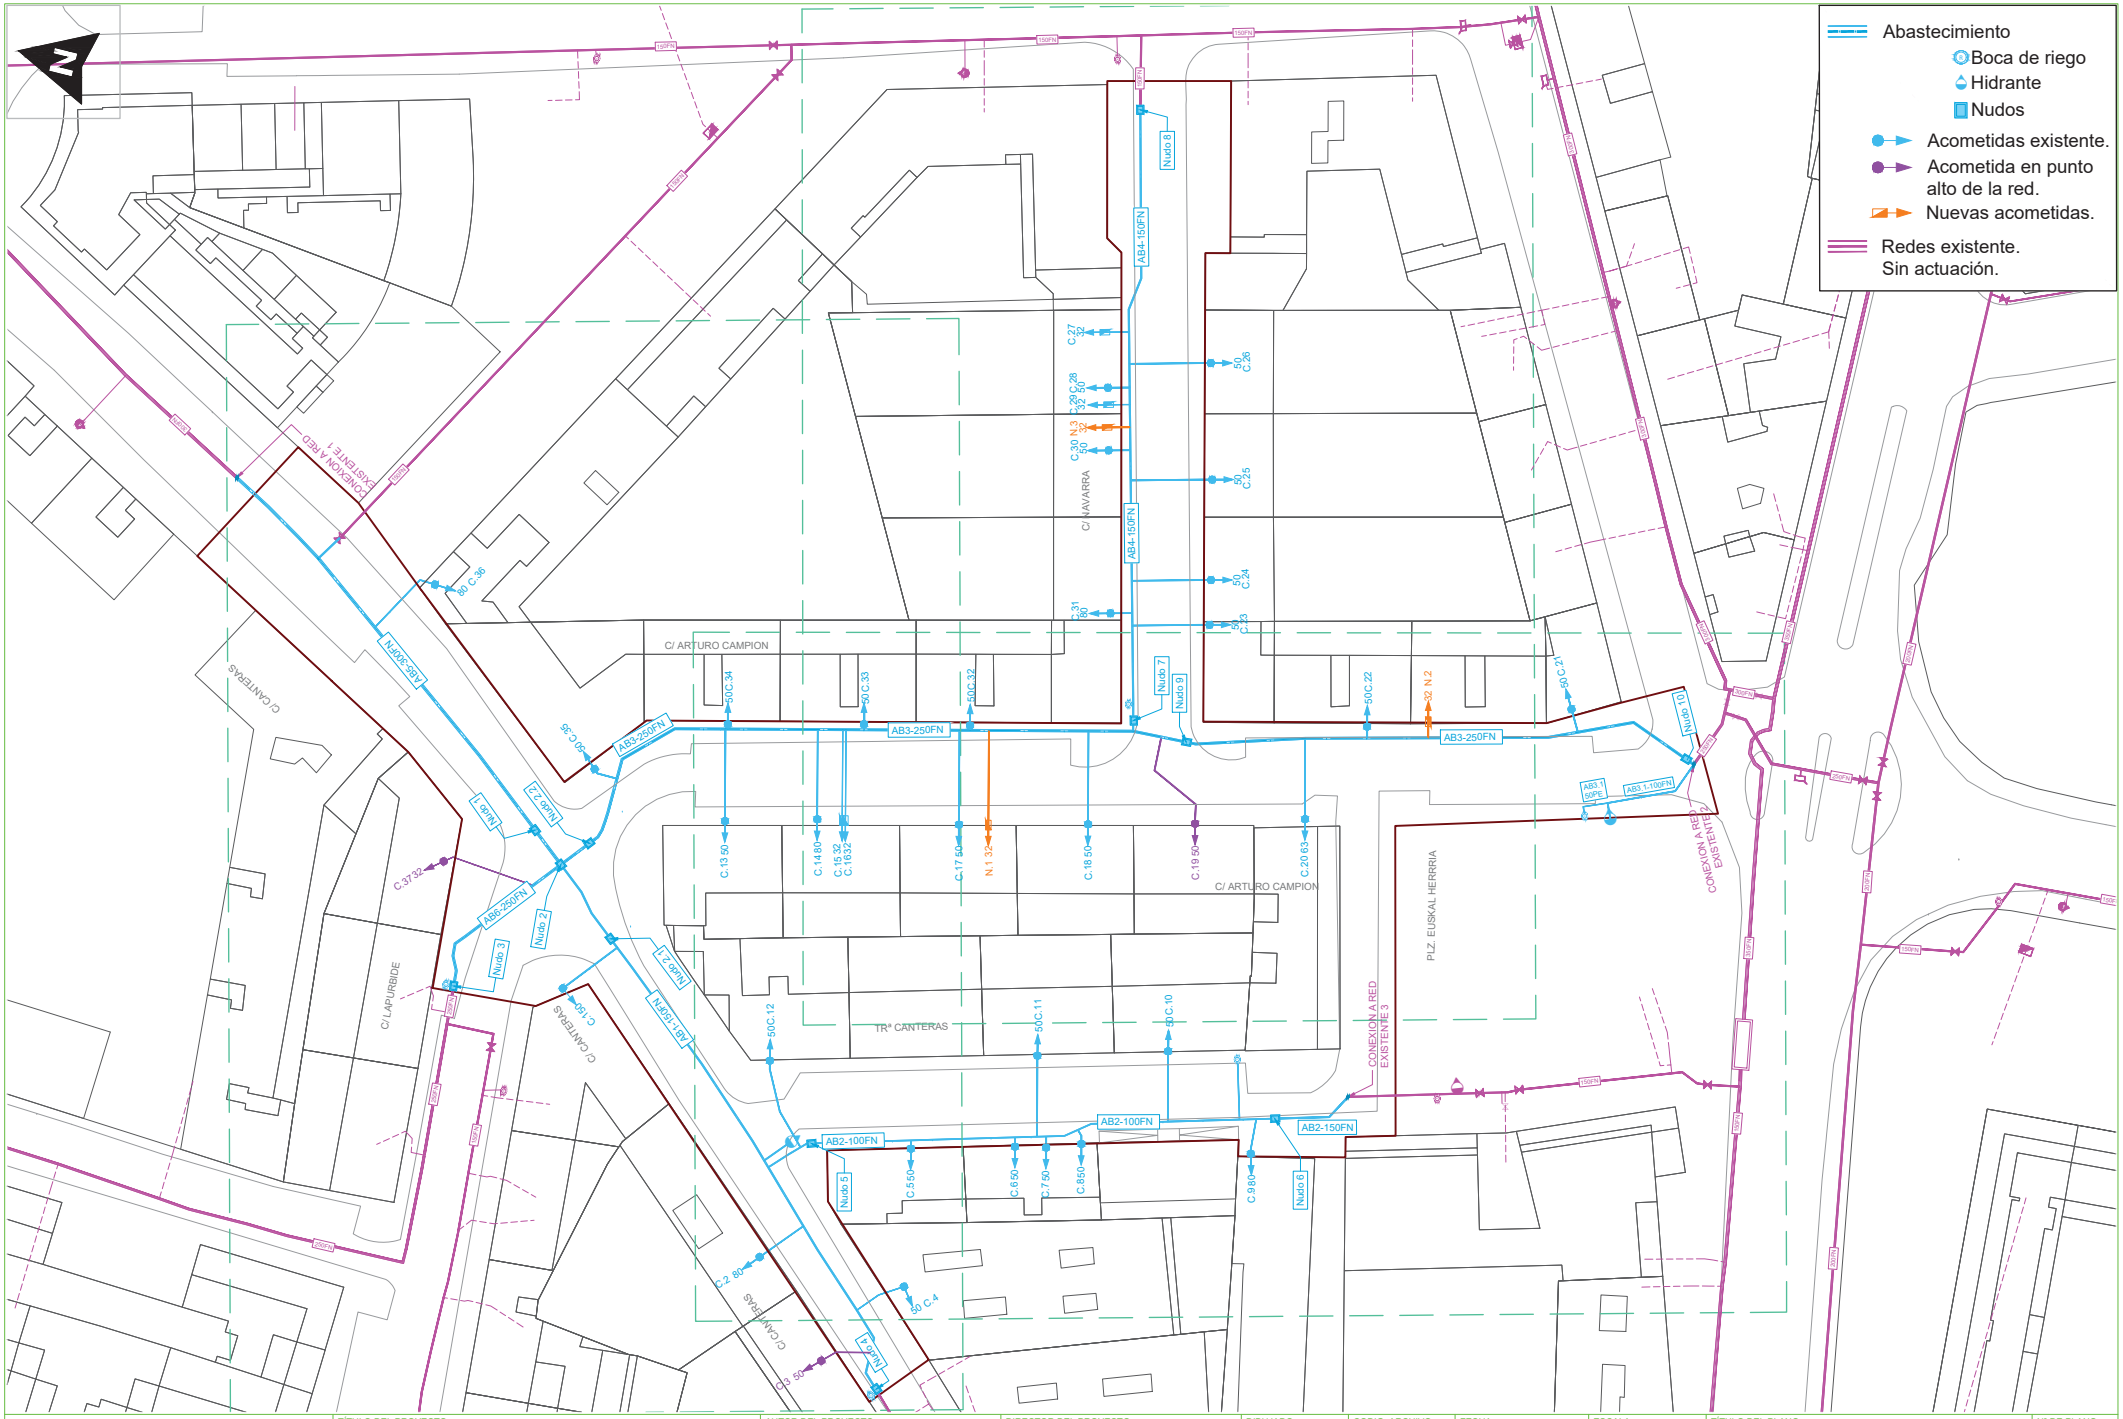


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/750, A1 = 1/325	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 3 / Nº DE HOJA: 1 de 4



Mancomunidad Comarca de Pamplona / Mankomunitatea Iruñerria Iparraldea · Servicios de la Comarca de Pamplona, s.a. / Iruñerria Zerbitzuak, sa.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 plancabastecimientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 3 / Nº DE HOJA: 2 de 4




Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 plancabastecimientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 3 / Nº DE HOJA: 3 de 4

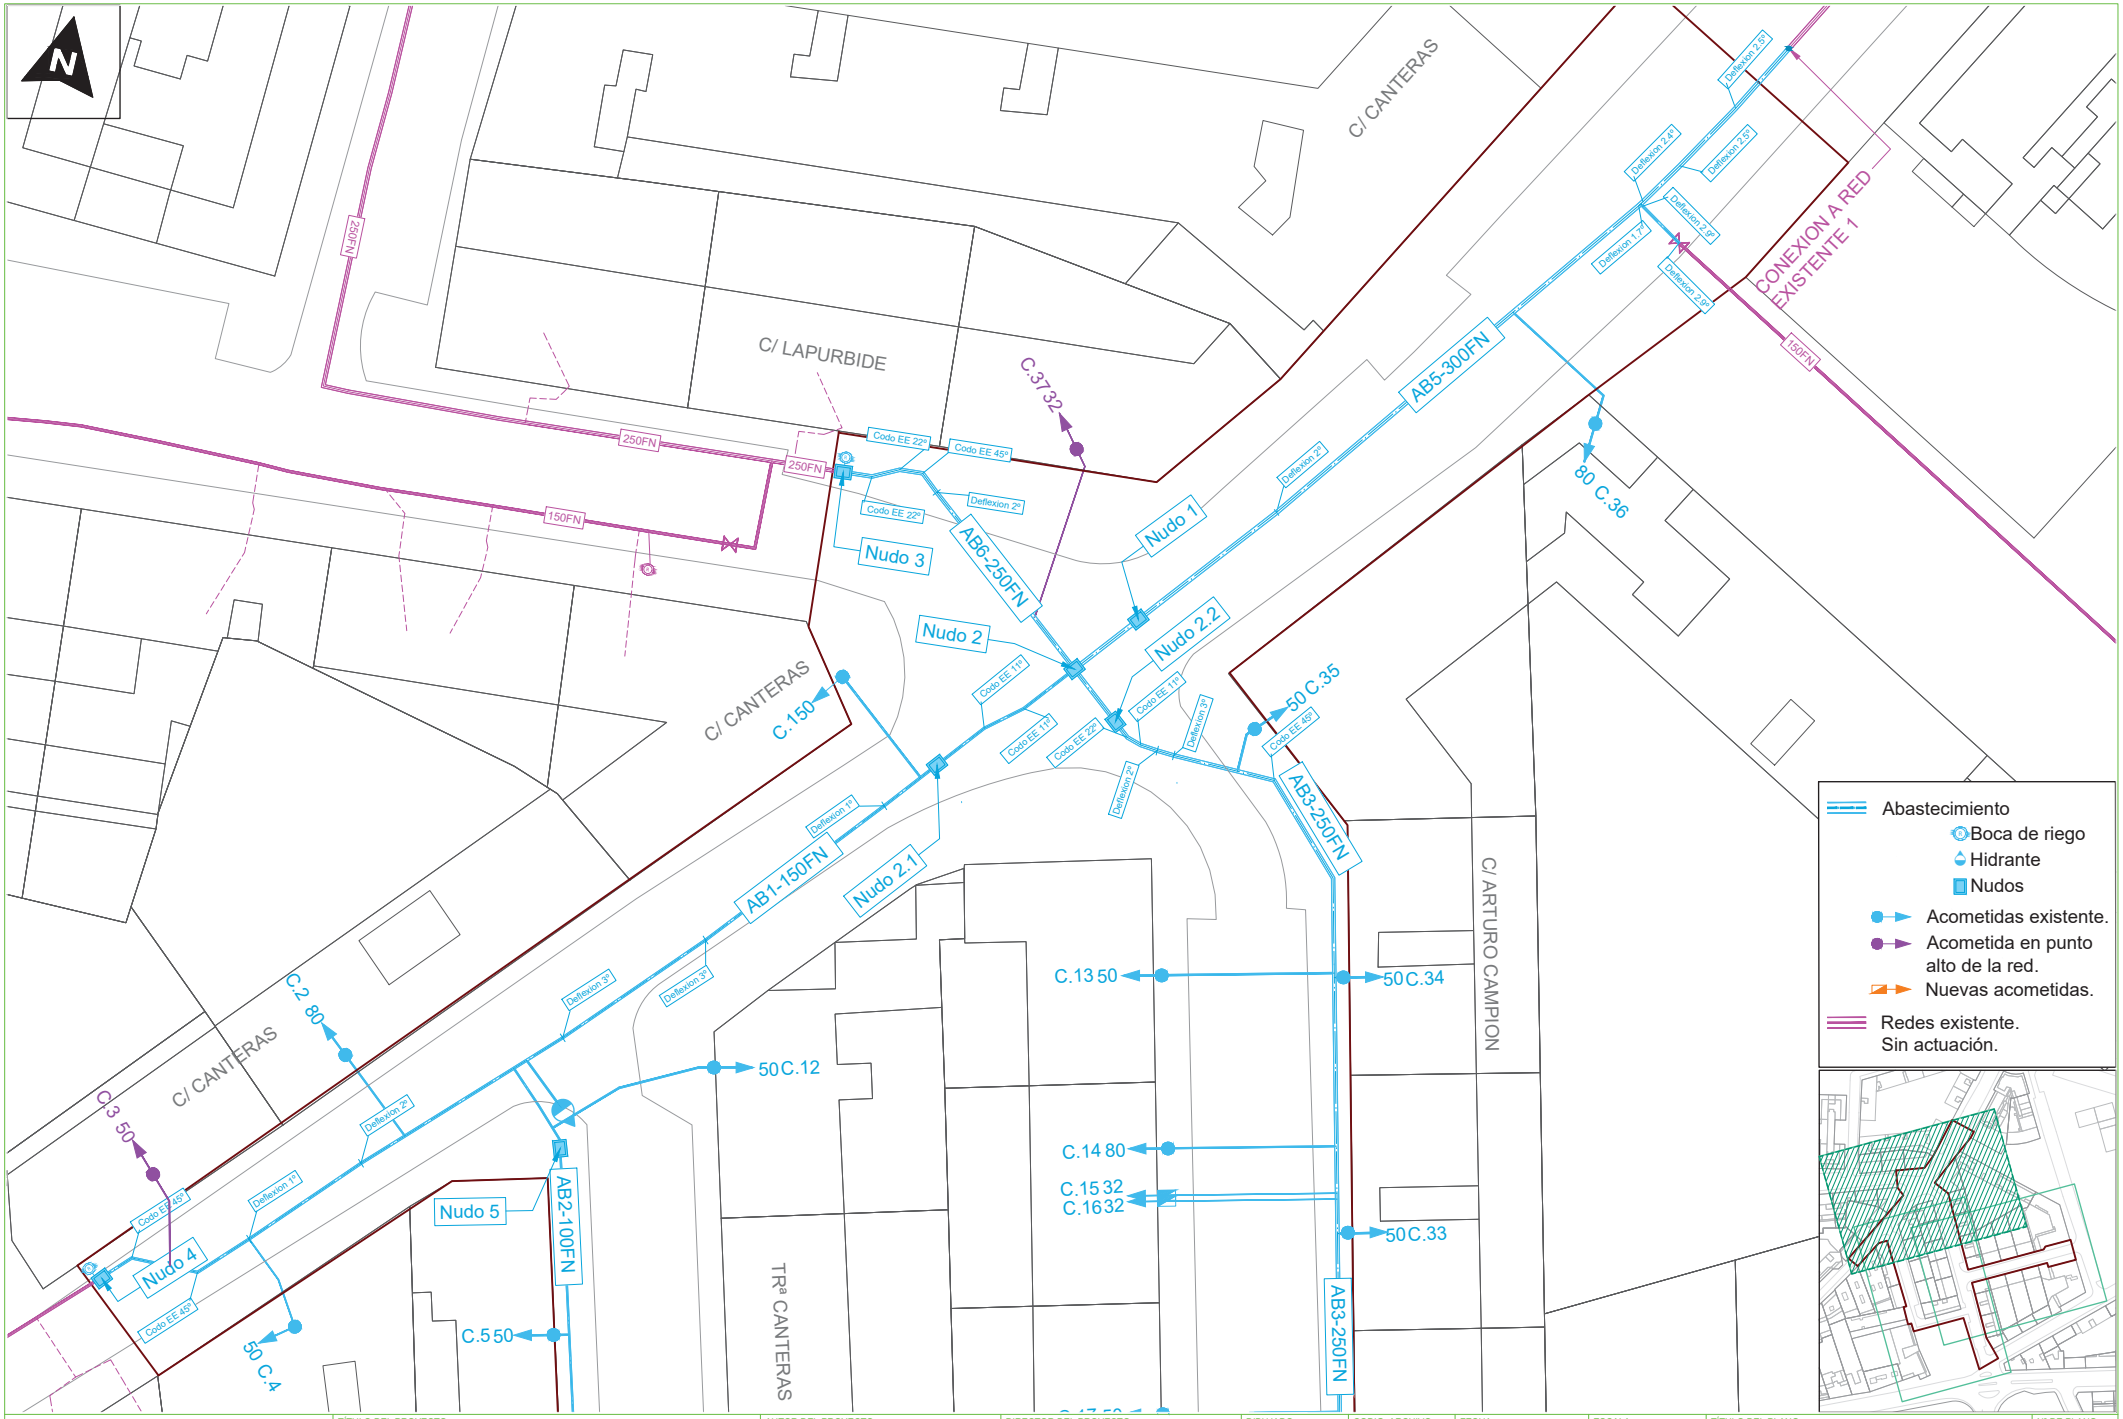

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 3 / Nº DE HOJA: 4 de 4

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB1
Escala V = H

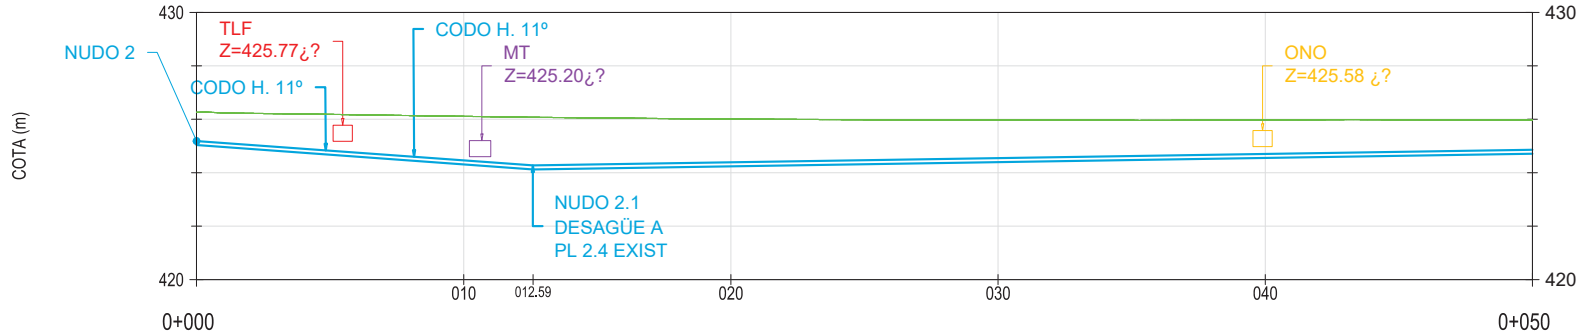


COTA TERRENO	426.26	426.11	426.07	426.01	425.97	425.98	425.97
RASANTE HIDR.	425.04	424.31	424.12	424.24	424.40	424.55	424.71
PROF R. HIDRAULICA	1.23	1.80	1.95	1.77	1.58	1.42	1.26
GEOM. VERTICAL	P=-7.241% L=12.594m.			P=1.570% L=37.905m			
TUBERIAS	150 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 1 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB1

Escala V = H

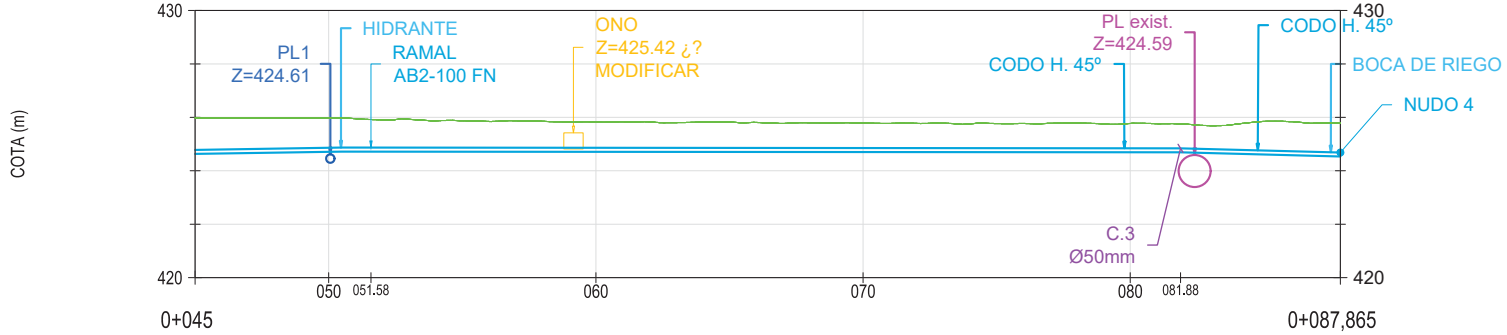


COTA TERRENO	425.98	425.97	425.92	425.83	425.78	425.77	425.75	425.78
RASANTE HIDR.	424.63	424.71	424.72	424.71	424.70	424.69	424.69	424.53
PROF R. HIDRAULICA	1.35	1.26	1.20	1.12	1.08	1.08	1.06	1.25
GEOM. VERTICAL	P=1.570% L=37.905m			P=-0.089% L=31.369m.				P=-2.606% L=5.997m.
TUBERIAS	150 mm Tubería de FN							

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 2 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB2


Escala V = H

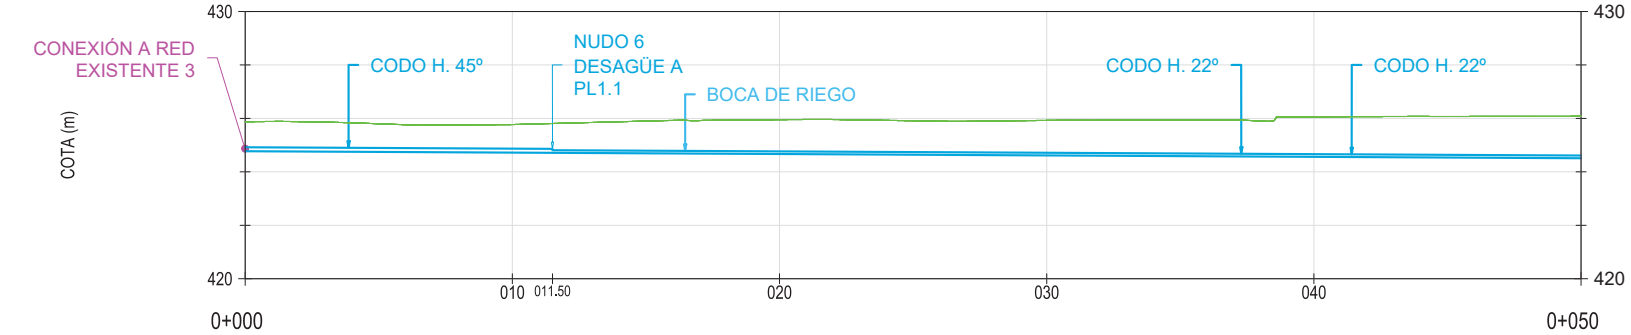

	0+000	010	011.50	020	030	040	0+050
COTA TERRENO	425.87	425.77	425.81	425.95	425.92	426.06	426.08
RASANTE HIDR.	424.77	424.72	424.71	424.67	424.61	424.56	424.51
PROF R. HIDRAULICA	1.10	1.05	1.10	1.29	1.31	1.50	1.57
GEOM. VERTICAL	P=-0.523% L=11.500m.			P=-0.523% L=65.442m.			
TUBERIAS	150 mm Tubería de FN			100 mm Tubería de FN			

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 3 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB2
Escala V = H

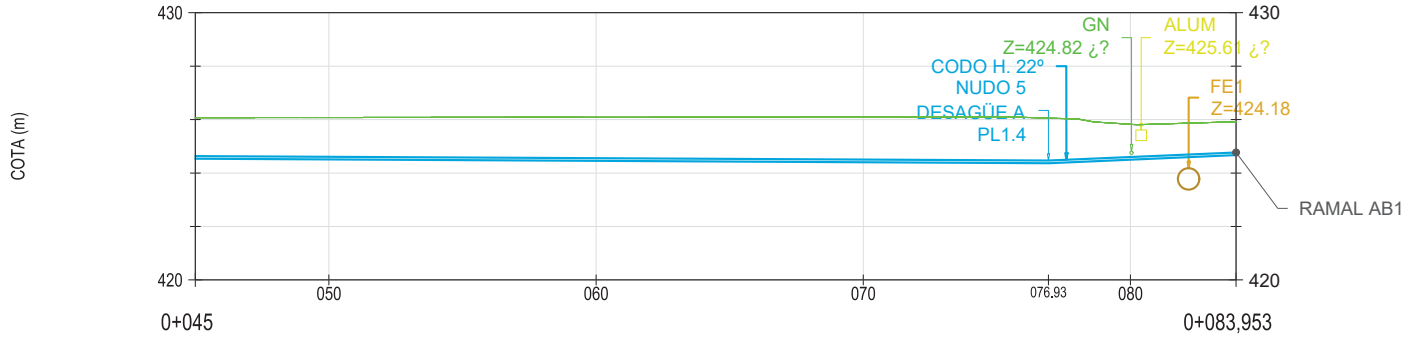

COTA TERRENO	426.07	426.08	426.09	426.11	426.05	425.82	425.92
RASANTE HIDR.	424.53	424.51	424.46	424.40	424.37	424.50	424.67
PROF R. HIDRAULICA	1.54	1.57	1.63	1.70	1.69	1.32	1.25
GEOM. VERTICAL	P=-0.523% L=65.442m.					P=4.318% L=7.011m	
TUBERIAS	100 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 4 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB3
Escala V = H

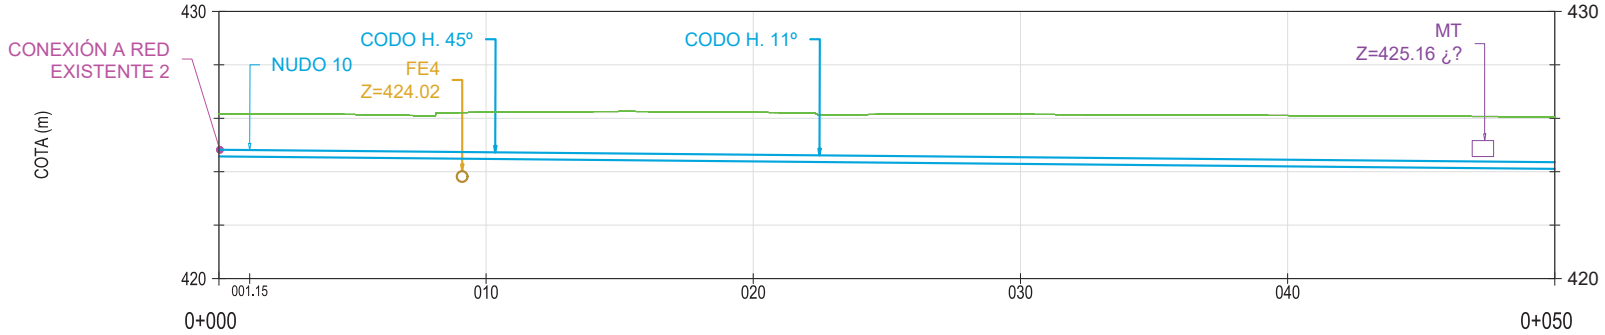

COTA TERRENO	426.17	426.16	426.22	426.22	426.15	426.10	426.06
RASANTE HIDR.	424.57	424.56	424.48	424.38	424.29	424.20	424.10
PROF R. HIDRAULICA	1.60	1.60	1.75	1.84	1.86	1.90	1.95
GEOM. VERTICAL	P=-0.930% L=61.354m.						
TUBERIAS	250 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 5 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB3
Escala V = H

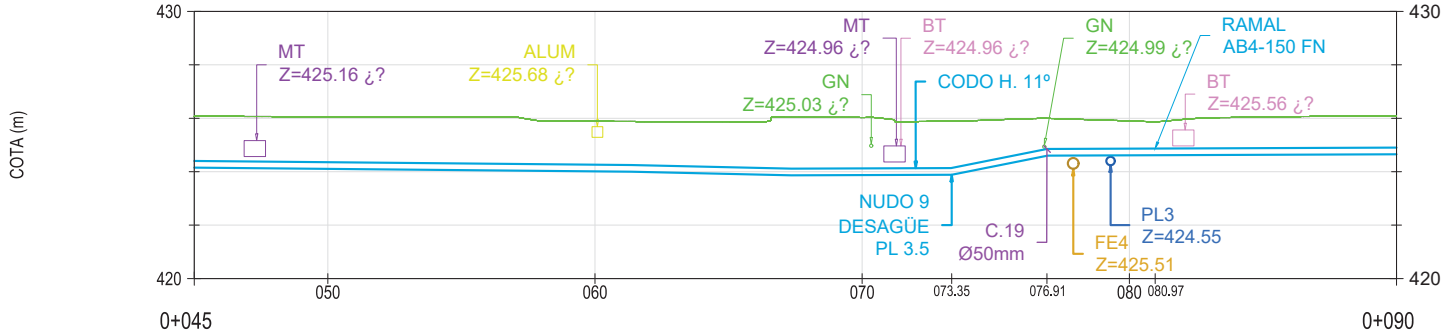

COTA TERRENO	426.08	426.06	425.89	426.03	425.89	426.00	425.90	425.86	426.08
RASANTE HIDR.	424.15	424.10	424.01	423.87	423.88	425.59	424.61	424.62	424.65
PROF R. HIDRAULICA	1.92	1.95	1.88	2.16	2.02	1.40	1.29	1.25	1.43
GEOM. VERTICAL	P=-0.930% L=61.354m.		P=-2.266% L=5.998m.	P=0.406% L=6.000m	P=19.859% L=3.589m		P=0.406% L=94.865m		
TUBERIAS	250 mm Tubería de FN								

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 6 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB3
Escala V = H

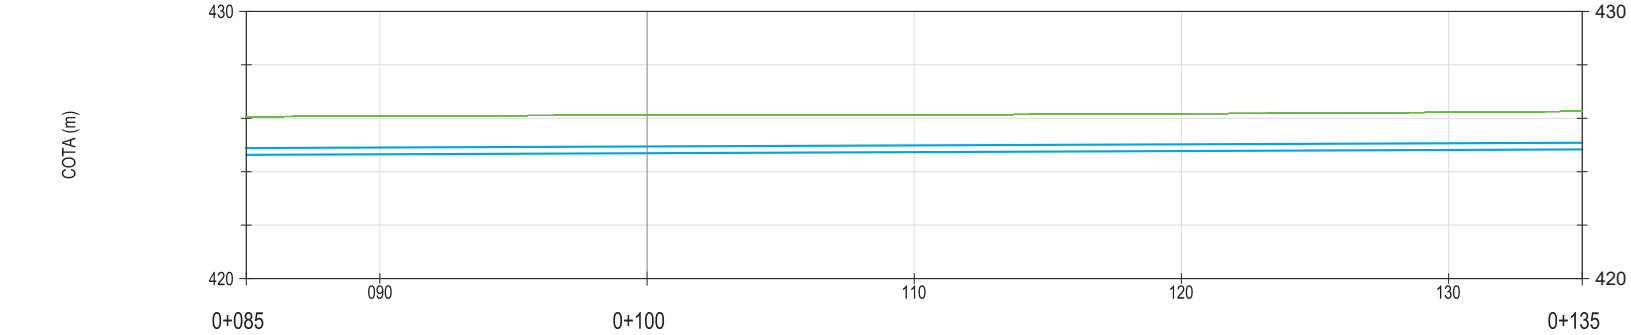

COTA TERRENO	426.05	426.08	426.11	426.12	426.17	426.22	426.26
RASANTE HIDR.	424.63	424.65	424.69	424.73	424.77	424.82	424.84
PROF R. HIDRAULICA	1.41	1.43	1.42	1.39	1.40	1.41	1.42
GEOM. VERTICAL	P=0.406% L=94.865m						
TUBERIAS	250 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Mankomunitatea Iruñerria	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 7 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB3
Escala V = H

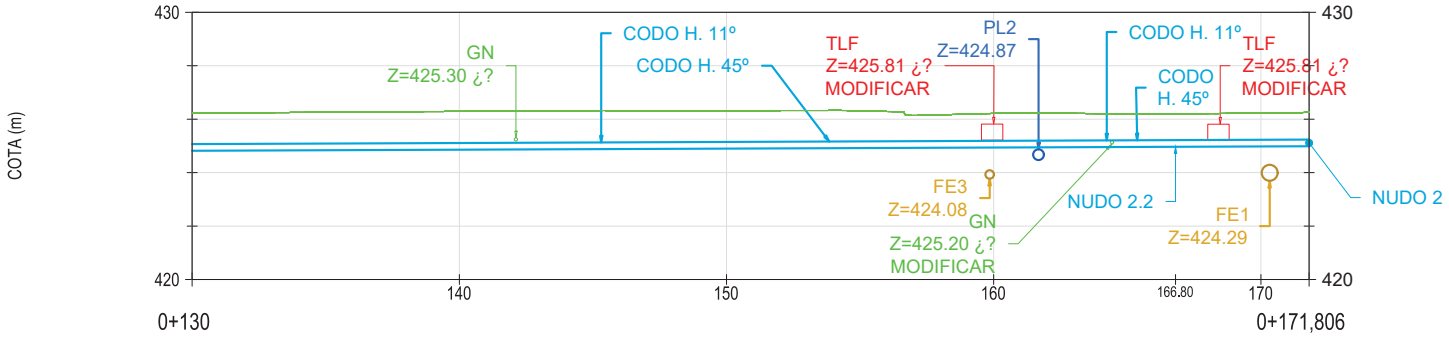


COTA TERRENO	426.22	426.29	426.31	426.22	426.20	426.24	426.26
RASANTE HIDR.	424.82	424.86	424.90	424.94	424.96	424.98	424.99
PROF R. HIDRAULICA	1.41	1.44	1.41	1.28	1.24	1.26	1.28
GEOM. VERTICAL	P=0.406% L=94.865m						
TUBERIAS	250 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 8 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB4


Escala V = H

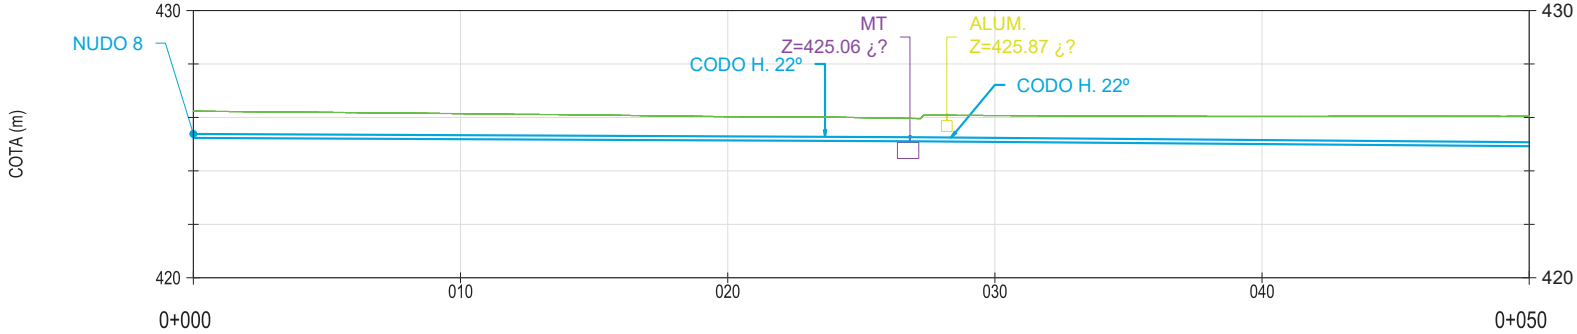

COTA TERRENO	426.23	426.14	426.03	426.07	426.04	426.04
RASANTE HIDR.	425.23	425.19	425.14	425.08	425.00	424.92
PROF R. HIDRAULICA	1.00	0.96	0.89	0.99	1.03	1.12
GEOM. VERTICAL	P=-0.460% L=27.202m.			P=-0.806% L=60.361m.		
TUBERIAS	150 mm Tubería de FN					

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 9 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB4
Escala V = H

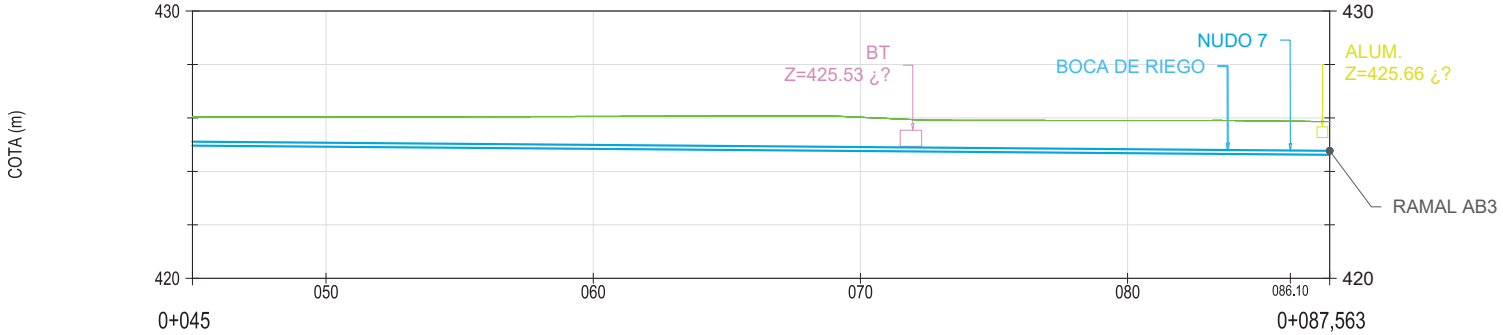

COTA TERRENO	426.04	426.04	426.06	426.03	425.90	426.87	425.86
RASANTE HIDR.	424.96	424.92	424.84	424.76	424.68	424.63	424.62
PROF R. HIDRAULICA	1.08	1.12	1.21	1.26	1.22	1.24	1.24
GEOM. VERTICAL	P=-0.806% L=60.361m.						
TUBERIAS	150 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Mankomunitatea Iruñerria	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 10 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB5
Escala V = H

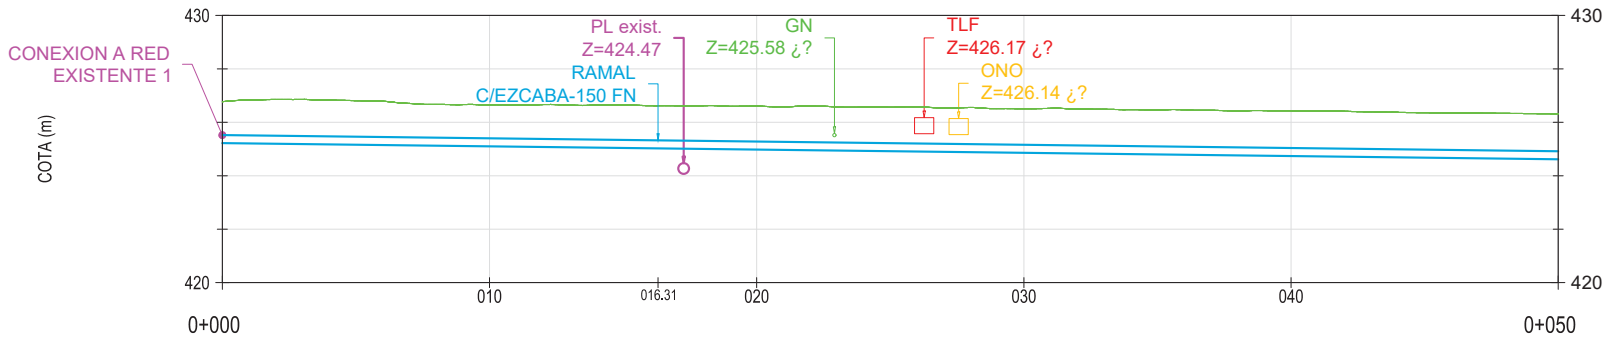


COTA TERRENO	426.77	426.66	426.62	426.61	426.51	426.43	426.32
RASANTE HIDR.	425.22	425.10	425.02	424.98	424.86	424.74	424.62
PROF R. HIDRAULICA	1.55	1.56	1.59	1.63	1.65	1.69	1.70
GEOM. VERTICAL	P=-1.206% L=64.891m.						
TUBERIAS	300 mm Tubería de FN						

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 11 de 13

Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB5


Escala V = H

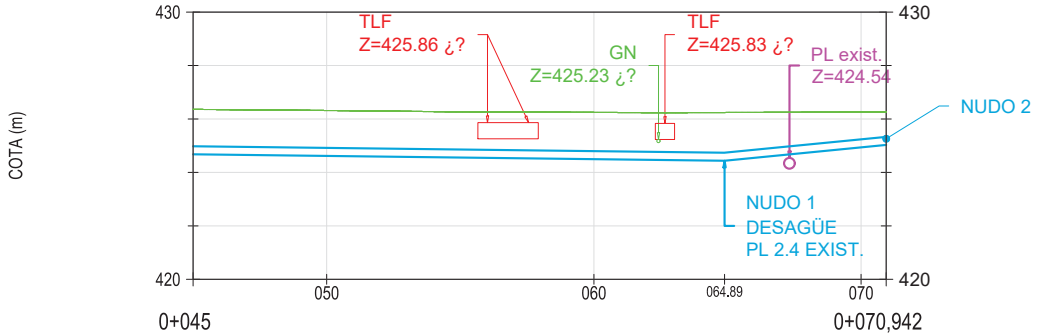

COTA TERRENO	426.36	426.32	426.25	426.24	426.26	426.26
RASANTE HIDR.	424.68	424.62	424.50	424.44	424.94	425.03
PROF R. HIDRAULICA	1.68	1.70	1.75	1.80	1.32	1.23
GEOM. VERTICAL	P=-1.206% L=64.891m.				P=9.769% L=6.051m	
TUBERIAS	300 mm Tubería de FN					

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 12 de 13


Perfil Longitudinal: ABASTECIMIENTO AB6
Escala V = H

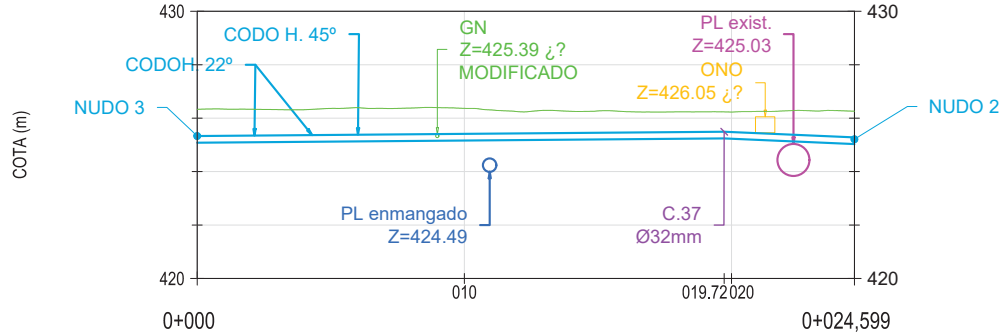

COTA TERRENO	426.33	426.37	426.23 / 426.23	426.26
RASANTE HIDR.	425.08	425.16	425.24 / 425.23	425.03
PROF R. HIDRAULICA	1.25	1.20	0.99 / 1.00	1.23
GEOM. VERTICAL	P=0.816% L=19.713m		P=-4.343% L=4.886m.	
TUBERIAS	250 mm Tubería de FN			


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 4 / Nº DE HOJA: 13 de 13

NUDO 1 desagüe

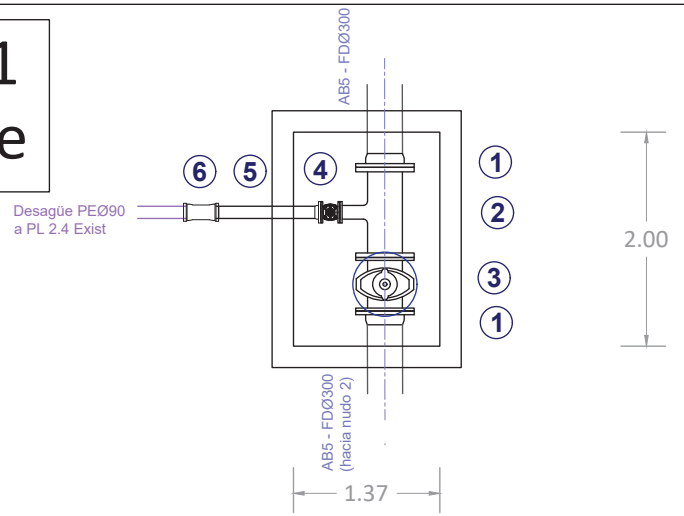

1 - Junta BE Quick Ø300
2 - TE BBB 300/300/80
3 - VCC Ø300
4 - VCC Ø80
5 - Tubería FN80
6 - Manguito universal FN80-PE90


NUDO 2

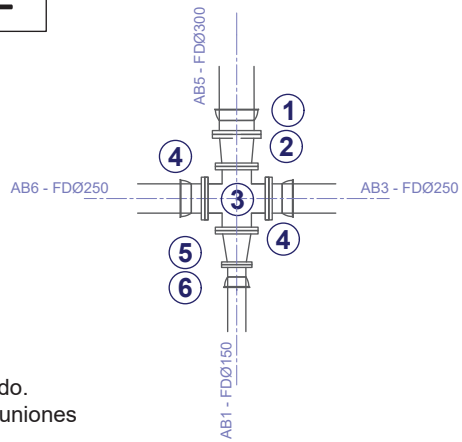

Nota: nudo enterrado.
Proteger todas las uniones
con cinta grasa.


1 - Brida Enchufe Ø300
2 - Reducción BB 300/250
3 - Cruceta 250/250/250/250
4 - Brida enchufe 250
5 - Reducción BB 250/150
6 - Brida Enchufe BE Ø150

NUDO 2.1 Desagüe

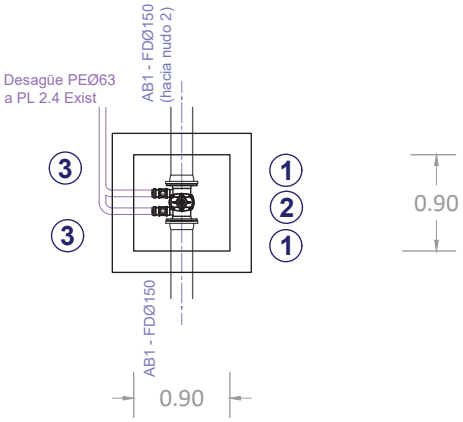

1 - Brida Enchufe Quick Ø150
2 - Válvula compuerta larga Ø150 2 tomas laterales de 1.5"en by-pass
3 - Valvula compuerta roscada DN50(2") PN-16, más enlace mixto macho latón DN63mm (interior 2")


NUDO 2.2

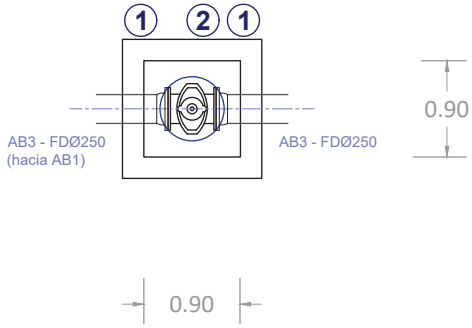

1 - Brida Enchufe Quick Ø250
2 - Válvula compuerta corta Ø250


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Mankomunitatea Iruñerria	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientonudos.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/50	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. NUDOS.	Nº DE PLANO: 5 / Nº DE HOJA: 1 de 3

NUDO 3

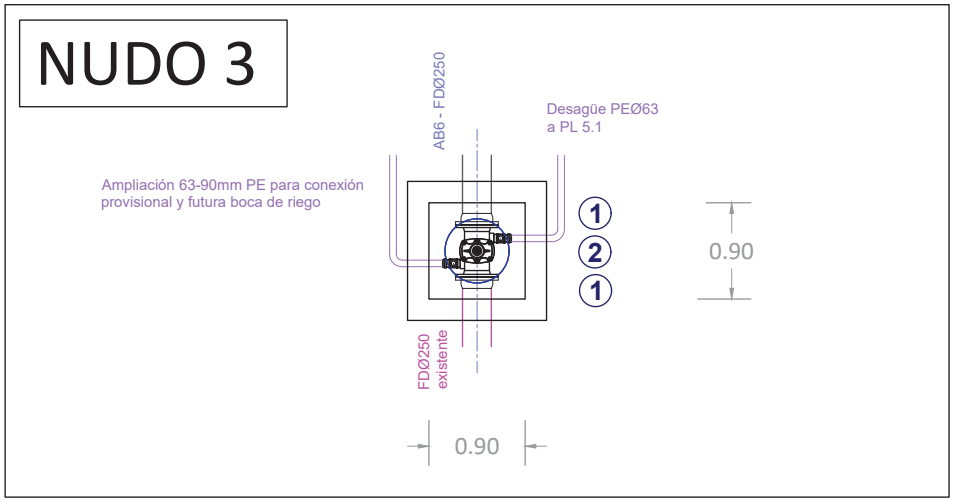


1 - Brida Enchufe Quick Ø250
2 - Válvula compuerta larga Ø250 2 tomas laterales de 1.5"

NUDO 4

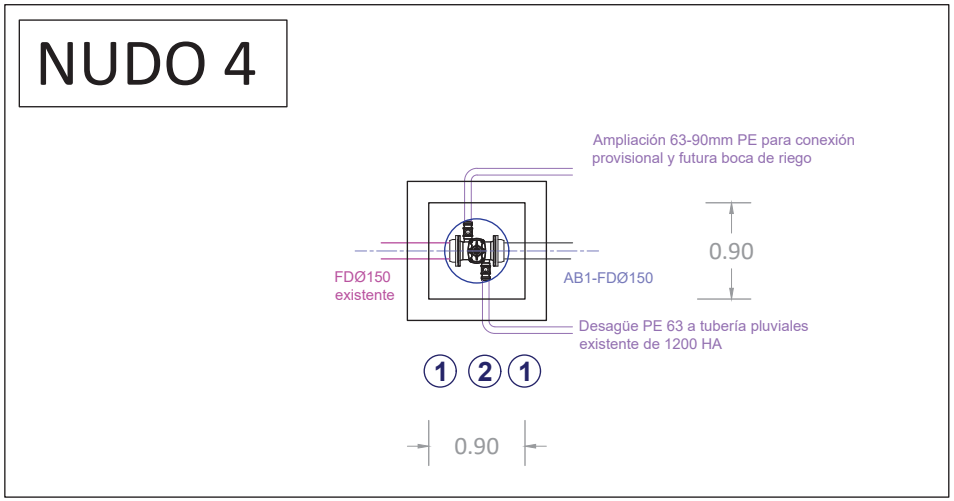


1 - Brida Enchufe Quick Ø250
2 - Válvula compuerta larga Ø250 2 tomas laterales de 1.5"

NUDO 5

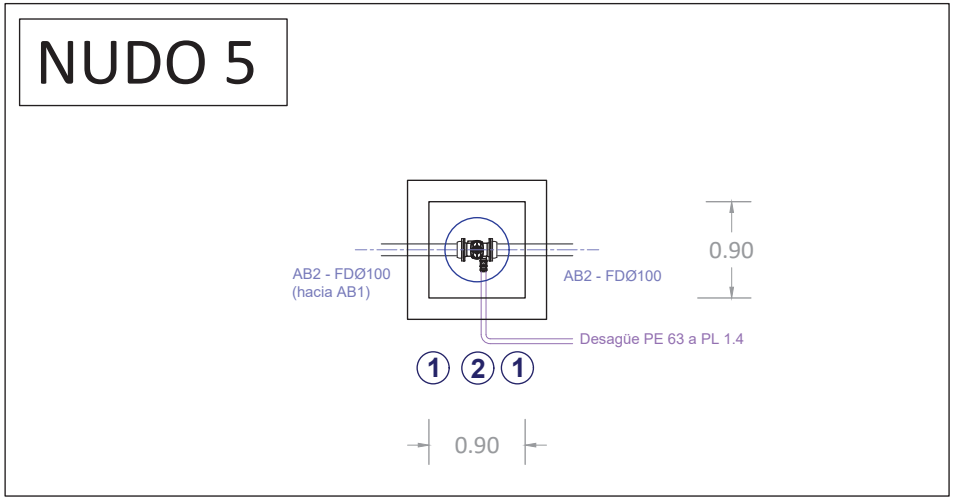

1 - Brida Enchufe Quick Ø100
2 - Válvula compuerta larga Ø100 2 tomas laterales de 1.5"


NUDO 6

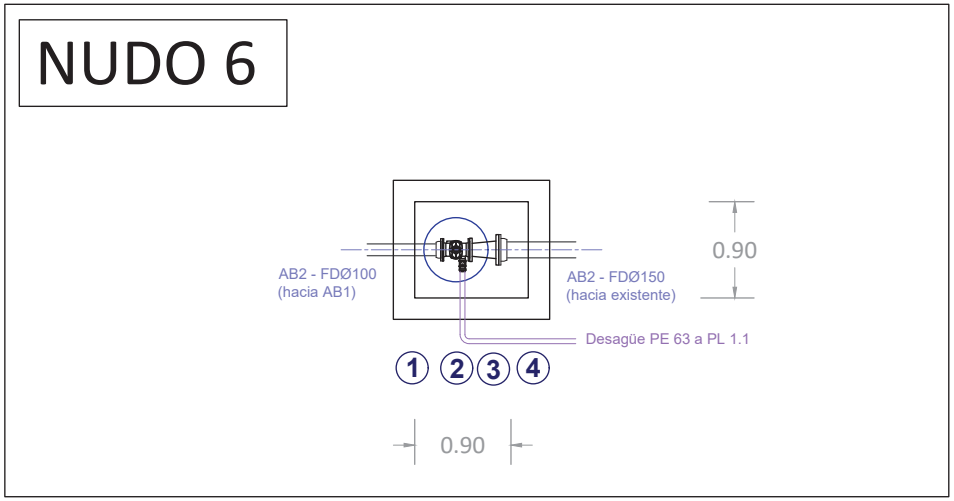

1 - Brida Enchufe Quick Ø100
2 - Válvula compuerta larga Ø100 2 tomas laterales de 1.5"
3 - Reducción 150/100
4 - Brida Enchufe Quick Ø150


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientonudos.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/50	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. NUDOS.	Nº DE PLANO: 5 / Nº DE HOJA: 2 de 3

NUDO 7

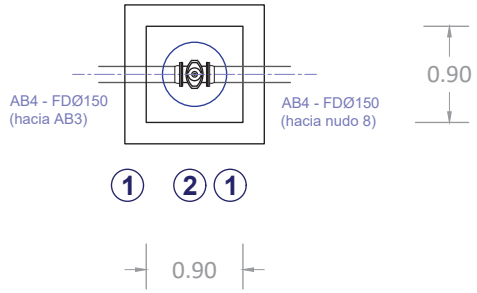


1 - Brida Enchufe Quick Ø150
2 - Válvula compuerta larga Ø150

NUDO 8

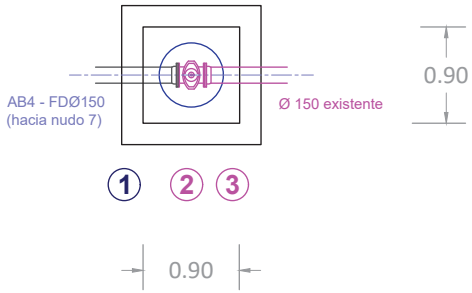


1 - Brida Enchufe Quick Ø150
2 - Válvula existente
3 - Enlace existente

NUDO 9 desagüe

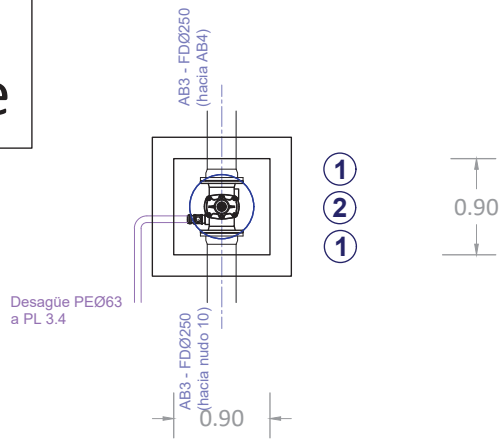


1 - Brida Enchufe Quick Ø250
2 - Válvula compuerta larga Ø250 2 tomas laterales de 1.5"

NUDO 10

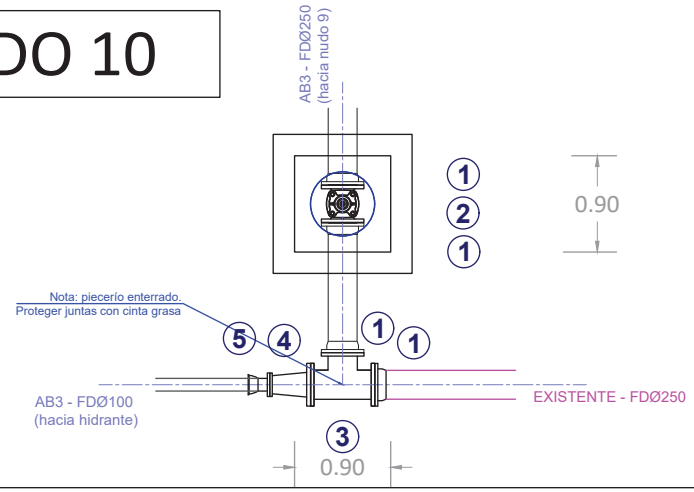


1 - Brida Enchufe Quick Ø250
2 - Válvula compuerta corta Ø250
3 - TE BBB 250/250/250
4 - Reducción 250-100
5 - Brida Enchufe Quick Ø100


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientonudos.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/50	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. NUDOS.	Nº DE PLANO: 5 / Nº DE HOJA: 3 de 3

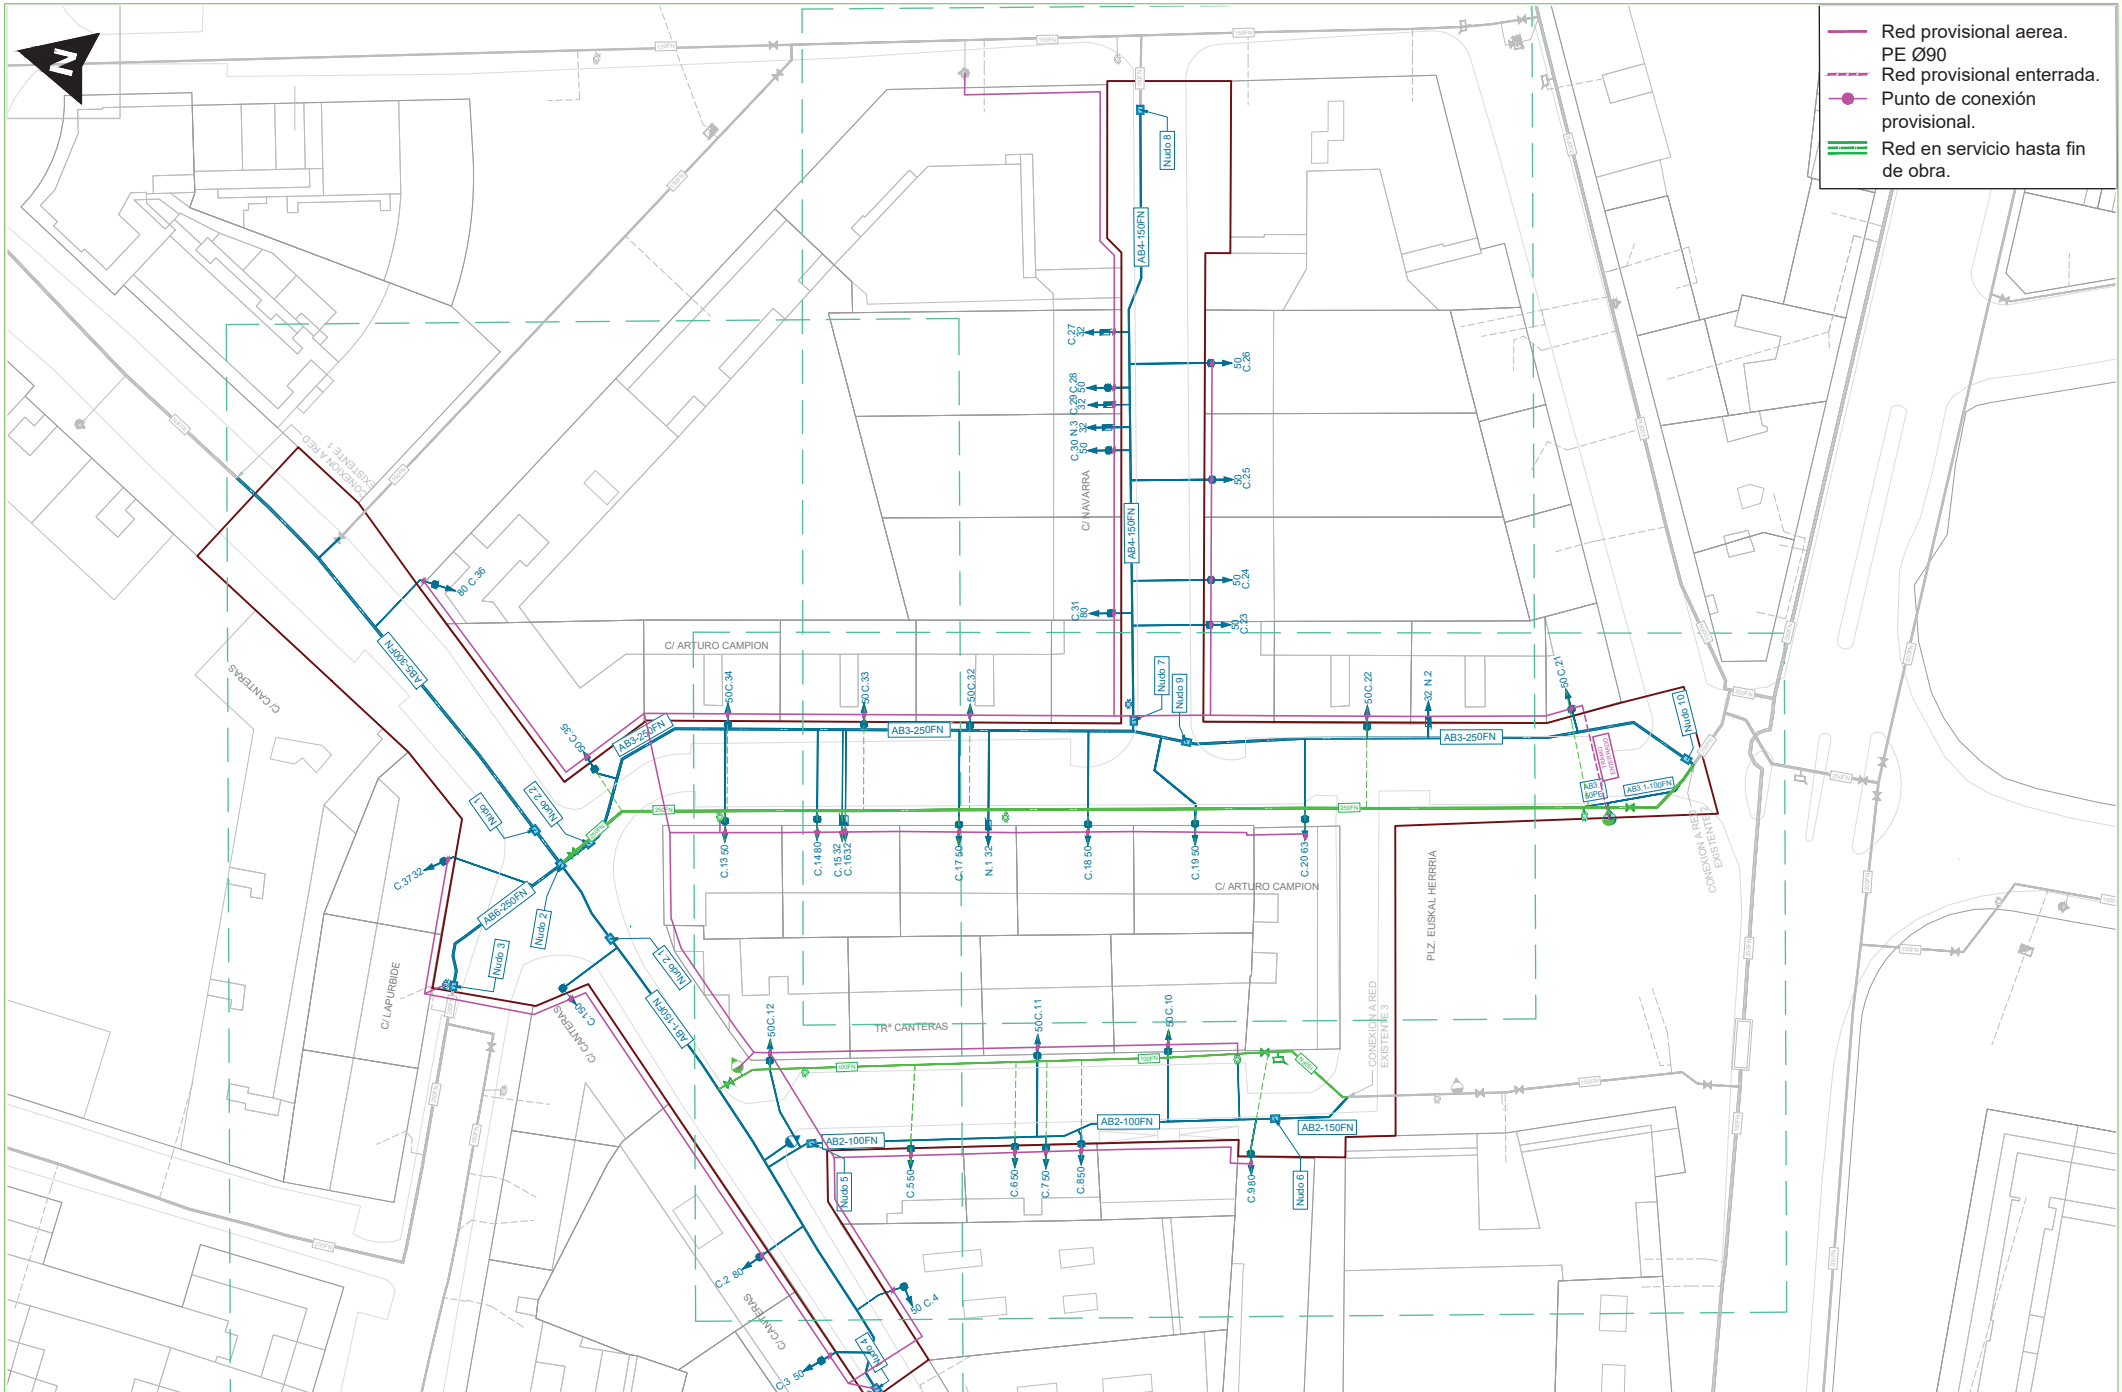


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientoplantaestadoprovisional.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/750, A1 = 1/325	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.	Nº DE PLANO: 6 / Nº DE HOJA: 1 de 4

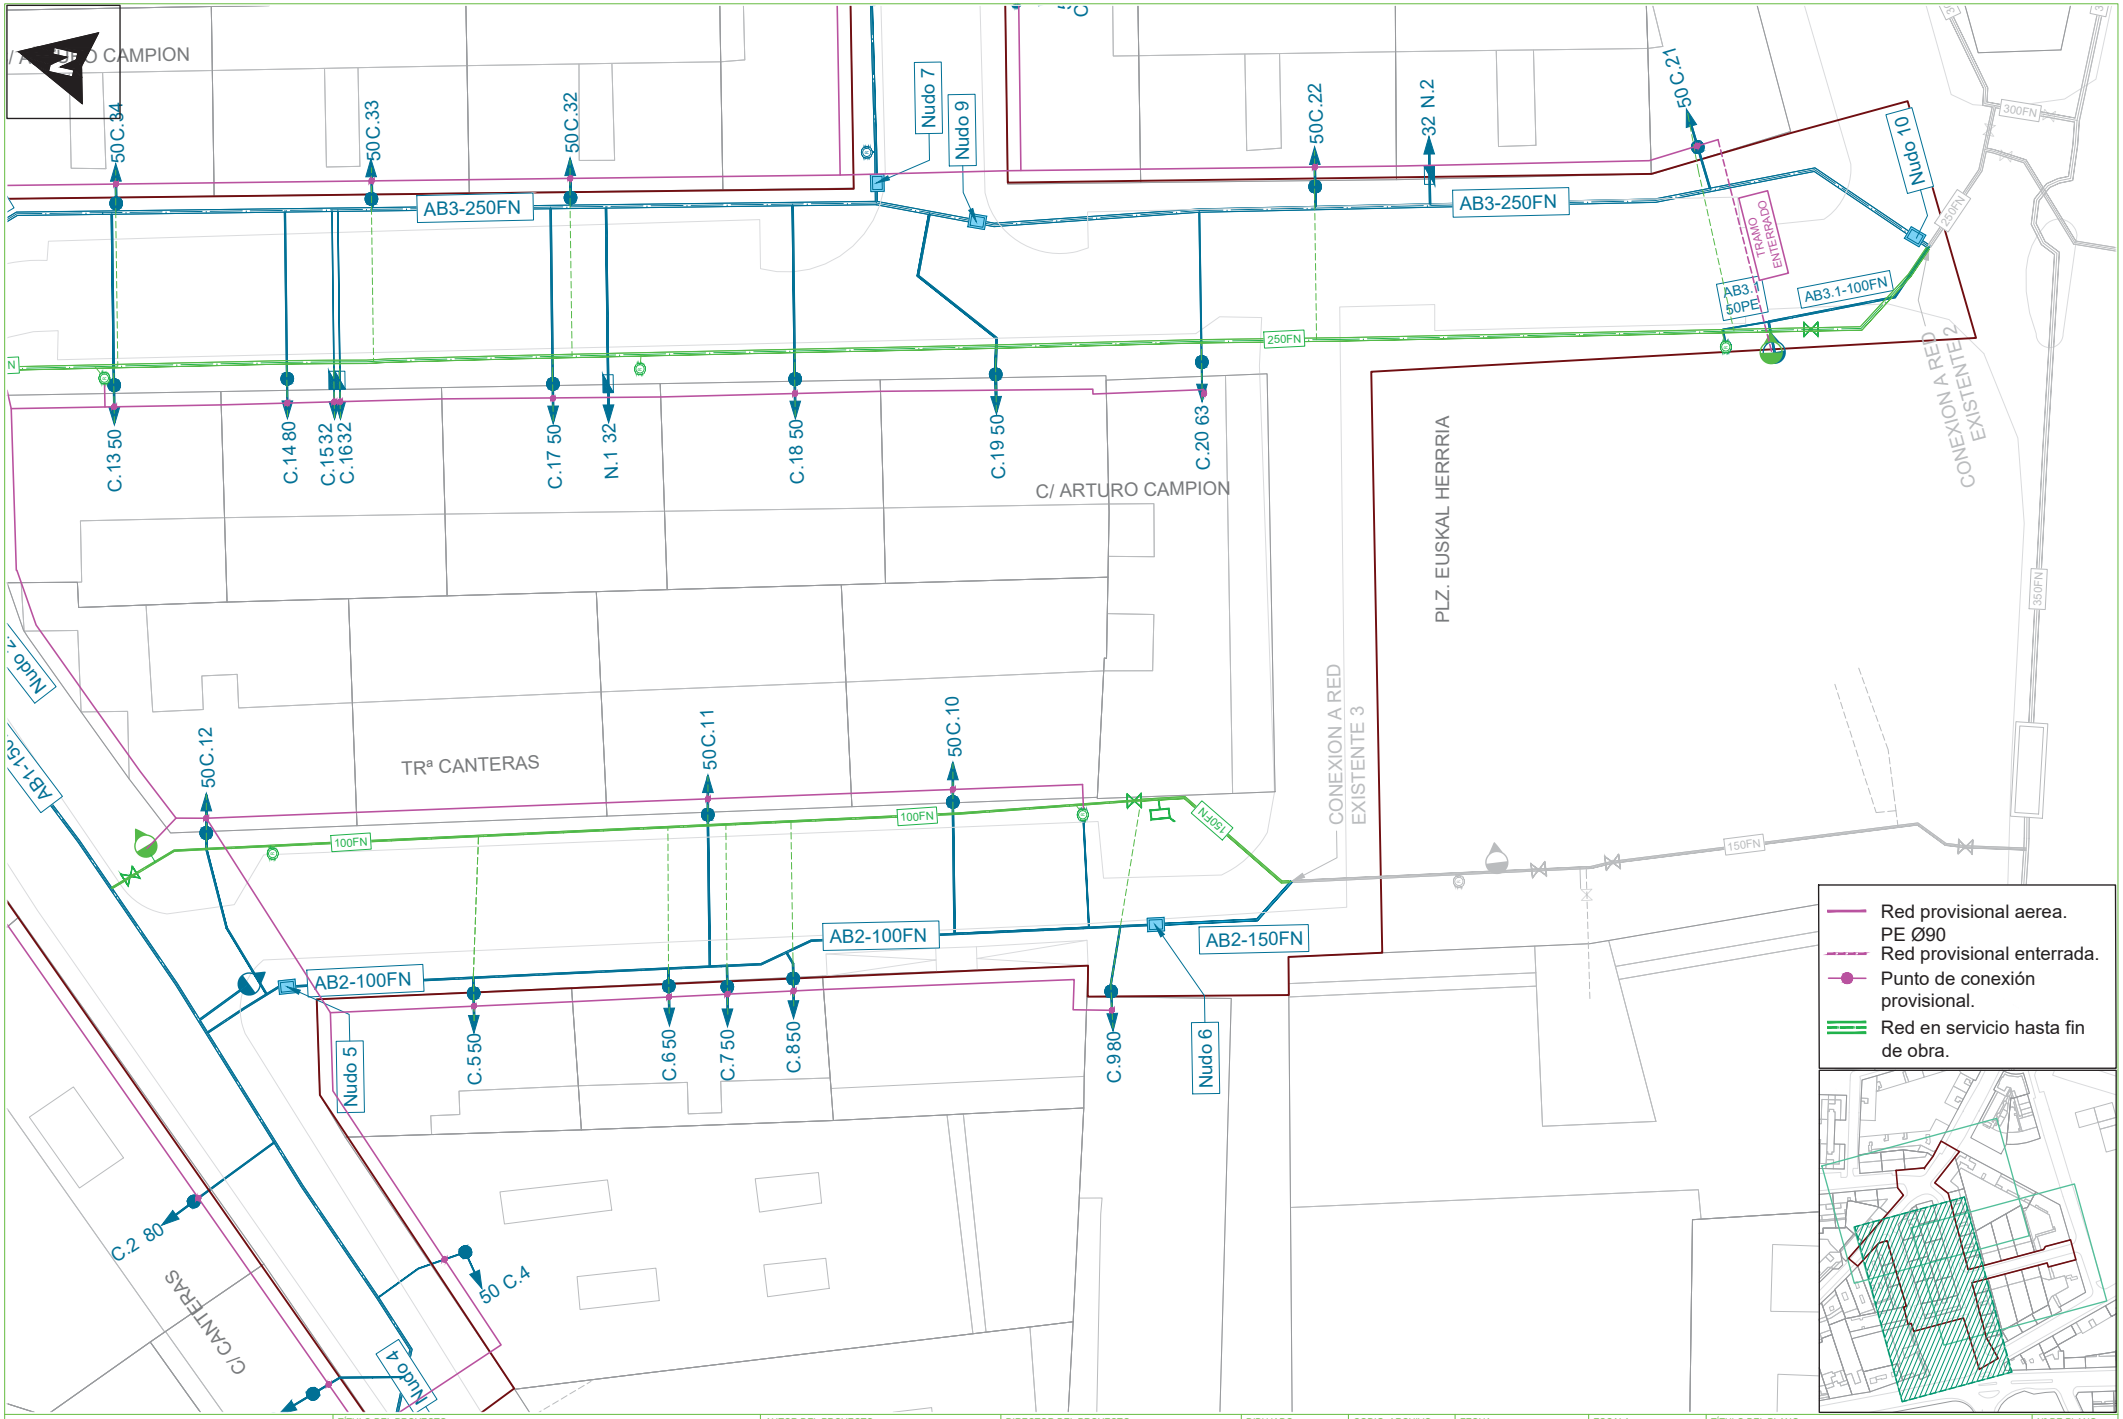


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientoplantadeestadoprovisional.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.	Nº DE PLANO: 6 / Nº DE HOJA: 2 de 4

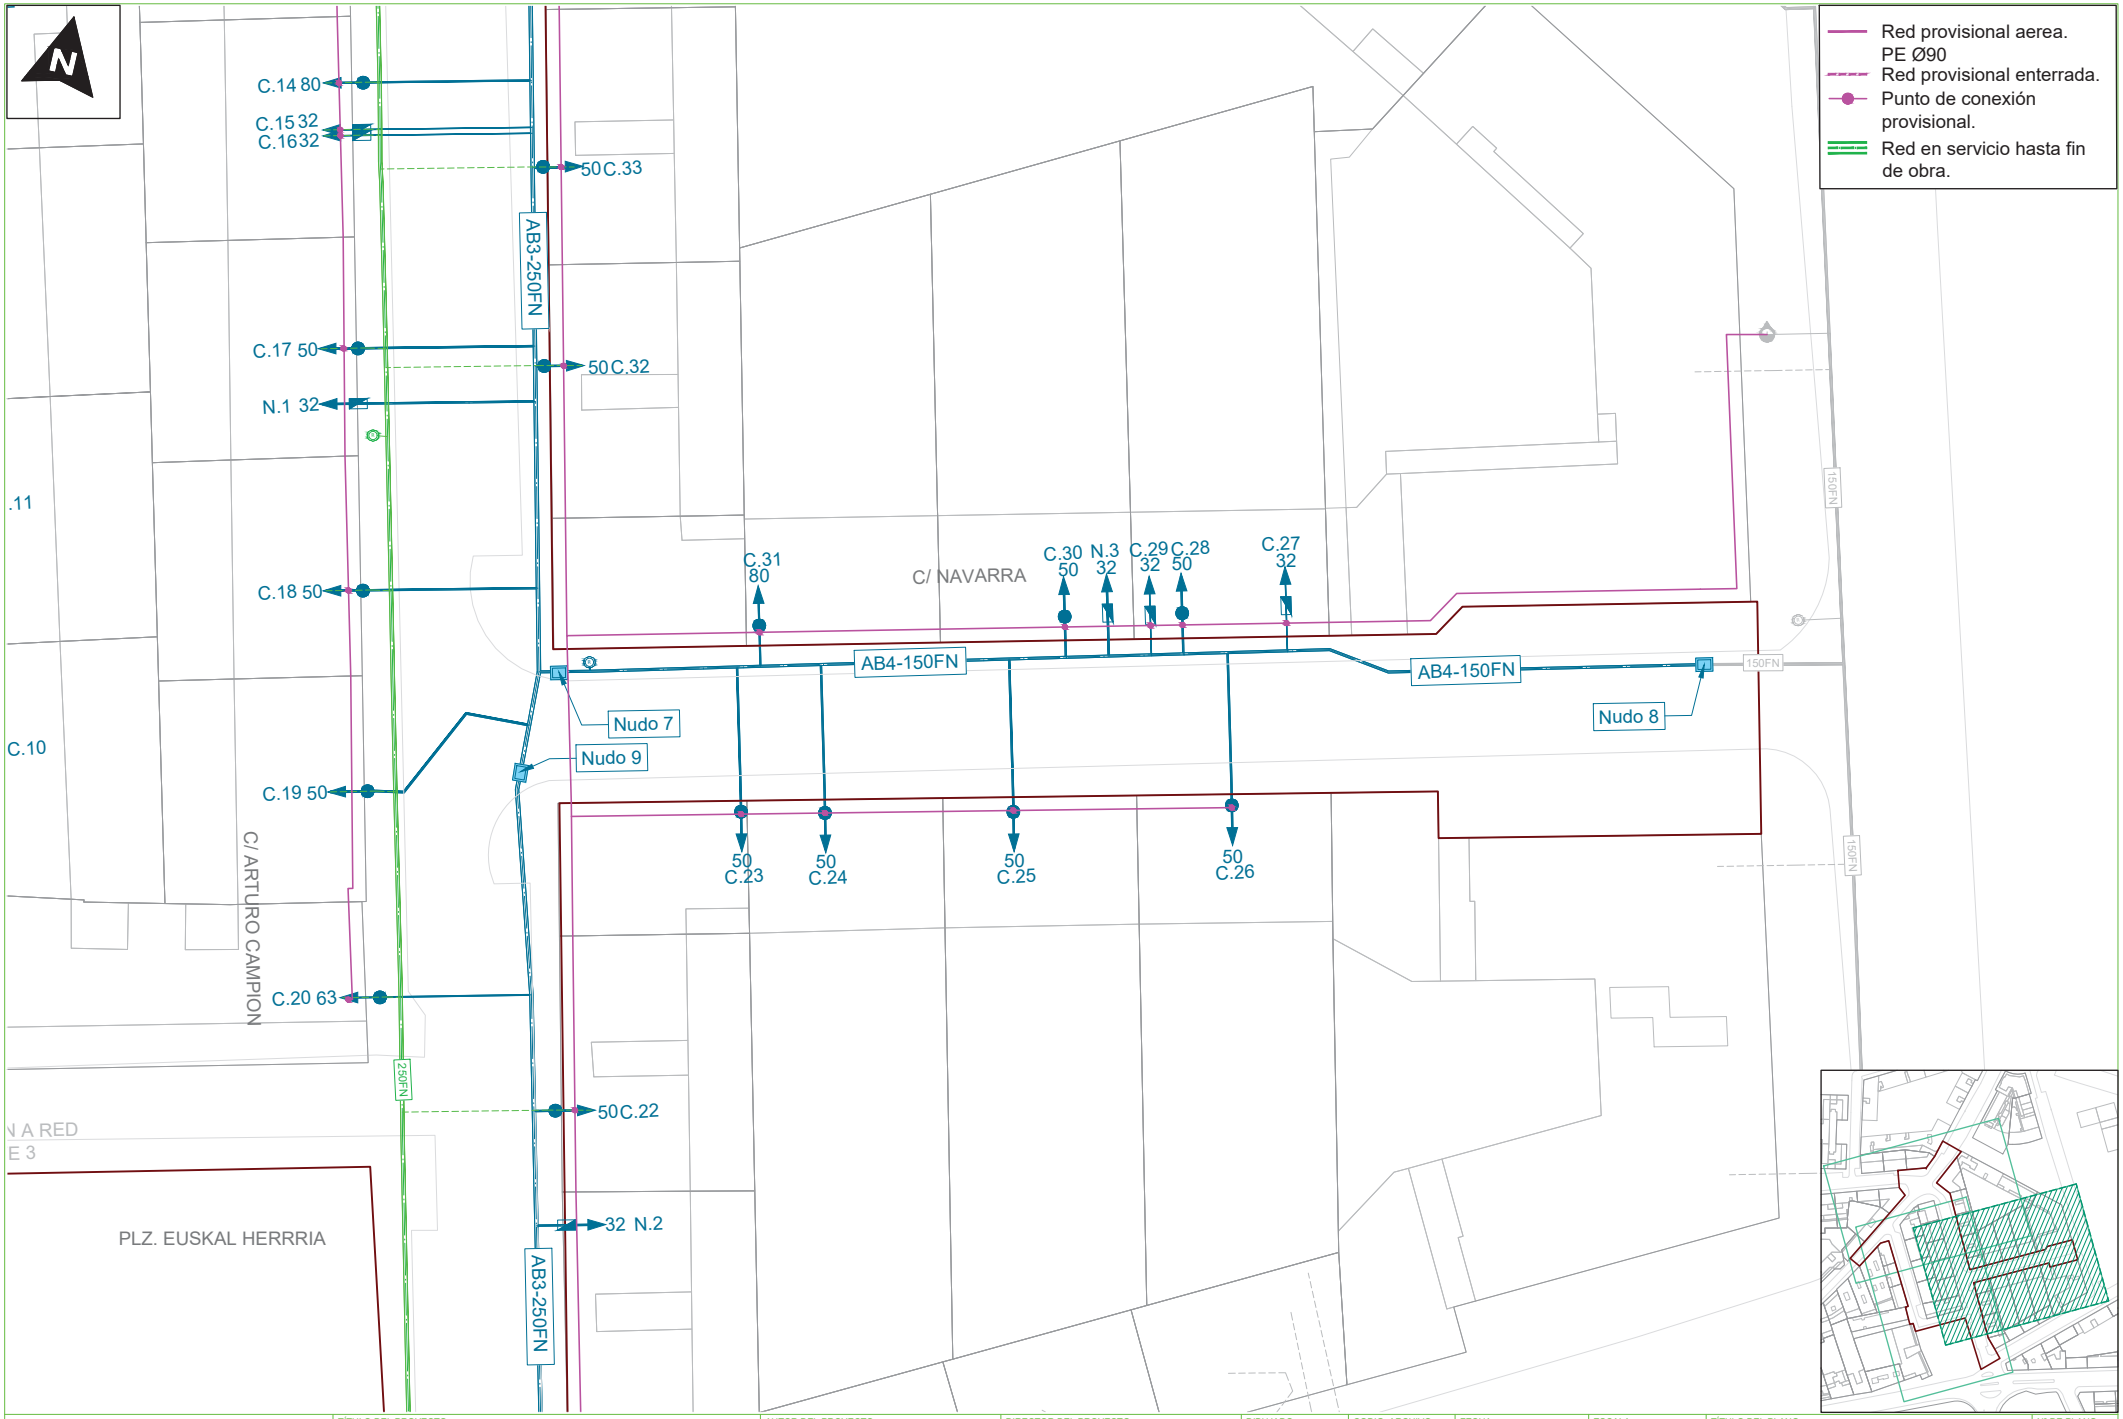

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientoplantadeestadoprovisional.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.	Nº DE PLANO: 6 / Nº DE HOJA: 3 de 4

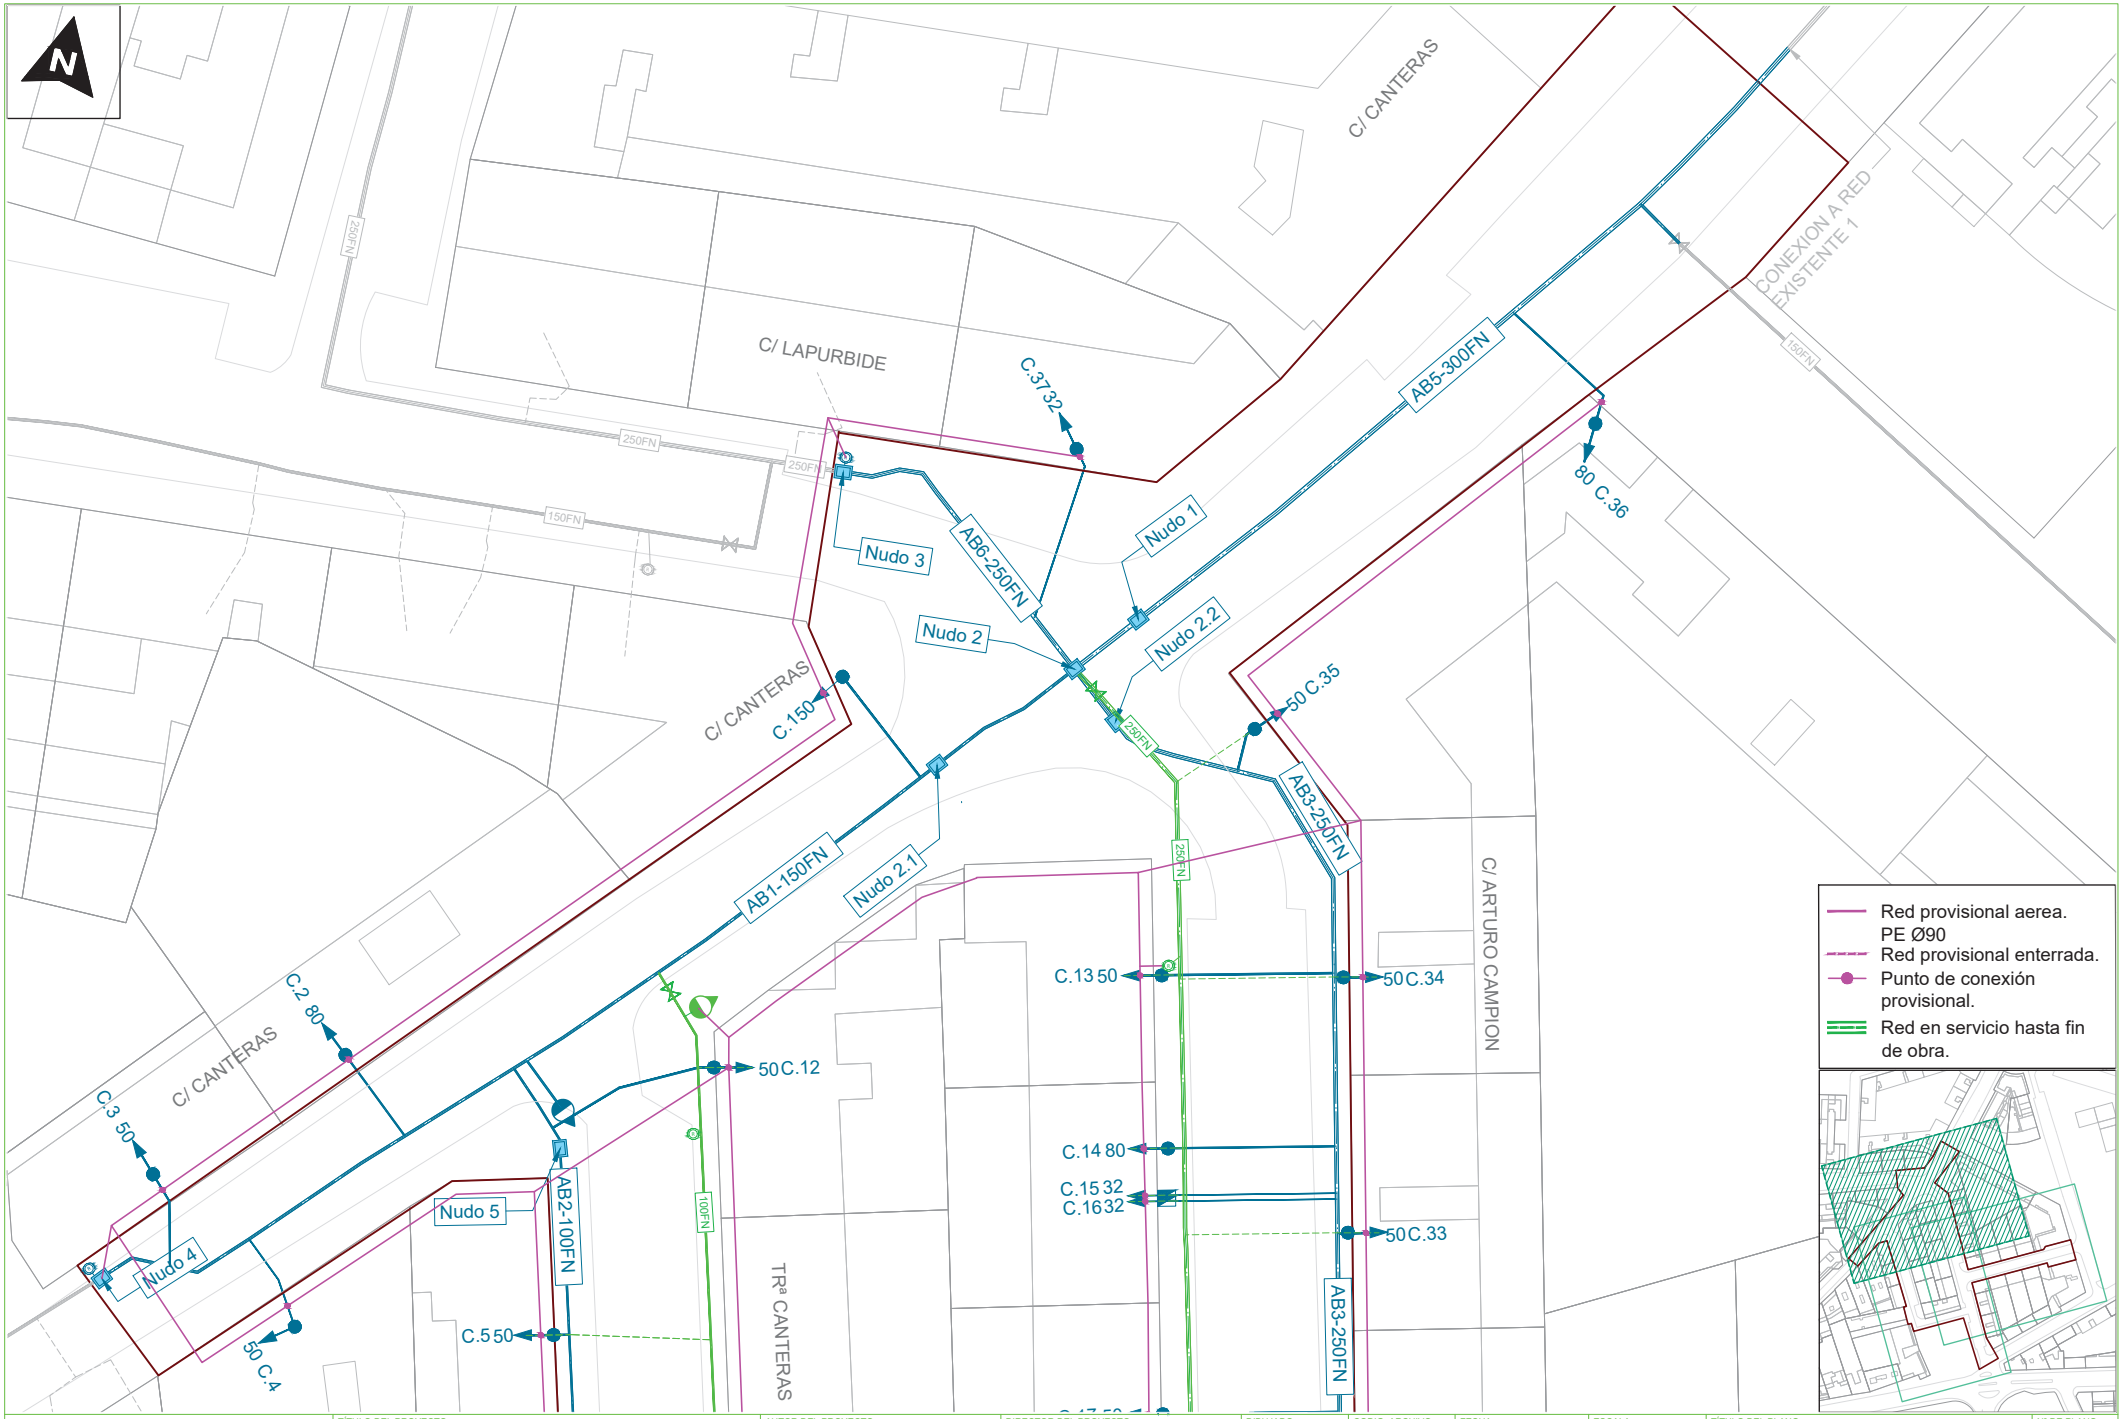

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientoplantadeestadoprovisional.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. PLANTA DE ESTADO PROVISIONAL.	Nº DE PLANO: 6 / Nº DE HOJA: 4 de 4

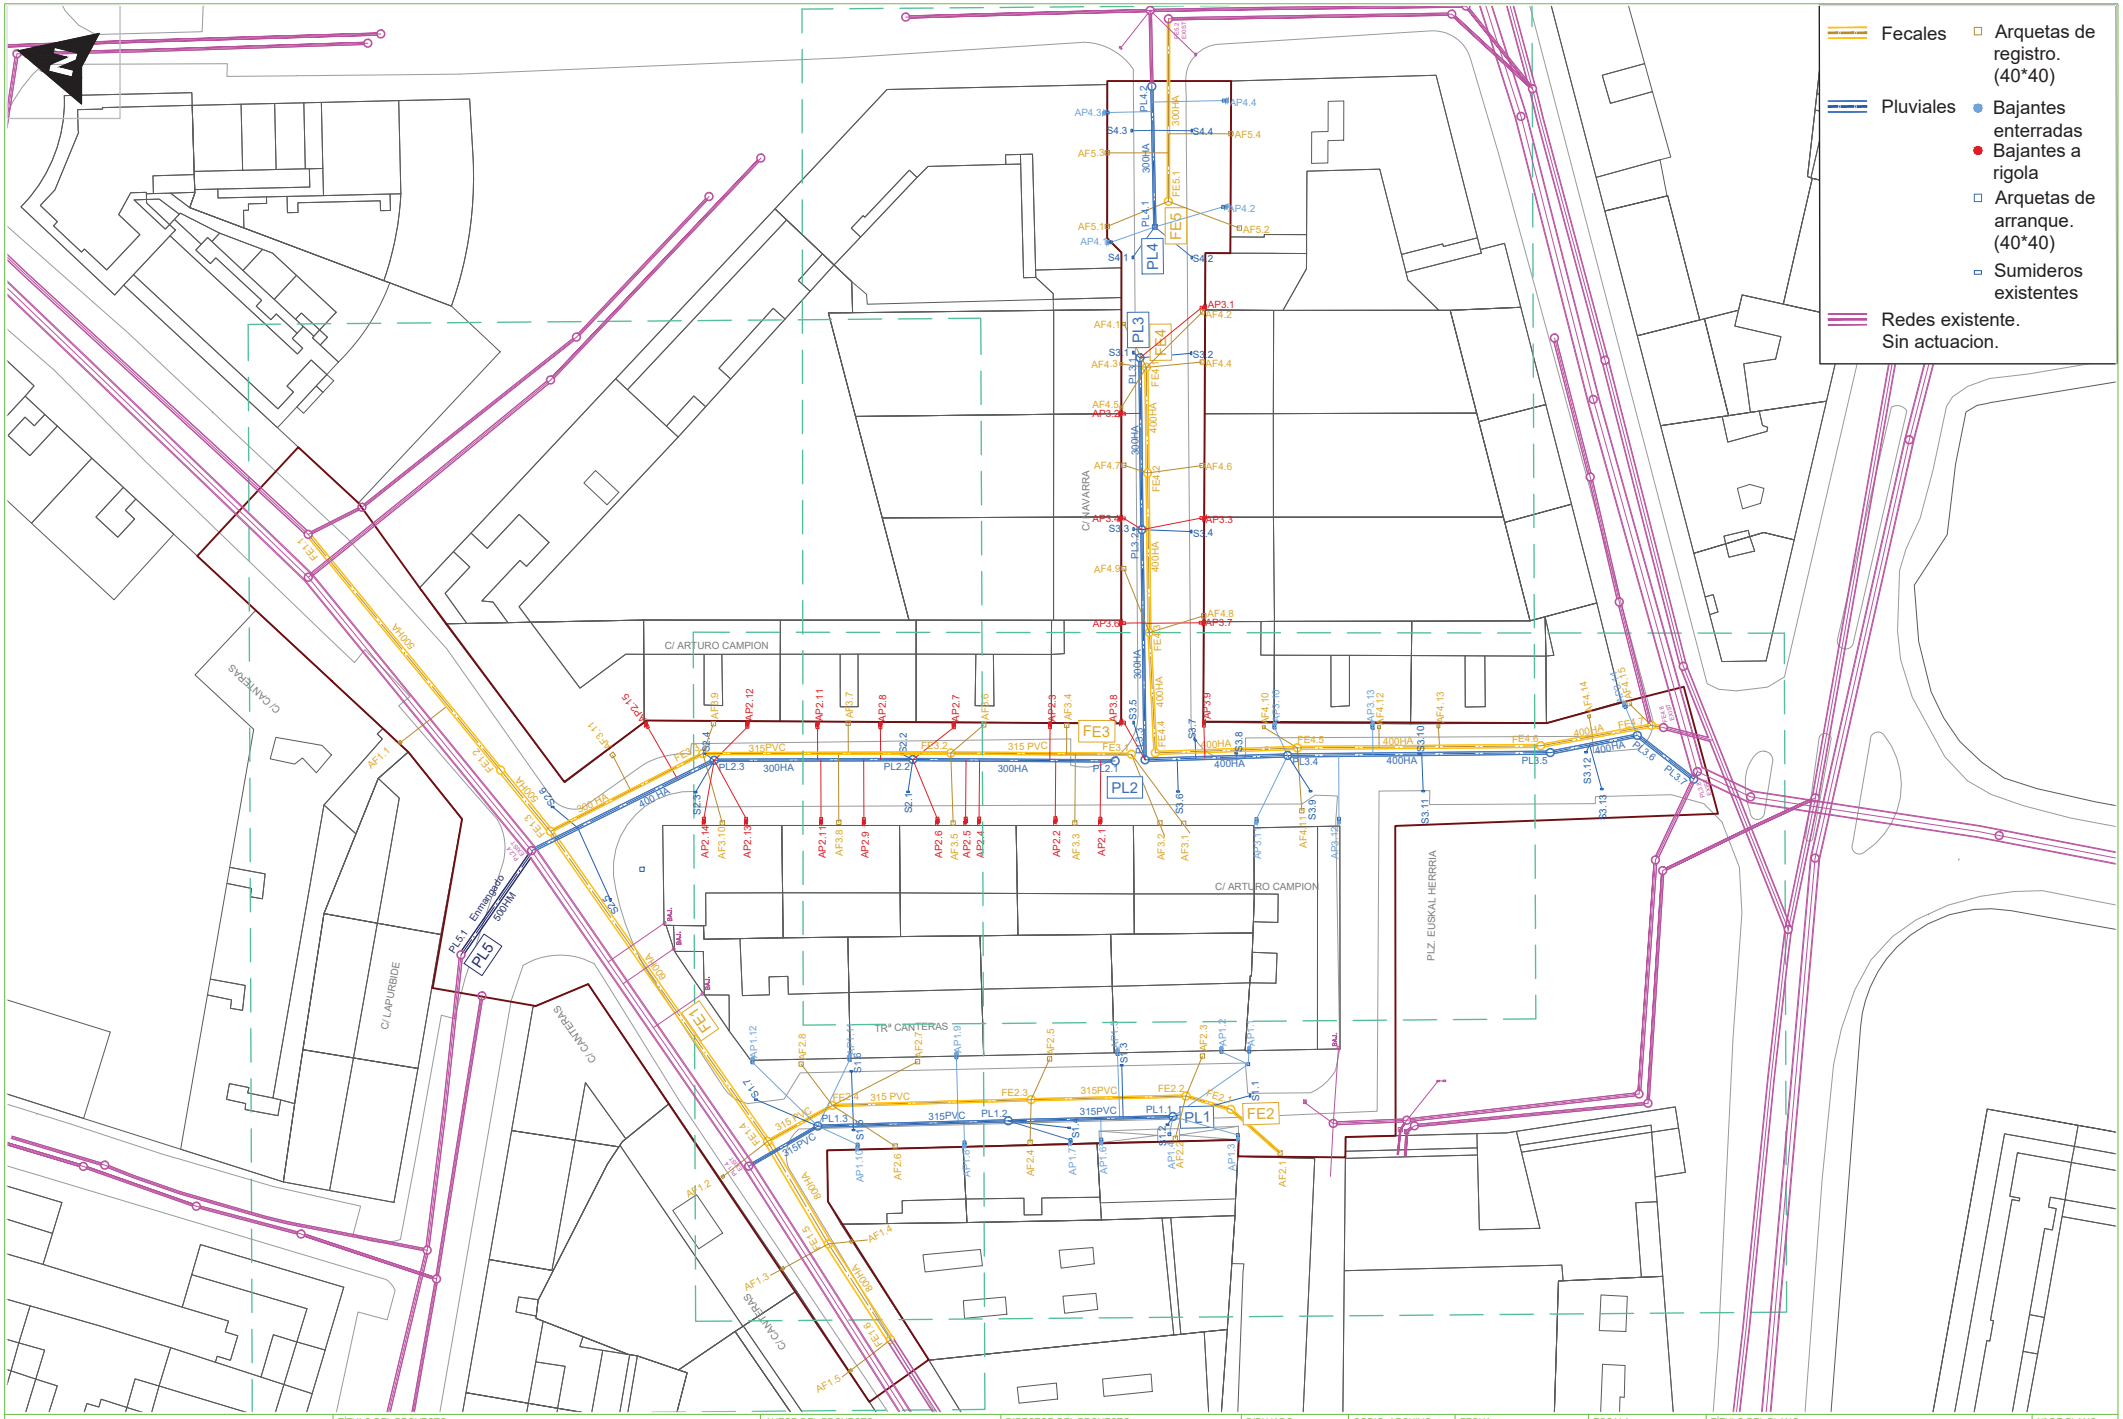


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/750, A1 = 1/325	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 7 / Nº DE HOJA: 1 de 4



Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 7 / Nº DE HOJA: 2 de 4




Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 7 / Nº DE HOJA: 3 de 4

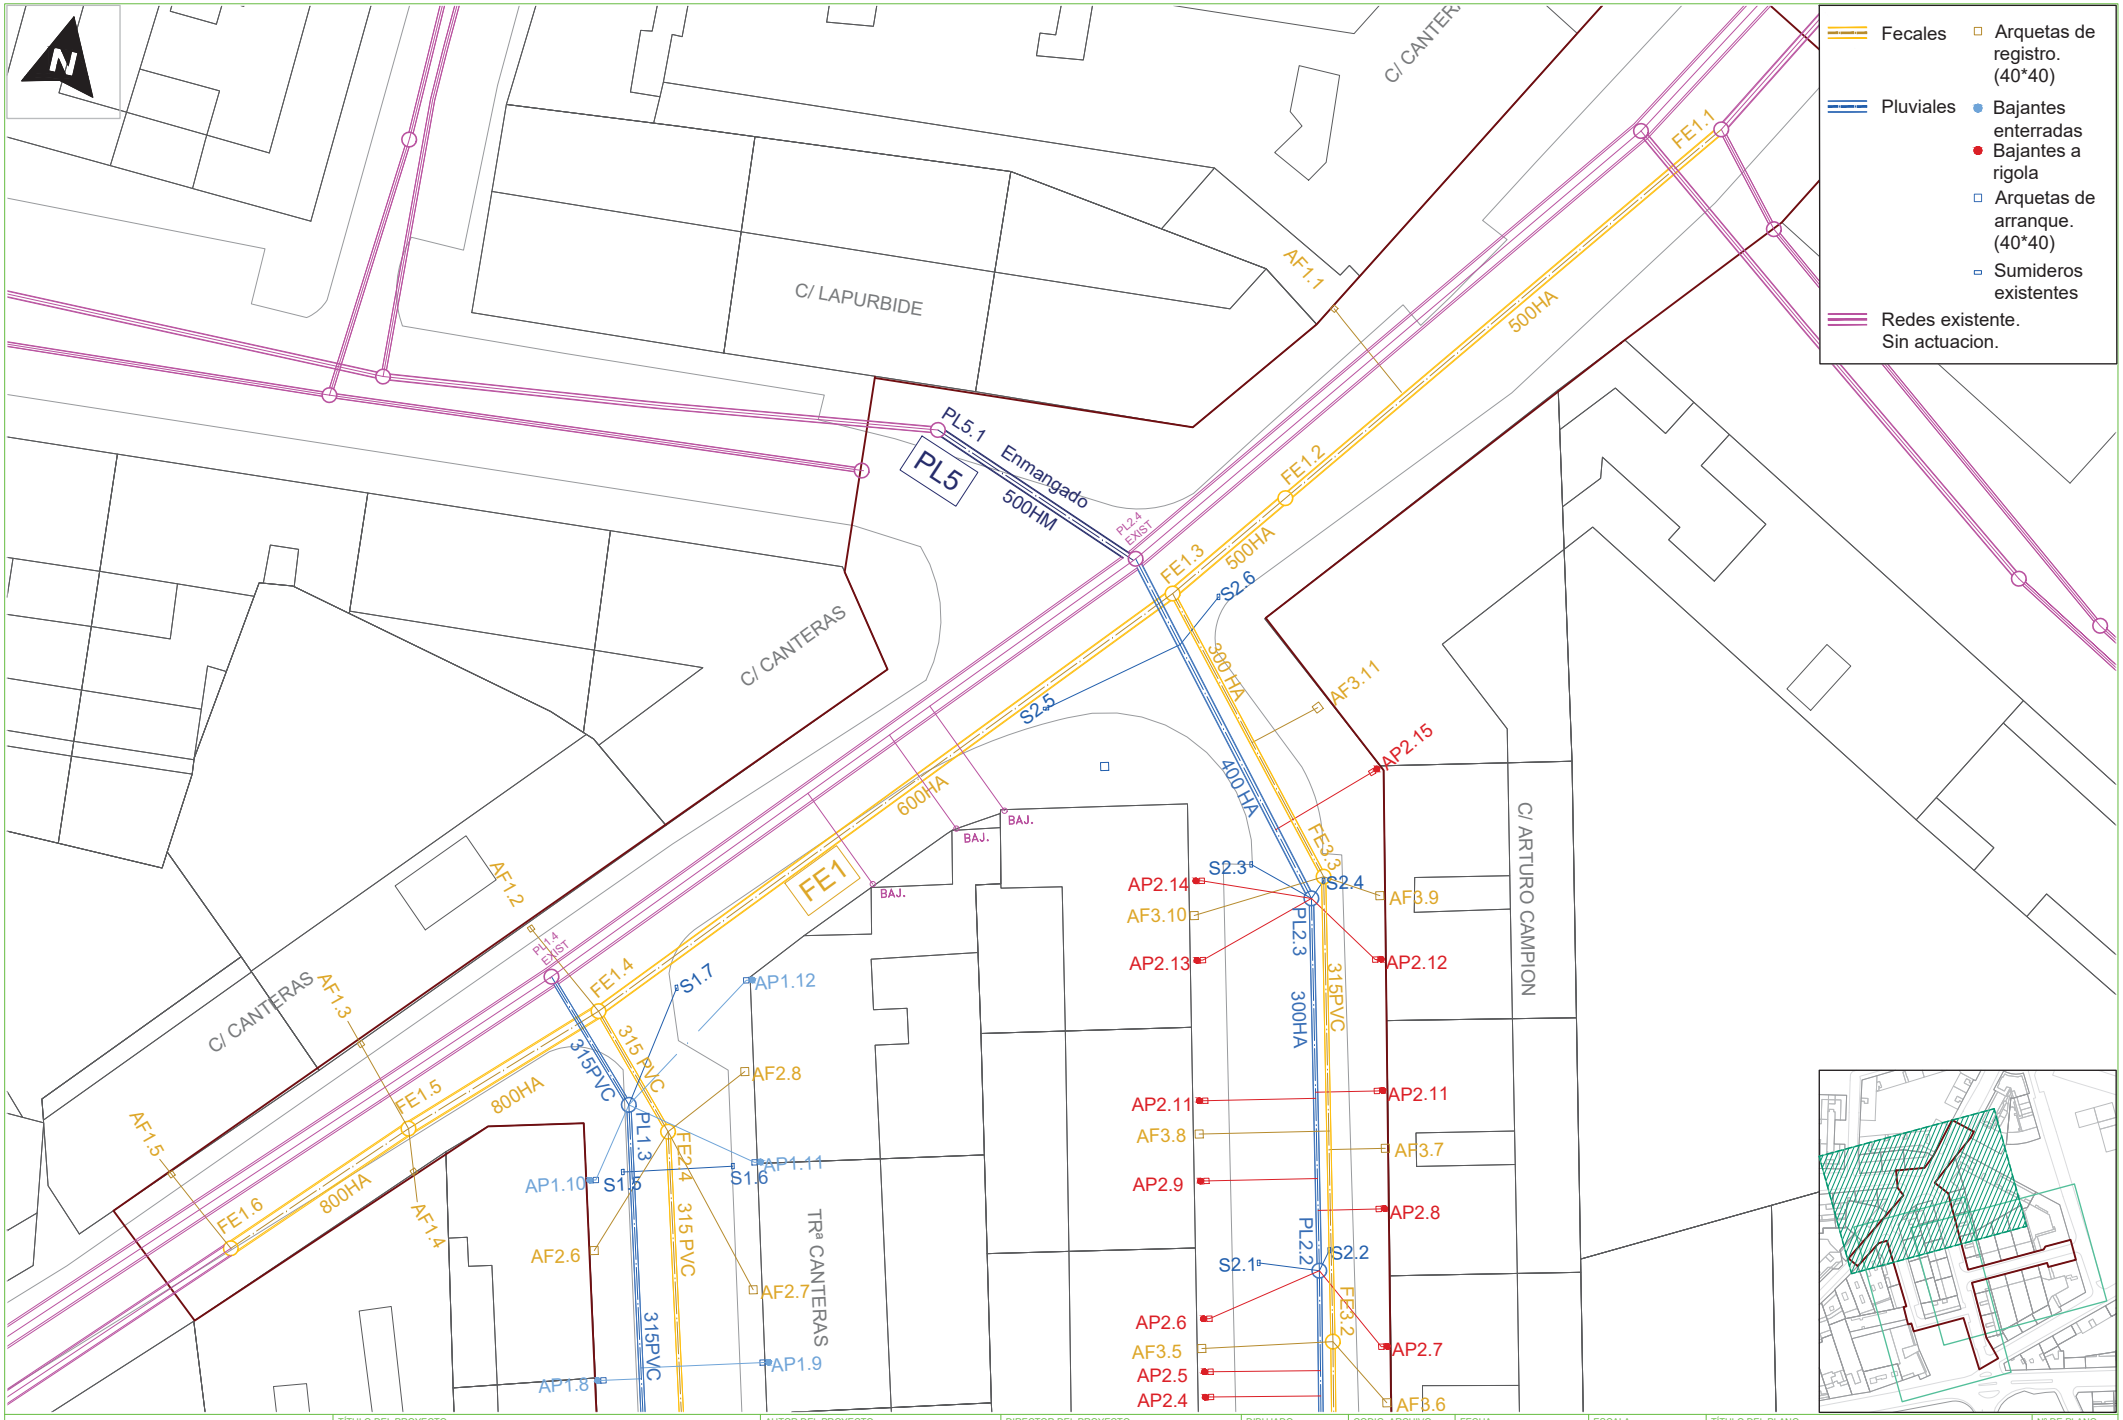

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoplantadeestadodefinitivo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/400, A1 = 1/200	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PLANTA DE ESTADO DEFINITIVO.	Nº DE PLANO: 7 / Nº DE HOJA: 4 de 4


Perfil Longitudinal: FECALES FE1
Escala V = H

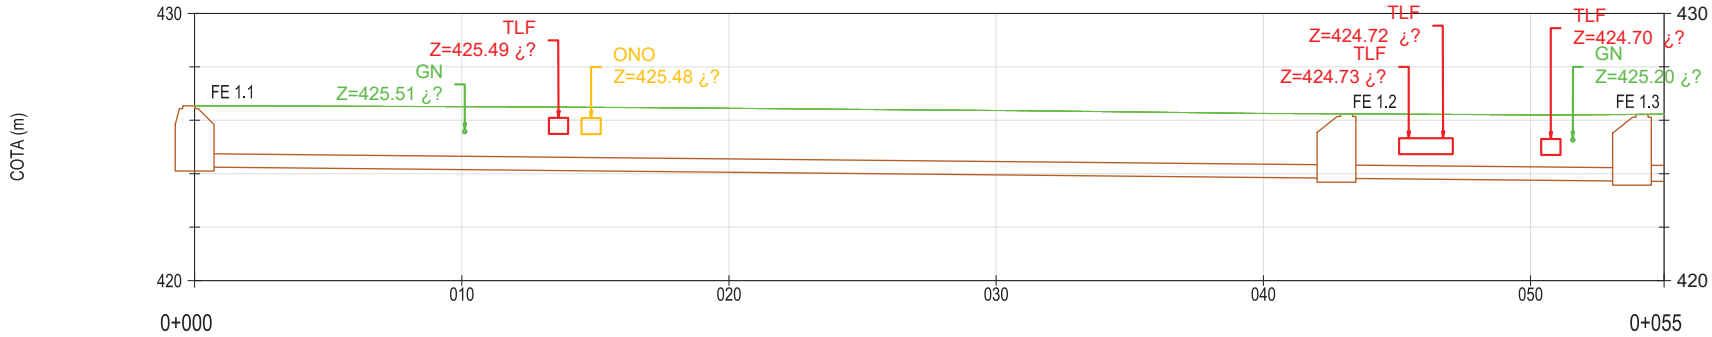

COTA TERRENO	426.54	426.51	426.45	426.37	426.25	426.20	426.23
RASANTE HIDR.	424.25	424.15	424.05	423.96	423.86	423.76	423.71
PROF R. HIDRAULICA	2.29	2.36	2.39	2.41	2.40	2.44	2.52
TUBERIAS			500 mm Tubería de hormigón i=0.98% L=42.74			500 mm Tubería de hormigón i=0.99% L=11.06	600 mm Tubería de hormigón i=0.79% L=53.14
POZOS	FE 1.1 0+000 426.54 424.25 2.29				FE 1.2 0+042,74 426.24 423.83 2.41		FE 1.3 0+053,80 426.22 423.72 2.50

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 1 de 16

Perfil Longitudinal: FECALES FE1
Escala V = H

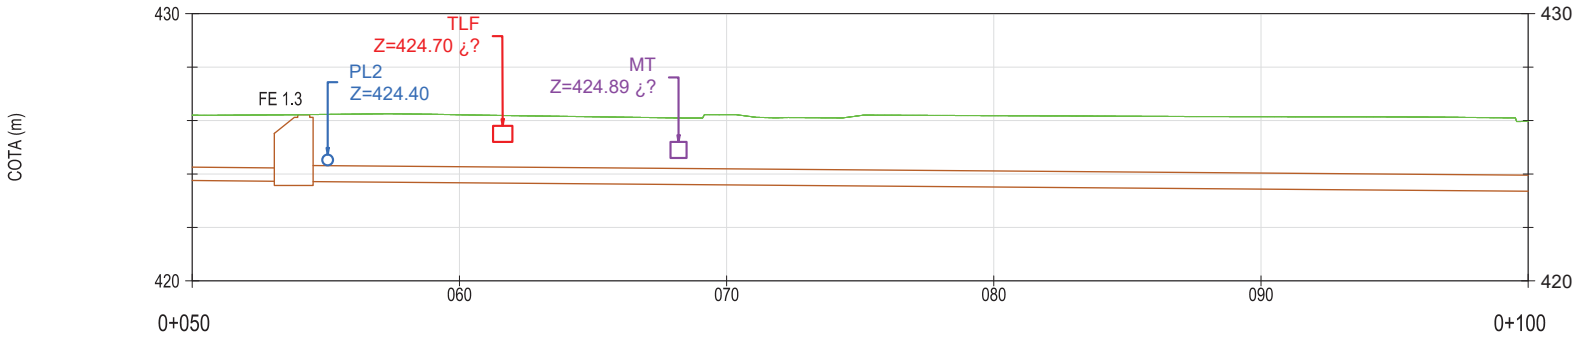


COTA TERRENO	426.20	426.22	426.22	426.18	426.14	425.97
RASANTE HIDR.	423.76	423.67	423.59	423.51	423.43	423.35
PROF R. HIDRAULICA	2.44	2.54	2.63	2.67	2.71	2.61
TUBERIAS	500 mm Tubería de hormigón i=0.99% L=11.06			600 mm Tubería de hormigón i=0.79% L=53.14		
POZOS	FE 1.3 0+053.80 426.22 423.72 2.50					

TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	CODIGO DWG 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg		JUNIO 2026	A3 = 1/200 A1 = 1/100	SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	8 Nº DE HOJA 2 de 16

Perfil Longitudinal: FECALES FE1

Escala V = H

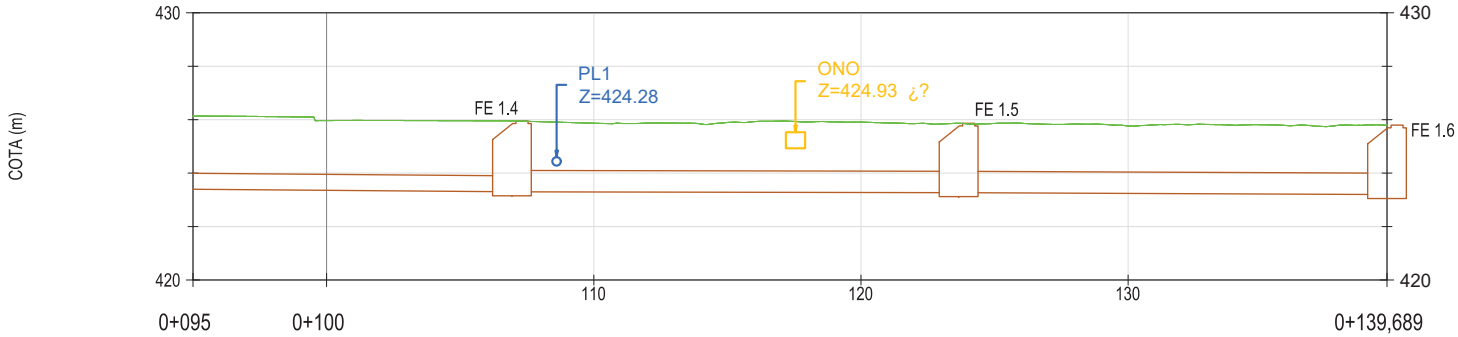


COTA TERRENO	426.14	425.97	425.87	425.91	425.77	425.80
RASANTE HIDR.	423.39	423.35	423.29	423.28	423.24	423.20
PROF R. HIDRAULICA	2.74	2.61	2.57	2.63	2.52	2.60
TUBERIAS	600 mm Tubería de hormigón i=0.79% L=53.14		800 mm Tubería de hormigón i=0.18% L=16.72		800 mm Tubería de hormigón i=0.44% L=16.03	
POZOS	FE 1.4 0+106,94 425.96 423.30 2.66		FE 1.5 0+123,66 425.87 423.27 2.60		FE 1.6 0+139,69 425.80 423.20 2.60	

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 3 de 16

Perfil Longitudinal: FECALES FE2

Escala V = H

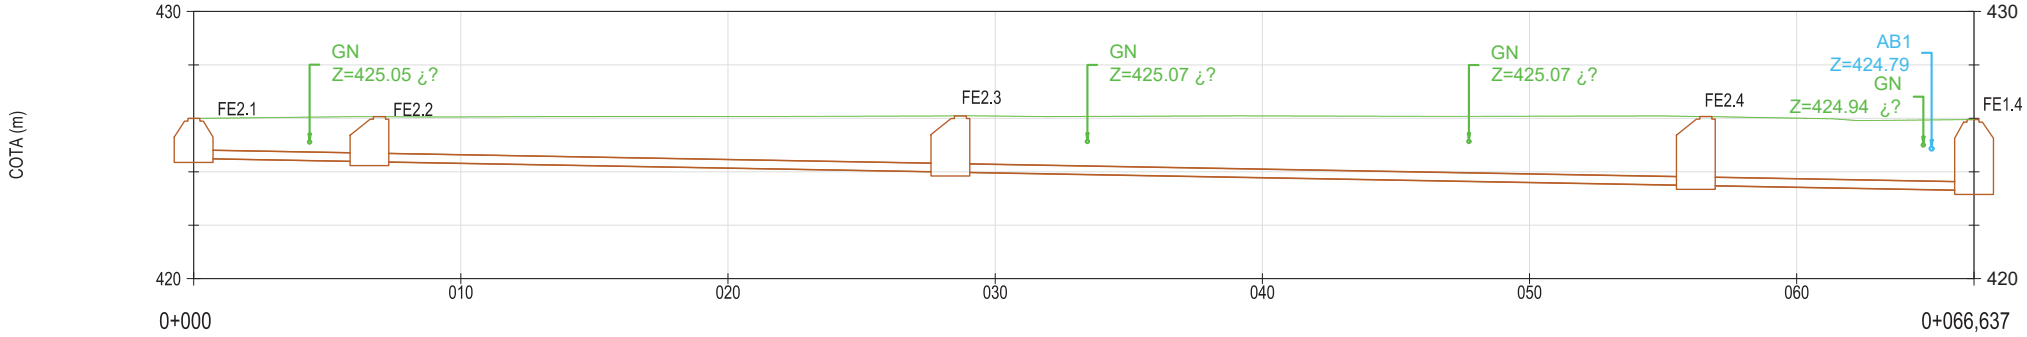

COTA TERRENO	426.00	426.05	426.07	426.09	426.09	426.08	426.01	425.96
RASANTE HIDR.	424.50	424.32	424.14	423.96	423.78	423.60	423.42	423.30
PROF R. HIDRAULICA	1.50	1.73	1.93	2.13	2.31	2.48	2.59	2.65


TUBERIAS				
	315 mm Tubería de PVC i=1.82% L=6.58	315 mm Tubería de PVC i=1.79% L=21.75	315 mm Tubería de PVC i=1.79% L=27.91	315 mm Tubería de PVC i=1.82% L=10.41

POZOS				
	FE2.1 0+000 426.00 424.50 1.50	FE2.2 0+006,58 426.06 424.38 1.68	FE2.3 0+028,32 426.09 423.99 2.10	FE2.4 0+056,22 426.07 423.49 2.58

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	CODIGO DWG 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	JUNIO 2026	A3 = 1/200 A1 = 1/100	SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	8 Nº DE HOJA 4 de 16


Perfil Longitudinal: FECALES FE3
Escala V = H

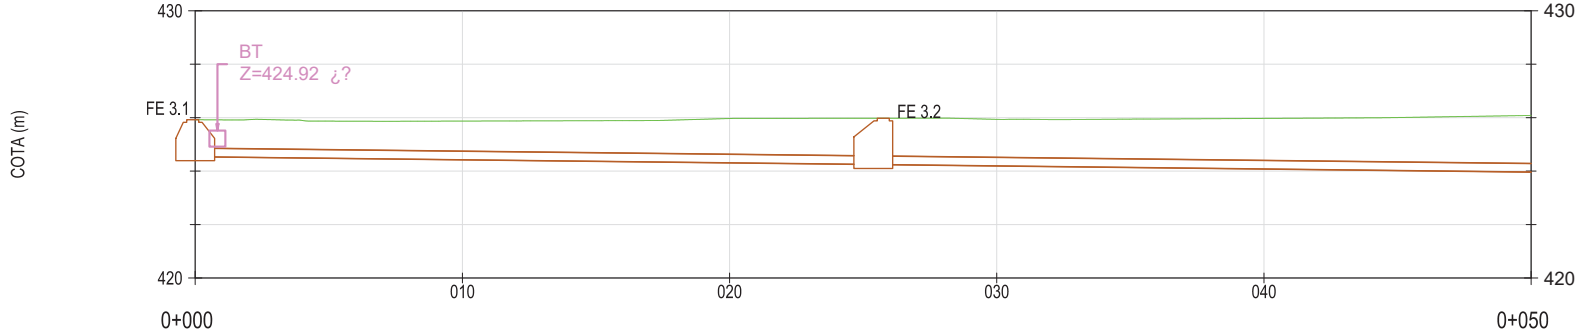

COTA TERRENO	425.92	425.87	425.97	425.94	425.97	426.08
RASANTE HIDR.	424.54	424.43	424.31	424.20	424.08	423.97
PROF R. HIDRAULICA	1.38	1.45	1.66	1.74	1.89	2.12
TUBERIAS		315 mm Tubería de PVC i=1.14% L=25.38			315 mm Tubería de PVC i=1.15% L=34.81	
POZOS	FE 3.1 0+000 425.92 424.54 1.38			FE 3.2 0+025.38 425.98 424.25 1.73		

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 5 de 16


Perfil Longitudinal: FECALES FE3
Escala V = H

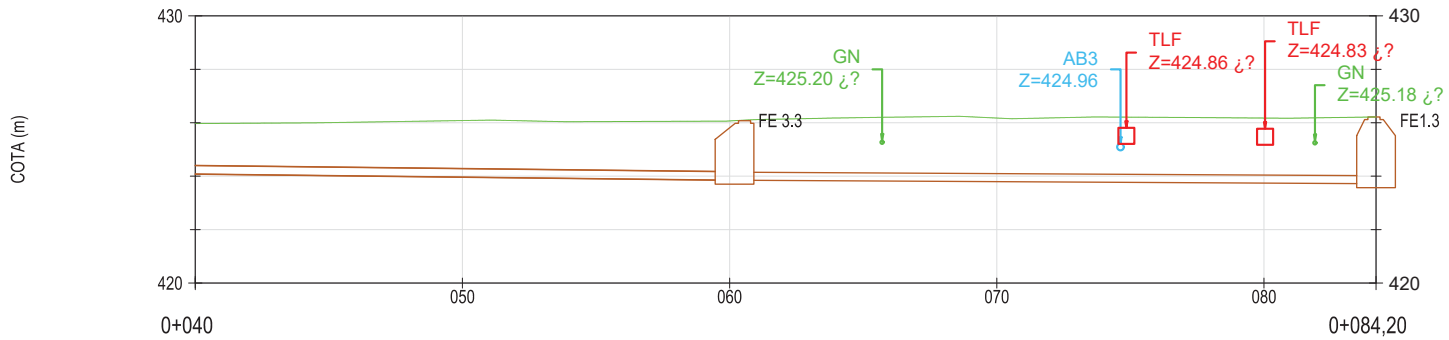

COTA TERRENO	425.97	426.08	426.07	426.18	426.18	426.22
RASANTE HIDR.	424.08	423.97	423.85	423.80	423.74	423.72
PROF R. HIDRAULICA	1.89	2.12	2.22	2.38	2.43	2.50
TUBERIAS		315 mm Tubería de PVC i=1.15% L=34.81		300 mm Tubería de hormigón i=0.54% L=24.01		
POZOS			FE 3.3 0+060,18 426.08 423.85 2.23			

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 6 de 16

Perfil Longitudinal: FECALES FE4
Escala V = H

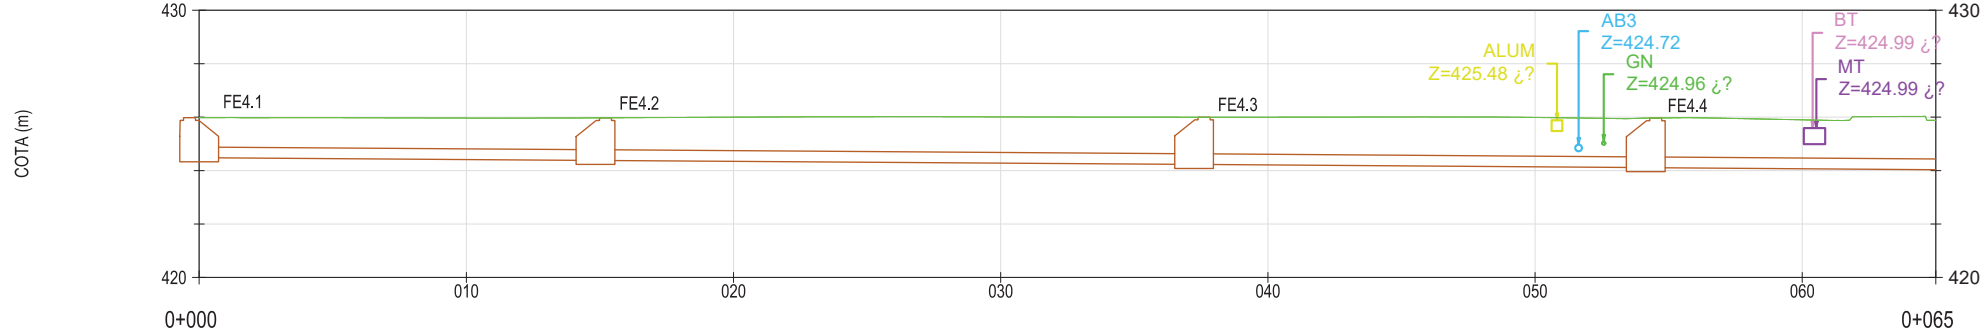

COTA TERRENO	425.98	425.96	426.00	426.01	426.00	425.99	425.90	425.88
RASANTE HIDR.	424.48	424.41	424.35	424.28	424.21	424.14	424.07	424.03
PROF R. HIDRAULICA	1.50	1.55	1.65	1.73	1.79	1.85	1.83	1.84
TUBERIAS		400 mm Tubería de hormigón i=0.67% L=14.83		400 mm Tubería de hormigón i=0.67% L=22.40		400 mm Tubería de hormigón i=0.71% L=16.91		400 mm Tubería de hormigón i=0.70% L=19.93
POZOS	FE4.1 0+000 425.98 424.48 1.50		FE4.2 0+014,83 425.97 424.38 1.59		FE4.3 0+037,24 426.00 424.23 1.77		FE4.4 0+054,14 425.96 424.11 1.85	

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.

TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA

AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial

DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial

DIBUJADO

CODIG. ARCHIVO

CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg

FECHA: JUNIO 2026


ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100

TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES

Nº DE PLANO: 8

Nº DE HOJA: 7 de 16

Perfil Longitudinal: FECALES FE4
Escala V = H

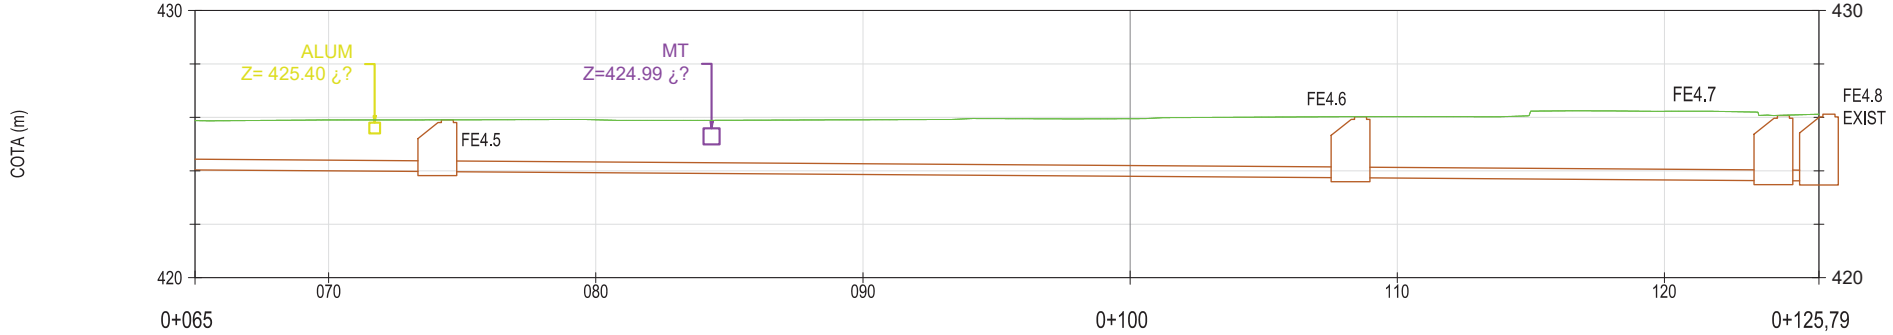

COTA TERRENO	425.88	425.90	425.91	425.91	425.95	426.03	426.23	426.12
RASANTE HIDR.	424.03	424.00	423.93	423.86	423.80	423.73	423.66	423.62
PROF R. HIDRAULICA	1.84	1.90	1.98	2.05	2.15	2.30	2.57	2.50

TUBERIAS	400 mm Tubería de hormigón i=0.70% L=19.93	400 mm Tubería de hormigón i=0.67% L=34.18	400 mm Tubería de hormigón i=0.70% L=15.83	400 mm Tubería de hormigón i=0.59% L=1.71


POZOS	FE4.5 0+074,07 425.91 423.97 1.94	FE4.6 0+108,25 426.03 423.74 2.29	FE4.7 0+124,08 426.07 423.63 2.44

FE4.8 EXIST
0+125,78
426.12
423.62
2.50

Mancomunidad Comarca de Pamplona
Servicios de la Comarca de Pamplona
Instituto Mankomunitatea
Instituto Zerbitzuak

TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	CODIGO DWG 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	JUNIO 2026	A3 = 1/200 A1 = 1/100	SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	8 Nº DE HOJA 8 de 16


Perfil Longitudinal: FECALES FE5
Escala V = H

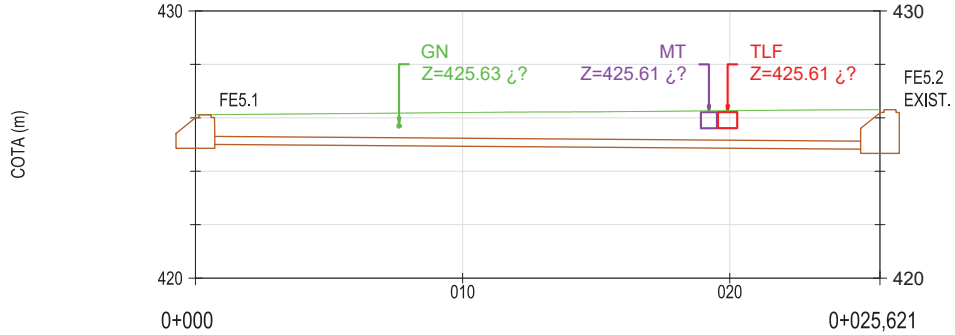

COTA TERRENO	426.11	426.20	426.27	426.30
RASANTE HIDR.	425.01	424.94	424.86	424.82
PROF R. HIDRAULICA	1.10	1.26	1.41	1.48
TUBERIAS	300 mm Tubería de hormigón i=0.74% L=25.62			
POZOS	FE5.1 0+000 426.11 425.01 1.10			FE5.2 0+025.62 426.30 424.82 1.48

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Komarkaldea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 9 de 16

Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL1
Escala V = H

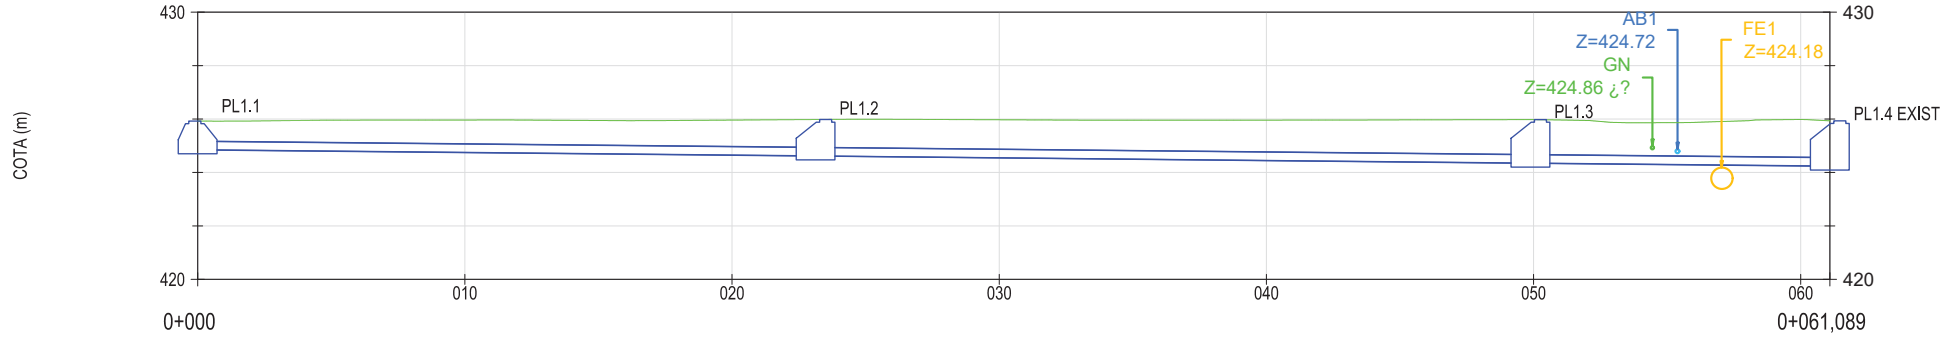


COTA TERRENO	425.93	425.96	425.96	425.97	425.96	425.98	425.98 / 425.93
RASANTE HIDR.	424.85	424.75	424.65	424.55	424.45	424.35	424.25 / 424.24
PROF R. HIDRAULICA	1.08	1.21	1.31	1.42	1.51	1.63	1.73 / 1.69
TUBERIAS		315 mm Tubería de PVC i=0.99% L=23.13		315 mm Tubería de PVC i=1.01% L=26.76		315 mm Tubería de PVC i=0.98% L=11.21	
POZOS	PL1.1 0+000 425.93 424.85 1.08		PL1.2 0+023,13 425.98 424.62 1.36			PL1.3 0+049,88 425.98 424.35 1.63	PL1.4 EXIST 0+061.09 425.93 424.24 1.69

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona

TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	JUNIO 2026	A3 = 1/200 A1 = 1/100	SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	8 Nº DE HOJA: 10 de 16

Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL2
Escala V = H

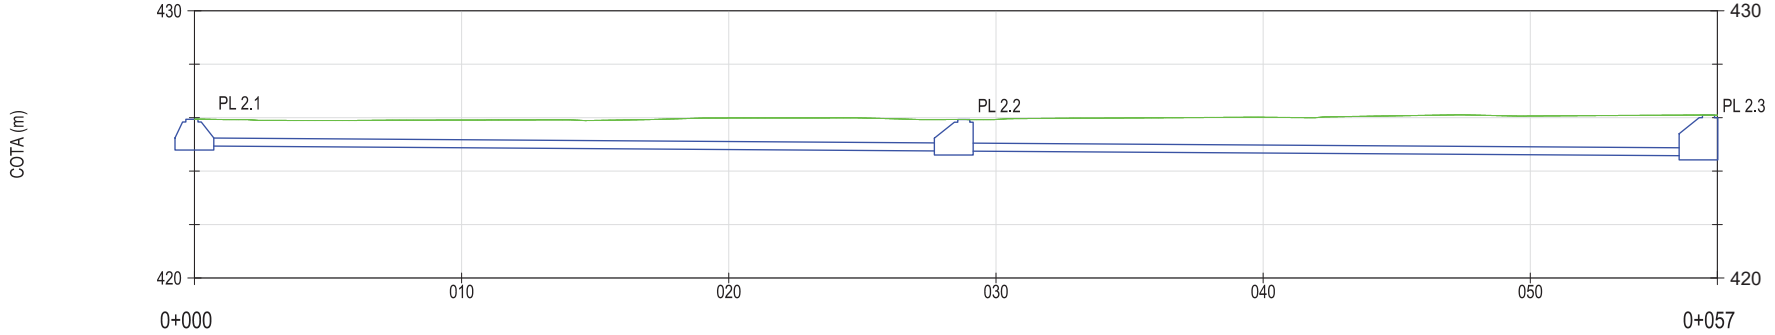

COTA TERRENO	425.94	425.91	425.99	425.93	426.01	426.06	426.09
RASANTE HIDR.	424.94	424.87	424.81	424.74	424.65	424.57	424.52
PROF R. HIDRAULICA	1.00	1.04	1.18	1.20	1.36	1.49	1.57

TUBERIAS

300 mm Tubería de hormigón i=0.67% L=28.42

300 mm Tubería de hormigón i=0.65% L=27.87

400 mm Tubería de hormigón i=0.66% L=28.62

POZOS


PL 2.1 0+000 425.94 424.94 1.00

PL 2.2 0+028,42 425.93 424.75 1.18

PL 2.3 0+056,29 426.10 424.57 1.53

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 11 de 16


Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL2
Escala V = H

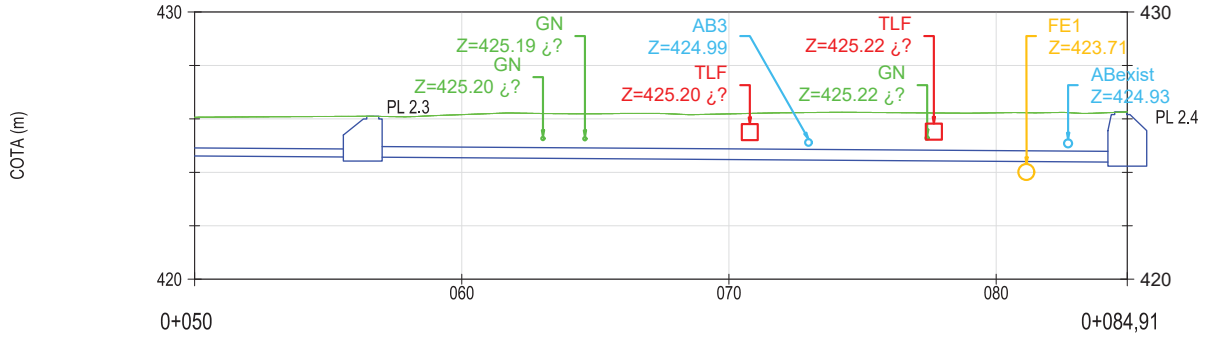

COTA TERRENO	426.06	426.16	426.19	426.23	426.26
RASANTE HIDR.	424.57	424.50	424.45	424.40	424.38
PROF R. HIDRAULICA	1.49	1.66	1.73	1.82	1.88
TUBERIAS	300 mm Tubería de hormigón i=0.65% L=27.87		400 mm Tubería de hormigón i=0.66% L=28.62		
POZOS	PL 2.3 0+056,29 426.10 424.57 1.53				PL 2.4 0+084,91 426.26 424.38 1.88

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 12 de 16

Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL3
Escala V = H

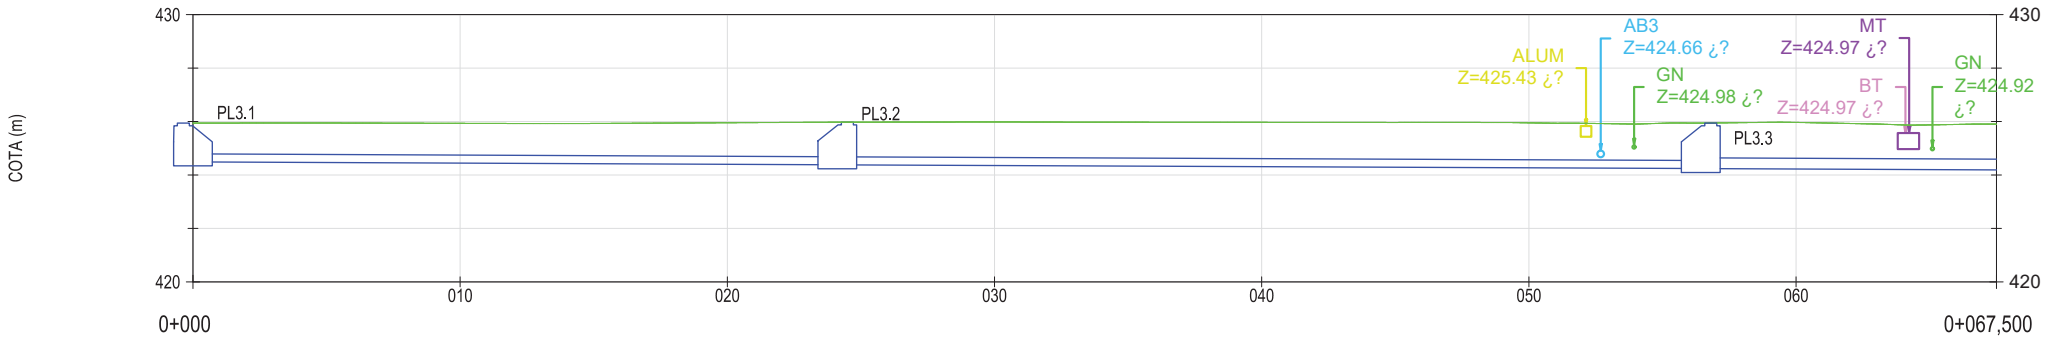


COTA TERRENO	425.94	425.93	425.95	425.98	425.97	425.95	425.97	425.90
RASANTE HIDR.	424.49	424.44	424.40	424.35	424.31	424.27	424.22	424.19
PROF R. HIDRAULICA	1.45	1.49	1.56	1.63	1.66	1.68	1.74	1.71
TUBERIAS	300 mm Tubería de hormigón i=0.46% L=24.12			300 mm Tubería de hormigón i=0.43% L=32.32			400 mm Tubería de hormigón i=0.45% L=20.03	
POZOS	PL3.1 0+000 425.94 424.49 1.45			PL3.2 0+024,12 425.98 424.38 1.60			PL3.3 0+056,43 425.94 424.24 1.70	

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona

TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 13 de 16

Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL3


Escala V = H

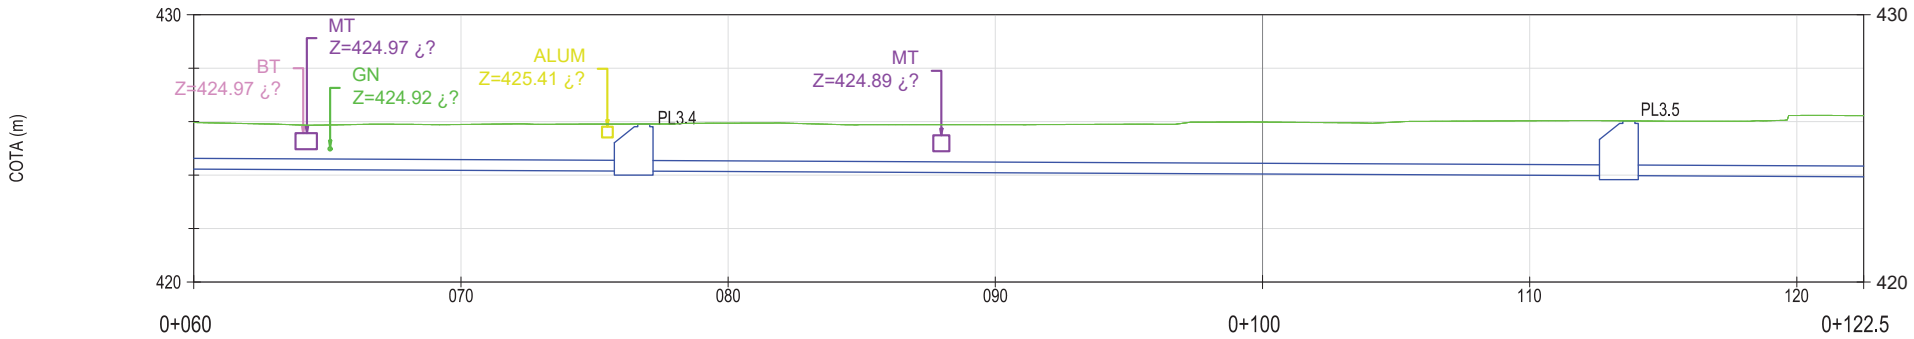

COTA TERRENO	425.97	425.89	425.94	425.89	425.98	426.03	426.23	426.23
RASANTE HIDR.	424.22	424.18	424.13	424.09	424.04	424.00	423.95	423.94
PROF R. HIDRAULICA	1.74	1.71	1.81	1.80	1.94	2.04	2.28	2.29
TUBERIAS	400 mm Tubería de hormigón i=0.45% L=20.03				400 mm Tubería de hormigón i=0.46% L=36.87			400 mm Tubería de hormigón i=0.48% L=12.46
POZOS			PL3.4 0+076,47 425.91 424.15 1.76				PL3.5 0+113,34 426.03 423.98 2.05	

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 14 de 16


Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL3
Escala V = H

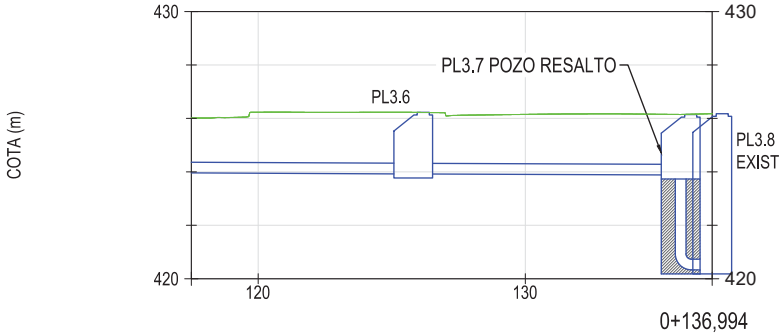

COTA TERRENO	426.03	426.23	426.15	426.18
RASANTE HIDR.	423.96	423.95	423.90	420.32
PROF R. HIDRAULICA	2.05	2.28	2.25	5.86
TUBERIAS	400 mm Tubería de hormigón i=0.48% L=12.46		400 mm Tubería de hormigón i=0.40% L=10.01	600 mm Tubería de hormigón i=0.00% L=1.18
POZOS	PL3.6 0+125,80 426.23 423.92 2.31		PL3.7 POZO RESALTO 0+135,81 426.15 420.33 5.82	PL3.8 EXIST 0+136,99 426.18 420.33 5.85

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 15 de 16

Perfil Longitudinal: PLUVIALES PL4
Escala V = H

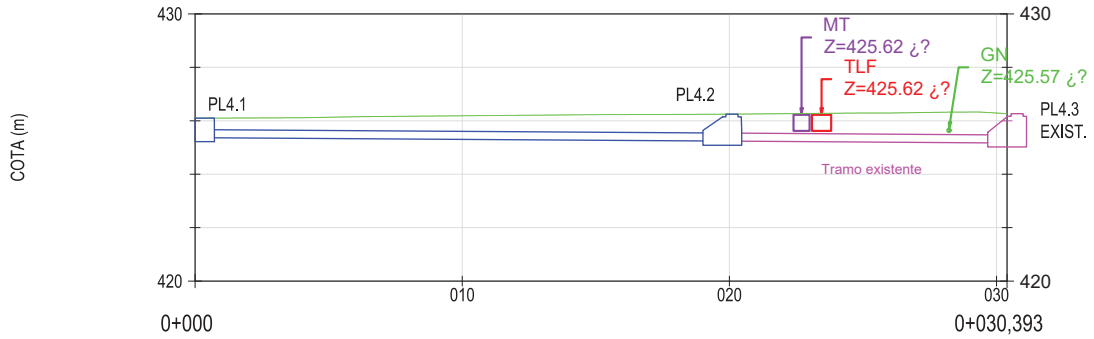


COTA TERRENO	426.10	426.19	426.25	426.29 / 426.27
RASANTE HIDR.	425.37	425.30	425.24	425.17 / 425.17
PROF R. HIDRAULICA	0.73	0.88	1.01	1.12 / 1.10
TUBERIAS		300 mm Tubería de hormigón i=0.66% L=19.74		300 mm Tubería de hormigón i=0.66% L=10.66
POZOS	PL4.1 0+000 426.10 425.37 0.98		PL4.2 0+019.74 426.25 425.24 1.01	PL4.3 EXIST 0+030.39 426.27 425.17 1.10


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientoperfileslongitudinales.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = 1/200, A1 = 1/100	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. PERFILES LONGITUDINALES	Nº DE PLANO: 8 / Nº DE HOJA: 16 de16

TAPA DE REGISTRO ABATIBLE. TRÁFICO INTENSO. TAPA Y MARCO CIRCULARES. (MARCADO ABASTECIMIENTO). E=1/20

(TAPA TIPO PAMREX O SIMILAR ACEPTADA POR SCPSA)

- COTA DE PASO: Ø 610 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
- CLASE: D400 (400KN)
- TAPA: ARTICULADA MEDIANTE CHARNELA, CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90º CONTRA CIERRE ACCIDENTAL, EXTRAÍBLE EN POSICIÓN VERTICAL (VENTILADA PARA LOS CASOS DE VENTOSAS).
- MARCO: CIRCULAR
- INSONORIZACIÓN: MEDIANTE JUNTA ELASTOMÉRICA EN EL MARCO
- FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS O HERRAJES Ø 12 CON TACO DE ANCLAJE MECÁNICO Y DOBLE TUERCA PARA NIVELACIÓN, SEGÚN DETALLE 1.
- INSCRIPCIÓN: MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA Y ANAGRAMA. (ABASTECIMIENTO).
- NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN 124: 1995.
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO






UBICACIÓN:
-CALZADAS CON TRÁFICO RODADO INTENSO


INSTALACIÓN: EJE BISAGRA - CIERRE *EN EL SENTIDO DEL TRÁFICO RODADO*

EL MARCO IRÁ APOYADO EN TODO SU PERÍMETRO SOBRE LOS MUROS DE ARQUETA, MÓDULO CÓNICO DE POZO O LOSA.


LA JUNTA ELASTOMÉRICA Y LOS CAJEADOS DE BISAGRA Y CIERRE DEBEN QUEDAR LIBRES DE MORTERO, HORMIGÓN, ETC...

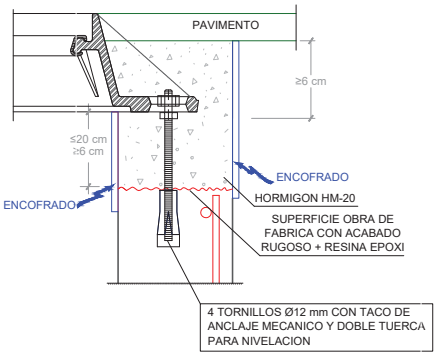


ARQUETA DE REGISTRO PARA HIDRANTE DE INCENDIOS. E =1/20

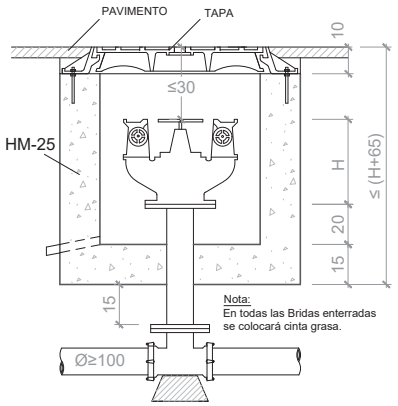


Nota:
En todas las Bridas enterradas se colocará cinta grasa.

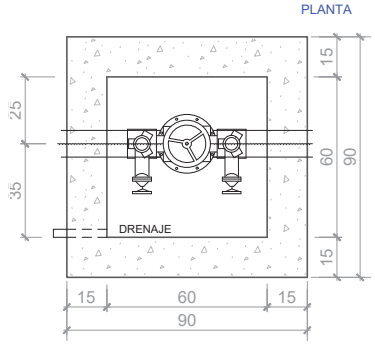


ARQUETA DE REGISTRO PARA VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DN ≤250 O DESAGÜE. E =1/20

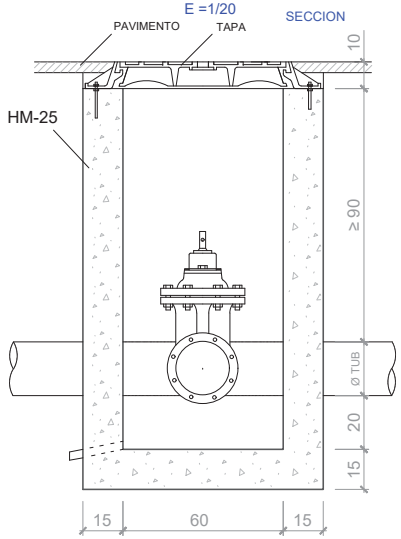


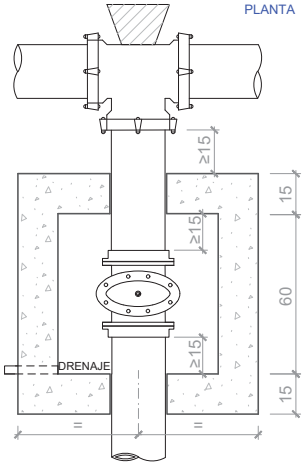


ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS D ≤ 63 CON CONTADOR EXTERIOR. E=1/20

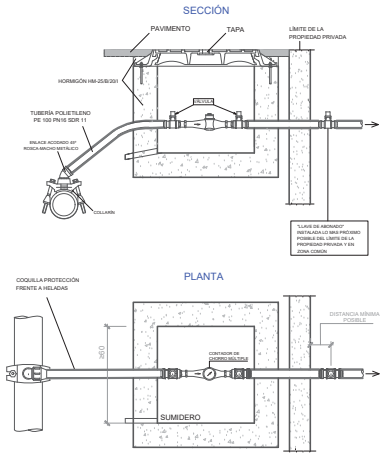

ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS DN < 50 CON CONTADOR EXTERIOR Ø25 (L=115mm),Ø20,15 Y13mm. E=1/20

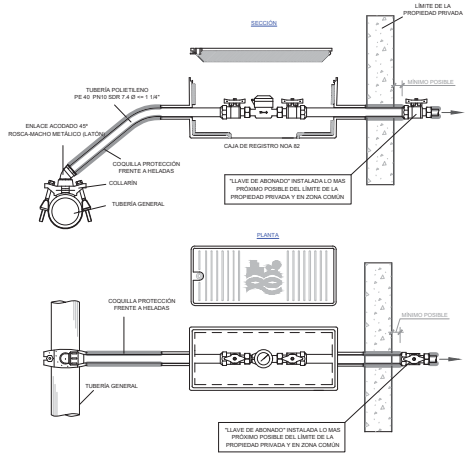


ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS DN ≤ 50 CON CONTADOR INTERIOR. E=1/20

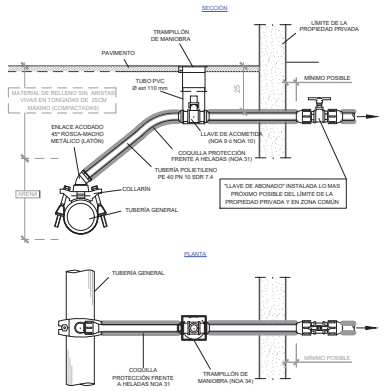

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientodetallesyseccionTipo	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 9 / Nº DE HOJA: 1 de 4

TAPA DE REGISTRO ABATIBLE. TAPA Y MARCO CIRCULARES (MARCADO ABASTECIMIENTO). E=1/20

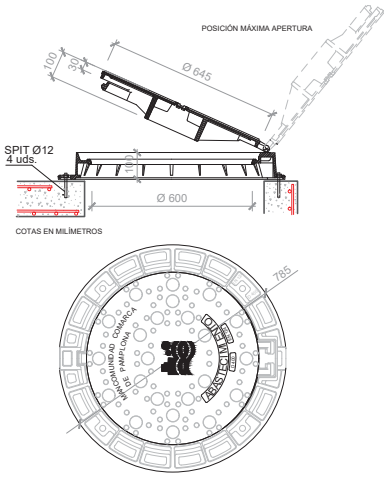

(TAPA TIPO REXESS O SIMILAR ACEPTADA POR SCPSA)

- COTA DE PASO: Ø 600 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
- CLASE: D400 (400KN)
- TAPA: ARTICULADA MEDIANTE CHARNELA, CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90º CONTRA CIERRE ACCIDENTAL, EXTRAÍBLE EN POSICIÓN VERTICAL (VENTILADA PARA LOS CASOS DE VENTOSAS).
- MARCO: CIRCULAR
- DISPOSITIVO DE CIERRE: MEDIANTE APÉNDICE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL SOLIDARIO A LA TAPA.
- INSONORIZACIÓN: MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA EN EL MARCO
- FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS O HERRAJES Ø 12 CON TACO DE ANCLAJE MECÁNICO Y DOBLE TUERCA PARA NIVELACIÓN, SEGÚN DETALLE 1.
- INSCRIPCIÓN: MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA Y ANAGRAMA. (ABASTECIMIENTO).
- NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN 124: 1995.
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO


UBICACIÓN:
- CALZADAS CON TRÁFICO RODADO
- ZONAS DE ACERA REMONTABLES POR EL TRÁFICO RODADO.
- ZONAS VERDES.

INSTALACIÓN: EJE BISAGRA - CIERRE *EN EL SENTIDO DEL TRÁFICO RODADO*

EL MARCO IRÁ APOYADO EN TODO SU PERÍMETRO SOBRE LOS MUROS DE ARQUETA, MÓDULO CÓNICO DE POZO O LOSA.

LA JUNTA ELÁSTICA Y LOS CAJEADOS DE BISAGRA Y CIERRE DEBEN QUEDAR LIBRES DE MORTERO, HORMIGÓN, ETC...

DETALLE 1 (FIJACIÓN DEL MARCO DE LAS TAPAS TIPO REXEL Y PAMREX). E=1/5

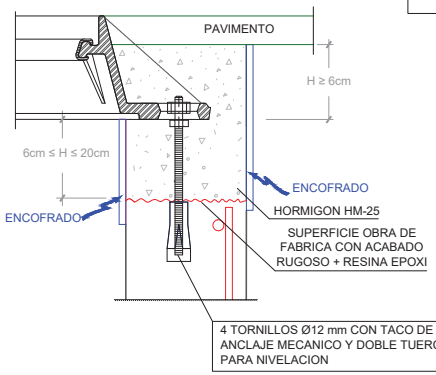


CUADRO DE HORMIGONES

ELEMENTO	TIPO	CEMENTO	ACERO (UNE-EN-10080)	COEF. MAYORACIÓN DE ACCIONES	FORMA DE ELABORACIÓN	MÁXIMA RELACIÓN A/C	CONTROL EJECUCIÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL
DEPÓSITOS; LOSAS, MUROS, SOLERAS (CLORUROS)	HA-30/B/20/IIV+Qb	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Intensa	5.00
ARQUETAS DE REGISTRO DE ABASTECIMIENTO ARMADAS	HA-25/B/20/IIa	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Normal	4.50
ARQUETAS DE REGISTRO DE ABASTECIMIENTO SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
CONTRARRESTOS ARMADOS	HA-25/B/20/IIa	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Normal	4.50
CONTRARRESTOS SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES	HNE-15/P/20	Según usos recomendados RC-08	-	-	Central	0.65	Normal	-
PRESOLERAS LIMPIEZA DE CIMENTACIONES	HL-150/P/40	Según usos recomendados RC-08	-	-		0.65	Normal	-


ELEMENTO	TIPO	CEMENTO	FORMA DE ELABORACIÓN	CONSISTENCIA	CANTIDAD CEMENTO	MÁXIMA RELACIÓN A/C	CONTROL EJECUCIÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL
BAJO SOLERAS DE DEPÓSITOS	POROSO	Según usos recomendados RC-08	Sin árido fino d<20	Seca	≥250 Kg/m³	0.65	Normal	-

ARQUETA DE REGISTRO PARA NUDOS. E =1/20


SECCIÓN

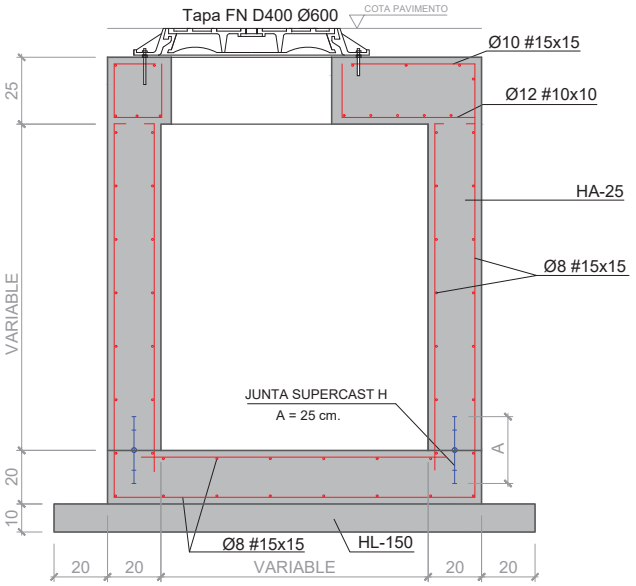

PLANTA

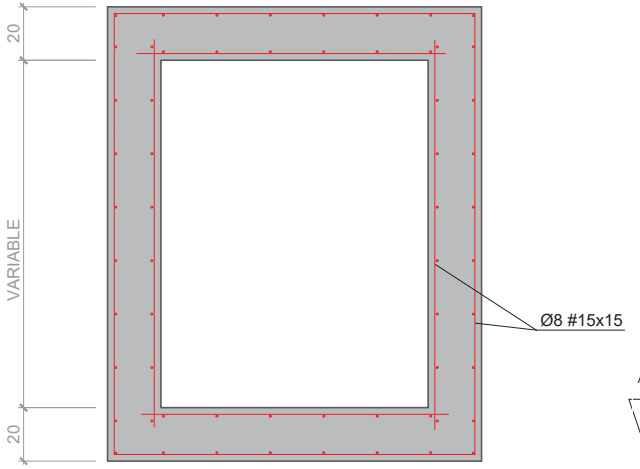


DETALLE DE SELLADO DE TUBERÍAS EN ARQUETAS DE REGISTRO.




DETALLE DE ARMADURAS EN ARQUETAS TIPO DE NUDOS E =1/20


SECCIÓN PARCIAL VERTICAL VISTA EN ALZADO (centímetros)

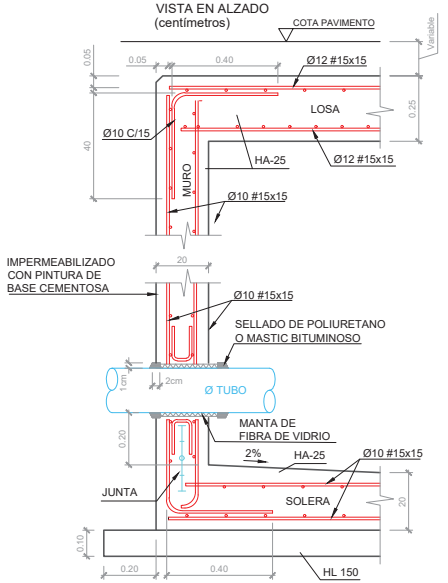

SECCIÓN PARCIAL HORIZONTAL VISTA EN PLANTA (ENCUENTRO DE MUROS) (centímetros)



PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO. E=1/10

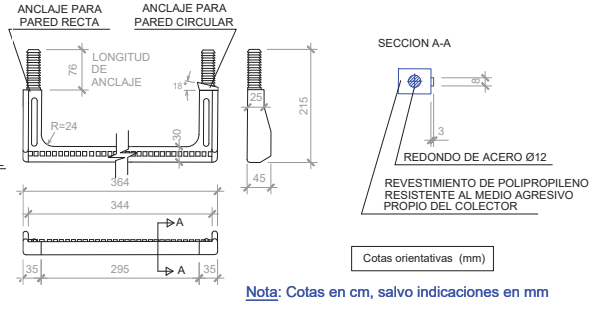


Cotas orientativas (mm)

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm


Mancomunidad Comarca de Pamplona Mankomunitatea / Servicios de la Comarca de Pamplona Zerbitzuak	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planoabastecimientodetallesyseccion.tipo	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 9 / Nº DE HOJA: 2 de 4

ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS DN < 50 CON CONTADOR EXTERIOR (DN 13 - 20 mm)
E=1/10

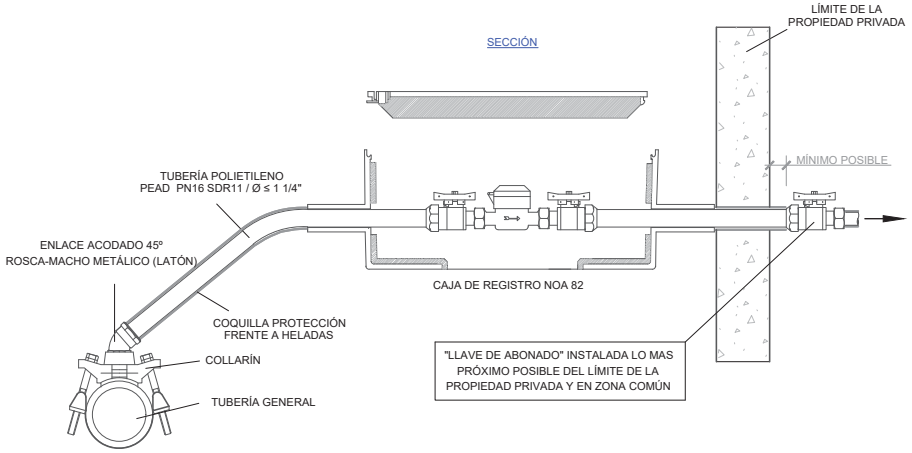


ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS D ≤ 63 CON CONTADOR EXTERIOR DN = 50-40-32-25 mm CON RACORES.
E=1/10

SECCIÓN

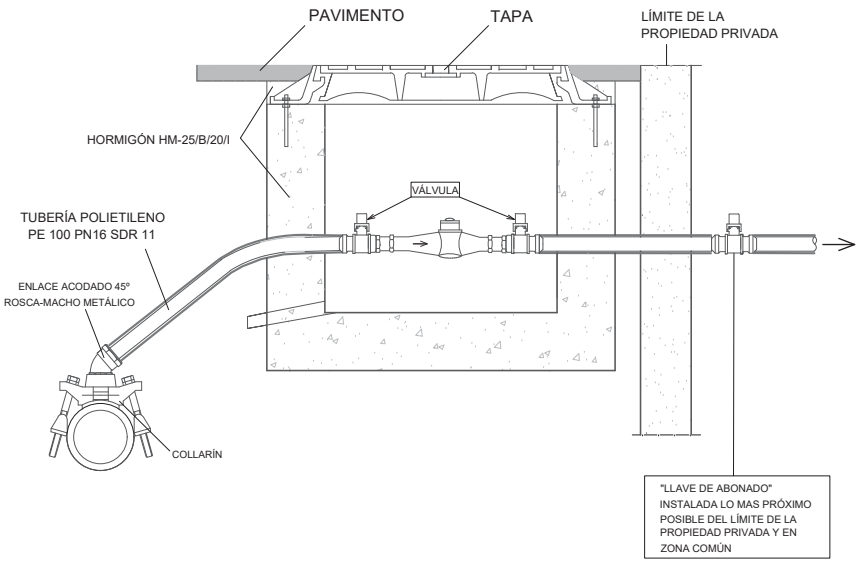


ACOMETIDA SÓLO DE SERVICIOS DN < 50 CON CONTADOR INTERIOR.
E=1/33

SECCIÓN

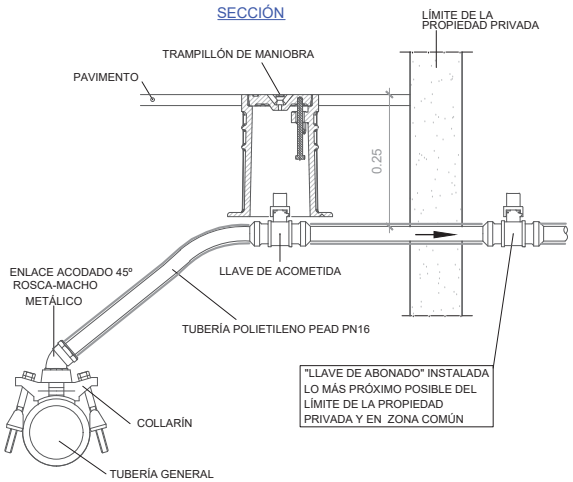

PLANTA

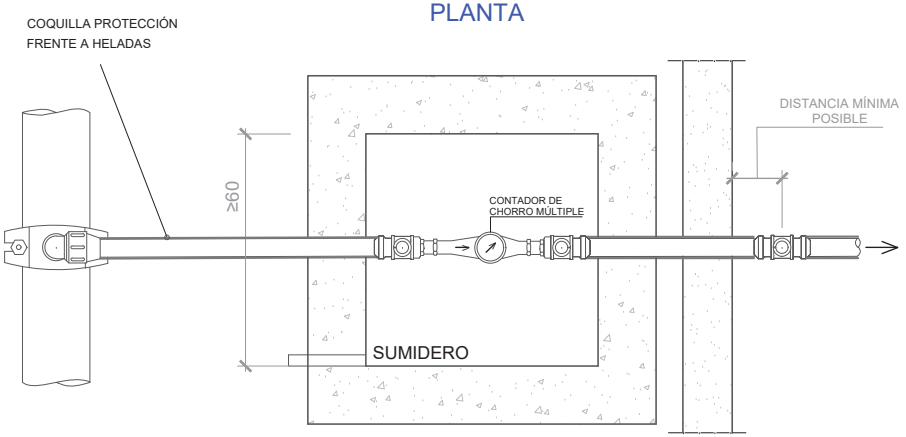

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona · Servicios de la Comarca de Pamplona	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosabastecimientodetallesyseccionTipo	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 9 / Nº DE HOJA: 3 de 4

MACIZOS DE ANCLAJE

* Hipótesis de cálculo:

Condiciones mecánicas del terreno: cohesión c=0 ; ángulo rozamiento interno θ=23º ; peso específico=1,8 tn/m³
Hormigón: peso específico HA=2,5 tn/m³, HM=2,2 tn/m³
Estado límite de cálculo: prueba de presión, tubería y macizo sin relleno de tierras de cobertura. A considerar:
-Empuje hidráulico para presión de prueba (STP)=12 bar
-Empuje activo del terreno supuesta una altura de tierras sobre la tubería de 0,80m, distribución uniforme
-Coeficiente de Rozamiento hormigón-terreno (⅔ tg θ)
-Coeficiente de seguridad =1

ELEMENTOS HORIZONTALES PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR HASTA DN250

CONTRARRESTO HORIZONTAL

Presión de prueba (STP)=12 kp/cm2 - Cotas en cm

DN	CODO 11,25º					CODO 22,5º					CODO 45º					CODO 90º					TE 90º				
	H1	H2	L	A	B	H1	H2	L	A	B	H1	H2	L	A	B	H1	H2	L	A	B	H1	H2	L	A	B
80	30	30	30	15	25	30	30	30	20	45	30	30	50	20	90	30	30	50	25	150	30	30	50	20	100
100	30	30	40	15	30	30	30	50	20	60	30	30	60	25	110	30	30	90	30	210	30	30	60	25	145
150	30	30	90	20	55	30	30	100	25	100	30	30	120	30	200	30	40	140	35	315	30	30	120	30	270
200	30	30	140	20	75	30	30	160	25	145	30	30	170	35	275	30	50	190	45	425	30	30	170	35	375
250	50	50	140	20	75	50	50	160	25	140	50	50	170	40	280	60	60	180	60	420	50	50	170	45	385

ELEMENTOS VERTICALES PARA TUBERÍA DE FUNDICIÓN NODULAR HASTA DN250

CONTRARRESTO VERTICAL CÓNCAVO

Presión de prueba (STP)=12 kp/cm2 - Cotas en cm

DN	CODO 11,25º			CODO 22,5º			CODO 45º			CODO 90º		
	H	B	L	H	B	L	H	B	L	H	B	L
80	30	50	50	30	50	50	40	50	50	40	60	60
100	30	50	50	30	50	50	40	60	60	40	80	80
150	30	50	50	30	50	50	40	60	60	40	80	80
200	30	50	50	30	60	60	40	60	60	50	100	100
250	30	50	50	30	60	60	50	80	80	60	100	120

CONTRARRESTO VERTICAL CONVEXO


Presión de prueba (STP)=12 kp/cm2 - Cotas en cm


DN	CODO 11,25º			CODO 22,5º			CODO 45º			CODO 90º		
	H	B	L	H	B	L	H	B	L	H	B	L
80	30	60	30	30	60	50	30	60	80	30	60	100
100	50	60	30	50	60	50	50	60	80	50	60	110
150	60	60	50	80	60	80	80	60	120	80	80	140
200	60	80	80	80	80	100	80	100	120	100	100	150
250	80	80	80	80	80	140	100	100	150	120	150	150


CUADRO DE HORMIGONES

ELEMENTO	TIPO	CEMENTO	ACERO (UNE-EN-10080)	COEF. MAYORACIÓN DE ACCIONES	FORMA DE ELABORACIÓN	MÁXIMA RELACIÓN A/C	CONTROL EJECUCIÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL
DEPÓSITOS; LOSAS, MUROS, SOLERAS (CLORUROS)	HA-30/B/20/IV+Qb	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Intensa	5.00
ARQUETAS DE REGISTRO DE ABASTECIMIENTO ARMADAS	HA-25/B/20/IIa	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Normal	4.50
ARQUETAS DE REGISTRO DE ABASTECIMIENTO SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
CONTRARRESTOS ARMADOS	HA-25/B/20/IIa	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Normal	4.50
CONTRARRESTOS SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES	HNE-15/P/20	Según usos recomendados RC-08	-	-	Central	0.65	Normal	-
PRESOLERAS LIMPIEZA DE CIMENTACIONES	HL-150/P/40	Según usos recomendados RC-08	-	-		0.65	Normal	-


ELEMENTO	TIPO	CEMENTO	FORMA DE ELABORACIÓN	CONSISTENCIA	CANTIDAD CEMENTO	MÁXIMA RELACIÓN A/C	CONTROL EJECUCIÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL
BAJO SOLERAS DE DEPÓSITOS	POROSO	Según usos recomendados RC-08	Sin árido fino d=20	Seca	≥250 Kg/m³	0.65	Normal	-






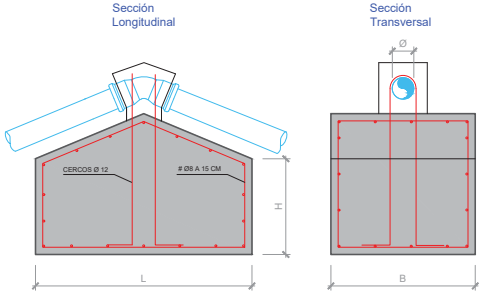

DETALLE DE ZANJA TIPO EN VIALES Y ACERAS E=1/50

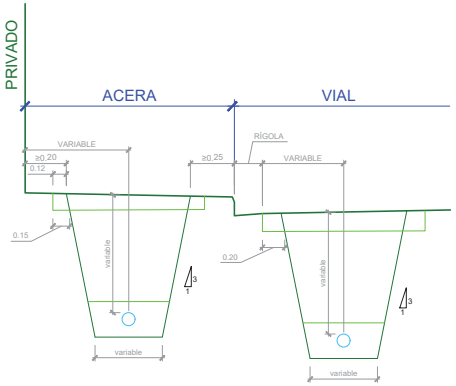


ZANJA TIPO ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO. E=1/20

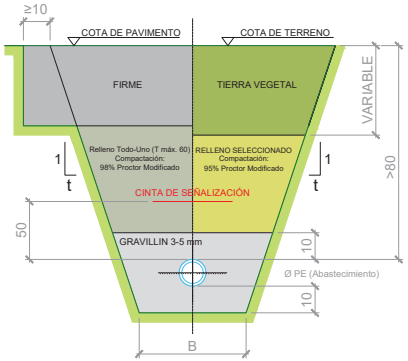

Talud (t) = ⅓ (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = ½ (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)

ABASTECIMIENTO		
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material
32 a 63	40	PE

ZANJA TIPO CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO. E=1/20

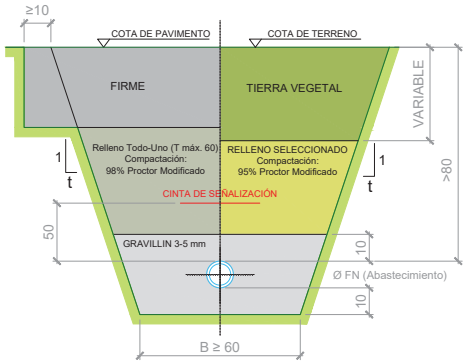

Talud (t) = ⅓ (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = ½ (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)

ABASTECIMIENTO		
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material
80 a 150	60	FN
150 a 250	80	FN
300	100	FN


* NOTA: Las dimensiones definidas para los macizos corresponden con las hipótesis anteriormente expresadas. A la vista de las condiciones reales de ejecución y presión de prueba, la D.F., previa justificación, podrá redefinir los mismos.

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona Mankomunitatea Iruñerria
Servicios de la Comarca de Pamplona Iruñerriko Zerbitzuak

TÍTULO DEL PROYECTO	AUTOR DEL PROYECTO	DIRECTOR DEL PROYECTO	DIBUJADO	CODIG. ARCHIVO	FECHA	ESCALA	TÍTULO DEL PLANO	Nº DE PLANO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	CODIGO DWG 00001190 planoabastecimientodetallesyseccionTipo		JUNIO 2026	A3 = INDICADAS	ABASTECIMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	9 Nº DE HOJA 4 de 4

POZO DE REGISTRO DE HORMIGÓN ARMADO PREFABRICADO . E=1/20

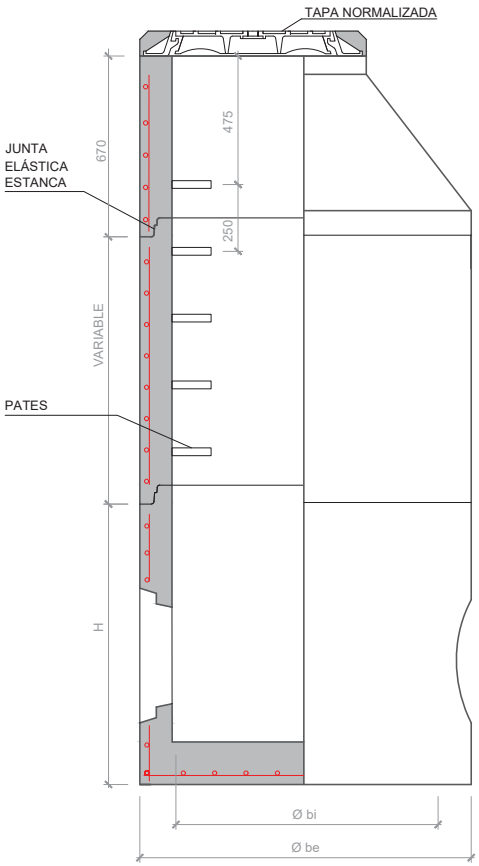



Pozo representado:
Øbi = 1000 mm.
Anillo de recrecido. Altura = 1000 mm.


Cotas en mm

COTAS ORIENTATIVAS (mm)				
Ø bi	1000	1200		1500
Ø be	1240	1520	1600	2100
H	1025	1200	1355	1700
e	120	160	200	300


MÓDULO BASE . E=1/20

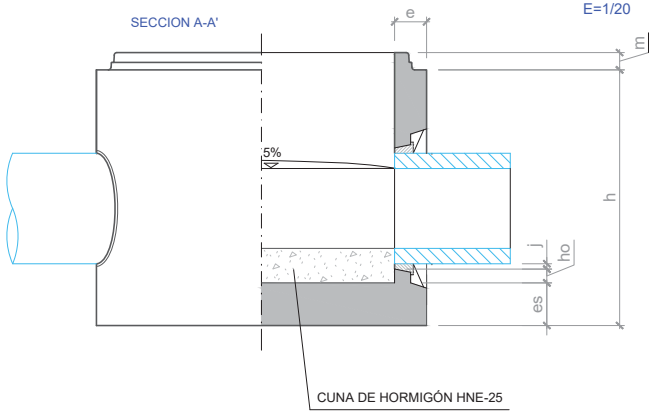

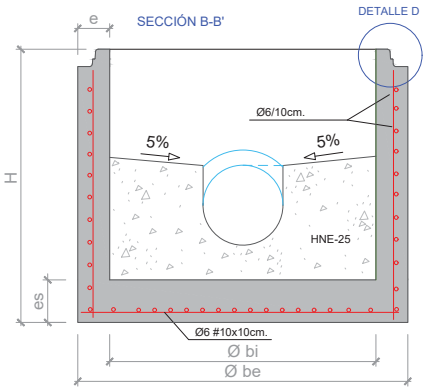


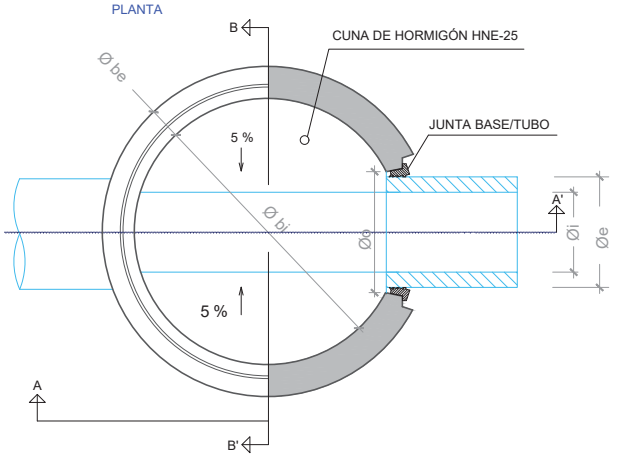

DETALLES DE JUNTA

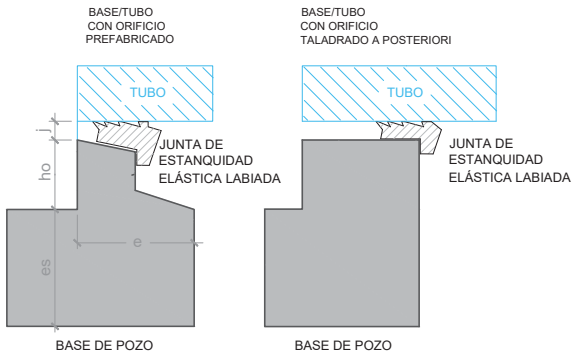

DETALLE - D (Cotas en mm)

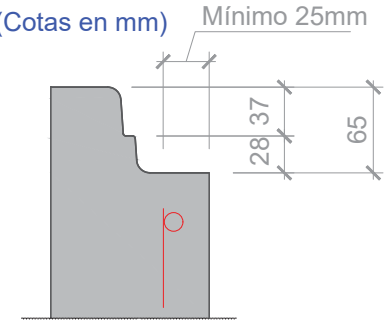



	POZO	TUBO	COTAS ORIENTATIVAS EN BASES DE REGISTROS PREFABRICADOS (mm)								
Ø bi	INTERIOR		1000						1200		1500
Ø be	EXTERIOR		1240						1520	1600	2100
Ø i		INTERIOR	238	300	380	300H	400H	476	500H	600H	800H
Ø e		EXTERIOR	PVC 250	PVC 315	PVC 400	415	525	PVC 500	645	750	984
Ø o	ORIFICIO		290	355	440	455	565	540	685	790	1020
H	TOTAL		1025						1200	1355	1700
h	UTIL		960						1135	1290	1650
m	MACHO		65						65	65	65
e	ALZADOS		120						160	200	300
es	SOLERA		120	120	120	120	120	120	165	200	300
ho			177	145	92	55	40	52	105	60	210
j	JUNTA		20					20			20

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm


Mancomunidad Comarca de Pamplona / Mankomunitatea Iruñerria · Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. / Iruñerriko Zerbitzuak S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientodetalleseyeccionestipo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 10 / Nº DE HOJA: 1 de 5

MÓDULO CÓNICO.
E=1/20

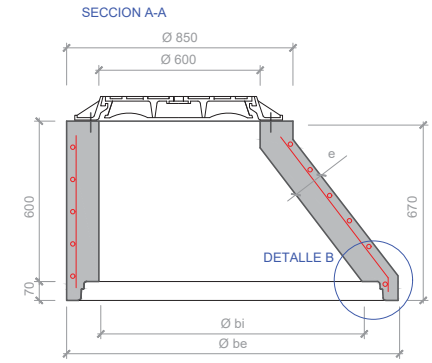


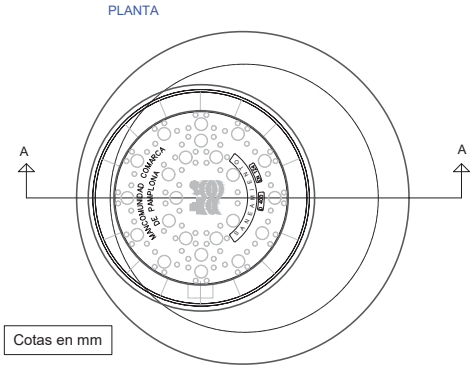



COTAS ORIENTATIVAS (mm)			
Ø bi	1000	1200	1500
Ø be	1240	1520	2100
e	120	160	300




MÓDULO CILÍNDRICO.
E=1/20

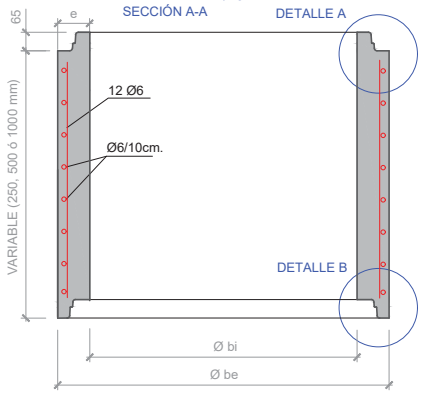

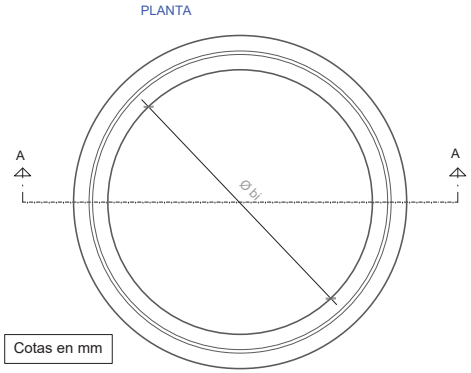








COTAS ORIENTATIVAS (mm)			
Ø bi	1000	1200	1500
Ø be	1240	1520	2100
e	120	160	300

LOSA DE CUBIERTA PARA POZO DE Ø1000mm.
E=1/20

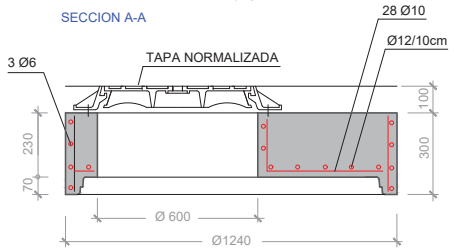


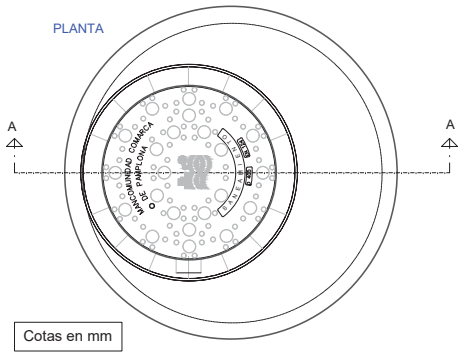

DETALLE DE LA JUNTA ENTRE MÓDULOS
E=1/10




DETALLE DE REMATE EN CAMPO DE TAPA DE REGISTRO
E=1/20




Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Pamplonako Komarkako Mankomunitatea	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientodetalleseseccionttipo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 10 / Nº DE HOJA: 2 de 6

POZO DE RESALTO.
E=1/20

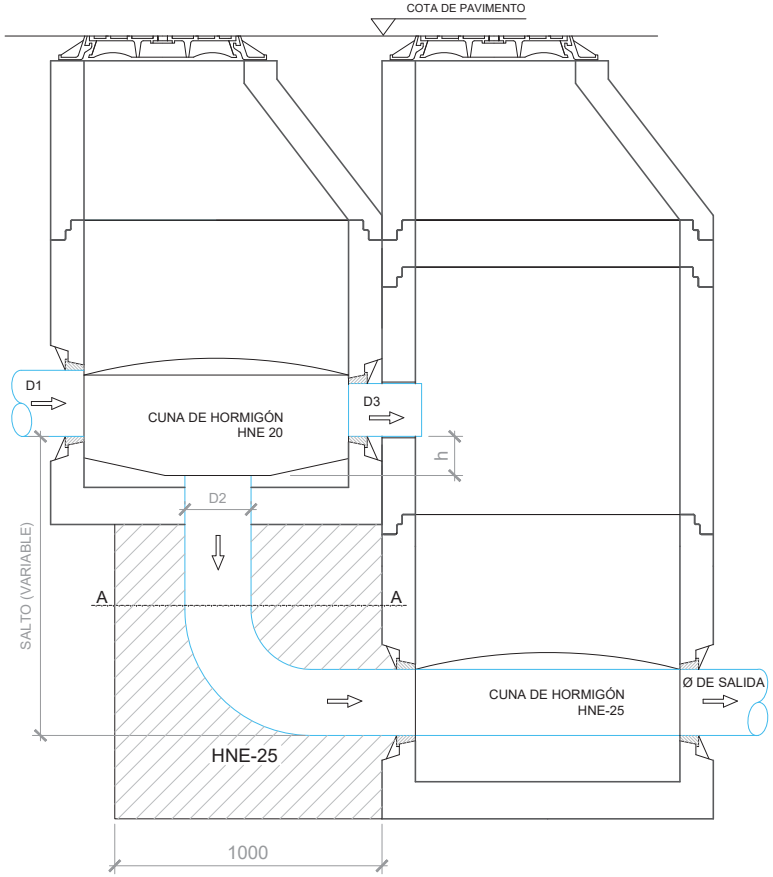



SECCIÓN A-A


RELACIÓN DE DIÁMETROS Y COTAS (mm)				
D1(Ø)	D2(Ø)	D3(Ø)	h	B
160 - 250	200	200	100 -150	800
300 - 500	300	300 - 500	200 - 300	1200
600	400	600	350	1500

Cotas en mm

TAPA DE REGISTRO ABATIBLE. TAPA Y MARCO CIRCULARES. (MARCADO SANEAMIENTO O PLUVIALES). E=1/20

(TAPA TIPO REXESS O SIMILAR ACEPTADA POR SCPSA)

- COTA DE PASO: Ø 600 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
- CLASE: D400 (400KN)
- TAPA: ARTICULADA MEDIANTE CHARNELA, CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90º CONTRA CIERRE ACCIDENTAL, EXTRAÍBLE EN POSICIÓN VERTICAL (VENTILADA PARA LOS CASOS DE VENTOSAS).
- MARCO: CIRCULAR
- DISPOSITIVO DE CIERRE: MEDIANTE APÉNDICE ELÁSTICO DE FUNDICIÓN DÚCTIL SOLIDARIO A LA TAPA.
- INSONORIZACIÓN: MEDIANTE JUNTA ELÁSTICA EN EL MARCO
- FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS O HERRAJES Ø 12 CON TACO DE ANCLAJE MECÁNICO Y DOBLE TUERCA PARA NIVELACIÓN, SEGÚN DETALLE 1.
- INSCRIPCION: MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA Y ANAGRAMA. (SANEAMIENTO O PLUVIALES).
- NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN 124: 1995.
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO

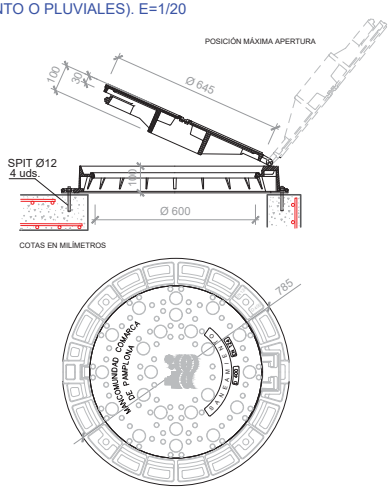


UBICACIÓN:
- CALZADAS CON TRÁFICO RODADO
- ZONAS DE ACERA REMONTABLES POR EL TRÁFICO RODADO.
- ZONAS VERDES.

INSTALACIÓN: EJE BISAGRA - CIERRE *EN EL SENTIDO DEL TRÁFICO RODADO*

EL MARCO IRÁ APOYADO EN TODO SU PERÍMETRO SOBRE LOS MUROS DE ARQUETA, MÓDULO CÓNICO DE POZO O LOSA.

LA JUNTA ELÁSTICA Y LOS CAJEADOS DE BISAGRA Y CIERRE DEBEN QUEDAR LIBRES DE MORTERO, HORMIGÓN, ETC...

DETALLE 1.
E=1/5

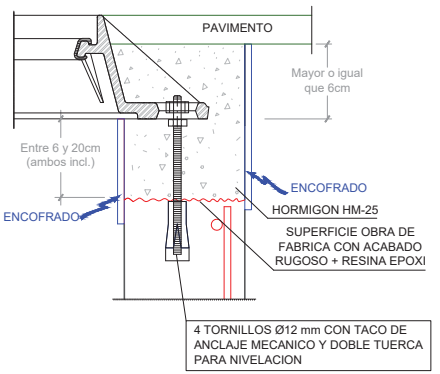


TAPA DE REGISTRO ABATIBLE. TRÁFICO INTENSO. TAPA Y MARCO CIRCULARES. (MARCADO SANEAMIENTO O PLUVIALES). E=1/20

(TAPA TIPO PAMREX O SIMILAR ACEPTADA POR SCPSA)

- COTA DE PASO: Ø 610 mm.
- MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
- CLASE: D400 (400KN)
- TAPA: ARTICULADA MEDIANTE CHARNELA, CON BLOQUEO DE SEGURIDAD A 90º CONTRA CIERRE ACCIDENTAL, EXTRAÍBLE EN POSICIÓN VERTICAL (VENTILADA PARA LOS CASOS DE VENTOSAS).
- MARCO: CIRCULAR
- INSONORIZACIÓN: MEDIANTE JUNTA ELASTOMÉRICA EN EL MARCO
- FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE 4 SPITS O HERRAJES Ø 12 CON TACO DE ANCLAJE MECÁNICO Y DOBLE TUERCA PARA NIVELACIÓN, SEGÚN DETALLE 1.
- INSCRIPCIÓN: MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA Y ANAGRAMA. (SANEAMIENTO O PLUVIALES).

- NORMA DE APLICACIÓN: UNE-EN 124: 1995.
- MARCADO: S/ EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO

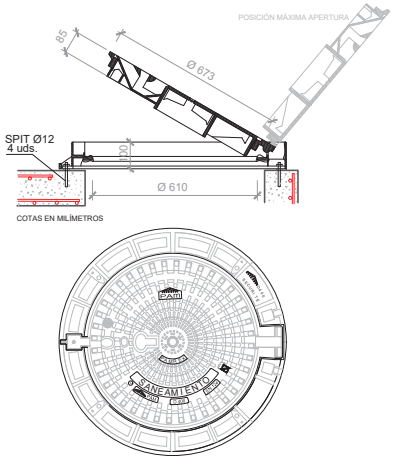


UBICACIÓN:
-CALZADAS CON TRÁFICO RODADO INTENSO

INSTALACIÓN: EJE BISAGRA - CIERRE *EN EL SENTIDO DEL TRÁFICO RODADO*

EL MARCO IRÁ APOYADO EN TODO SU PERÍMETRO SOBRE LOS MUROS DE ARQUETA, MÓDULO CÓNICO DE POZO O LOSA.

LA JUNTA ELASTOMÉRICA Y LOS CAJEADOS DE BISAGRA Y CIERRE DEBEN QUEDAR LIBRES DE MORTERO, HORMIGÓN, ETC...


PATE DE POLIPROPILENO CON VARILLA DE ACERO. E=1/10

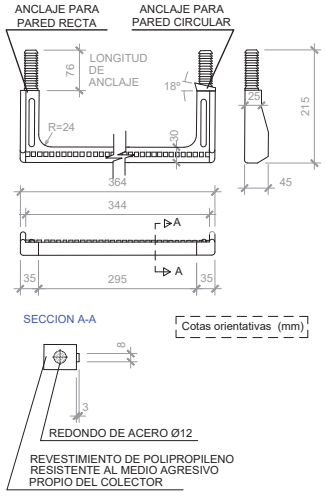


Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona Udalerria Mankomunitatea / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. Udalerria Zerbitzuak S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientodetalleysecciontipo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 10 / Nº DE HOJA: 3 de 6


ARQUETA DE ARRANQUE NO SIFÓNICA PARA Ø >250mm. E=1/20

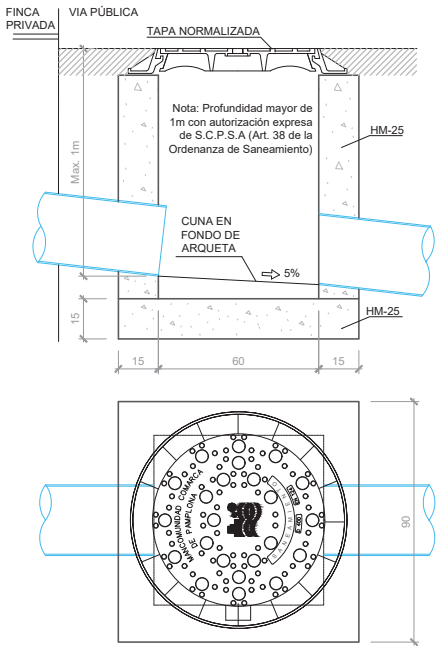

ARQUETA DE ARRANQUE NO SIFÓNICA PARA Ø≤250. E=1/20

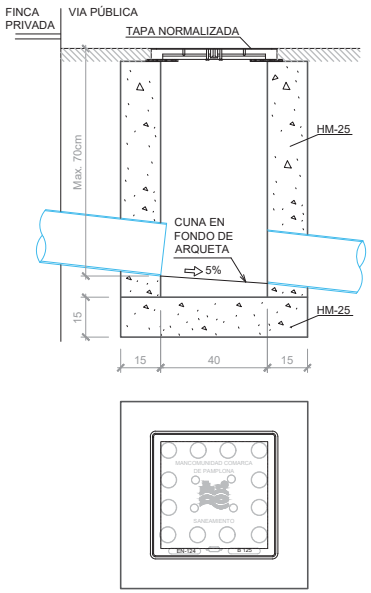

SUMIDERO NO SIFÓNICO IN-SITU. E=1/20

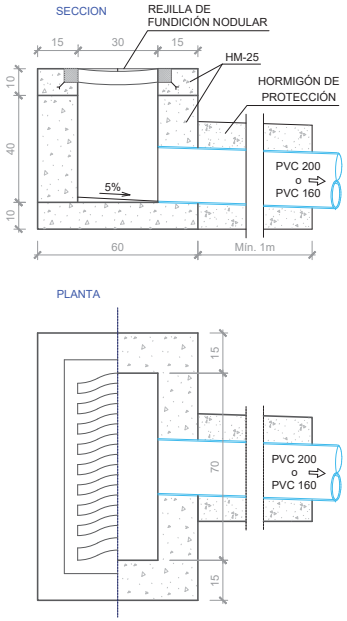

TAPA DE REGISTRO HIDRÁULICA. TAPA CUADRADA Y MARCO CUADRADO. E=1/20

TAPA TIPO AKSESS O SIMILAR ACEPTADA POR SCPSA

-COTA DE PASOS: 400x400 Y 600x600mm
-MATERIAL: FUNDICIÓN NODULAR
-CLASE: B125 (125 KN)
-TAPA: ARTICULADA MEDIANTE RANURA EN MARCO, CON TOPES DE POSICIONAMIENTO Y EXTRAIBLE.
-CIERRE HIDRÁULICO: INSERCIÓN DE PERÍMETRO DE LA TAPA EN CAJERA DE MARCO
-FIJACIÓN A LA ARQUETA: MEDIANTE PATILLAS EN MARCO
-NORMA DE APLICACION: UNE-EN 124: 1995.
-MARCADO: S/ UNE EN-124 CON MARCA DE ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO
-REVESTIMIENTO: BARNIZ DE RESINAS EPOXI EN COLOR NEGRO
-INSCRIPCIÓN: MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA Y ANAGRAMA. (SANEAMIENTO O PLUVIALES).


UBICACIÓN:

- ZONAS DE ACERA NO REMONTABLES POR EL TRÁFICO RODADO


EL MARCO IRÁ APOYADO EN TODO SU PERÍMETRO SOBRE LOS MUROS DE LA ARQUETA.

DIMENSIONES (mm).

EXTREMO MARCO A x A	PASO O x O	ALTURA DE MARCO H
510x510	400x400	38
710x710	600x600	38




ENTRONQUE A COLECTOR DE HORMIGÓN MEDIANTE JUNTA DE ELASTÓMERO




TUBERÍA COLECTOR: HORMIGÓN
TUBERÍA ACOMETIDA: PVC
TALADRO COLECTOR: CON BROCA DE GRAN DIÁMETRO
JUNTA: JUNTA DE ESTANQUIDAD ELÁSTICA LABIADA S/ UNE-EN 681-1

ENTRONQUE A COLECTOR DE PVC MEDIANTE PIEZA ESPECIAL DE UNIÓN




TALADRO COLECTOR: CON BROCA DE GRAN DIÁMETRO
PIEZA ESPECIAL: PVC CLICK
UNIÓN A ACOMETIDA: JUNTA ELASTÓMERO S/ UNE-EN 681-1

ENTRONQUE A POZO CON JUNTA ELÁSTICA / ESTANCA. E=1/20

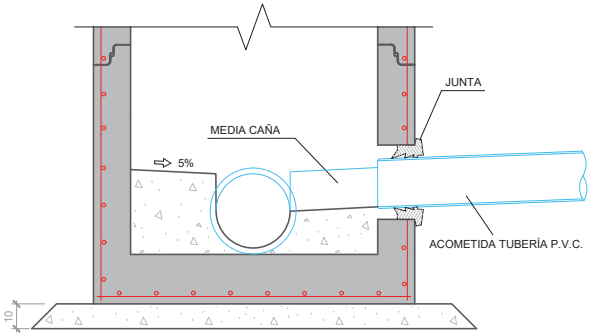

ACOMETIDA: TUBERÍA PVC COLOR GRIS
ORIFICIO: PERFORACIÓN DE PARED DE POZO CON BROCA DE GRAN DIÁMETRO
JUNTA: JUNTA ESTANQUIDAD ELÁSTICA LABIADA S/ UNE-EN 681-1

ENTRONQUE A POZO CON MANGUITO PASAMUROS. E=1/20

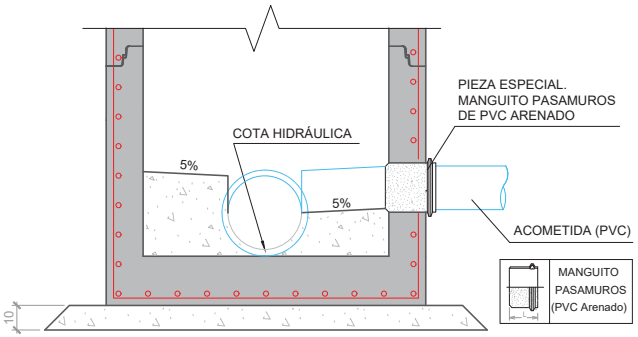

DIAMETRO TUBERIA Ø(mm)	DIMENSIONES L(mm)
160	173
200	183
250	178
315	200
400	230
500	187

ACOMETIDA: TUBERÍA PVC COLOR GRIS
ORIFICIO: PERFORACIÓN DE PARED DE POZO CON BROCA DE GRAN DIÁMETRO
PIEZA ESPECIAL: MANGUITO PASAMUROS DE PVC ARENADO


CUADRO DE HORMIGONES


ELEMENTO	TIPO	CEMENTO	ACERO (UNE-EN-10080)	COEF. MAYORACIÓN DE ACCIONES	FORMA DE ELABORACIÓN	MÁXIMA RELACIÓN A/C	CONTROL EJECUCIÓN	RECUBRIMIENTO NOMINAL
ARQUETAS Y REGISTROS DE SANEAMIENTO ARMADOS, TANQUE DEPURADORAS, FOSAS SÉPTICAS	HA-35/B/20/IV+Qc	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.45	Intensa	5.00
ARQUETAS DE REGISTRO DE SANEAMIENTO SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
CONTRARRESTOS ARMADOS	HA-25/B/20/IIa	Según usos recomendados RC-08	B 500 S	1.5	Central	0.50	Normal	4.50
CONTRARRESTOS SIN ARMAR	HM-25/B/20/I	Según usos recomendados RC-08	-	1.5	Central	0.50	Normal	-
CUNAS/MEDIAS CAÑAS	HNE-25/B/20	Según usos recomendados RC-08	-	-	Central	0.65	Normal	-
PROTECCIÓN DE CONDUCCIONES	HNE-15/P/20	Según usos recomendados RC-08	-	-	Central	0.65	Normal	-
PRESOLERAS LIMPIEZA DE CIMENTACIONES	HL-150/P/40	Según usos recomendados RC-08	-	-		0.65	Normal	-

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm


Mancomunidad Comarca de Pamplona Mankomunitatea / Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. Zerbitzuak S.A.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientodetalleseseccionestipo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 10 / Nº DE HOJA: 4 de 6

DETALLE DE BASE
IN-SITU. E=1/5

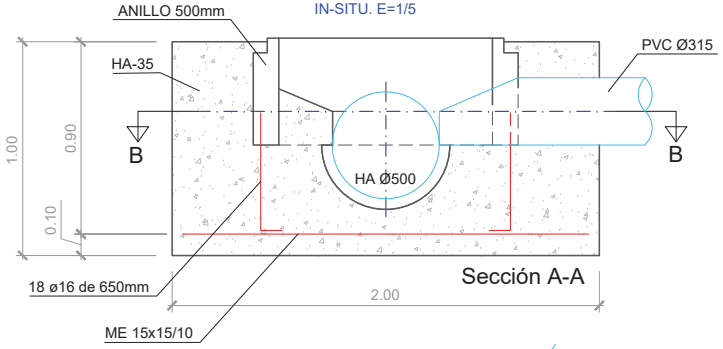

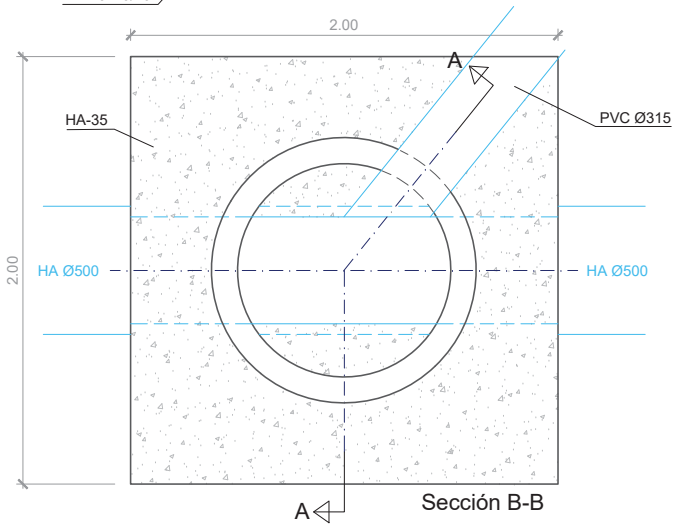


ZANJA TIPO ENTIBADA.
E=1/20

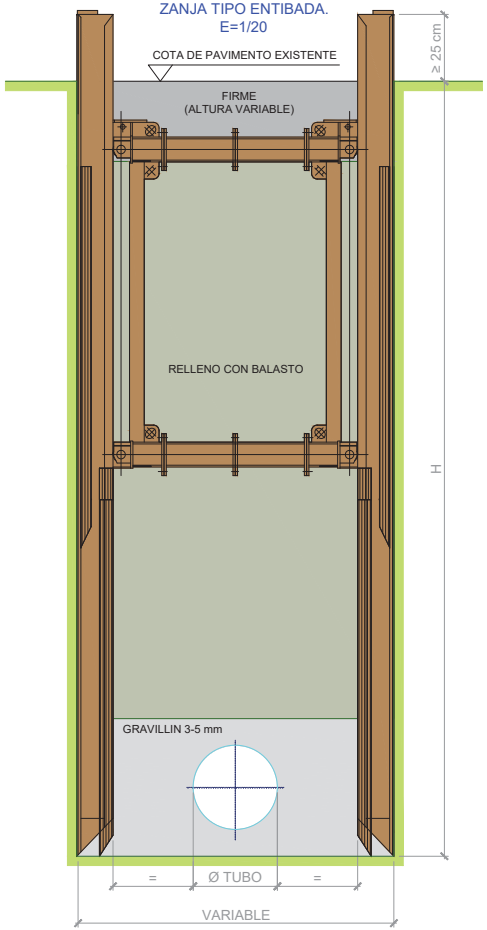


DETALLE DE APOYOS EN ZANJA PARA TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA (HM) U HORMIGÓN ARMADO (HA)

APOYO DE HORMIGÓN A 120º
E=1/20

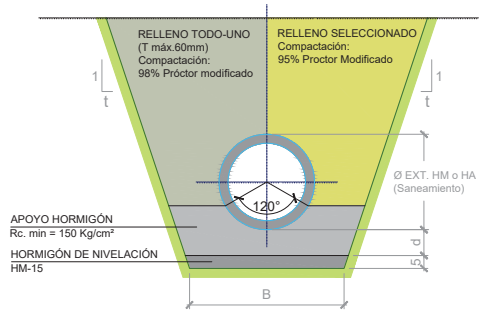


APOYO DE HORMIGÓN A 90º
E=1/20

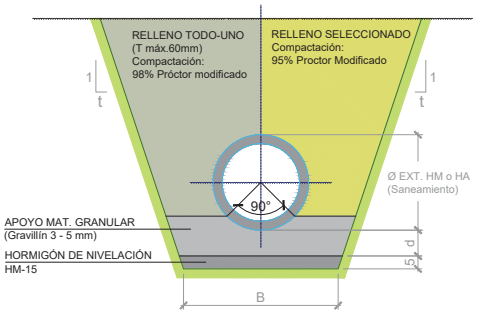

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona / Servicios de la Comarca de Pamplona s.a.	TÍTULO DEL PROYECTO: 00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA	AUTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIRECTOR DEL PROYECTO: Agustina Rivera Martin, Ingeniero Industrial	DIBUJADO / CODIG. ARCHIVO / CODIGO DWG: 00001190 planosaneamientodetalleseseccionttipo.dwg	FECHA: JUNIO 2026	ESCALA: A3 = INDICADAS	TÍTULO DEL PLANO: SANEAMIENTO. DETALLES Y SECCIONES TIPO.	Nº DE PLANO: 10 / Nº DE HOJA: 5 de 6

SECCION TIPO DE ZANJA CONJUNTA. SANEAMIENTO (FECALES Y PLUVIALES) Y ABASTECIMIENTO
E=1/20

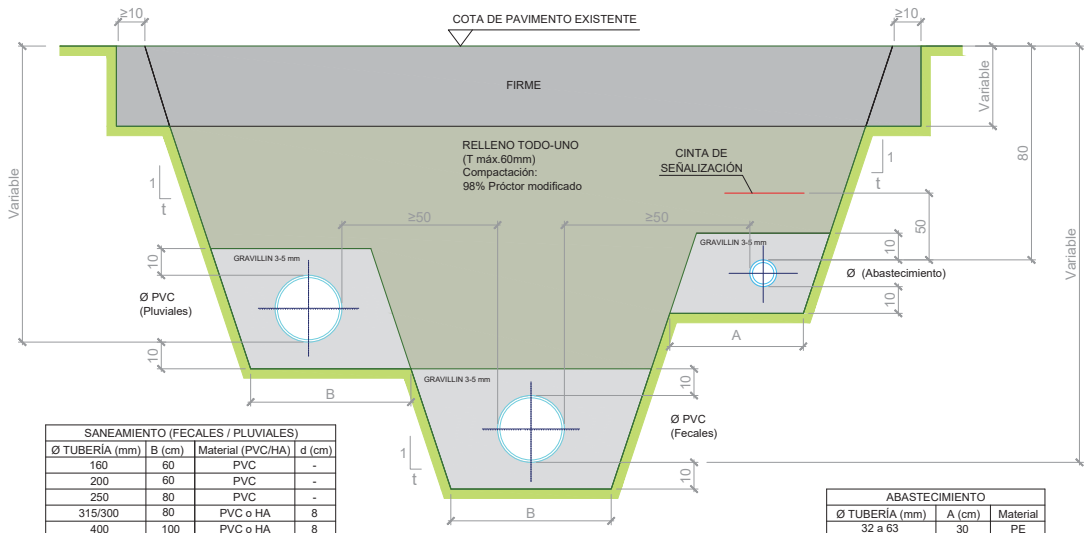


SANEAMIENTO (FECALES / PLUVIALES)			
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material (PVC/HA)	d (cm)
160	60	PVC	-
200	60	PVC	-
250	80	PVC	-
315/300	80	PVC o HA	8
400	100	PVC o HA	8
500	100	PVC o HA	8
600	120	HA	8
800	140	HA	10

ABASTECIMIENTO		
Ø TUBERÍA (mm)	A (cm)	Material
32 a 63	30	PE
80 a 150	40	FN
150 a 250	60	FN
300	80	FN

Talud (t) = 1/3 (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = 1/2 (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)


ZANJA TIPO CONJUNTA PLUVIALES Y FECALES
E=1/20

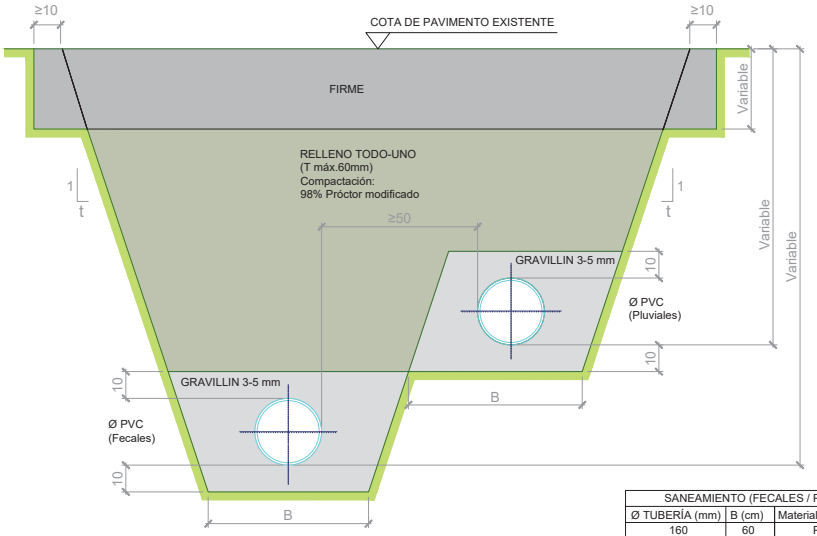

SANEAMIENTO (FECALES / PLUVIALES)			
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material (PVC/HA)	d (cm)
160	60	PVC	-
200	60	PVC	-
250	80	PVC	-
315/300	80	PVC o HA	8
400	100	PVC o HA	8
500	100	PVC o HA	8
600	120	HA	8
800	140	HA	10

Talud (t) = 1/3 (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = 1/2 (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)

ZANJA TIPO CONJUNTA SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
E=1/20

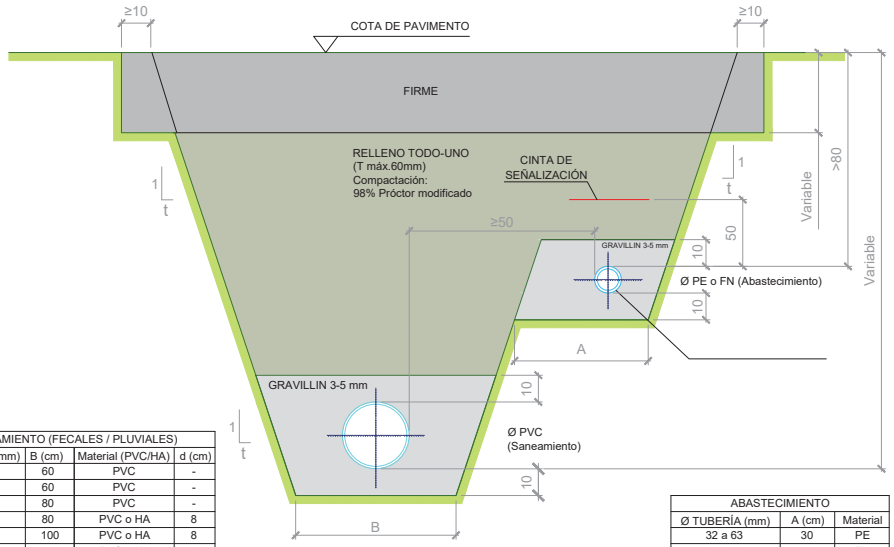


SANEAMIENTO (FECALES / PLUVIALES)			
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material (PVC/HA)	d (cm)
160	60	PVC	-
200	60	PVC	-
250	80	PVC	-
315/300	80	PVC o HA	8
400	100	PVC o HA	8
500	100	PVC o HA	8
600	120	HA	8
800	140	HA	10

ABASTECIMIENTO		
Ø TUBERÍA (mm)	A (cm)	Material
32 a 63	30	PE
80 a 150	40	FN
150 a 250	60	FN
300	80	FN

Talud (t) = 1/3 (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = 1/2 (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)

ZANJA TIPO SANEAMIENTO.
E=1/20

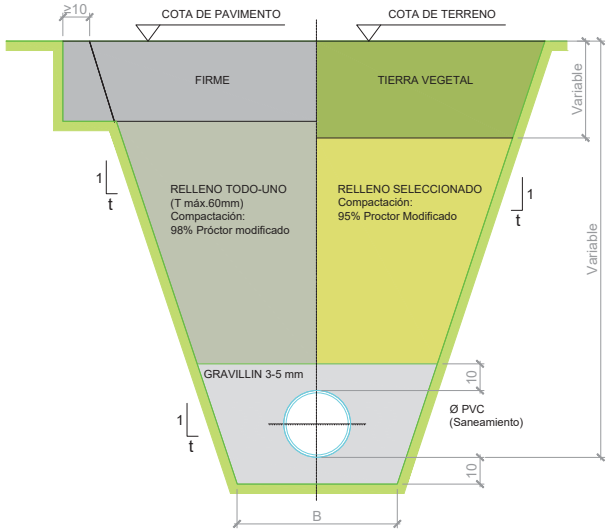

SANEAMIENTO (FECALES / PLUVIALES)			
Ø TUBERÍA (mm)	B (cm)	Material (PVC/HA)	d (cm)
160	60	PVC	-
200	60	PVC	-
250	80	PVC	-
315/300	80	PVC o HA	8
400	100	PVC o HA	8
500	100	PVC o HA	8
600	120	HA	8
800	140	HA	10

Talud (t) = 1/3 (Profundidad de excavación ≤3m)
Talud (t) = 1/2 (Profundidad de excavación >3m)
Talud (t) = 1/10 (Excavación en roca)

Nota: Cotas en cm, salvo indicaciones en mm

Mancomunidad Comarca de Pamplona Instituto Mankomunitatea
Servicios de la Comarca de Pamplona s.a. Instituto Zerbitzuak s.a.

TÍTULO DEL PROYECTO
00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKALHERRIA

AUTOR DEL PROYECTO
Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

DIRECTOR DEL PROYECTO
Agustina Rivera Martin
Ingeniero Industrial

DIBUJADO

CODIG. ARCHIVO

CODIGO DWG
00001190 planosaneamientodetalleseseccionestipo.dwg

FECHA
JUNIO 2026

ESCALA
A3 = INDICADAS

TÍTULO DEL PLANO
SANEAMIENTO.
DETALLES Y SECCIONES TIPO.

Nº DE PLANO
10

Nº DE HOJA
6 de 6

DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

INDICE

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

ÍNDICE

I. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

I.1. OBJETO DEL PLIEGO

I.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

I.3. DISCREPANCIAS Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

II. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA

II.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

II.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR

III. CONDICIONES GENERALES

III.1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE MATERIALES

III.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

III.1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR S.C.P.S.A.

III.1.3. MATERIALES SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR S.C.P.S.A.

III.1.4. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

III.1.5. MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES

III.1.6. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

III.1.7. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

III.1.8. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES

III.1.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

III.1.10. CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

III.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.2.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.2.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.2.3. MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO

III.2.4. OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS

III.2.5. ABONO DE OBRA INCOMPLETA

III.2.6. MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

III.2.7. MATERIALES SOBRANTES

III.2.8. SEGURIDAD Y SALUD

III.2.9. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

III.2.10. MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

III.2.11. REVISIÓN DE PRECIOS

III.3. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

III.3.1. CONDICIONES GENERALES

III.3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS

III.3.3. PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA

III.3.4. TRABAJOS PRELIMINARES

III.3.5. AFECCIONES A SERVICIOS

III.3.6. REPLANTEO

III.3.7. CONTROL TOPOGRÁFICO

III.3.8. TRÁFICO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE ACCESOS A LAS OBRAS

III.3.9. AFECCIONES A TERCEROS: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS. PROTECCIONES COLECTIVAS

III.3.10. OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

III.3.11. PRUEBAS

III.3.12. OTRAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

III.3.13. LIMPIEZA DE OBRAS

III.3.14. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

III.3.15. SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

IV. OBRA CIVIL. UNIDADES DE OBRA. RECEPCIÓN DE MATERIALES, EJECUCIÓN Y MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

IV.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

IV.1.1. EXCAVACIONES

IV.1.2. ZANJAS

IV.1.3. DEMOLICIONES DE OBRA DE FABRICA DE CUALQUIER TIPO

IV.1.4. DEMOLICIONES DE FIRMES DE CARRETERAS, CAMINOS Y ACERAS

IV.1.5. ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS

IV.1.6. TRANSPORTE A VERTEDERO

IV.1.7. RELLENOS DE ZANJAS

IV.1.8. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

IV.1.9. ESCOLLERAS

IV.1.10. ENTIBACIONES

IV.2. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

IV.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

IV.2.2. HORMIGONES

IV.2.3. MUROS

IV.2.4. ARMADURAS PASIVAS

IV.2.5. MALLAS ELECTROSOLDADAS

IV.2.6. JUNTAS EN EL HORMIGÓN

IV.2.7. ENCOFRADOS

IV.2.8. PASAMUROS EN MUROS DE HORMIGON

IV.3. REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

IV.3.1. SANEO DE HORMIGÓN DETERIORADO

IV.3.2. LIMPIEZA DEL HORMIGÓN Y DE LAS ARMADURAS

IV.3.3. REPARACION ESTRUCTURAL DEL HORMIGON DETERIORADO

IV.3.4. ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO

IV.3.5. RELLENO DE HUECOS DE HORMIGÓN CON MORTEROS EXPANSIVOS

IV.3.6. PUENTES DE UNIÓN. PRODUCTOS DE ADHESIÓN ESTRUCTURAL

IV.3.7. INYECCIÓN DE FISURAS

IV.3.8. PINTURA DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN ANTICARBONATACIÓN

IV.4. REDES DE ABASTECIMIENTO

IV.4.1. TUBERIA DE FUNDICION NODULAR

IV.4.2. PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICION DUCTIL

IV.4.3. TUBOS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD

IV.4.4. TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD

IV.4.5. PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES EN REDES DE ABASTECIMIENTO. RESULTADOS A OBTENER

IV.4.6. ANCLAJES, SOPORTES Y CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN

IV.4.7. ANCLAJES, SOPORTES Y CONTRARRESTOS METÁLICOS

IV.4.8. VALVULERIA

IV.4.9. CARRETES DE DESMONTAJE

IV.4.10. VENTOSAS

IV.5. REDES DE SANEAMIENTO

IV.5.1. TUBERÍAS DE PVC CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

IV.5.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

IV.5.3. TOLERANCIAS DE NIVELACIÓN EN TUBERÍAS DE HORMIGÓN

IV.5.4. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN TUBERÍAS DE SANEAMIENTO CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

IV.5.5. INSPECCIÓN VIDEOGRÁFICA DE LA RED DE SANEAMIENTO

IV.5.6. REGISTROS PREFABRICADOS

IV.5.7. REGISTROS Y OBRAS DE FABRICA "IN SITU"

IV.5.8. ENTRONQUES DE TUBERIAS EN LOS POZOS Y ARQUETAS

IV.5.9. PRUEBAS ESTANQUIDAD EN POZOS DE REGISTRO

IV.5.10. PATES TREPADORES

IV.5.11. MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO

IV.6. REDES DE DRENAJE

IV.6.1. TUBERIAS DRENAJE P.V.C.

IV.6.2. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE

IV.6.3. GEOTEXTIL FILTRANTE

IV.6.4. CAZ DE HORMIGÓN

IV.7. AFIRMADOS Y PAVIMENTOS

IV.7.1. BASES GRANULARES. ZAHORRAS ARTIFICIALES

IV.7.2. BORDILLOS DE HORMIGÓN

IV.7.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO

IV.7.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CON ARIDO CALIZO

IV.7.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CON ÁRIDO OFÍTICO

IV.8. OBRAS DE ALBAÑILERÍA

IV.8.1. MORTEROS

IV.9. IMPERMEABILIZACIONES

IV.9.1. SELLADOS CON MASILLAS ELASTICAS

IV.9.2. BANDAS DE PVC

IV.9.3. REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

IV.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS

IV.10.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE OBRAS

IV.10.2. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO DE OBRAS

IV.10.3. MARCAS VIALES

IV.10.4. ELEMENTOS DE DEFENSA PARA TRÁFICO RODADO EN OBRAS

IV.11. PROTECCIONES COLECTIVAS DE TERCEROS

IV.11.1. PASARELAS Y PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN

IV.11.2. VALLAS DE OBRA

IV.12. OTRAS UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

I. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

I.1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, constituye el conjunto de instrucciones, normas y especificaciones, que junto a lo indicado en los Planos del Proyecto, definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de la obra "00001190 RENOVACIÓN DE REDES ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN. CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA ".

I.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

En primer lugar, será necesario contactar con el Ayuntamiento de Ansoáin para coordinar varias cuestiones de accesibilidad e información a los vecinos. La coordinación con el ayuntamiento será permanente durante toda la obra ya que esta renovación de redes está ligada a la renovación de pavimentación que va a abordar el propio ayuntamiento.
Asimismo, será preciso comunicarse con el Departamento de Residuos de S.C.P.S.A. para gestionar el traslado temporal de los contenedores a otra ubicación durante la ejecución de las obras.

Todos los materiales utilizados serán los homologados por la Mancomunidad, Los detalles constructivos que no estén reflejados en los planos deberán ajustarse a los contemplados en la Ordenanza sobre Redes y aprobados por la Dirección de la Obra.

C/Canteras:

En esta calle únicamente se renuevan la red de abastecimiento y el colector de fecales, ya que el colector de pluviales existente se encuentra en condiciones adecuadas para seguir en funcionamiento, pudiendo plantearnos más a futuro el enmangado del mismo.

El ramal de abastecimiento se ha dividido en dos tramos: el AB5, que discurre desde la conexión con la red existente 1 hasta el nudo 2, y el AB1, que se extiende desde el nudo 2 hasta el nudo 4. El ramal AB5 se conecta a la red existente mediante un manguito de unión; se trata de una tubería de 300 mm de diámetro, a la que se incorpora un ramal procedente de calle Ezcaba de 150 mm, y que presenta un punto bajo en el nudo 1, donde se proyecta un desagüe hacia el pozo PL2.4 existente, finalizando su trazado en el nudo 2 con una cruceta.

Por su parte, el ramal AB1 consiste en una tubería de 150 mm, que presenta un punto bajo en el nudo 2.1 (PK0+012.59), con desagüe igualmente dirigido al pozo PL2.4 existente. A continuación, el trazado alcanza un punto alto (PK0+081.88) en la acometida C.3, de 50 mm de diámetro, que actúa como ventosa en la red. En este tramo se incorpora también el ramal AB2, y el conjunto finaliza en el nudo 4, donde se dispone una válvula de retención que permitirá la instalación de una boca de riego y un desagüe.

El colector de fecales, FE1, se replantea siguiendo la configuración existente, respetando tanto los diámetros actuales como las cotas de los pozos. Además, se contempla que el primer pozo (FE 1.1) y el último (FE 1.6) no se renueven por completo, limitándose la actuación a la reparación de los desperfectos detectados, sin proceder a la instalación de nuevos elementos. No obstante, se incorpora un pozo adicional al estado actual entre los dos primeros con el fin de resolver el cruce con las líneas de telecomunicaciones identificadas en la información del PCCS, garantizando así una implantación compatible con los servicios existentes.

Esta calle consta de un gran numero de servicios existentes, tal y como se refleja en el correspondiente plano, donde destaca de manera importante la cámara de Telefónica situada en la esquina este de la intersección entre la calle Canteras y Arturo Campión.

En la calle Canteras existen dos puntos a los que se deberá prestar especial atención a la hora de ejecutar las obras. En las intersecciones con las calles Arturo Campión y Travesía canteras se producen varios cruces entre las redes de fecales, pluviales y abastecimiento. Estos cruces se han estudiado para que no se produzcan interferencias, pero apenas disponen de holgura por lo que si en alguno de los puntos coinciden las campanas de los tubos, es posible que no se puedan respetar las cotas de proyecto. Antes de ejecutar estas tuberías será necesario abrir las zanjas y realizar el replanteo correspondiente para evitar interferencias. Actualmente estos cruces están resueltos mediante la duplicación de tuberías, pasando de una tubería de diámetro 400mm a 2 de 250mm.

C/Lapurbide:

La renovación del ramal de abastecimiento AB6 consiste en una tubería de fundición nodular de 250 mm, que arranca en el nudo 3, donde se instala una válvula de retención para permitir la colocación de una boca de riego y un desagüe. El trazado se resuelve mediante varios codos de 22° y 45° para evitar el pozo PL5.1. La red presenta un punto alto (PK0+019.72) en la acometida C.37, de 32 mm, que actúa como ventosa, y finaliza en el nudo 2 conectando a la cruceta.

El colector de pluviales PL5 se ejecutará mediante un enmangado desde el pozo PL5.1 hasta el colector existente PL2.4, de la tubería de hormigón en masa de 500 mm.

En este tramo de calle no existe colector de fecales, por lo que no se prevé ninguna actuación en dicha red.

Trª Canteras:

Las redes se acumulan en el lado de los portales nº2, nº4 y nº6, dejando espacio en el otro margen de la vía para plantar vegetación.

La renovación del ramal abastecimiento AB2 comienza en la conexión con la red existente 3, desde donde, mediante codos de 45°, la conducción se aproxima progresivamente a la fachada. En el nudo 6 (PK0+011.15) se produce un cambio de diámetro, pasando de una tubería de fundición nodular de 150 mm, que recorre la plaza Euskal Herria, a otra de 100 mm. La red de abastecimiento discurre por la alineación más próxima a la fachada y, debido a la topografía de la acera, a la altura del portal n.º 6 es necesario retranquear la conducción mediante dos codos de 22°. Antes de llegar a calle Canteras, en el nudo 5 (PK0+076.93), se identifica un punto bajo en el que se proyecta la instalación de un desagüe, destinado a evacuar el agua hacia el pozo PL 1.4.

Los colectores de pluviales y fecales discurren paralelos a lo largo de todo el trazado. El colector de fecales FE2 está ejecutado en PVC de 315 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 1,8 %, y vierte finalmente en el pozo FE1.4 del colector FE1. Por su parte, el colector de pluviales PL1, también de PVC de 315 mm, presenta una profundidad media de 1,4 m y una inclinación media del 1 %, finalizando en el pozo PL1.4 existente, perteneciente al colector de pluviales que no se renueva en la calle Canteras.

C/Navarra:

La red de abastecimiento AB4 discurre por el mismo trazado que el actual y se trata de una tubería de 150 mm que comienza en el nudo 8 conectándose a la red existente y que se conecta al ramal AB3. Cuenta con el nudo 7 (PK0+086.10) con válvula de corte.

La red de saneamiento se divide en dos: la que se dirige hacia C/ Ezcaba y la que lo hace hacia C/ Arturo Campión. En el tramo hacia C/ Ezcaba, el ramal de fecales FE5 está formado por una tubería de hormigón en masa de 300 mm, con una profundidad media de 1,25 m y una inclinación del 0,74 %; únicamente se renueva el pozo FE5.1, finalizando el ramal en un pozo existente. El ramal de pluviales PL4, también de hormigón en masa de 300 mm, arranca en una arqueta de inicio debido a la escasa profundidad necesaria para alcanzar una inclinación del 0,66 % y llegar a la cota del pozo existente. Se incorpora un pozo intermedio para ejecutar la renovación dentro del ámbito previsto para la renovación del pavimento.

Las redes que continúan hacia C/ Arturo Campión se describen en el siguiente apartado y son los ramales FE4 y PL3.

C/Arturo Campion:

Las redes se concentran en el lado de los portales comprendidos entre los números 2 y 18, dejando libre el margen opuesto de la vía para la implantación de vegetación. Se desplaza por completo al lado contrario el ramal de abastecimiento, y se ajusta la red de saneamiento al margen seleccionado.

La red de abastecimiento AB3 está formada por una tubería de fundición nodular de 250 mm que discurre paralela a la fachada a lo largo de todo su trazado. Parte de la conexión con la red existente 2 y, mediante codos de 45° y 11°, se aproxima a la fachada. Presenta un punto bajo (PK0+073.35) en el nudo 9 y un punto alto (PK0+076.91) donde se ubica la acometida C.19, de 50 mm. A este ramal se incorpora el AB4 en el PK0+080.97, y el trazado continúa hasta el nudo 2.2 (PK0+166.80), donde, tras varios codos y deflexiones, finaliza en la válvula de la cruceta del nudo 2.

Existe un ramal denominado AB3.1 que arranca en la conexión con la red existente 2 y da servicio tanto al hidrante como a la boca de riego. El trazado se ejecuta con una tubería de fundición nodular de 100 mm hasta el hidrante, y con una tubería de PE de 50 mm hasta la boca de riego.

La red de saneamiento se divide en dos: la que discurre desde C/ Navarra hacia Av. Villava y la que se dirige hacia C/ Canteras. En el tramo procedente de C/ Navarra, el ramal de fecales FE4 está formado por una tubería de hormigón en masa de 400 mm, con una profundidad media de 2 m y una inclinación media del 0,7 %, y conecta con el pozo PL4.8 existente. El ramal de pluviales PL3 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre los pozos PL3.1 y PL3.3, y con tubería de 400 mm desde PL3.3 hasta el pozo existente PL3.8. Presenta una profundidad media de 1,86 m y una inclinación media del 0,45 %. Conviene mencionar que el pozo PL3.7 actúa como pozo de resalto, ya que el ramal llega a una profundidad aproximada de 2,3 m, mientras que el pozo PL3.8 alcanza casi 5 m, generando un salto de cota significativo.

En cuanto a la red que se dirige hacia C/ Canteras, el ramal de fecales FE3 se compone de una tubería de PVC de 315 mm entre los pozos FE3.1 y FE3.3, y de hormigón en masa de 300 mm desde FE3.3 hasta su conexión final en el pozo FE1.3 del ramal FE1. Presenta una profundidad media de 1,94 m, con una inclinación del 1,14 % en el tramo de PVC y del 0,54 % en el tramo de hormigón. El ramal de pluviales PL2 se ejecuta con tubería de 300 mm de hormigón en masa entre PL2.1 y PL2.3,

y con tubería de 400 mm desde PL2.3 hasta el pozo existente PL2.4, con una profundidad media de 1,44 m y una inclinación media del 0,66 %.

Dado que el proyecto contempla la reubicación completa de varios ramales de abastecimiento, los trazados antiguos podrán mantenerse en servicio de forma temporal hasta la finalización de las obras, garantizando así la continuidad del suministro. Paralelamente, se instalará una red de abastecimiento provisional, configurada de forma mallada, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y asegurar el suministro a las viviendas situadas en aquellas calles donde todavía no haya reubicación del ramal de abastecimiento.

Como paso final se considera indispensable, y así se refleja en los precios de las correspondientes unidades de obra, que la línea de abastecimiento este limpia probada y desinfectada.

Previa a la recepción de la obra, tanto los registros como las conducciones de hormigón deberán ser probados según la normativa de la Mancomunidad, el coste de estas pruebas está contemplados en los precios de cada una de las unidades de obra. Todos los colectores deberán someterse a una inspección video gráfica completa. El coste de dicha inspección viene reflejado en el presupuesto. Las pruebas de presión y estanqueidad se deberán realizar de acuerdo con lo previsto en el PPTP de este proyecto, las ordenanzas o lo que indique el Director de las Obras según el caso.

I.3. DISCREPANCIAS Y PRELACIÓN DE DOCUMENTOS

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumeradas por orden de prioridad: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, Presupuesto y Memoria, sin perjuicio de lo que en su caso pueda establecer el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares de la Obra que rija en su contratación.

A estos documentos iniciales hay que añadir:

- Los planos de obra complementarios o sustitutivos de los planos que hayan sido debidamente aprobados por la Dirección de Obra.

- Las órdenes escritas emanadas de la Dirección de Obra y reflejadas en el Libro de órdenes, de existencia obligatoria en la obra

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, o entre cualquiera de los documentos del proyecto, el criterio será establecido por la Dirección de Obra.

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en los Planos y el Pliego, o que por su uso y costumbre deben ser realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles sino que deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones. Dicho incremento de obra no supondrá modificación alguna en el Presupuesto ofertado por el Contratista en su oferta.

II. DISPOSICIONES TÉCNICAS A TENER EN CUENTA

II.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

1. Real Decreto Legislativo 3/2011. Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público.

2. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Reglamento General de la Ley de Contratos Públicos.

3. Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado. (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre; B.O.E. 16-02-1971).

4. Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos.

5. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

6. Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

7. Ley Foral 4-2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental.

II.2. DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR

1. Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), relativa al proyecto y ejecución de estructuras y elementos estructurales de hormigón en masa, armado y pretensado (R.D. 1247/2008 de 18 de Julio).

2. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes PG-3 Orden Ministerial de 1.976 y modificaciones realizadas por Ordenes Ministeriales y por Ordenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

3. Código Técnico de la Edificación (R.D.314/2006 de 17 de Marzo).

4. Normativa de Redes de Saneamiento. (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)

5. Normativa de Redes de Abastecimiento de agua. (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)

6. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Elementos de Hormigón en Redes de Saneamiento. (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona)

7. Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo sanitario (R.D. 140/2003).

8. Instrucción 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987).

9. Decreto Foral 23/2011 de 23 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

10. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

III. CONDICIONES GENERALES

III.1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCION DE MATERIALES

III.1.1. MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista, excepto aquéllos que de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por S.C.P.S.A.

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. En ningún caso, se procederá al acopio y utilización en obra de materiales de procedencia no aprobada.

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas y tipos de material a emplear.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CEE.

III.1.2. MATERIALES SUMINISTRADOS POR S.C.P.S.A.

Los materiales suministrados por S.C.P.S.A. que deberán ser instalados por el contratista son los que figuran en Presupuesto como material "a colocar".

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga S.C.P.S.A. el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista.

La entrega de los materiales se realizará en el lugar que cada momento determine S.C.P.S.A., siendo a cargo del Contratista los gastos de carga, transporte, descarga, manipulación, acopios y vigilancia.

Se establecerá acuerdo entre S.C.P.S.A. y Contratista para fijar la fecha del suministro.

III.1.3. MATERIALES SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR S.C.P.S.A.

Los materiales suministrados e instalados por S.C.P.S.A. en coordinación con la obra ejecutada por el Contratista son los que figuran como tales en la Memoria del Proyecto.

Se establecerá acuerdo entre S.C.P.S.A. y el Contratista para fijar las fechas de montaje. En caso de utilizarse medios del Contratista en ayudas al montaje, serán objeto de control por partes de maquinaria y personal, firmados a diario por la Dirección de Obra y Certificadas por Administración, sin cuyo requisito no serán atendidos.

III.1.4. ANÁLISIS Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos ensayos o análisis que la

Dirección de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que hayan de emplearse.

La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus resultados, será de la exclusiva competencia de la Dirección de Obra, cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiere designado o aceptado para su realización. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que considere no responden a las condiciones del presente Pliego.

Todos los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales serán a cargo del Contratista, excepto los mencionados expresamente en este Pliego, en la Memoria o en Presupuesto, como de abono a cargo de S.C.P.S.A.

III.1.5. MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo (tales como caminos, obras de tierra, cimentaciones, anclajes, armaduras o empalmes, etc.) cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles de calidad mantenidos en este Pliego.

III.1.6. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar, con independencia del control de calidad propiamente dicho.

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser destinados.

III.1.7. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir si procede la admisión de los mismos.

III.1.8. MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección de Obra podrá dar orden al Contratista para que los

reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista.

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección de Obra podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados.

III.1.9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos.

III.1.10. CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA

Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección de Obra, quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido.

III.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

III.2.1. CRITERIOS GENERALES PARA EL ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 1 que figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y baja o alza de licitación en su caso. A la cantidad resultante se añadirá el Impuesto Sobre el Valor Añadido vigente.

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma aunque no figuren todos ellos especificados en su descripción.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los considerados como gastos indirectos, quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto.

Serán de cuenta de la Contrata los gastos de inspección, vigilancia y ensayos de la obra civil, así como las cargas fiscales que se deriven de las disposiciones legales vigentes.

También serán de cuenta de la Contrata y quedan absorbidos en los precios:

- La construcción de accesos de obra, pistas, instalaciones auxiliares, etc. que no estén expresamente definidos en el Proyecto y valorados en su Presupuesto.

- Los gastos originados al practicar los replanteos y la custodia y reposición de estacas, marcas y señales.

- Las indemnizaciones a la Administración y a terceros por todos los daños que cause con las obras, por la interrupción de los servicios públicos o particulares o por ocupaciones temporales.

- Las catas para mejor definición de las infraestructuras y servicios afectados, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto.

- Las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto.

- Los gastos de establecimiento y desmontaje de almacenes, talleres y depósitos, así como las acometidas de energía eléctrica y agua y sus consumos.

- La implantación y conservación de señales de tráfico y elementos para la seguridad del tráfico rodado y peatonal, de acuerdo con la normativa vigente.

- Los gastos de protección de todos los materiales y de la propia obra contra todo deterioro o daño durante el período de construcción y durante el plazo de garantía.

- Los gastos derivados de la más estricta vigilancia para dar cumplimiento a todas las disposiciones relacionadas con la seguridad personal de los obreros en el trabajo.

- La retirada de todas las instalaciones, herramientas, materiales, etc. y la limpieza general final de la Obra para su recepción.

En el caso de que el Contratista no cumpliese con alguna de las obligaciones expresadas, la Dirección de Obra, previo aviso, podrá ordenar que se ejecuten las correspondientes labores con cargo a la Contrata.

III.2.2. CRITERIOS GENERALES PARA LA MEDICIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo con las normas que establece este pliego, tendrá lugar en presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la Dirección de Obra consigne.

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente.

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra.

No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. Tampoco le será abonado, en

su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección de Obra para subsanar cualquier defecto de ejecución.

No se detallan en los conceptos incluidos en cada precio los especificados en la cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Económico Administrativas Generales, aprobado por Decreto de 31 de Diciembre de 1.970.

III.2.3. MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación correspondiente.

III.2.4. OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser derruidos a su costa si la Dirección de Obra así lo exige y en ningún caso serán abonados, siendo responsable el Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos pueda derivarse.

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio de S.C.P.S.A., la Dirección de Obra determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con dicho precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo.

III.2.5. ABONO DE OBRA INCOMPLETA

Si por rescisión del Contrato o por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección de Obra, sin que tenga derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.

III.2.6. MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRECIOS CONTRADICTORIOS

Para la valoración de la unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán previamente a su ejecución, **Precios Contradictorios** entre el Adjudicatario y la Dirección de Obra, en base a criterios similares a los del Cuadro de Precios, y si no existen, en base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección de Obra, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.

A todos los efectos se utilizarán como Precios Unitarios, los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, que pasarán a formar parte del Contrato.

También podrá la Dirección de Obra, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al Adjudicatario, la realización inmediata de estas Unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario, que quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de cinco días desde dicha orden, justificación de la valoración de la unidad, sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

En el caso de ejecución de Unidades de obra o **Trabajos por Administración**, así como en los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de este Proyecto, o en los contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección de Obra y Adjudicatario, se utilizarán como precios unitarios, los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.

Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración.

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria, la presentación de partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, materiales empleados, y la firma diaria de conformidad, de la Dirección de Obra o de su representante autorizado, cuya copia se incluirá en las Certificaciones de abono. Sin dicha firma de conformidad, el Adjudicatario no podrá exigir abono alguno, y estará a la valoración, que en su caso, dictamine la Dirección de Obra.

III.2.7. MATERIALES SOBRANTES

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato.

III.2.8. SEGURIDAD Y SALUD

El coste de las actividades preventivas en la obra se imputará, siguiendo los criterios de la normativa vigente, de la siguiente manera:
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a cargo del contratista, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados como medios auxiliares, reglamentariamente exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra, y necesarios para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, por lo que deben ser considerados incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Los sistemas de protección colectiva y la señalización que deban ser dispuestos para su aplicación en la obra, son costes que serán retribuidos de acuerdo con el presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.
En cuanto a la protección colectiva y la señalización de la obra, es preciso distinguir entre la que se refiere a la protección e información requerida por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra.
En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril y los medios empleados figuran el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud.
En lo que se refiere a la protección colectiva, la señalización y el balizamiento del tráfico exterior afectado por la obra, los medios a emplear vienen regulados, entre otras, por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras. La valoración de los mismos figura en el presupuesto general de la obra, en capítulo diferenciado. Todo ello sin perjuicio de su inclusión en la Memoria del Estudio de Seguridad y Salud como aspectos a cumplir en la obra.

III.2.9. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos:

- la identificación del poseedor y del productor
- la obra de procedencia
- el número de licencia de la obra
- la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible
- el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya
- la identificación del gestor de las operaciones de destino.

Dicho documento servirá de justificante de las mediciones de abono.

La Dirección de Obra deberá validar el método de medición empleado por el gestor de residuos para plasmar la cantidad de residuos recibidos. En caso que, a su juicio, dicho método no sea lo suficientemente preciso, podrá proponer un método alternativo.

Los valores dados de volumen y/o peso se entenderán sobre perfil.

La medición y abono de la gestión de los Residuos de Construcción y Demolición incluye los siguientes conceptos:

1. Costes de segregación de residuos

Se consideran como costes indirectos los gastos de segregación de residuos, independientemente que esta se realice por el poseedor en la misma obra o se encargue la misma a Gestor autorizado. Estos costes incluyen la instalación y gestión de acopios e instalaciones de segregación de residuos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

2. Transporte a vertedero/gestor

Se abonarán por metro cúbico y kilómetro (m³.km) al precio indicado en el cuadro de precios del presupuesto.
Dicho precio se ajustará a la menor distancia por carretera desde el origen del residuo hasta la localización del vertedero o gestor indicado en el Plan de Gestión de Residuos aprobado.

La medición se realizará sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio de transporte.

3. Tasas de Gestión de Residuos

El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión sus previsiones de elección de gestores autorizados para cada tipo de residuo. Los criterios de selección se guiarán por los principios de idoneidad, eficiencia y economía. Cualquier cambio en obra con respecto a lo indicado en el Plan de Gestión aprobado, deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

La medición se realizará sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio del canon.

3.1. Tasa de vertido (D5) de tierras y piedras no contaminadas
Se abonará en el caso de que el destino final sea el vertido en vertedero de inertes autorizado. La elección de vertedero será la que figure en el Plan de Gestión de Residuos aprobado o en su caso otro admitido por la Dirección de Obra a propuesta del contratista. El canon de vertido será el que figura en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

Cuando el contratista, en su Plan de Gestión, contemple la utilización de estos materiales en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, propuesta por él mismo y declarada como tal por el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, el canon de vertido será el que figure en el Plan de Gestión de residuos aprobado, previa justificación por parte del contratista.

El contratista debe indicar en el Plan de Gestión sus previsiones de reutilización de estos materiales en otras obras en las que sea adjudicatario. En este caso no se abonará ningún precio en concepto de canon de vertido, entendiéndose que el vertido y los acopios intermedios son sufragados por el canon de tierras de préstamo de la obra receptora de dichos materiales.

3.2. Tasa de gestión de residuos no peligrosos
No se considerará la tasa de gestión de aquellos materiales reutilizables para los que ya existe un mercado, como son las fracciones de residuos ya segregadas de madera, vidrio, metal, plástico y papel o cartón. En este caso sólo será aplicable el coste del transporte al gestor autorizado aprobado en el Plan de Gestión.

La tasa de gestión de residuos inertes o de residuos no peligrosos asimilables a urbanos en vertedero será la que figure en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

3.3. Tasa de gestión de residuos peligrosos

Se abonará la tasa de gestión de fracciones de residuos peligrosos ya segregados. La elección de gestor autorizado será la que figure en el Plan de Gestión de Residuos aprobado o en su caso otro admitido por la Dirección de Obra a propuesta del contratista.

La tasa de gestión de residuos peligrosos será el que figura en el cuadro de precios del Estudio de Gestión de Residuos o en su caso, el aprobado en el Plan de Gestión de Residuos de la Obra.

III.2.10. MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

La Dirección de Obra ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución de las obras.

Correrán a cuenta del contratista los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales hasta un límite del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra.

El Contratista deberá poner por su cuenta y en su cargo todos los medios personales y materiales para llevar a cabo la toma de muestras y su posible conservación en obra.

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección de Obra serán de cuenta del Adjudicatario.

En ningún caso se incluyen en estos ensayos, las pruebas de estanquidad de tuberías, registros, depósitos y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra, cuyo coste se incluye en los precios de las unidades de obra implicadas.

III.2.11. REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios, se regirá por lo dispuesto en el Artº correspondiente del Pliego de Cláusulas Administrativas de la obra o en el anejo correspondiente de la Memoria, que servirá de base para la licitación y contratación de la misma.

En el caso de que en el citado Pliego de C.A. o Anejo no se estipule o mencione dicha revisión de precios, se entenderá que no existe revisión de precios aplicables a la ejecución de la obra.

III.3. CONDICIONES GENERALES DE LA OBRA

III.3.1. CONDICIONES GENERALES

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta de licitación,

no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos.

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean impuestas por los Organismos competentes.

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras.

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a efectos de Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra.

III.3.2. PROGRAMA DE TRABAJOS Y PLAZOS

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, de 12 de octubre de 2001, antes de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato, el Contratista deberá presentar, por escrito y cuadruplicado, el Programa definitivo de Ejecución de los Trabajos.

Este programa incluirá los datos siguientes:

a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto con expresión del volumen de éstas.

b) Determinación de los medios necesarios tales como personal, instalaciones, equipo y materiales con expresión de sus rendimientos medios.

c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.

e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos.

f) El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Director de Obra que propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor realización de los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, necesitando la aprobación del Director de Obra para introducir cualquier variación en el mismo.

Los plazos parciales serán fijados por la Administración al aprobar el Programa de trabajos del Proyecto de Construcción. En el Programa de Trabajo, se definirá y detallará expresamente los tiempos y medios de las pruebas parciales y de conjunto.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato, de acuerdo la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Este plan, una vez aprobado por la Administración, se incorporará al Pliego de Prescripciones del Proyecto y adquirirá por tanto, carácter contractual.

Modificaciones del Programa:
Si el Contratista durante la ejecución de la obra se viese obligado a alterar la programación realizada, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra, al menos, con siete (7) días de antelación a la fecha prevista como origen de dicha alteración. Por otra parte, la Dirección de la Obra se reserva el derecho de modificar la marcha prevista de los trabajos por necesidades de otra índole, poniéndolo en conocimiento del Contratista con diez (10) días de antelación, siempre que no respondan a causas de fuerza mayor.

Plazo para Comenzar las Obras:
La ejecución de las obras deberá iniciarse al día siguiente de la fecha del Acta de replanteo.

III.3.3. PERSONAL FACULTATIVO DEL CONTRATISTA

El Contratista comunicará por escrito a la Administración, antes de la firma del Acta de Replanteo, el nombre del Jefe de obra. Ésta persona será el representante del contratista ante la Dirección de Obra e interlocutor de la misma. Tendrá capacidad completa de decisión en el ámbito de la obra.

Deberá ser la misma persona que la definida en la oferta presentada por el Contratista o de superior formación y experiencia.

En cualquiera de los casos y en cualquier momento, la Dirección de Obra, podrá rechazar a su juicio, a la persona propuesta para este cargo.

El Jefe de Obra tendrá la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y con la experiencia profesional suficiente a juicio de la Dirección de la Obra. Su dedicación a la obra debe ser a tiempo completo, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituida sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla.

Además del Jefe de Obra, el Contratista dispondrá en tanto duren las obras, salvo autorización expresa de la Dirección de las mismas, del siguiente personal a pie de obra, como mínimo:

- Un Jefe de producción (estructuras y edificaciones, y conducciones) con titulación de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas o Ingenieros de Caminos.

- Un (1) Topógrafo.

- Dos Encargados generales (estructuras y edificaciones, y conducciones) con amplia experiencia.

Este personal deberá ser presentado por el Contratista durante la oferta y no podrá variarse sin autorización previa de la Dirección de las Obras.

III.3.4. TRABAJOS PRELIMINARES

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección de Obra el Contratista realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de instalaciones de segregación de residuos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras.

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de protección.

En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización se realizará de acuerdo con la Instrucción 8.3-ic sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

III.3.5. AFECCIONES A SERVICIOS

El Contratista, antes de iniciar el movimiento de tierras, tomará coordenadas x, y, z, para su posterior reposición, de todos los puntos singulares de servicios existentes en la zona de influencia de la traza, afectada por las obras:

> Caminos, carreteras, cunetas, regatas, ríos, vallados, propiedades, hitos de muga, señales, carteles, registros, pozos y arquetas existentes, elementos estructurales tales como zapatas o losas de hormigón, postes de teléfono y electricidad, farolas, arbolado, drenajes de fincas, mobiliario urbano, etc.

En los planos de planta del proyecto y perfil de la tubería, se identifican los principales servicios afectados, información recabada durante la elaboración del proyecto que deberá ser cotejada in situ.

En esta obra, en principio, se esperan afecciones a

> Abastecimiento
> Saneamiento
> Instalaciones de riego
> Gas
> Telefonía y fibra óptica
> Electricidad en alta/baja tensión
> Caminos y carreteras
> Ríos y regatas

Se delimitaran las servidumbres de redes aéreas (electrificación, telefonía,…) para definir su dominio público (preparación de gálibos,…)

Antes de iniciarse las excavaciones, el Contratista deberá disponer información exacta de la posición x, y, z de los servicios enterrados, realizando previamente calicatas de detección y reconocimiento.

Para ello, solicitará por escrito el marcaje in situ de las instalaciones a la compañía concesionaria del servicio.

Efectuado el marcaje, y donde no exista seguridad absoluta de su posición x, y, z, se realizará una calicata de localización del servicio, con suficiente antelación a las excavaciones de obra, para que la posición exacta de la instalación permita a la Dirección de la obra determinar:

- La posible modificación de trazado en planta y/o alzado

- El posible desvío del servicio afectado, acordado y presupuestado con la propiedad del mismo.

Por tanto, el objeto de estas calicatas es esencial para adoptar con antelación suficiente, la solución más adecuada, impidiendo errores de trazado, incremento de costes y retrasos de obra.

Identificada la ubicación del servicio afectado, la Dirección de Obra comunicará al Contratista la solución adoptada (mantenimiento de la solución proyectada, modificación de trazado, desvío, etc.), de forma gráfica y/o escrita.

El Contratista modificará a su cargo, y sin compensación económica, los tramos de tubería que fueran necesarios, para salvar con un trazado hidráulico, aquellos servicios que no hubieran sido detectados, al no haber efectuado calicatas previas de localización del servicio.

En obras de renovación de redes de abastecimiento y/o saneamiento, en aquellos tramos donde se renueve la red, será responsabilidad del contratista la localización de todas y cada una de las acometidas existentes, incluso aunque estas acometidas no figuren en los planos de proyecto.

El Contratista se hará cargo, sin compensación económica, de los sobrecostes que se produzcan en la renovación de aquellas acometidas que se descubra, a posteriori, que se han quedado sin conectar a la red ya renovada. En caso que la obra se encuentre en período de garantía, la renovación de dichas acometidas se hará íntegramente a costa del contratista.

III.3.6. REPLANTEO

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los art. 24, 25 y 26 del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cota relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación.

En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecerá a su cargo, por medio de la Dirección de Obra, las que se precisen para que puedan tramitarse y sea aprobada el Acta.

En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar las coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, en aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa. El contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos.

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección de Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.

La Dirección de Obra, por el personal a sus órdenes, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las partes de la obra que desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario se levantará Acta de estos replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada.

Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la Propiedad serán sufragados por ella.

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y de las que indique la Dirección de Obra de los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección de Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas.

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección de Obra para que ésta realice su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de esa parte de la obra.

Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección de Obra, deberá replantearse el contorno de los alzados antes de empezar la ejecución de los mismos.

III.3.7. CONTROL TOPOGRÁFICO

Para el replanteo en planta y perfil, se procederá a referenciar en el terreno todos los puntos significativos del eje de la traza:

- Los puntos de cambio de alineación recta/curva en planta
- Los puntos de cambio de pendiente de la tubería

- Los puntos de ventosas y desagües

En el terreno, y paralelamente al eje replanteado de la tubería, se señalarán los cambios de zanja tipo, para guiar la excavación de forma que se ejecuten los taludes y bermas de seguridad del proyecto.

Efectuada la excavación a su cota se replanteará de nuevo el eje de la tubería sobre el fondo de zanja. El replanteo debe considerar en cada tubo, sus 3 componentes x , y , z.

Las desviaciones angulares en las juntas entre tubos (**α**) deberán cumplir las condiciones siguientes:

No se permiten variaciones angulares que varíen el sentido de la desviación angular proyectada (ni en planta, ni en alzado).

El error máximo previsto, por tubo es de 0,25 grados sexagesimales

El incumplimiento de las condiciones anteriores, exigirá la rectificación de la colocación de los tubos afectados.

Por tanto, el control topográfico es un control en tres dimensiones, en el que deben considerarse el replanteo en planta de la tubería y la nivelación de la misma.

Se controlarán topográficamente los taludes realmente ejecutados y el perfil de roca, en cada uno de los puntos del perfil longitudinal del proyecto.

En caso de discrepancia, la Dirección de Obra especificará la cota de roca, en función de la definición de roca, especificada en el artículo de excavaciones de este artículo del Pliego.

III.3.8. TRÁFICO DE OBRA: MANTENIMIENTO DE ACCESOS A LAS OBRAS

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran por su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las existentes al comienzo.

Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización.

En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo del Contratista.

III.3.9. AFECCIONES A TERCEROS: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS OBRAS. PROTECCIONES COLECTIVAS

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia y determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación de tráfico tanto peatonal como rodado.

El Contratista deberá presentar un plan donde se analicen las afecciones a terceros, se propongan medidas de ordenación de tráfico, desvíos, accesos a la obra, itinerarios peatonales dentro de la obra y las medidas de señalización, balizamiento y protecciones colectivas.

El Director de las obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por parte del Contratista.

No deberán iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera o vía urbana sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento, defensa y protecciones colectivas.

Estos elementos deberán ser modificados e incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el período de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos.

Los elementos de señalización, balizamiento, defensa y protecciones colectivas dejarán de utilizarse si se deterioran, se rompen o sufren cualquier otra circunstancia que comprometa la eficacia de su función. La Dirección de Obra podrá exigir la sustitución sin coste de aquellos elementos que, a su juicio, presenten un estado de deterioro que comprometa la eficacia de su función.

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Presupuesto de la obra no se prevea explícitamente lo contrario, los gastos de suministro, colocación, conservación y retirada de la señalización, balizamiento, defensa, protecciones colectivas y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

III.3.10. OCUPACIÓN DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los terrenos que se precisen ocupar definitivamente para ubicación de las obras serán proporcionados por la Administración.

Las indemnizaciones que corresponda abonar por la ocupación de aquello que se precise ocupar provisionalmente durante la ejecución de las obras para instalaciones, depósitos de materiales, escombreras, caminos, toma de tierras, de préstamos, etc., serán de cuenta del Contratista, quien deberá gestionar su ocupación si no corresponden a los terrenos adquiridos por la Administración.

III.3.11. PRUEBAS

Durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción se someterán las obras a las pruebas precisas a juicio de la Dirección de Obra para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista mecánico y/o hidráulico.

Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los 10 días siguientes a la comunicación por parte del Adjudicatario a la Dirección de Obra de que las instalaciones se encuentran a punto de ser probadas.

Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el material necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno pues los costes correspondientes están incluidos en los presupuestos.

Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obra, condicionantes de la redacción del Acta de Recepción de Obra.

La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta de Recepción de Obra en caso positivo.

III.3.12. OTRAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término a lo que sobre ello se detalla en los planos y presupuesto y en segundo, a las instrucciones que por escrito reciba de la Dirección de Obra, de acuerdo con los Pliegos o Normas Oficiales que sean aplicables en cada caso.

III.3.13. LIMPIEZA DE OBRAS

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección de Obra, siendo a cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su terminación.

III.3.14. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

En lo que respecta a la gestión de residuos, se estará a lo que disponga el Decreto Foral 23/2011 de 23 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, así como a las indicaciones dadas en el Estudio de Gestión de Residuos de la Construcción.

El Decreto Foral define los conceptos de:

- Productor de residuos de construcción y demolición, que se identifica con la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición

- Poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la misma

En esta obra, esas figuras se corresponden con:

Productor de los Residuos. Servicios de la Comarca de Pamplona S.A.
Poseedor de los Residuos. El contratista adjudicatario

El poseedor de los residuos presentará ante el promotor un **Plan de Gestión de Residuos** que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección de Obra, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

Obligaciones del poseedor

Independientemente de la cantidad generada, debe hacerse una separación de los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, debiendo ser incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.

La segregación por tipo de residuo será obligatoria a partir de determinados umbrales. En el artículo 5.4 del DF 23/2011 se especifica a partir de qué valores se ha de proceder a segregar determinadas fracciones de residuos.

Aun así, por la tipología de la obra, se considera que no existen razones técnicas que imposibiliten o hagan excesivamente gravoso la segregación en obra de los residuos. Por tanto, la separación en fracciones se llevará a cabo por el poseedor de los RCD dentro de la obra.
El contratista deberá especificar en el Plan de Gestión cuales han de ser los medios y los métodos organizativos que aseguren el correcto cumplimiento de la obligación de segregación de los residuos en obra.
La separación de fracciones por un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de RCD externa a la obra, se considera una mala práctica. Dicha práctica sólo podrá llevarse a cabo previa justificación técnica y autorización expresa de la Dirección Facultativa. En cualquier caso correrá a cuenta del poseedor.
Mientras se encuentren los residuos en su poder, el poseedor los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas.
Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.
En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
Informará a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.
El personal de obra, el cual está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, está obligado a:

- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán. Las etiquetas deben

informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que pueden ser causa de accidentes.

No sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos.

III.3.15. SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJO

Se cumplirán y verificarán las medidas de seguridad establecidas, en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

En este proyecto, se han definido las obras, incorporando implícitamente determinadas medidas de seguridad en la producción, que compatibilizan la instalación de las tuberías con la seguridad en su ejecución:

- Definición de infraestructuras y servicios afectados y forma de acometer las obras en zonas de afección.

- Definición de las excavaciones con taludes y bermas de seguridad adecuados al terreno, profundidad y tuberías a instalar, ejecución de rampas de escape sistemáticas, y medidas de control de obra civil que obligan a un adecuado orden en la obra, premisa indispensable para la seguridad y salud de operarios y terceros afectados.

- Ordenación de la franja de afección de obra, para permitir la seguridad y limpieza en el movimiento de personal y maquinaria.

- Condiciones de montaje de tuberías, de pruebas de la instalación, y de realización de estructuras.

Asimismo, y como documento de referencia en esta materia, se ha redactado el Estudio de Seguridad y Salud, específico para esta obra, estudio que documenta y presupuesta las actuaciones en esta materia y que servirá de base para el preceptivo **Plan de Seguridad y Salud** a desarrollar por el Adjudicatario antes del inicio de obra.

Se cumplirá también la obligación de control de la Subcontratación, de acuerdo con la Ley 32/2006 sobre subcontratación en el sector de la construcción.

Dicha ley, conforme se detalla en el Estudio de Seguridad y Salud, obliga a:

- El cumplimiento de determinadas condiciones para que las subcontrataciones que se efectúen a partir del tercer nivel de subcontratación respondan a causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

- Una serie de requisitos de calidad o solvencia a las empresas que vayan a actuar en este sector, reforzando estas garantías en relación con la acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales de sus recursos humanos, con la acreditación de la organización preventiva de la propia empresa y con la calidad del empleo precisando unas mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de la empresa.

- Introduciendo los adecuados mecanismos de transparencia en las obras de construcción, mediante determinados sistemas documentales y de reforzamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores de las distintas empresas que intervienen en la obra.

Se cumplirán también las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo de exposición al amianto, reguladas por Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo.
El desmontaje o cualquier otra manipulación de tuberías de fibrocemento deberá ser expresamente autorizado por la Dirección de Obra.

Igualmente queda obligado a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos terceros que se muevan en las proximidades de las obras. Como elemento primordial de seguridad se establecerá toda la señalización necesaria durante el desarrollo de las obras, haciendo referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras. Así, habrá que prestar especial atención al tráfico afectado por la ejecución de las obras y a los posibles desvíos, que deberán estar convenientemente señalizados según el Reglamento vigente.

Viene también obligado al cumplimiento de cuanto le dicte la Dirección de Obra, encaminado a garantizar la seguridad de los trabajadores y buena marcha de las obras, bien entendido que en ningún caso dicho cumplimiento eximirá al Contratista de su responsabilidad.

IV. OBRA CIVIL. UNIDADES DE OBRA. RECEPCIÓN DE MATERIALES, EJECUCIÓN Y MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

IV.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

IV.1.1. EXCAVACIONES

Definiciones

En atención a los distintos medios de excavación utilizables y a los rendimientos alcanzables por los mismos según el tipo de excavación, en este Pliego se distinguen los siguientes tipos de excavación:

a) Explanación o desmonte: movimientos de tierras en vaciados o explanaciones a cielo abierto. Es el tipo de excavación que posibilita el uso de los medios de excavación de mayor capacidad y rendimiento.

b) Excavación en zanja y pozos de registro: excavación que se hace en un terreno para realizar la instalación de una conducción subterránea.

c) Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica: Es el tipo de excavación que afecta a volúmenes más reducidos, con mayores condicionantes de ejecución, de espacio y de rendimiento.

Condiciones generales

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que figuran en los planos y las que determinen la Dirección de Obra.

El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las medidas de precaución, desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante o por defectuosa ejecución de los trabajos indicados.

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las entibaciones se entiende comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo especificación en contra en el Presupuesto.

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos nivelados y limpios por completo.

Será por cuenta del Contratista, salvo especificación en contra en el Presupuesto, los entubamientos de regatas y cunetas durante la duración de la obra, bombeos y agotamientos de la zanja o excavación para garantizar un trabajo en seco que asegure la calidad de la obra.

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, debiendo rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.

Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán reutilizar o transportar a vertedero, en las condiciones que exige el Real Decreto 105-2008 de Gestión Residuos de la Construcción (RCD), estando incluido en el precio de la excavación la carga sobre camión y la descarga. El destino final de los mismos será el que se especifique en el Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección de Obra.

En cuanto a las condiciones de seguridad en el trabajo se dispondrán las señalizaciones de información de las obras exigidas por la Diputación Foral de Navarra.

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación, de la Normativa sobre Seguridad y Salud en el Trabajo.

Será por cuenta del Contratista, salvo especificación en contra en el Presupuesto, la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías da cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, telefonía, saneamiento, etc. Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, tanto si figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente. La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta descubrir totalmente el tramo afectado.

En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales necesarias para efectuar un acopio separado, dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa de tierra vegetal que se extraiga de la zona superior de la excavación en las zonas de cultivo, así como las necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de excavación.

Cuando la base de la zanja presente malas condiciones a juicio de la Dirección de Obra podrá prepararse una base granular aumentando para ello la profundidad necesaria de excavación con una anchura igual a la base de la zanja proyectada.

El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la Dirección de Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitirá el ejecutar excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse afectadas por condicionantes externos, ya sean climatológicos o de cualquier otro índole.

Medición y Abono

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen por m³, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del Presupuesto.

El criterio de aplicación de los precios de excavación, explanación y desmonte será el fijado en el Presupuesto de la Obra o, en su defecto, el indicado por la Dirección de Obra.

La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. El cálculo de volúmenes se realizará sobre la base de la anchura que tenga el fondo de excavación y taludes definidos en las secciones tipo de los planos de proyecto, adoptando como profundidades de tierra y roca excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado.

El contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección de Obra la aparición de roca en las excavaciones con tiempo suficiente y previo al relleno subsiguiente, tanto en explanaciones y desmonte como en apertura de zanjas y pozos, con objeto de que pueda definirse la superficie de separación tierra-roca que sirva para efectuar las mediciones correspondientes. La no observancia a la Dirección de Obra llevará consigo que se cubique como si fuese tierra toda la excavación realizada.

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección de Obra antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura válidos para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos.

En los precios unitarios de excavación están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la explanación, o el desmonte, incluyendo:

- El refino de las superficies aunque sea realizado manualmente.

- Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivo, se considerarán incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y detonante; todo lo cual será de competencia y a cargo del contratista y bajo su responsabilidad. También se incluyen la excavación posterior del material volado y las operaciones de limpieza de escombros proyectado en los terrenos colindantes.

- Las entibaciones puntuales necesarias por razones de seguridad.

- Labores de agotamiento del agua en la excavación en tanto ésta se encuentre abierta.

- Los trabajos de carga a camión y descarga de materiales sobrantes.

- El establecimiento de barandillas, rampas de escape y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos.

- El apeo y reparación de las conducciones de agua, telefonía, electricidad, saneamiento o cualquier otro servicio o servidumbre que se descubran al ejecutar las excavaciones.

En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección de Obra. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización expresa por escrito de la Dirección de Obra.

Determinación de la cota absoluta de roca:

En base al Anejo geológico-geotécnico del proyecto, la cota de roca en cada perfil se determinará aplicando la siguiente definición:

Se entiende por límite de excavabilidad entre tierras (o terreno de transición) y roca, a la cota de rechazo (Nb>100 golpes/ para 20 cm. avance) de la puntaza del ensayo de penetración DSPH.

La cubicación de proyecto está efectuada en base al Estudio geotécnico y de reconocimiento real del terreno (calicatas y penetrómetros efectuados), con un valor estimado para cada perfil de la cota absoluta de roca. Este valor, que se estima algo por encima del probable, se modificará por el valor tomado en obra, puesto que la cota de roca de proyecto se basa en datos puntuales discontinuos, a diferencia de los datos continuos que se obtendrán con las excavaciones en zanja.

La banda de ocupación temporal, paralela a la tubería, solo le da derecho, al Contratista Adjudicatario, a poder pasar la maquinaria de obra por dicha banda, por tanto, todos los caminos de acceso a las obras, así como la retirada de la tierra vegtal, la reposición de la misma una vez terminada la obra, el despedregado, etc,.., correrán a cargo del Contratista Adjudicatario debiendo dejar el terreno en iguales o mejores condiciones que el que originalmente había antes de las obras. Únicamente serán de abono los trabajos realizados en la superficie proyectada superior delimitada por las cabezas de talud de la zanja de la canalización.

IV.1.2. ZANJAS

La excavación de las zanjas de alojamiento de las tuberías y obras de fábrica, salvo indicación expresa de la Dirección Obra, deben realizarse en cada tramo, según los taludes especificados en la Memoria y Planos del Proyecto.

Con el fin de evitar sobrepresiones laterales y riesgos de desprendimiento de material suelto, el material extraído de la excavación no deberá acopiarse en el mismo borde de la zanja, sino que se dejará, al menos, una franja de guarda de 2 m., entre el acopio y la arista superior de la zanja.

Es importante devolver al terreno, su cohesión y uniformidad originales. Por ello, el terreno se compactará, alcanzando densidades del 95% del Proctor Modificado.

Durante el transcurso de la obra, la D.O. podrá ordenar las calicatas de reconocimiento del terreno que procedan, con antelación suficiente, para mantener o cambiar los taludes definidos en proyecto y las zanjas tipo de cada tramo.

Previa aprobación de la Dirección Técnica, los taludes definidos en Proyecto para zanjas y excavaciones, podrán modificarse. El criterio de la D.O., prevalente sobre el del proyecto, será el que deberá seguirse en la realización de la obra y en las mediciones que resulten.

La ejecución y las mediciones de abono de las excavaciones y zanjas mixtas (con roca en la parte inferior y tierras en la superior) se realizarán conforme a la zanja mixta tipo del proyecto (Roca; talud 1:5; Tierras; el indicado en planos para cada tramo), lo que supone que pueden existir taludes diferentes en una misma excavación, según el tipo de terreno a excavar. La D.O., en función de los tipos de terreno de cada capa diferenciada, N. F., alturas, etc., aprobará o modificará los taludes de proyecto.

Sólo cuando exista modificación, la D.O. indicará los nuevos taludes al Contratista, por lo que en caso de no realizar ninguna orden al respecto, la obra debe realizarse conforme a los taludes del proyecto.

El Contratista de la obra, deberá informar, a la mayor brevedad, a la Dirección Técnica de Obra, cuando observe la necesidad de incrementar la seguridad de las excavaciones.

Todas las zanjas verticales, se entibarán preceptivamente, a sección completa, utilizándose paneles de acero o similar que soporten con garantías las acciones laterales originadas en el tramo concreto de entibación.

Por razones de seguridad, en un mismo tramo de obra, no permanecerán abiertos en el mismo instante más de 400 m. de longitud de zanja.

Ningún tramo de zanja permanecerá abierto más de 20 días naturales. En caso contrario, la D.O. estará facultada para ordenar el retaluzado de la zanja, con cargo al Contratista y sin que suponga mayor medición de abono.

En el caso de excavación de zanjas con menor talud (más verticales), que las definidas por el Proyecto o por la D. Obra, la medición de abono quedará a criterio de la D. Técnica, quien, en el caso de reiterado incumplimiento en la ejecución de una correcta excavación, abonará la excavación realmente realizada (inferior a la proyectada u ordenada), disponiendo las sanciones establecidas al efecto.

Dentro del precio de la excavación se incluye el agotamiento de las zanjas, (bombeo de aguas freáticas o pluviales), así como la entibación no sistemática de tramos concretos, que requieran una entibación por razones de seguridad. Asimismo se incluyen las catas de reconocimiento del terreno efectuadas al objeto de poder conocer sus características y estabilidad y definir así, en función del terreno existente, los taludes de excavación más adecuados.

La posterior reposición de la capa superior de tierra vegetal, debe realizarse con tierra exenta de piedras o lajas de roca. Para ello, es preciso, que durante la excavación de la zanja, se separe esta capa en un cordón diferente al del resto de la excavación, de forma que se evite la mezcla de tierras de diferenciada calidad agrícola.

IV.1.3. DEMOLICIONES DE OBRA DE FABRICA DE CUALQUIER TIPO

Ejecución

Previamente a la demolición, el Contratista comunicará a la Dirección de Obra el método de derribo que se propone utilizar, equipos mecánicos a utilizar y medidas de seguridad previstas. En ningún caso se iniciarán los trabajos de demolición sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.

Será de aplicación el artículo 301.4 del PG-3.

Medición y Abono

Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de excavación.

Será de aplicación el artículo 301.5 del PG-3.

IV.1.4. DEMOLICIONES DE FIRMES DE CARRETERAS, CAMINOS Y ACERAS

Ejecución de las obras

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes, evitar daños en las construcciones próximas existentes y minimizar las molestias a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la superficie de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que quede una línea de fractura rectilínea y uniforme.

Medición y abono

Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las demoliciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de excavación.

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m²), de acuerdo con las unidades de obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e incluyen todas las operaciones necesarias para su total realización, corte del pavimento con máquina, señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico, carga sobre camión, transporte y descarga en lugar de almacenamiento provisional, etc.

IV.1.5. ACOPIOS TEMPORALES DE TIERRAS

Definiciones

Se definen como acopios temporales de tierras aquéllos realizados en áreas propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por ésta última, con materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior utilización en la obra.

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo responsabilidad del Contratista su localización y el abono de los cánones correspondientes, en caso necesario.

Ejecución de las obras

Las condiciones de descarga en zonas de acopio temporales no son objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el propietario de los terrenos destinados a tal fin. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público o privado, que utilice durante las operaciones de transporte a vertedero o lugar de acopio.

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas para los acopios temporales. Estos se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y ejecución de las obras o perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar de empleo.

Medición y abono

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios unitarios, todas las operaciones descritas.

El Contratista está obligado a restituir a su estado original, sin que proceda abono por dicho concepto, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya dispuesto del material depositado en ellas.

Si por necesidades de obra parte del material existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará al vertedero que se especifique en el Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección de Obra.

IV.1.6. TRANSPORTE A VERTEDERO

Definición

Se entienden como tales las operaciones de transporte de materiales procedentes de excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y haya sido autorizado previamente por la Dirección de Obra.

Ejecución

Las operaciones de transporte a vertedero se realizarán con las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro, etc.

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de obra depositen restos de tierra, barro, etc. en las calles, carreteras y zonas con tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos a su cargo.

El transporte de residuos se debe realizar en las condiciones que exige el Real Decreto 105-2008 de Gestión de Residuos de la Construcción (RCD). El destino final de los mismos será el que se especifique en el Plan de Gestión de Residuos aprobado por la Dirección de Obra.

Medición y Abono

Se abonarán por metro cúbico y kilómetro (m^3.km) al precio indicado en el cuadro de precios del presupuesto.
La distancia se medirá en un único sentido de ida y se ajustará a la menor distancia por carretera desde el origen del residuo hasta la localización del vertedero o gestor indicado en el Plan de Gestión de Residuos aprobado. El precio incluye el coste del viaje de ida y vuelta.
Las excavaciones y/o demoliciones se medirán sobre perfil, estando contemplado el coste añadido del esponjamiento dentro del precio de transporte.

IV.1.7. RELLENOS DE ZANJAS

Definición, alcance y fases para el relleno de la zanja

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, compactación y todas las operaciones necesarias para su realización.

Se distinguirán en principio tres fases de relleno:
a) Relleno de asiento y recubrimiento de tuberías
b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a colocar el relleno de acabado (el firme o la tierra vegetal).
c) Relleno de acabado, consistente en la reposición de la tierra vegetal o de un firme para circulación rodada.

Los materiales a emplear en cada una de las fases de relleno serán:

a) Áridos para asiento y Recubrimiento de tuberías

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra caliza de cantera.

El coeficiente de desgaste del material pétreo, medido por el ensayo de Los Ángeles, según UNE-EN 1097-2, será inferior a treinta (30) y su equivalente de arena determinado según UNE-EN 933-8 será superior a cincuenta (EA > 50).

En todo caso estarán exentos de arcilla, margas u otros materiales extraños.

La gravilla deberá ser bateada y retacada para formar un apoyo efectivo de cada tubo. Ésta recubrirá completamente el tubo hasta 10 cm. por encima de su clave.

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.

Fracciones granulométricas a utilizar:

- Tuberías de Saneamiento:
  - Gravillín 3-5 o 5-8 mm para tuberías de PVC de diámetros comprendidos entre 160 y 500 mm
  - Gravillín 5-8 o 8-12 mm para tuberías de Hormigón de diámetros comprendidos entre 300 y 600 mm
  - Grava 12-19 mm para tuberías de Hormigón de diámetros igual o superiores a D800 mm
- Tuberías de Abastecimiento:
  - Gravillín 3-5 o 5-8 mm para tuberías de abastecimiento

a) Relleno de cubrición

Los materiales a emplear vendrán fijados en los Planos o Memoria.

En los primeros 90 cm. sobre el relleno de recubrimiento de gravilla, se distingue una capa de transición. En esta capa, con objeto de no cargar la tubería de forma excesiva, se compactará al 90% del P.M., puesto que la compactación supone una situación crítica a controlar en la mayoría de las tuberías de gran diámetro.

1. **Relleno con tierras**

   Cuando se utilicen las definiciones de suelos inadecuados, tolerables, adecuados o seleccionados, éstas harán referencia al Art. 330 del PG-3.

   En caso alternativo la calidad del relleno se fijará en Planos y Presupuesto así como la procedencia de estos materiales.

   Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLT-108/92, NLT-111/78, NLT-118/59 y NLT-152/72.

   La capa se compactará al 95% del P.M.

2. **Relleno con Zahorras artificiales**

   Se utilizarán zahorras artificiales preparadas mediante machaqueo de piedra caliza de cantera.

   Se contempla la posibilidad de utilización de dos curvas granulométricas distintas:

   - Todouno de 2ª: hace referencia a una curva granulométrica continua con tamaño máximo inferior a 60 mm, con las condiciones granulométricas del apartado 333.4.2 del PG-3.

   - Todo uno de 1ª: hace referencia a una curva granulométrica comprendida dentro del huso ZA20 ó ZA25, como se definen en el apartado 510.3 del PG-3.

   En lo que respecta a forma, dureza, limpieza y plasticidad, se estará a lo dispuesto en el Pliego PG-3 art. 510.

   El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.

   La capa se compactará al 98% del P.M.

3. **Relleno con Zahorras naturales**

   Se utilizarán zahorras naturales, con áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos granulares, o una mezcla de ambos

   La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZN40 o similar. En lo que respecta a forma, dureza, limpieza y plasticidad, se estará a lo dispuesto en el Pliego PG-3 art. 510.

El Contratista propondrá al Director de las Obras el material a utilizar, y antes de su empleo deberá contar con la aprobación explícita de éste.

La capa se compactará al 95% del P.M.

b) Relleno de acabado

El relleno en la última capa consistirá en la reposición de la capa original en las mismas condiciones de calidad.

En el caso de la capa de tierra vegetal, se repondrá la capa de 50 cm con la tierra vegetal retirada previamente en la excavación. La misma se adecuará al laboreo mediante ripado y retirada de piedras que lo dificulten.

Ejecución

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección de Obra.

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin.

La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de los mismos según la situación en el terreno y el tipo de conducción. Se detalla en los planos las diferentes clases de relleno.

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con el mismo de forma simultánea en ambos lados.

Ensayos

El Programa de Control de Calidad aprobado por la Dirección de Obra establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos de compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. El costo de estos ensayos de control sistemático figurará en capítulo aparte del Presupuesto de la obra.

No se autoriza el relleno de una capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la capa inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección de Obra.

Los ensayos para la obtención del Proctor Modificado (PM), se realizarán según la UNE 103501

El relleno y consolidación de zanjas se realizará una vez colocada la tubería y efectuadas las pruebas correspondientes.

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección de Obra a cargo del Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la propia reparación puedan producirse.

Se observarán asimismo las especificaciones al respecto contenidas en el art. 321 del PG-3.

Medición y Abono

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m³ deducidos de planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de Precios nº 1.

Estos precios abarcan todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material cuando se exija o sea necesario.

Estos precios se aplican también al relleno de tierra vegetal que deberá realizarse, cuando así se exija en Planos, en la última capa de relleno. Esta operación incluye todas las operaciones necesarias para esta unidad de obra.

Por último en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposición del terreno en sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y remoción de tierras.

La banda de ocupación temporal, paralela a la tubería, solo le da derecho, al Contratista Adjudicatario, a poder pasar la maquinaria de obra por dicha banda, por tanto, todos los caminos de acceso a las obras, así como la retirada de la tierra vegtal, la reposición de la misma una vez terminada la obra, el despedregado, etc,.., correrán a cargo del Contratista Adjudicatario debiendo dejar el terreno en iguales o mejores condiciones que el que originalmente había antes de las obras. Únicamente serán de abono los trabajos realizados en la superficie proyectada superior delimitada por las cabezas de talud de la zanja de la canalización.

IV.1.8. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Ejecución

Es la capa superior de tierra vegetal, en jardines y fincas de cultivo, con material exento de piedras de tamaño superior a 20 mm

El aporte de material procederá de préstamo o de la propia excavación. Para ello, es preciso, que durante la excavación, se separe esta capa en un cordón diferente al del resto de la excavación, de forma que se evite la mezcla de tierras de diferenciada calidad agrícola.

La tierra vegetal a suministrar para su colocación en obra habrá de ser de excelente calidad, procedente de la capa superficial de un terreno, con un contenido en materia orgánica no inferior a un 5% y un contenido en arcilla no superior a un 30%.

El material estará lo más disgregado posible no admitiéndose la presencia de terrones o tormos. No contendrá piedras ni elementos extraños, así como ramas o vegetación.

La procedencia deberá ser notificada previamente a la Dirección de Obra que podría exigir la presentación por escrito de la autorización del propietario de los terrenos para la retirada de esta tierra vegetal.

El extendido de la tierra vegetal debe realizarse sobre el terreno ya remodelado con maquinaria que ocasione una mínima compactación.

Para proporcionar un buen contacto entre las sucesivas capas de material superficial se escarificará la superficie antes de cubrirla.

Si el material sobre el que se va a extender estuviera compactado habría que realizar un escarificado más profundo (40 a 50 cm), para prevenir la laminación en capas, mejorar la infiltración y el movimiento del agua, evitar el deslizamiento de la tierra extendida y facilitar la penetración de las raíces.

La tierra vegetal normalmente se extiende mediante un bulldozer o una motoniveladora, teniendo en cuenta que si se utiliza maquinaria pesada, el extendido se realizará de manera que se evite que los vehículos la compacten. Una vez se haya procedido al extendido de la capa de tierra vegetal, se efectuará un ligero laboreo para igualarla y esponjarla.

Medición y Abono

Se abonará por superficie ejecutada en proyección horizontal en m² o por volumen en m³ (obtenido multiplicando la superficie real en planta extendida por el espesor indicado en Planos y Mediciones de Proyecto), de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1.

La banda de ocupación temporal, paralela a la tubería, solo le da derecho, al Contratista Adjudicatario, a poder pasar la maquinaria de obra por dicha banda, por tanto, todos los caminos de acceso a las obras, así como la retirada de la tierra vegtal, la reposición de la misma una vez terminada la obra, el despedregado, etc,.., correrán a cargo del Contratista Adjudicatario debiendo dejar el terreno en iguales o mejores condiciones que el que originalmente había antes de las obras. Únicamente serán de abono los trabajos realizados en la superficie proyectada superior delimitada por las cabezas de talud de la zanja de la canalización.

IV.1.9. ESCOLLERAS

Materiales

Los materiales pétreos a emplear procederán de cantera autorizada y obtenidos por machaqueo de piedra caliza.

La utilización de material rocoso procedente de la excavación deberá ser aprobada expresamente por la Dirección de Obra.

En cualquier caso, las piedras a utilizar deberán tener la superficie rugosa. No se admitirán piedras o bloques redondeados. La piedra estará limpia de raíces o tierras, será homogénea en su aspecto exterior, no tendrá forma lajosa y presentarán aristas vivas al ser rotas. No presentará cavernas ni diaclasas, ni tampoco inclusiones de otros materiales.

En general serán adecuadas para escollera las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas resistentes, sin alteración apreciable, compactas y estables químicamente frente a la acción de los agentes externos, y en particular frente al agua.

La densidad seca, de acuerdo con la norma NLT 153/58, será superior a dos mil quinientos (2500) kilogramos/m³.

El Director de Obra tendrá facultad para rechazar materiales para escollera.

La granulometría de la escollera tipo vendrá limitada por:

-los elementos de mayor tamaño no excederán de 1.500 kilogramos de peso

-no se admitirán partidas que contengan más de un 25% de su peso por elementos de menos de doscientos (200) kilogramos.

Las condiciones anteriores corresponden al material colocado.

El Proyecto o, en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir tamaños máximos superiores.

Ejecución

Las zanjas de cimentación y demás excavaciones necesarias deberán realizarse por el Contratista de acuerdo con el Proyecto y las prescripciones del Director de las Obras.

Los taludes a ser protegidos por la escollera deberán presentar una superficie regular, y estar libres de materiales blandos, restos vegetales y otros materiales indeseados.

Se dispondrá una capa filtro sobre la superficie preparada del talud, cuidando de que no se produzca la segregación del material. Se podrá prescindir de la capa filtro cuando así lo exprese el Proyecto, atendiendo a que la escollera tenga como única misión la protección del talud frente a la meteorización y no sean de prever flujos de agua.

La piedra se colocará de forma que se obtengan las secciones transversales indicadas en el Proyecto. No se admitirán procedimientos de puesta en obra que provoquen segregaciones en la escollera, ni daño al talud o capa de filtro.

El frente de la escollera será uniforme y carecerá de lomos o depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen cavidades respecto de la superficie general.

Caso de que por motivos estructurales o de estabilidad de escollera (elevada altura, etc.) fuese necesario un rejunteo con hormigón la Dirección de obra especificará la proporción de volumen escollera/hormigón necesaria

Medición y Abono

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra, medidos sobre plano de obra ejecutada.

El precio incluirá la p.p. de excavación para cimentación de la escollera. El material de filtro granular y el hormigón de rejunteo, cuando no estén incluidos en el precio de la escollera, se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente colocados en obra.

IV.1.10. ENTIBACIONES

Definición

La entibación utilizada en obra será **cuajada** (revestirá el 100% de la superficie a proteger).

Materiales

Será realizada con paneles metálicos, separados por travesaños metálicos de longitud regulable mediante pistones metálicos extensibles, susceptibles de alargamiento para ajustarse a la anchura de la zanja.

Deberán estar diseñados para cumplir con su misión resistente y estar dotados de los elementos necesarios para su manejo con garantías de fiabilidad y seguridad.

Deberán cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN 13331

Ejecución

El sistema de entibación a utilizar en cada zanja, deberá ser determinada por la Dirección Facultativa a propuesta de la Jefatura de obra, en función de las características del terreno deducidas del análisis geológico del mismo.

El Contratista presentará a la Dirección de Obra una propuesta de sistema de entibación a utilizar. Dicha propuesta deberá contener, al menos:
Estudio de presión de cálculo del terreno (e_d) sobre la entibación
Manual de instrucciones del fabricante, con el contenido mínimo que marca la UNE-EN 13331

Deberá comprobarse que la presión de cálculo del terreno (e_d) no supere la resistencia límite del sistema de entibación propuesto (R_d según UNE-EN 13331) determinada por el fabricante. La resistencia característica mínima del sistema debe ser $R_{k,\,min}$ = 30 KN/m^2

En el cálculo de la presión efectiva horizontal del terreno de cálculo (e_d), deberá considerarse la entibación como estructura flexible que movilizará el empuje activo del suelo. Salvo justificación en contra, se considerará:

- Datos del terreno:
  - peso específico ≥1,80 t/m3
  - ángulo de rozamiento interno ≤25º
  - cohesión del terreno nula
- Sobrecarga por tráfico pesado de, al menos, 15 KN/m2.
- Coeficiente de seguridad para las acciones ≥1,50

El diámetro exterior del tubo determinará:
- La anchura de la zanja. La anchura mínima se determinará atendiendo al Ø ext. del tubo y a la profundidad de la zanja.

Anchura mínima según la profundidad de la zanja	
Profundidad (en m)	Mínima anchura (en m)
hasta 1,50 m	b=0,65
de 1,50 hasta 2,00 m	b=0,75
de 2,00 hasta 3,00 m	b=0,80
de 3,00 hasta 4,00 m	b=0,90
más de 4,00 m	b=1,00

Anchura mínima según el Øext. del tubo	
Ø ext. del tubo (b, en m)	Mínima anchura (en m)
hasta 0,40 m	b=d+0,40
de 0,40 hasta 0,80 m	b=d+0,70
de 0,80 hasta 1,40 m	b=d+0,85
más de 1,40 m	b=d+1,00

- La disposición de los codales. La distancia entre los codales transversales inferiores y la clave de la tubería a colocar debe ser al menos 30 cm.

Se emplearán cajones de entibación (sistema de entibación tipo ES-B-SV según norma UNE-EN 13331) con zanjas de hasta 4 m de profundidad. En suelos cohesivos, se podrán montar en el exterior de la zanja e introducirlos posteriormente hasta el fondo. En suelos no cohesivos, se realizará la entibación conforme se produce la excavación de la zanja.

En profundidades superiores a 4 m, debe utilizarse un sistema de entibación con corredera, de tipo doble, con bastidor de soporte (tipo RD según norma UNE-EN 13331). Las mismas deben colocarse hincándose a medida que se va efectuando la excavación, añadiendo los paneles verticales suplementarios precisos a medida que se va profundizando la excavación.

Para evitar la caída de piedras u otros objetos desde el borde superior de la zanja, la entibación metálica deberá sobresalir al menos 25 cm del terreno natural.

En la parte superior de la entibación se colocarán barandillas, de modo que se proteja a los trabajadores del riesgo de caídas al interior de la zanja. Las mismas deberán cumplir la norma UNE-EN 13374. En los cajones de entibación, dichas barandillas podrán estar unidas a la estructura del mismo. Se podrá suplir esta medida mediante el uso de entibaciones que sobresalgan al menos un metro sobre el terreno.

En la entibación de tramos cortos, en excavaciones de formas irregulares, o donde se presenten repetidamente conducciones transversales, se podrán emplear entibaciones con tablestacas guiadas, con un zuncho resistente en la parte superior que soporte los empujes laterales del terreno.

Cualquier sistema de entibación deberá contar con la aprobación expresa de la Dirección de Obra antes de su utilización en obra.

Medición y Abono

Salvo en caso de estar especificado en presupuesto, el importe de las entibaciones necesarias para la ejecución de la obra se considerará incluido en el precio de excavación.

Cuando así lo contemple el Presupuesto, se medirán y abonarán los m² reales de panel de entibación empleado, incluyendo en el precio las operaciones de transporte a obra y posterior retirada, almacenaje, trasiego y colocación de los paneles, la p.p. de grúa para su manejo y retirada, incluso incrementos de costes en excavaciones, rellenos y colocación de tuberías.

En el caso de zanjas la entibación es doble y dispone de paneles a ambos lados del talud por lo que se medirá y abonará los m² reales de un solo talud vertical de zanja resultante de multiplicar la profundidad de la zanja protegida por la longitud de entibación empleada.

En ningún caso se medirá como superficie de entibación la parte de la misma que sobresale sobre el terreno a modo de protección contra caídas de personas u objetos.

IV.2. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

IV.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con carácter prevalente sobre otros artículos de este Pliego, las características de los materiales en estructuras de H.A. serán:

Hormigón limpieza	HL-150/B/20 y HNE-15/B/20
Hormigón no estructural	HM-20/B/IIa en aceras, base de firmes y en recubrimientos y protecciones de tuberías.
Hormigón estructural	HM-25/B/20/I o HA -25/B/20/IIa en contrarrestos HA-35/B/20/IV + Qc en registros de colectores HA-30/B/20/IIa en arquetas de abastecimiento.
Control hormigones	Estadístico
Aceros barra corrugada	B 500 S
Acero malla electrosoldada	B 500 S
Control aceros:	Normal
Separadores	En cuadrícula de 60x60 cm. Material plástico, de contorno rígido dentado, mínimo 8 nervios radiales
Control separadores:	Normal

IV.2.2. HORMIGONES

MATERIALES

Áridos

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se indican en el artículo correspondiente de la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural (EHE).

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de Obra podrá establecer su clasificación disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes.

El tamaño del árido se ajustará a las especificaciones indicadas en el Cap. 6 de la EHE.

Agua

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones en general, cumplirá las condiciones que prescribe la Instrucción EHE.

Cemento

Se usará cemento Tipo CEM-II o CEM-III, cumpliendo las condiciones prescritas en la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) y las indicadas en el artículo correspondiente de la citada Instrucción EHE

En los casos que determine el Proyecto o en su caso la Dirección de Obra, el cemento a emplear cumplirá las condiciones de los resistentes a las aguas selenitosas u otros cementos especiales.

Hormigones

Se prevén los siguientes hormigones:

A. Hormigón de limpieza HL-150/P/20 para limpieza de cimentaciones y presoleras.

B. Hormigón no estructural HNE-15/P/20 en rellenos y recubrimientos

C. Hormigón estructural HM-25/B/20/I o HA -25/B/20/IIa en contrarrestos.

D. Hormigón armado HA-25/B/20/IIa u hormigón en masa HM-20/B/20/I en contrarestos.

E. Hormigón armado HA-30/B/20/IIa en arquetas de registro (según detalle).

F. Hormigón HA-35/B/20/IV+Qc para armar en cimientos, losas, soleras, alzado de muros y demás elementos en contacto con aguas residuales.

En cuya denominación, el número indica la resistencia característica específica del hormigón a comprensión a los veintiocho (28) días, expresada en MPa. (N/mm².)

La consistencia de todos los hormigones será blanda, salvo que a la vista de ensayos al efecto, la Dirección de Obra decidiera otra cosa, lo que habría que comunicar por escrito al Contratista, quedando éste obligado al cumplimiento de las condiciones de resistencia y restantes que especifique aquélla de acuerdo con el presente Pliego.

La consolidación del hormigón se hará mediante vibradores en número y potencia suficientes.

Aditivos para morteros y hormigones

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero.

La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra.
Se clasifican en:

A. Aireantes
B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D.
C. Retardadores del fraguado.
D. Aceleradores del fraguado.
E. Otros aditivos químicos.

Las condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos son:

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras.

Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra.

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable.

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico.

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo.

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo plazo y productos siderúrgicos.

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez (10) horas.

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto.

Impermeabilizantes

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo.

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad.

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a base de proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra.

Plastificantes

Cumplirán las siguientes:

A. Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón.

B. El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos.

C. No deben aumentar la retracción de fraguado.

D. Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la dosificación del cemento (menos del uno coma cinco por ciento (1'5%) del peso del cemento).

E. Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales para la calidad del hormigón.

F. A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%).

G. No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%).

H. No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se prohíbe el empleo de detergentes constituidos por alquil-aril-sulfonatos de sodio o por alquisulfatos de sodio.

Retardadores

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones con varias capas de vibración.

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo.

No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para éste.

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización explícita del Director de Obra.

Otros aditivos

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra.

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los que apunte la Dirección de Obra.

La utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales.

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto desencofrado o puesta en carga.

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes otras medidas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción de prolongada duración.

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra.

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón mortero. Queda prescrita la utilización de gas-oil.

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del hormigón o mortero.

EJECUCIÓN

Consideraciones generales

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón estructural EHE y las observaciones de la Dirección de Obra.

El Nivel de Control para los Hormigones será el que se define en Planos y Memoria.

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección de Obra, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón.

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata.

El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el capítulo 15 de la Instrucción EHE.

Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una resistencia de entre 0'9 y 1'0 fck se estará a lo dispuesto en la EHE, con la imposición de las siguientes sanciones económicas:

$$\boxed{Pa = (0.7 + 3 \times (k - 0.9)) \times P}$$

donde: Pa = precio abono

P = Precio proyecto

$$K = \frac{Fck\ldots resultado}{Fck\ldots proyecto}$$

En caso de resistencia inferior al 90% de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar.

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el cap.15 de la Instrucción EHE.

El Contratista si así se ordena suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos.

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHE.

Ejecución de las Obras

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:

* Preparación del tajo:

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado.

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia.

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos pre elaborados.

Se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

No obstante estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de hormigón de rasanteo HL-150/C/TM para limpieza e igualación, y se cuidará de evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado.

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.

* Transporte del hormigón

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactación.

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante.

* Puesta en obra del hormigón

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales: pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las medidas necesarias para

impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación de obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación.

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2'50 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa.

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares.

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída de menos de 2'50 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera. El importe del bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra.

* Compactación del hormigón

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación.

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie.

Si se avería uno de los vibradores empleado y no se puede sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonado, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o sustituido el vibrado averiado.

* Juntas de Hormigonado

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto.

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón.

En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de cemento que sean incompatibles entre sí.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su V^{O} B^{O} o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15).

* Acabado del hormigón

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos ni rugosidades.

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará con mortero especial aprobado por la D.F. del mismo color y calidad que el hormigón, para lo cual se pintará adecuadamente tras su puesta en obra.

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón.

* Observaciones generales respecto a la ejecución

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio.

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces (empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.).

* Desencofrado

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio.

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay.

A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula expresada en la Instrucción EHE.

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias.

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura.

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.

* Curado

El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas.

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será impuesta por la Dirección de Obra en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto.

Medición y Abono

Serán de abono al adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con sujeción a planos del proyecto o las modificaciones introducidas por la Dirección de Obra en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los planos de detalle y órdenes escritas.

Se abonarán por su volumen real en m³ o superficie real en m²., de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1.

En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se requieran.

El precio de m³ de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de medición que sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente.

También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la colocación de juntas de dilatación y estanquidad, sujeción y correcto hormigonado de tuberías, pasamuros, etc.

En el caso del hormigón de solera, el precio del m³, incluye la formación de pendiente así como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida. También incluye, en su caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento.

Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado.

IV.2.3. MUROS

Ejecución

El hormigonado de los muros se hará de una sola vez o entre las juntas de construcción que se expresa en los planos. En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra, para su V^{o} B^{o} o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15).

Su puesta en obra será por bombeo y se efectuará de tal forma que la velocidad de ascensión del hormigón no comprometa la seguridad del encofrado.

Para muros de más de 3 metros se recomienda no rebasar el ascenso en más de 1 metro por hora.

El vertido se hará procurando formar una superficie inclinada en la masa del hormigón, y se habrá de contar con la precaución y medios necesarios para evitar la aparición de juntas de hormigonado.

En el caso de muros de contención de tierra, éstos se ejecutarán por bataches en el caso de que así figure en Planos o lo exija la Dirección de Obra.

Medición y Abono

Se abonarán por su volumen real en m³ o superficie real en m²., de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Nº1.

IV.2.4. ARMADURAS PASIVAS

Materiales

El acero será soldable, tendrá un límite elástico característico como mínimo igual a 400 MPa. (4000 Kg/cm².): acero B 400 S, o 500 MPa. (5000 kg/cm².) : acero B 500 S según se especifique en la Unidad o en los Planos, y cumplirá lo previsto en la Instrucción EHE. Asimismo estará en posesión de Sello de Calidad, debiendo llevar grabadas las marcas de identificación reglamentarias.

El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos y diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava o zahorras sobre el que se situarán las barras. En ningún caso se admitirá acero de recuperación.

Ejecución

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

No se admitirá el soldado de barras entre sí, salvo en el caso de mallazos pre elaborados.

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso.

Los empalmes y solapes serán los indicados en los Planos. En caso contrario se dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción EHE.

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de un centímetro.

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos igual al diámetro de la barra, y en todo caso lo que se marque en planos.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener la aprobación de las armaduras colocadas por la Dirección de Obra.

En el caso de tener que recurrir a operaciones para el modificado de posición de barras, introducción de nuevas barras en hormigón endurecido, etc., se deberá contar en todo caso con la aprobación de la Dirección de Obra del método que se proponga.

Medición y Abono

Se medirá por kg. de hierro en peso teórico y se abonará al precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1, en el que se incluye la parte proporcional de solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores, soportes, setas o capuchones de plástico y cualquier otro medio de protección.

IV.2.5. MALLAS ELECTROSOLDADAS

Materiales

Se entiende por malla electrosoldada la armadura formada por la disposición de barras corrugadas o alambres corrugados, longitudinales y transversales, de diámetro nominal igual o diferente, que se cruzan entre sí perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, realizada en un proceso de producción en serie en instalación industrial ajena a la obra, que sea conforme con lo establecido en UNE-EN 10080.

La calidad y condiciones generales serán las especificadas en la Instrucción EHE, aceros B 400 S o B 500 S, según se indique en las unidades de obra o en planos.

La designación de las mallas electrosoldadas será conforme con lo indicado en el apartado 5.2 de la UNE-EN 10080

Ejecución

Las mallas electrosoldadas se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las

oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido y compactación del hormigón permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección de Obra, la aprobación de las mallas electrosoldadas colocadas.

Medición y Abono

En el caso del acero en mallazo electrosoldado para armado de forjados y soleras se medirá por m² previstos en planos y/o mediciones debidamente autorizadas y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto incluyendo colocación, solapes, pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y soportes, setas o capuchones de plástico y cualquier otro medio de protección.

IV.2.6. JUNTAS EN EL HORMIGÓN

Ejecución

Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación. A su vez las juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o se inducirán en la masa del hormigón mediante corte.

En los casos en que se exija estanquidad a la junta se colocará una banda de P.V.C. de acuerdo a lo reflejado en planos y se sellará superficialmente.

Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá proceder a su encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras así como de la banda de P.V.C., no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de barras o de la junta.

Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada.

En los casos en que se prescriba se colocará un berenjeno exterior para marcar dicha huella en el paramento.

En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la superficie, éste se hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 24 horas del hormigonado. Las dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos y su importe, salvo disposición en contra, se considera incluido en el m³ de hormigón.

Medición y Abono

Todos los costes de estas operaciones de encofrado, marcado o serrado de juntas, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto, se consideran incluidos en el precio de metro cúbico de hormigón.

IV.2.7. ENCOFRADOS

MATERIALES

Encofrados de madera de tabla

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. En general será tabla de dos y medios (2'5) centímetros. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o que la Dirección de Obra determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4'5) a cinco (5) centímetros y necesariamente cepillado.

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente resistencia para el uso a que se destinarán.

Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación específica previa de la Dirección de Obra.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de madera machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales. El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada.

Los encofrados de madera de tabla para paramentos no vistos podrían constituirse con tabla suelta, aunque en todo caso se dispondrán los medios adecuados para evitar la pérdida de lechada.

Encofrados de madera aglomerada

En los paramentos definidos en Planos y Memoria se utilizará como encofrado madera en paneles de aglomerado de espesor no inferior a 16 mm Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de los paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada. El número de puestas máximo será de diez.

La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular.

Encofrado metálico

Tanto por prescripción del Proyecto como por propuesta del Contratista aceptada por la Dirección de Obra, se utilizarán encofrados en base de chapa metálica. Dichos encofrados deberán contar con la rigidez suficiente para evitar abombamientos y desplazamientos, no admitiéndose, por otro lado, elementos que presenten abolladuras o desgarros.

En todo caso la Dirección deberá aprobar el sistema de encofrado, pudiendo exigir en todo momento mayores dimensiones de paneles, disposición de los mismos, etc. No se admitirán orificios en los paneles que den lugar a pérdidas de lechada, por lo que deberán presentar los paneles una superficie cerrada.

Elementos de encofrado

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes:

- Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos elementos podrán ser de madera aunque es preferible que sean de material plástico, debiendo fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas aristas y líneas que fije la Dirección de Obra, debiendo poner especial cuidado en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

- Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el recubrimiento rígido.
  Deberán estar constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, y no inducir corrosión de las armaduras. Deben ser al menos tan impermeables al agua como el hormigón, y ser resistentes a los ataques químicos a que se puede ver sometido este.
  Independientemente de que sean provisionales o definitivos, deberán ser de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber sido específicamente diseñados para este fin.

  Si los separadores son de hormigón, éste deberá ser, en cuanto a resistencia, permeabilidad, higroscopicidad, dilatación térmica, etc., de una calidad comparable a la del utilizado en la construcción de la pieza. Análogamente, si son de mortero, su calidad deberá ser semejante a la del mortero contenido en el hormigón de la obra.
  Cuando se utilicen separadores constituidos con material que no contenga cemento, aquellos deberán, para asegurar su buen enlace con el hormigón de la pieza, presentar orificios cuya sección total sea al menos equivalente al 25% de la superficie total del separador.

  Se prohíbe el empleo de madera así como el de cualquier material residual de construcción, aunque sea ladrillo u hormigón. En el caso de que puedan quedar vistos, se prohíbe asimismo el empleo de materiales metálicos. En cualquier caso, los materiales componentes de los separadores no deberán tener amianto.

  Estos elementos deberán ser de mortero de cemento cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas las piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla de alzados. Queda prohibida la utilización de piezas cúbicas en alzados.

  Para carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores, con forma de disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de D14. En todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

  Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente.

  El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser suficiente para cumplir su cometido no debiendo colocarse más de los necesarios.

- Espadas o flejes perdidos para atirantamiento de encofrados en alzados.
  Como norma general queda prohibida la utilización de latiguillos para el atirantamiento de encofrados entre sí. Para este cometido podrán utilizarse espadas recuperables o flejes perdidos.

Las espadas recuperables podrán ser de modelos comerciales o con barra o alambre de armar; En ambos casos se alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos de PVC embutidos en el hormigón; Estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su misión y de rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado; Deberán contar en su extremo con piezas troncónicas plásticas que una vez retiradas favorezcan el sellado de estos orificios; Estos tubos plásticos deberán retirarse del núcleo del hormigón por calentamiento o tracción.

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical. Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los paramentos con lechada de forma que se dé el color de estos paramentos.

Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una vez hormigonado. De este tipo de tirantes solo se admitirán aquéllas que permitan un descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No se admite, pues, aquéllos que solo permiten el corte a ras de paramento de hormigón de la parte que sobresale.

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se consideran incluidos en el precio del encofrado.

EJECUCIÓN

Las cimbras y encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas, fijas y variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm para los movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto.

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m. se dispondrá el encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable.

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo de compactación previsto. Los distintos tipos de encofrados para cada paramento se reflejan en Planos o Memoria.

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón.

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares (metálicos o plásticos) en las aristas exteriores del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin embargo será exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se prevea en los planos o por orden de la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 5 mm en las líneas de las aristas. Su coste está incluido en el precio de m² de encofrado.

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para hormigonar de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón.

A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo.

MEDICIÓN Y ABONO

Los encofrados se medirán por m² de la superficie en contacto con el hormigón, con p/p. de puntales, sopandas, cuñas y demás elementos auxiliares, incluso el desencofrado posterior, considerando el nº de puestas. En todo caso se seguirá el criterio reflejado en las mediciones.

Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. necesarios para dar forma al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se consideran incluidos en el precio del m² de encofrado.

IV.2.8. PASAMUROS EN MUROS DE HORMIGON

Las juntas de tubos en muros de hormigón armado serán ELÁSTICAS e IMPERMEABLES.

Los detalles constructivos figuran en planos. En su defecto el proceso será:

- envolver la tubería con manta de fibra de vidrio de 25 mm de espesor

- sellado exterior e interior a base de:
  roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm
  imprimación previa de bordes
  sellado con poliuretano o mastic bituminoso en todo el perímetro de la junta.

Las juntas de tubos en muros de hormigón armado en que por sus características no sea posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el hueco existente entre el tubo y la obra de fábrica con mortero de relleno expansivo que cumpla las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-6.

El hueco a rellenar con dicho mortero será de tres centímetros (3 cm.) de espesor a todo lo largo y ancho del perímetro de unión.

IV.3. REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

IV.3.1. SANEO DE HORMIGÓN DETERIORADO

La preparación del sustrato de hormigón y de las armaduras debe permitir la correcta aplicación de los productos y sistemas, cumpliendo con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

Dependiendo del alcance del daño del hormigón, la preparación del soporte puede exigir la eliminación/demolición de una capa de hormigón de grosor variable. Se debe eliminar el hormigón débil, dañado y deteriorado y, donde sea necesario, el hormigón sano, por medios mecánicos adecuados o chorro de agua a alta presión.

El hormigón una vez preparado debe ser un hormigón sólido con una resistencia mínima a tracción de 1 N/mm^2 y sano.

Se admiten diferentes procedimientos de saneado. La elección del método apropiado irá en función de la extensión/dimensión del daño (área y profundidad) y de la localización (accesibilidad y posición).

Métodos de Saneo de hormigón deteriorado

a) Hidrodemolición: consistente en la aplicación de chorro de agua a presión controlada por equipo de hidrodemolicion formado por grupo de presión autónomo de 1.000 CV y caudales en punta de 256 litros/minuto, hasta completa eliminación de hormigones en mal estado con un espesor medio de 60 mm.

b) Picado: mediante un martillo y un cincel o con martillo neumático o eléctrico o mediante un desbastador.

c) Este método deja un acabado muy irregular y hay un riesgo medio-alto de producirse fisuras o micro roturas en el hormigón adyacente al preparado. Se deben considerar estos daños, que deberán subsanarse eliminando o consolidando esas zonas.

Excepcionalmente se podrá realizar un saneo por picado con la aprobación expresa previa de la Dirección de Obra.

Se ejecutará preferentemente mediante técnicas de hidrodemolición, ya que provocan menos daños en el hormigón circundante y consiguen el saneo y la limpieza del soporte en una sola operación.

El Director de las obras indicará las zonas donde se debe realizar la eliminación del material, el método de saneo y la profundidad a alcanzar en cada una de ellas en función del estado del paramento.

Mediante el método de la fenolftaleína se obtendrá una medida del avance de la carbonatación con objeto de guiar la profundidad necesaria de la preparación del soporte.

El Contratista deberá realizar la prueba de la fenolftaleína en las zonas a sanear las veces que sea necesario con cargo a esta unidad de obra. Se deberá sanear todo el hormigón despasivado que rodee las armaduras de las zonas marcadas en su circunferencia íntegra.

El saneo de una zona marcada debe extenderse a lo largo de las armaduras marcadas hasta encontrar las mismas libres de óxido visible en su circunferencia íntegra.

En caso de que aparezca corrosión por picaduras en armaduras, deberán tomarse muestras de hormigón a diferente profundidad para su análisis en laboratorio y posterior confección de un perfil de penetración de cloruros. La toma de muestras se hará con cargo a esta unidad de obra.

Medición y Abono

El abono se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1 y su medición se realizará por m2. Se consideran incluidos todos los medios necesarios incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.2. LIMPIEZA DEL HORMIGÓN Y DE LAS ARMADURAS

Definición

La preparación del sustrato de hormigón y de las armaduras debe permitir la correcta aplicación de los productos y sistemas, cumpliendo con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

El objetivo principal de la preparación de la superficie es buscar la perfecta adherencia entre el soporte (hormigón y/o acero) y los materiales que se van a aplicar. Por ello se debe:

- Obtener un soporte cohesivo, libre de partículas sueltas o mal adheridas, lechada superficial, restos de desencofrante, productos de curado, tratamientos antiguos o cualquier sustancia que reste adherencia a los tratamientos a realizar.

- Conseguir una superficie de poro abierto para facilitar la unión y la adherencia entre los distintos materiales.

El hormigón una vez preparado debe ser un hormigón sólido con una resistencia mínima a tracción de 1 N/mm^2, sano, limpio y con la superficie de poro abierto (se recomienda una rugosidad mínima de 5 mm) para mejorar la adherencia entre el hormigón viejo y el material de reparación.

Se admiten diferentes procedimientos de limpieza, tanto manuales como mecánicos. La elección del método apropiado irá en función de la extensión/dimensión del daño (área y profundidad), la localización (accesibilidad y posición) y criterios de seguridad y salud (en sitios mal ventilados o sin ventilación se debe descartar la aplicación del chorro de arena vía seca).

Procedimientos de limpieza del sustrato (hormigón y acero)

a) Chorro de arena vía seca. Consiste en proyectar sobre el soporte de hormigón un chorro de arena de sílice mediante un compresor de caudal variable en función de la distancia al soporte, con una presión de 7 atm aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 y 2 mm y el operario que realice el trabajo actuará provisto de una escafandra protectora ventilada con aire fresco.

   Este método es adecuado para dar rugosidad a las superficies, mejorando la adherencia entre materiales. Idóneo para la eliminación de lechada superficial, contaminantes y para la preparación de superficies para la posterior aplicación de pinturas y revestimientos. El espesor de eliminación es aproximadamente 0,75 mm.

   Tras el chorreado abrasivo, la superficie se debe limpiar para eliminar el polvo y partículas sueltas.

b) Chorro de agua. Consiste en proyectar sobre el soporte agua con una presión mínima mediante un grupo de presión autónomo a través de una lanzadera provista de una boquilla adecuada y con una presión en bomba controlada con un manómetro.

   - A baja presión hasta 18 MPa para la eliminación de suciedad, polvo, partículas sueltas, etc. (Hidrolavado)
   - A alta presión de 18-60 MPa para la eliminación de la lechada superficial, contaminantes hidrosolubles, etc.

c) Cepillado. Consiste en un cepillado enérgico con cepillo de púas metálicas, provocando la erosión de la superficie de hormigón. Este método está indicado para la eliminación de pinturas finas y lechada superficial del hormigón en pequeñas superficies.

Se realizará una limpieza de todas las armaduras cubiertas con óxido hasta grado Sa 2 ½ mediante limpieza por chorreado abrasivo con arena de sílice. En pequeñas zonas y con la aprobación explícita de la dirección de obra, hasta grado St 3 mediante limpieza manual y mecánica por cepillado con cepillo de púas metálicas. Definición de grados de limpieza según norma UNE-EN ISO 8501-1.

Cuando se haya ejecutado un saneo previo por técnicas de hidrodemolicion, se podrá evitar la realización de la limpieza posterior.

La aplicación de productos o sistemas de reparación o refuerzo debe ser inmediata tras el lavado. En caso de que a juicio de la Dirección de Obra, el tiempo transcurrido entre ambos procesos sea excesivo, se repetirá la limpieza sin cargo alguno para la propiedad.

Medición y Abono

El abono se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1 y su medición se realizará por m^2. Se consideran incluidos todos los medios necesarios incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.3. REPARACION ESTRUCTURAL DEL HORMIGON DETERIORADO

Definición

Se consideran productos y/o sistemas de reparación estructural del hormigón a aquellos que remplazan hormigón deteriorado, recuperando la integridad estructural y la durabilidad del elemento reparado.

Estos Morteros estructurales son utilizados para:

- Restauración de hormigón estructural (Principio 3 de la UNE-EN 1504-9): en reparación de desconchones y daños del hormigón, en las zonas de estructura en los que aparezca deterioros provocados por la corrosión y consiguiente expansión de la armadura pasiva

- Refuerzo estructural del hormigón (Principio 4 de la UNE-EN 1504-9): en incremento de la capacidad portante de las estructuras de hormigón mediante la adición de mortero

- Conservación o restauración del pasivado de armaduras (Principio 7 de la UNE-EN 1504-9), en el incremento del recubrimiento y remplazando el hormigón contaminado o carbonatado

Materiales

a) Mortero estructural clase R4 según norma UNE-EN 1504-3:

Mortero tixotrópico, de retracción compensada, de base cementosa, con áridos de granulometría gruesa y reforzado con fibras.

b) Mortero para revestimiento anticorrosión de las armaduras (pasivado) según norma UNE-EN 1504-7:

Producto para la protección de las armaduras del hormigón frente a la corrosión y como capa de adherencia. Podrá ser:

- de base cementosa con inhibidores de la corrosión para la protección activa
- de base epoxi para la protección pasiva (efecto barrera)

c) Mortero para adhesión estructural según norma UNE-EN 1504-4:

Producto que funcione como puente de unión. Podrá ser:

- Mortero con conglomerantes hidráulicos poliméricos
- Adhesivo estructural tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes, que no contenga disolventes y tolere la humedad.

Se utilizarán productos y sistemas para el refuerzo estructural del hormigón conformes según la norma UNE-EN 1504.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra

Los sacos empleados para el transporte del mortero se conservarán en buen estado y se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, no más de seis meses desde su fecha de fabricación.

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.
Antes de la aplicación de estos productos, se debe contar con la aprobación expresa por parte de la Dirección de Obra de la preparación del soporte.
Sobre la superficie recién saneada y limpiada se aplicará un pasivado de la armadura vista y una posterior imprimación de adherencia.
Sobre la imprimación se extiende el mortero tixotrópico. Si el volumen a rellenar es grande o el fraguado lento, se requiere colocar un encofrado protegido con una lámina de plástico para facilitar el posterior desencofrado.

En caso de que sea necesario aplicar el mortero en varias capas, las mismas se aplicarán húmedo sobre húmedo. En caso de interrupción, se deberá tratar la superficie para obtener la adherencia necesaria.
Se protegerá del viento, del sol y de las heladas durante su endurecimiento.
Cuando los productos sean de base cementosa, es precisa la operación de curado. Se adoptará cualquiera de los métodos habituales de curado, tales como arpilleras húmedas, láminas de polietileno o un producto de curado adecuado.

Medición y abono

La medición y abono de la restauración o reparación de la superficie de hormigón con aplicación de pasivado y puente de unión se realizará en m^2, de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1. Se considera incluido el encofrado necesario, el curado y todos los medios necesarios, incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.4. ANCLAJES CON BARRAS DE ACERO

Definición

Consiste esta unidad en la ejecución del anclaje de armaduras de acero (barras corrugadas) utilizadas como refuerzo estructural, con objeto de asegurar la continuidad de las estructuras de hormigón armado.

Materiales

Las barras de acero a emplear cumplirán las especificaciones del artículo 240, "Barras corrugadas para hormigón armado", del PG-3/75. Las barras serán del tipo B 500 S

El producto de anclaje químico será:

- Adhesivo tixotrópico de dos componentes, a base de resinas epoxi de alta resistencia (Grouts epoxi), libre de disolventes y que tolere la humedad.
  Deberá cumplir las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-6.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra

Los principios a conseguir, de entre los definidos en la norma UNE-EN 1504-9, son:

- Principio 4: Refuerzo estructural: Incremento o restauración de la capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón. Método 4.2: Instalación de barras de unión en agujeros prefabricados u horadados en el hormigón

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

Esta unidad comprende como mínimo la realización de las siguientes operaciones:

- Ejecución del taladro y limpieza del mismo
- Suministro y colocación de la barra de acero
- Suministro y puesta en obra del producto de anclaje químico estructural

Medición y abono

Los anclajes se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas, valorándose al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto. Se incluyen todos los medios necesarios, incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.5. RELLENO DE HUECOS DE HORMIGÓN CON MORTEROS EXPANSIVOS

Materiales

Relleno con morteros de base cementosa (Grouts cementosos), mono componentes, de naturaleza fluida, de retracción compensada, expansivos, de huecos o grietas dentro de la masa de hormigón (confinadas), como los orificios dejados por las espadas del encofrado para el hormigonado.

Los productos y sistemas utilizados cumplirán las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-6.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

Los soportes deberán estar limpios, sanos, exentos de grasas, aceites y lechadas superficiales. Los elementos metálicos estarán, además, exentos de óxido.

Aptos para aplicar por vertido, debe preverse una salida para el aire, de forma que éste pueda salir fácilmente a medida que se rellena el hueco.

En caso de uso de mortero con consistencia plástica será necesario ayudar a la compactación mediante una ligera vibración.

Para aprovechar al máximo las propiedades expansivas se debe hacer su puesta en obra sin superar los tiempos desde el mezclado indicados por el fabricante.

Una vez vertido debe ser protegido del sol, viento, etc. La operación de curado es imprescindible en todos los casos.

Medición y abono

Los rellenos se medirán y abonarán por las unidades realmente ejecutadas, valorándose al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1 del presente Proyecto. Se incluyen los trabajos de

preparación del soporte, encofrado, curado y todos los medios necesarios incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.6. PUENTES DE UNIÓN. PRODUCTOS DE ADHESIÓN ESTRUCTURAL

Definición

Adhesión estructural de materiales en trabajos de reparación o refuerzo de una estructura de hormigón existente (Principio 4 de la UNE-EN 1504-4), incluyendo:

- Adhesión de placas de acero u otros materiales sobre superficies de hormigón como refuerzo. (Método de reparación 4.3 según UNE-EN 1504-4)

- Adhesión de hormigón endurecido sobre hormigón endurecido, asociado a la utilización de elemento prefabricados. (Método de reparación 4.4 según UNE-EN 1504-4)

- Adhesión de hormigón fresco sobre hormigón endurecido utilizando una junta adhesiva que forma parte integrante de la nueva estructura. (Método de reparación 4.4 según UNE-EN 1504-4)

Materiales

Adhesivo estructural tixotrópico a base de resinas epoxi, de dos componentes, que no contenga disolventes y tolere la humedad.

Se utilizarán productos y sistemas para el refuerzo estructural del hormigón conformes según la norma UNE-EN 1504.

Los productos y sistemas utilizados cumplirán las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-4.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

El soporte deberá estar limpio, sin agua estancada, exento de grasas y aceites, de partes mal adheridas, lechadas superficiales y restos de otros oficios.

La preparación del soporte se hará preferiblemente de forma mecánica (repicado, chorro de arena o utilizando cepillos de púas de acero, etc.) hasta conseguir una superficie totalmente sana y suficientemente rugosa.

Se deberán respetar las indicaciones de aplicación (temperatura de aplicación, vida de mezcla, plazo de aplicación del hormigón, etc.) así como el tiempo de puesta en carga indicadas por el fabricante.

Medición y Abono

El abono de los mismos se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1 y su medición se realizará por m2. Se considera incluido la preparación del soporte, así como todos los medios necesarios incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.7. INYECCIÓN DE FISURAS

Definición

La inyección se utiliza para remediar los efectos nocivos de las fisuras en el hormigón.

Para Protección contra la penetración (Principio 1 según UNE-EN 1504), para conseguir la impermeabilización frente al agua y/o evitar la penetración de agentes agresivos susceptibles de provocar la corrosión de las armaduras de acero.

Materiales

En la elección del producto o sistema se tendrá en cuenta, entre otros, la actividad, la anchura y el grado de humedad de la fisura.

Los productos y sistemas utilizados cumplirán las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-5.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.
El soporte deberá estar limpio, sin agua estancada, exento de grasas y aceites, de partes mal adheridas, lechadas superficiales y restos de otros oficios.

El soporte debe ser tratado mediante chorreo abrasivo o medios mecánicos tales como lijado o repicado. Se deben limpiar las fisuras para eliminar el polvo mediante un compresor de aire.

Medición y Abono

El abono de los mismos se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios número 1 y su medición se realizará por m2. Se considera incluido la preparación del soporte, así como todos los medios necesarios incluidos los auxiliares para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.3.8. PINTURA DE PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN ANTICARBONATACIÓN

Materiales

Pintura de protección frente a carbonatación, mono componente, a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa, que produce una superficie de acabado mate, de cualquier color o composición de colores a decidir por la Dirección de Obra.

Los productos y sistemas utilizados cumplirán las especificaciones en cuanto a identificación, prestaciones y seguridad que se recogen en la norma UNE-EN 1504-2.

El sistema elegido contará con la aprobación expresa de la Dirección de Obra.

Características

- Contenido de sólidos en volumen Aprox. 60%
- Espesor de capa Mín. 60 micras – Máx. 150 micras
- Resistencia a la difusión de CO2: SD ≥ 200 m
- Permeabilidad al vapor de agua de Clase I (permeable al vapor de agua) SD ≤ 1 m
- Absorción capilar y permeabilidad al agua w < 0,1 hg/m2.h0.5
- Resistencia a la luz del pigmento: A1

Ejecución

La aplicación de los productos y sistemas deberá cumplir con las especificaciones que marca la UNE-EN 1504-10 para los Métodos seleccionados.

El producto se almacenará al abrigo de las heladas y protegido de la acción directa del sol un máximo de seis meses desde su fabricación en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar fresco y seco.

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que figurarán las características del producto.

Medición y Abono

La medición y abono de este material se realizará por m2. Se incluyen en el precio la limpieza de la superficie soporte, mano de imprimación y acabado con dos manos, con ejecución de despiece según planos en caso de composición con más de un color. Incluso los medios auxiliares necesarios para la realización de los trabajos y la retirada por gestor autorizado de los residuos generados.

IV.4. REDES DE ABASTECIMIENTO

IV.4.1. TUBERIA DE FUNDICION NODULAR

MATERIALES

Tubos de fundición dúctil

Tubería de fundición nodular, fabricada según las normas:

- Normas UNE-EN 545
- Norma Internacional ISO 2531:1998, relativa a tubos de fundición dúctil para canalizaciones con presión (1988).

Revestimientos

Revestimiento interior con mortero de cemento aplicado por vibro-centrifugación

Revestimiento exterior reforzado, apto para terrenos de corrosividad alta (resistividad <1.500 Ω.cm). Se aceptan como revestimientos exteriores los siguientes sistemas alternativos de capas:

- - zinc metálico (>200 gr/m²) + capa bituminosa de 70 µm de espesor medio mínimo + manga de polietileno colocada in situ

- - aleación de zinc-aluminio (85% Zn-15% Al) con masa ≥400 gr/m² + pintura epoxi con espesor ≥ 70µm.

Tipos de junta

Se admitirán los siguientes:

Automática flexible. Encaje auto estanco.Norma de aplicación para los aros de goma: UNE-EN 681-1. Esta junta une tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso.

La estanquidad se consigue por la compresión de un anillo de goma labiado, para que la presión interior del agua, favorezca la compresión.

El enchufe debe tener en su interior un alojamiento para el anillo de goma y el extremo liso debe estar achaflanado.

Junta acerrojada STANDARD Ve: El anclaje se consigue en el exterior del enchufe.

El anclaje se realiza en un elemento dispuesto en el extremo liso del tubo, un cordón de soldadura. En dicho cordón apoya una arandela y una contra brida que se fija al perfil exterior del enchufe con bulones especiales.

Condiciona la presión PFA.

Espesor de los tubos

DN (mm)	CLASE DE PRESIÓN	ESPESOR NOMINAL (mm)
80	C100	6,1
100	C100	6,1
150	C64	5,5
200	C64	6,5
250	C50	6,4
300	C50	7,4
400	C40	7,8
500	C40	9,3
600	C40	10,9
800	C30	11,1
1000	C30	13,4

Presiones

El cálculo de presiones se basa en la Norma UNE-EN 545.

3.1.- Presión máxima de funcionamiento (PFA)

Presión interior que un componente de la canalización puede soportar con toda seguridad de forma continua en régimen hidráulico permanente.

$$PFA = \frac{20 \cdot e \cdot Rt}{C \cdot D} \qquad (1)$$

PFA = Presión de funcionamiento admisible
R_t = Resistencia mínima a la tracción = 420 MPa
e = Espesor mínimo de la pared del tubo = e_n – T
e_n = Espesor nominal = K (0,5+0,001DN) (Con un mínimo de 6 mm)
T = Tolerancia máxima = (1,3 + 0,001 DN)
C = Coeficiente de seguridad = 3
D = Diámetro medio = D_{ext} – e
D_{ext} = Diámetro exterior

3.2.- Presión máxima admisible (PMA)

Presión hidrostática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de soportar un componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria.

La forma de cálculo de esta presión es igual que la expresión (1), pero utilizando un coeficiente de seguridad C = 2,5.

3.3.- Presión de ensayo admisible (PEA)

Presión hidrostática máxima de prueba en zanja a la cual es capaz de resistir un componente de la canalización durante un tiempo relativamente corto con el fin de asegurar la integridad y estanquidad de la misma.

PEA = 5 + PMA

Control de recepción

Los tubos que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a causa del proceso de fabricación y que no dificulten su empleo no serán rechazados. El fabricante puede, bajo su responsabilidad, elegir los procedimientos adecuados para corregir las pequeñas imperfecciones superficiales de aspecto.

Los tubos podrán ser cortados, taladrados o mecanizados; en caso de discusión serán considerados como aceptables si la dureza superficial no sobrepasa 230 unidades Brinell.

Para garantizar que los tubos responden a las características especificadas, se procederá al siguiente control de calidad:

- Control del revestimiento exterior

Los daños en los recubrimientos en los que el área con levantamiento completo del cinc y de la capa de acabado exceda los 5 mm de anchura, así como las zonas sin recubrir, deben ser reparados.

Las reparaciones se realizarán como se indica en norma UNE EN 545

- Control de espesor

La tolerancia t de espesor de pared de los tubos centrifugados será fijada en función del diámetro nominal del tubo en mm según la fórmula:

$$t = 1.3 + 0.001 + DN$$

No se fija límite de tolerancia en más.

- Control de longitud

Las longitudes normales de fabricación de los tubos con enchufe pueden ser:
Hasta diámetro DN= 500. Longitudes 4-5-5.5-6 m
Para diámetro DN> 500. Longitudes 4-5-5.5-6-7 m
El fabricante podrá suministrar hasta un 10 % de la cantidad total de tubos de cada diámetro, en longitudes inferiores a las especificadas en proyecto.

- Control de curvatura.

Haciendo rodar los tubos sobre dos raíles distantes aproximadamente 2/3 de la longitud L de los tubos, la flecha máxima fm, en mm, no debe sobrepasar 1.25 veces la longitud L de los tubos expresada en m
fm < 1.25*L

- Control de peso

Los pesos de los tubos serán los correspondientes a las tablas que figuran en el catálogo del fabricante. Serán calculados tomando como densidad de la fundición 7050 kp/m³
Las tolerancias admitidas sobre estos pesos serán las siguientes:
DN $\leq$ 200 $\pm$ 8%
DN > 200 $\pm$ 5%
Los tubos cuyo peso sea superior al máximo admitido serán aceptados con la condición de que satisfagan todas las demás cláusulas de la presente recomendación.

- Ensayos de tracción

La probeta mecanizada destinada al ensayo de tracción será obtenida del extremo liso de los tubos, del centro del espesor y con eje paralelo al eje del tubo.
Llevará una parte cilíndrica cuya longitud entre trazas será igual a cinco veces su diámetro, viniendo dado este en función del tubo según la tabla siguiente:

Espesor del tubo en mm	Diámetro de la probeta en mm
Inferior a 5	2.0
Igual o superior a 5 e inferior a 6	2.5
Igual o superior a 6 e inferior a 7	3.0
Igual o superior a 7 e inferior a 8	3.5
Igual o superior a 8 e inferior a 10	4.0

Igual o superior a 10 e inferior a 12	5.0
Igual o superior a 12	6.0

Los ensayos mecánicos del fabricante deben ser efectuados en el curso de la fabricación.
Cada lote debe estar formado por los tubos fabricados sucesivamente a razón de:

100 tubos hasta DN 300
50 Tubos para Dn 350 hasta DN 600 inclusive

Resistencia mínima a tracción: 4200 Kp/cm²
Límite convencional de elasticidad a 0.2% mínimo: 3000 Kp/cm²
Alargamiento mínimo a rotura: 10 %
El fabricante debe extraer de un tubo del lote una probeta de tracción que debe satisfacer las prescripciones de la tabla anterior.
Si los resultados de este ensayo son inferiores a los valores mínimos prescritos, deben ser obtenidas otras dos probetas del mismo tubo; éstas deberán satisfacer las mismas prescripciones.

- Ensayo de dureza Brinell

La comprobación de la dureza Brinell establecida se realizará sobre la superficie exterior de los tubos, después de un ligero rectificado.

- Recepción

Si el comprador desea recepcionar los tubos, esta recepción debe efectuarse en fábrica. El fabricante debe proveer los aparatos de ensayo, el material, las plantillas de control y el personal necesario.
El agente de recepción destinado por el comprador y acreditado ente el fabricante debe ser avisado con antelación del momento en que tendrán lugar las operaciones de recepción.
El agente de recepción puede asistir a la obtención, preparación y ensayo de probetas, control dimensional y pesaje, así como a los ensayos hidráulicos.
La recepción y pesado de los tubos puede hacerse después del revestimiento.
Si el comprador o su representante no se presentan para asistir a estas operaciones en el momento oportuno, el fabricante puede proceder a la recepción sin la presencia del comprador o su representante.

EJECUCIÓN

Montaje tubería de fundición nodular junta STANDARD

Una vez rasanteado el fondo según proyecto y libre de materiales sueltos e irregularidades en la base se dispondrá una cama de acuerdo a lo especificado en Planos o Memoria, sobre la que se colocará la tubería con ayuda de los medios mecánicos apropiados (grúa, tractel, etc.), se pondrá especial cuidado en no dañar la tubería, por lo cual no se aplicarán directamente sirgas a su superficie.

En todo lo referente al transporte de la tubería, montaje, juntas y demás trabajos relativos a la instalación de la tubería, se cumplirá lo prescrito en el Pliego General de Condiciones Facultativas de tuberías para abastecimiento de agua en lo que respecta a estos tipos de conducción y el capítulo de Estudio e Instalación de la canalización a presión del catálogo "Canalizaciones de Fundición Nodular" editado por FUNDITUBO.

La tubería una vez colocada, deberá ser nivelada tubo a tubo y corregidas las irregularidades en planta y alzado si las hubiera.

La máxima desviación angular permitida entre tubos será igual a la mitad de la máxima admisible establecida por el fabricante y se atenderá estrictamente a las especificadas en cada tubo en los planos, otros documentos del proyecto o indicaciones de la Dirección de Obra.

El Contratista adoptará todo tipo de precauciones para evitar la entrada de objetos o animales en el interior de la conducción, siendo él el único responsable de las consecuencias que se deriven de la inobservancia de la prescripción.

Inmediatamente a la colocación de la tubería se efectuará un relleno parcial de la zanja, de forma que se cubra la zona central de los tubos dejando libres las uniones, todo ello para impedir una posible flotación. Caso de producirse ésta por incumplimiento de lo aquí estipulado, deberá el Contratista reparar la situación a su costa.

No se permitirá el tener más de 250 ml de tubería sin probar, pudiendo exigir la Dirección de Obra el que se disponga de medios adicionales para llevar progresivamente adelante las pruebas.

Montaje tubería de fundición nodular con junta acerrojadas Ve

Las especificaciones de montaje son comunes con la tubería de fundición nodular con junta Standard.

La única especificación particular es realizar la colocación bajando a partir del punto superior, con el fin de que las juntas acerrojadas se coloquen por sí mismas en extensión.

Montaje tubería de fundición nodular en el interior de conducciones existentes

En este tipo de instalación, la tubería se aloja dentro de una tubería existente (camisa) de mayor diámetro.

Esta instalación debe realizarse con elementos que mejoren el soporte, la colocación y el centrado de la tubería dentro de la existente. Esto se consigue mediante la colocación, detrás de los enchufes, de unos collares centradores fabricados en plástico (PEHD), para apoyo y separación de la misma con respecto a su vaina de protección. Los centradores se colocarán espaciados en la tubería según especificaciones del fabricante, al menos uno a cada lado de cada junta y al menos uno cada 2 m.

La técnica de instalación consiste en pasar por el interior de la camisa un cable que se engancha al primer tubo de la nueva canalización, la cual se coloca a tracción tirando de este cable.

La tubería a instalar debe tener las juntas acerrojadas, debiendo comprobar que la fuerza de tracción no supera la fuerza de tracción máxima del tipo de unión seleccionado.

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1, entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta de goma y acople de las tuberías.

Asimismo, incluye la parte proporcional de limpieza, desinfección y pruebas de estanquidad a presión, con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas.

IV.4.2. PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICION DUCTIL

Características

Las piezas especiales de fundición dúctil irán revestidas interior y exteriormente con resina epoxi, con un espesor mínimo de 70 µm.

Tipos de junta:

- Extremos de enchufe: llevarán junta tipo “exprés”.

La estanquidad se consigue por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero presionado por medio de una contra brida móvil taladrada y sujeta por bulones en el resalte de la campana por su parte exterior.

Una vez verificada la posición de la contra brida, se deben apretar las tuercas progresivamente por pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en
zanja.

Para los bulones de 22 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 12 Kgm.

Para los bulones de 27 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 30 Kgm.

Tanto los bulones como la contra brida serán de fundición dúctil.

- Extremos de bridas:

Se unen por interposición entre las dos bridas de una arandela de estanquidad plana, que se comprime por el apretado de los tornillos, cuyas dimensiones y número varía según el diámetro de la conducción y la presión de servicio.

Las bridas serán PN-16 o PN-25 según la norma UNE-EN 1092.

Las bridas serán orientables para diámetros comprendidos entre DN80 y DN600 y fijas para los comprendidos entre DN700 y DN1200.

Los tornillos serán de acero clase resistente 6.8 o 8.8, bicromatados, dimensionados de forma apropiada según DN y PN de la brida, con arandelas a ambos lados, de dimensiones apropiadas según DN y PN de la brida. En el contexto de este pliego se entenderá por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o doble).

En caso de uniones a distinto material, deberá disponerse un montaje dieléctrico de la tornillería, de modo que se evite el contacto eléctrico entre materiales de distinto potencial de reducción, causa de la corrosión galvánica.

Las juntas de unión entre bridas serán de PVC o Plásticas (etileno-propileno) de dimensiones apropiadas según DN y PN de la brida.

En aquellas juntas de bridas que vayan a quedar enterradas, o bajo otras condiciones agresivas, deberá ser protegida su tornillería de amarre mediante envoltura realizada con “cinta grasa”.

Se ha podido agrupar varios tipos de bridas, o de plantillas de taladro, para diferentes presiones en función del diámetro, y queda como sigue:

Diámetros nominales DN	**Identidad forma de brida**	**Identidad plantilla de taladro**
40 y 50	PN 16 - 25	PN 16 - 25
60 y 65	PN 16 - 25	
80	PN 16 – 25	PN 16 - 25

Ejecución

Deberán dotarse de los anclajes y contrarrestos que fueran necesarios según cálculo.

Medición y abono

El abono de las piezas especiales podrá ser:

- bien por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o Dirección de Obra, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios 1,

- bien incluido como parte proporcional en el precio por metro lineal de tubería.

El criterio será el aplicado en el Presupuesto de la obra. En cualquier caso incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas, tornillería con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al), etc.

Asimismo, incluye la parte proporcional de limpieza, desinfección y pruebas de estanquidad a presión, con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas.

IV.4.3. TUBOS DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD

MATERIALES

Tubería de Polietileno PE 40 (Baja Densidad) SDR 7,4 para 10 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201

Marca de calidad

Deberá estar en posesión del marcado exigido por la norma UNE EN 12201 y marca de organismo de certificación acreditado por ENAC.

Tipo de Junta
La unión entre tubos se realizará mediante accesorios de compresión.

Accesorios
Los accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno serán de polipropileno o latón.

No podrán emplearse accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno con rosca macho de polipropileno. En estos casos los accesorios de rosca macho serán metálicos, realizados en latón.

En las piezas de latón, el casquillo en la unión a tubo será de resina acetálica.
Todos los elementos deberán contar con marcado según la normativa correspondiente e identificación del fabricante.
Dispondrán de Certificado para Uso Alimentario conforme al RD 140/2003, todos ellos otorgado por entidad acreditada por ENAC y deberán cumplir los ensayos establecidos en las Normas:

- UNE-EN ISO 3458 Estanquidad con presión hidráulica interior
- UNE-EN ISO 3459 Estanquidad bajo presión negativa
- UNE-EN ISO 3503 Estanquidad con presión hidráulica interior para conjuntos sometidos a flexión.
- UNE-EN ISO 3501 Resistencia al desgarro bajo fuerza longitudinal constante

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1, entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, colocación de la junta de goma y acople de las tuberías.

Asimismo, incluye la parte proporcional de limpieza, desinfección y pruebas de estanquidad a presión, con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas.

El abono de las piezas especiales podrá ser:

- bien por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o Dirección de Obra, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios 1,

- bien incluido como parte proporcional en el precio por metro lineal de tubería.

El criterio será el aplicado en el Presupuesto de la obra. En cualquier caso incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas y tornillería.

IV.4.4. TUBOS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD

MATERIALES

Tubería de Polietileno PE 100 SDR 11 o PE 80 SDR 9, para 16 atmósferas de presión de trabajo fabricada según norma UNE-EN 12201

Marca de calidad

Deberá estar en posesión del marcado exigido por la norma UNE EN 12201 y marca de organismo de certificación acreditado por ENAC.

Tipo de Junta
La unión entre tubos se realizará mediante accesorios de compresión.

Para la ejecución de uniones, derivaciones, etc. se emplearán accesorios mecánicos, de polipropileno o de latón que deberán satisfacer los ensayos de presión, estanquidad y arrancamiento sin necesidad de piezas auxiliares (liners o similares).

Accesorios

Los accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno serán de polipropileno o latón.
No podrán emplearse accesorios de acoplamiento para tuberías de polietileno con rosca macho de polipropileno. En estos casos los accesorios de rosca macho serán metálicos, realizados en latón.
En las piezas de latón, el casquillo en la unión a tubo será de resina acetálica.
Todos los elementos deberán contar con marcado según la normativa correspondiente e identificación del fabricante.
Dispondrán de Certificado para Uso Alimentario conforme al RD 140/2003, todos ellos otorgado por entidad acreditada por ENAC y deberán cumplir los ensayos establecidos en las Normas:

- UNE-EN ISO 3458 Estanquidad con presión hidráulica interior
- UNE-EN ISO 3459 Estanquidad bajo presión negativa
- UNE-EN ISO 3503 Estanquidad con presión hidráulica interior para conjuntos sometidos a flexión.
- UNE-EN ISO 3501 Resistencia al desgarro bajo fuerza longitudinal constante

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá por ml. realmente instalada según longitudes teóricas de planos y mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº1, entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe y acople de las tuberías.

Asimismo, incluye la parte proporcional de limpieza, desinfección y pruebas de estanquidad a presión, con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas.

El abono de las piezas especiales podrá ser:

- bien por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o Dirección de Obra, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios 1,

- bien incluido como parte proporcional en el precio por metro lineal de tubería.

El criterio será el aplicado en el Presupuesto de la obra. En cualquier caso incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas y tornillería.

IV.4.5. PRUEBA HIDROSTÁTICA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES EN REDES DE ABASTECIMIENTO. RESULTADOS A OBTENER

CONDICIONES GENERALES

A. El Contratista de la obra civil ejecutará todas las operaciones de lavado, prueba hidrostática y desinfección completa del sistema de tubos, incluyendo el transporte de agua para la prueba desde los puntos de toma autorizados, así como la evacuación del agua después de la prueba.

B. El Contratista de la obra deberá presentar una notificación escrita con una anterioridad de al menos 48 horas antes del programa propuesto para la prueba, para el examen y autorización expresa de la Dirección de Obra. Los planes propuestos por el Contratista para la obtención y transporte del agua para la prueba, su control y su disposición después de las pruebas también deberán ser presentados por escrito a la Dirección de Obra.

C. Los compuestos químicos para la cloración, las válvulas, tapones temporales, y cualquier otro equipo o material necesario para el control del agua será determinado y suministrado por el Contratista, sujeto al examen de la Dirección de Obra. No se deberá usar ningún material que sea perjudicial para el sistema, ya sea durante la construcción o durante la explotación.

D. A menos que se estipule otro modo en esta especificación, los puntos de toma del agua para la prueba hidrostática y desinfección del sistema de tubos de agua serán los indicados por S.C.P.S.A. No obstante el Contratista deberá hacer todo lo necesario para el transporte del agua desde la toma designada por S.C.P.S.A. hasta los puntos de uso. Todos los gastos ocasionados tanto por la compra de agua si fuese preciso, como su transporte y su futura evacuación correrán a cargo del Contratista.

E. Todos los tubos a presión deberán ser probados. La desinfección se hará por cloración. La dosificación del cloro será la indicada por la Dirección de Obra, quién dará al Contratista las instrucciones para la aplicación apropiada del cloro. Todas las operaciones de prueba hidrostática y cloración deberán ser ejecutadas por el Contratista en presencia de la Dirección de Obra.

F. Las operaciones de desinfección deberán ser programadas por el Contratista, lo más tarde como sea posible, dentro del período de tiempo del contrato, para asegurar el grado máximo de esterilidad de las instalaciones, al tiempo de que el trabajo sea aceptado por S.C.P.S.A. Las pruebas bacteriológicas serán hechas por el laboratorio de S.C.P.S.A. Los resultados de estas pruebas deberán ser satisfactorias.

G. La operación de vaciado y extracción del agua de los tubos después de que se complete la prueba hidrostática y la desinfección, deberá ser autorizada por la Dirección de Obra.

PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍAS

Una vez colocadas las tuberías y antes de rellenar la zanja se realizarán las pruebas de estanquidad o exfiltración con agua o presión.

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar los manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

El Contratista deberá dotarse de medios y planificarse para la ejecución de la obra. Muy especialmente son de cuenta del Contratista el diseño, construcción y demolición de los macizos de anclaje, estructuras metálicas de cierre y contención, taladros de bridas ciegas, montaje y desmontaje de ésas, y todos los medios auxiliares y personal necesario para las pruebas.

El Contratista presentará un plan de ejecución de las pruebas de estanqueidad y presión. En el plan se detallarán los tramos en que se ha dividido la instalación a probar, los puntos de llenado y vaciado de la conducción, la ubicación de los contrarrestos (tanto provisionales como definitivos), las presiones a que se realizarán la prueba de acuerdo a la UNE-EN 805, el cálculo y dimensiones de los contrarrestos en función de las condiciones reales del terreno y ejecución, y la equipación con que cuenta el contratista al efecto de realizar la prueba (medición de presión y volumen de agua). Dicho plan deberá ser aprobado por la dirección facultativa con anterioridad a la ejecución de las pruebas.

Antes de la prueba, todas las tuberías deben ser lavadas con agua o limpiadas con agua a presión, según lo más apropiado. El Contratista probará todas las tuberías, tanto por tramos como en el total de la tubería. Ninguna sección de tubería se deberá probar hasta que todo el hormigonado o mortero aplicado "in situ" tenga un curado de al menos 14 días. La prueba se hará cerrando válvulas, si éstas estuviesen ya instaladas o colocando tapones de prueba provisionales en los extremos de los tubos y llenando la conducción con agua lentamente. El Contratista será responsable de asegurarse que todos los tapones de prueba estén asegurados correctamente para resistir el empuje de la presión del agua de prueba sin hacer daño o producir movimiento de los tubos adyacentes. Se debe tener cuidado para asegurarse que todas las válvulas de las ventosas están abiertas durante el llenado con agua.

El empuje total sobre los tapones de prueba se transmitirá al terreno mediante estructuras suficientemente rígidas.

Las prestaciones del Contratista descritas en el apartado anterior comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de presión o de caudal correspondientes.

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de los ensayos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.

La tubería se deberá llenar con agua a una velocidad tal que no cause oscilaciones en la lámina de agua ni exceda la velocidad a la cual el aire pueda evacuarse por las ventosas de una manera razonable y que permita la salida de todo el aire que esté en la tubería. Una vez que una sección de tubería haya sido llenada con agua se debe dejar que permanezca en reposo a baja presión durante el tiempo necesario para que el revestimiento interior de mortero u hormigón absorba la cantidad apropiada de agua y para que se elimine el aire que está dentro del tubo. Durante este período se examinarán los cabos extremos ciegos, válvulas y conexiones, para comprobar si hay escape de

agua. Si se localizan escapes de agua se tomarán las medidas correctivas necesarias, que serán adoptadas por la Dirección de Obra.

La demora en la ejecución de las pruebas podrá ser causa de la orden de paralización del resto de la obra.

Tramos de prueba: Las longitudes de los tramos de prueba dependen de las características particulares de cada uno de ellos, debiendo seleccionarse de modo que:

- la presión de prueba (STP) pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en prueba
- pueda aplicarse una presión al menos igual a la presión máxima de diseño (MDP) en el punto más alto de cada uno de ellos
- pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba
- la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y más alta no exceda del 10% de STP
- en la medida de lo posible, sus extremos coincidirán con válvulas de paso de la tubería

Con todo ello, serán aprobadas por la Dirección de Obra, estando comprendidas a título orientativo entre 250 y 600 m. Antes de cada prueba se realizarán todos los anclajes necesarios.

Presión de prueba: Definiciones según UNE-EN 805:

- **(DP) Presión de Diseño:** presión máxima de funcionamiento de la red fijada por el proyectista excluyendo el golpe de ariete.

- **(MDP) Presión máxima de Diseño:** presión máxima de funcionamiento de la red fijada por el proyectista incluyendo el golpe de ariete.

    - MDP se designa **MDPa** cuando se fije previamente el golpe de ariete admitido.

      Solo el caso de los ramales de las redes de distribución, en los que, debido a la abundancia de mecanismos de cierre, acometidas, etc., es difícil calcular con detalle el golpe de ariete en la hipótesis pésima de funcionamiento, es una de las situaciones en las que su valor puede ser "estimado". El margen fijado para el golpe de ariete en este caso no debe ser inferior a 2 bares.

    - MDP se designa MDPc cuando el golpe de ariete se calcula en detalle.

La **Presión de prueba (STP)** se calculará conforme a la norma UNE-EN 805, a partir de la presión máxima de diseño (MDP), de forma que, dependiendo de que el golpe de ariete se haya calculado en detalle o únicamente se haya estimado, el valor de STP será:

- Golpe de ariete calculado => STP = MDPc + 0,1 N/mm2 (1 bar)
- Golpe de ariete no calculado: el menor de los dos valores siguientes :

$$STP = MDP_a \times 1{,}5 \text{ bar } (0{,}15 \text{ N/mm}^2)$$

o

$$STP = MDP_a + 5 \text{ bar } (0{,}5 \text{ N/mm}^2)$$

Criterio de aceptación: Una vez alcanzado el valor de STP, se desconecta el sistema de bombeo, no admitiéndose entrada de agua durante al menos una hora. Al final de este período, el descenso de

presión debe ser inferior a **0,02 N/mm2** (0,2 kp/cm^2) para tubos de fundición, acero, hormigón con camisa de chapa y PE.

A continuación, se eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP, suministrando para ello agua y midiendo el volumen final suministrado, debiendo ser éste inferior al valor dado por la expresión (UNE-EN 805).

$$\Delta V_{\max} = 1.2 \times V \times \Delta p \times \left[\frac{1}{Ew} + \frac{ID}{e \times E} \right]$$

Donde

$\Delta V_{\max}$	es la pérdida de agua admisible, en litros
V	es el volumen del tramo de conducción en prueba en litros
Δp	es la caída de presión admisible en kPa
E_w	es el módulo de elasticidad del agua (kPa)
D	es el diámetro interior del tubo (m)
e	es el espesor de la pared del tubo (m)
E	es el módulo de elasticidad del material del tubo (kPa)
1,2	es un factor de corrección

En caso de tuberías o tramos de tuberías que no superen la prueba de fugas de agua especificada, el Contratista deberá determinar la causa del escape excesivo, tomar las medidas necesarias para reparar el escape y hacer de nuevo la prueba hidrostática de la tubería o tramo de tubería, todo sin ningún costo adicional.

DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS

Todas las tuberías excepto las de los desagües, deberán ser desinfectadas como se establece en esta especificación.

En aquellos casos en que la citada limpieza pueda afectar al medio ambiente se deberá realizar un plan previo, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. No se iniciarán este tipo de trabajos hasta tanto no conste en el Libro de Órdenes la orden pertinente.

Cloración: Una mezcla de agua y cloro se aplicará por medio de un dispositivo de alimentación de cloro. La solución de cloro deberá aplicarse a un extremo de la tubería a través de una conexión de entrada de manera que, a medida que la tubería se vaya llenando con agua, la dosis de cloro aplicada al agua permita que la concentración en cloro del tramo a probar sea de 20 ppm (partes por millón, en base a peso, equivale a gr/m^3).

Se prevendrá que la solución concentrada de cloro de la tubería que está siendo tratada no se introduzca en las tuberías de distribución de agua potable en servicio.

Período de retención: El agua clorada se deberá mantener en la tubería el tiempo suficiente para destruir las bacterias. Este período de tiempo será al menos 24 horas. Después de que el agua tratado con cloro ha sido mantenida en el tubo el tiempo requerido, el cloro residual en los extremos de la tubería y otros puntos representativos deberá ser al menos de 10 ppm

Desinfección de válvulas: Durante el procedimiento de cloración de la tubería, todas las válvulas y otros accesorios deberán ser accionados mientras la tubería se está llenando con el agua altamente clorada.

Lavado final: Después de la cloración toda el agua tratada se debe vaciar de las tuberías por sus extremos y desagües. Posteriormente, y para eliminar el exceso de cloro residual procedente de la hipercloración, se realizará un aclarado de la tubería según indicaciones de la Dirección de Obra. Si el tratamiento inicial fallara, al no producirse unos resultados satisfactorios en las tuberías, de acuerdo con los análisis a efectuar de medida del cloro residual, el procedimiento de cloración se repetirá sin ningún costo adicional para S.C.P.S.A. hasta que se obtengan los resultados satisfactorios.

Las prestaciones del Contratista descritas comprenderán todas las operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo la toma de muestras y comprobaciones necesarias.

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de estos trabajos no son de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la tubería.

Medición y Abono

Todos los costes de estas operaciones de desinfección y pruebas de estanquidad, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto, se consideran incluidos en el precio de metro lineal de tubería.

IV.4.6. ANCLAJES, SOPORTES Y CONTRARRESTOS DE HORMIGÓN

Ejecución

Se constituyen en todos los casos mediante macizos de anclaje de hormigón armado de resistencia característica 25MPa y acero B500S.

El hormigonado de los contrarrestos y macizos de anclaje se hará de tal forma que cada uno se haga de una sola vez, o en cualquier caso respetando las prescripciones de interrupción de hormigonado recogidas en la EHE. Igualmente en caso de interrupciones en el hormigonado deberán preverse armaduras-conectores capaces de absorber las tensiones rasantes correspondientes.

El relleno del trasdós de los contrarrestos deberá ser compactado al 98% del PM. Alternativamente podrá hormigonarse contra el terreno, saneando previamente el mismo y garantizando un sobre espesor de al menos 20 cm.

Se ha considerado como estado límite de cálculo la prueba de presión, con tubería y macizo sin relleno de tierras de cobertura. Considerando:

- el empuje hidráulico para la presión de prueba STP
- el peso propio del macizo (con densidad 2,2 t/m3 o 2,5 t/m3 en hormigón armado)
- un ángulo de rozamiento interno del terreno $\theta=23^{\circ}$
- el rozamiento tierras-macizo en la base (igual a 2/3 tg(θ))
- el empuje activo supuesta una altura de tierras de 0,80 m sobre la tubería y con ley de distribución uniforme (con el valor de la cara superior del macizo).
- una densidad del terreno de $\gamma=1,8$ t/m3

- el coeficiente de seguridad al deslizamiento se ha tomado igual a 1

Las dimensiones definidas para los macizos se corresponden con las hipótesis anteriormente expresadas. A la vista de las condiciones reales de ejecución y presión de prueba, la Dirección de Obra, previa justificación, podrá redefinir los mismos.

A los contrarrestos se les dispondrá de conducciones pasantes que permitan la libre circulación del agua en zanja.

Estos elementos se redimensionaran en obra de acuerdo a las características reales del emplazamiento: características del terreno, profundidad real ejecutada, ángulo real ejecutado.

Medición y Abono

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los encofrados en madera cepillada y el hormigón correspondiente totalmente colocado.

IV.4.7. ANCLAJES, SOPORTES Y CONTRARRESTOS METÁLICOS

Definición

Piezas metálicas de acero inoxidable realizadas en taller de calderería, cuya función es la de servir de anclaje, soporte y contrarresto de los empujes hidráulicos producidos en válvulas, cambios de dirección o diámetro, tés y extremos cerrados de conducciones de abastecimiento.

Estas piezas se colocarán en registros visitables o en cámaras de llaves de depósitos y bombeos.

En ambientes corrosivos de elevada humedad y presencia de cloro se empleará con calidad AISI 316L, (inoxidable austenítico al molibdeno de bajo contenido en carbono). Uso en depósitos de agua potable, potabilizadoras.

En caso de ambientes en los cuales no haya presencia de cloro se empleará con calidad AISI 304, (austenítico). Uso en arquetas de abastecimiento, fosas sépticas, depuradoras de aguas residuales.

Su diseño particular figura en planos de detalle.

Como norma general dispondrán de placa de anclaje a solera de acero de espesor mínimo 10 mm, con taladros de paso para tornillos de anclaje y riostra de acero de espesor mínimo 5 mm. La unión de ambas dispondrá de rigidizadores.

El arriostrado de la tubería o pieza se realizará en junta de bridas o directamente a tubo mediante abrazadera con llanta de acero y junta de goma de asiento.

Se anclarán a solera mediante tornillos de métrica no inferior a 16 mm y tacos mecánicos expansivos.

Medición y Abono

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios la pieza de calderería, el galvanizado en caliente y el pintado de la misma, así como los trabajos de anclaje a solera, arriostrado de la tubería o pieza, la tornillería con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al) y las juntas de asiento que fueran necesarios.

IV.4.8. VALVULERIA

MATERIALES

Válvulas de Compuerta

La gama de utilización se ceñirá a tuberías de red de diámetro ≤ 250mm.

Se instalarán válvulas de compuerta de fabricantes aprobados por SCPSA, de modelo corto, que deberán cumplir las siguientes características:

Cuerpo: de fundición nodular con protección interior y exterior Epoxy.
De fondo liso, sin entalladura de encaje
Tapa: de fundición nodular con protección interior y exterior Epoxy.
Con tornillería embutida
Compuerta: de fundición dúctil recubierta con caucho nitrílico.
Con guías verticales independientes
Eje: de acero inoxidable pulido AISI-420
Tuerca unión compuerta-eje: de latón
Cierre empaquetadura superior: mediante doble junta tórica
Longitud: según DIN 3202
Tornillos: de acero clase 6.8 o 8.8, bicromatados, con arandelas a ambos lados
Taladro de bridas: s/DIN 2533
Maniobra de la válvula: caperuza o cuadradillo de maniobra

Válvulas de Mariposa

Las válvulas de mariposa serán estancas y cumplirán las siguientes características

Cuerpo de Fundición Nodular JS 1030 con taladros roscados y no pasantes
Eje de acero inoxidable AISI-420
Mariposa de acero inoxidable AISI-316
Anillo elastómero de etileno-propileno EPDM
Dotadas de mecanismo desmultiplicador, de accionamiento manual o motorizado, de par adecuado, sumergible, con volante y señalización visual.
Probada a estanquidad con agua
Montaje con tornillos de acero clase 8.8, con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al), con arandelas a ambos lados

Antes de la formalización del pedido, el Contratista deberá indicar a la Dirección de obra el nombre del fabricante de las válvulas de mariposa, para proceder a su autorización.

Asimismo presentará:

- Certificado de calidad de las válvulas.
- Manual de montaje y mantenimiento.
- Catálogos actualizados de las válvulas a emplear, que incluirán las curvas (Q, kv) de cerrado de la válvula, para que sea considerado en los cálculos del transitorio hidráulico, y así definir un correcto proceso de apertura y cierre de las mismas.

Válvulas de Retención

Las válvulas de retención serán de disco partido.

Las características que deben cumplir, son las siguientes:

- Cuerpo y tapa de fundición nodular.
- Asiento de elastómero (EPDM homologado para uso con agua potable).
- Eje y resortes de acero inoxidable AISI 316.
- Clapetas de acero inoxidable AISI 316.

Válvulas Automáticas

Son válvulas automáticas constituidas por:

- Válvula de base de membrana
- Un circuito de control llamado circuito piloto
- Un Piloto

Cumplirán las siguientes características:

- Cuerpo y Tapa de Fundición Nodular
- Partes internas en bronce o acero inoxidable
- Revestimiento interior y exterior con epoxi
- Circuito piloto de acero inoxidable

Dependiendo de su función, pueden ser:

- Altimétricas
- Sostenedoras de presión
- Reductoras de presión
- Alivio/Contra el Golpe de Ariete

El cierre de la válvula base será modulante, salvo en la válvula de alivio.

En cualquier caso la casa fabricante y suministradora será de reconocida experiencia en este tipo de elementos pudiendo ser propuesta por la Dirección de Obra.

EJECUCION

El almacenamiento de la válvula deberá hacerse en lugar apropiado, resguardado y sin temperaturas excesivas.

La instalación debe de efectuarse atendiendo a las especificaciones de montaje de cada fabricante, verificando, entre otros, los siguientes puntos:

- Observar el sentido previsto de circulación del agua.
- Antes de colocar cualquier válvula de regulación o sus accesorios, es indispensable proceder a la limpieza de las tuberías.
- Comprobar las condiciones de montaje en lo referente a :
  - Posibilidad de montaje horizontal/vertical
  - Normas de taladrado. Refrentado de bridas
  - Montaje entre bridas
  - Posibilidad de montaje en cabeza de línea o desmontaje aguas abajo
  - Distancias mínimas a otros elementos de la red
- Respetar el sentido de colocación indicado por la flecha en el cuerpo de la válvula.
- Comprobar la adecuación de la presión de servicio
- La necesidad de dispositivos de anclaje

Las válvulas ya colocadas deberán estar protegidas en su integridad mediante un envoltorio de film de plástico. Este envoltorio no se retirará hasta el fin de obra. Su objetivo es proteger a las mismas de impregnaciones de hormigón, mortero, golpes que puedan dañar su revestimiento exterior, etc.

La tornillería de conexión entre bridas, será de un material de la misma calidad que los elementos a los que une.

En caso de uniones a distinto material, deberá disponerse un montaje dieléctrico de la tornillería, de modo que se evite el contacto eléctrico entre materiales de distinto potencial de reducción, causa de la corrosión galvánica.

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios el almacenaje, la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas y tornillería con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al).

IV.4.9. CARRETES DE DESMONTAJE

Se instalarán carretes de desmontaje, adosados a cualquier válvula de mariposa y a las válvulas de compuerta que no sean del tipo enterrado.

Estos carretes facilitarán su desmontaje de la tubería donde se encuentran instaladas.

Materiales

En cuanto al cuerpo del carrete, se podrán instalar de dos tipos, según el diámetro de la conducción:

1. Totalmente en acero inoxidable, sin soldadura ni contra brida.

   El único indicado para su uso en instalaciones de abastecimiento, con atmósfera con Cloro, como cámaras de llaves de depósitos.

2. Acero carbono revestido con Poliamida.

Formado por dos cuerpos con bridas, todo ello en acero al carbono S 235 JR, revestido con poliamida, con junta de cierre

Indicado para su uso sólo en instalaciones de abastecimiento sin cloro en atmósfera, como arquetas, salas de bombeo, etc

En cuanto a la tornillería, los tornillos extractores serán de acero inoxidable.

Los tornillos pasantes, formados por varilla roscada, tuercas y arandelas, serán de acero inoxidable en el caso de bridas de ese material, o de acero clase 8.8 con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al) en caso de bridas de acero al carbono.

La junta de cierre será de elastómero NBR.

Los carretes deberán tener una correcta identificación, mediante la señalización en brida de:
• DN
• PN
• Colada
• Calidad Acero Inoxidable

Ejecución

En los carretes se colocarán, para mayor seguridad, tornillos pasantes de varilla roscada en todos y cada uno de sus agujeros, con tuerca y arandela en ambos lados, que rigidicen el movimiento longitudinal de éstos.

En caso de uniones a distinto material, deberá disponerse un montaje dieléctrico de la tornillería, de modo que se evite el contacto eléctrico entre materiales de distinto potencial de reducción, causa de la corrosión galvánica.

Medición y Abono

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios el almacenaje, la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas y tornillería de acero inoxidable.

IV.4.10. VENTOSAS

Materiales

Se instalarán ventosas trifuncionales, capaces de realizar las funciones de:
- - eliminación de aire durante el llenado de la canalización
- - entrada de aire durante el vaciado de la canalización
- - desgasificación en servicio

Se instalarán ventosas de fabricantes aprobados por SCPSA, que deberán cumplir las siguientes características:

Cuerpo de Fundición Nodular con base a brida.
Tapa de fundición nodular con dos orificios en parte superior
Revestimiento interior y exterior con epoxi
Flotadores: esféricos con alma de acero inoxidable y revestidos de elastómero

Ejecución

Válvula de aislamiento: en aquellas ventosas que lleven incorporada válvula de aislamiento con obturador de elastómero y deriven de una conducción principal cuyo diámetro sea inferior a 250 mm, podrá evitarse la colocación de una válvula de seccionamiento entre la derivación y la ventosa.

Cuando la ventosa se ubique en una arqueta de registro, la tapa de la misma dispondrá de orificios para la entrada o salida de aire.

Medición y Abono

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o según las órdenes de la Dirección de Obra y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios el almacenaje, la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares, como juntas y tortillería con revestimiento Geomet 500B (Zn-Al).

IV.5. REDES DE SANEAMIENTO

IV.5.1. TUBERÍAS DE PVC CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

MATERIALES

TUBERÍAS DE P.V.C. PARA SANEAMIENTO

Los tubos de P.V.C. serán de color gris, pared compacta, Serie 20 (SDR 41), Presión Nominal PN6, según norma UNE-EN ISO 1452 y el fabricante de ellos deberá disponer de sello o marca de calidad.

Los tubos serán de una longitud no inferior a 6 m., el sistema de unión entre ellos será de campana y junta de goma y los diámetros exteriores admitidos varían entre 160 y 500 mm (ambos inclusive).

A fin de comprobar que el material empleado en la fabricación es el adecuado, se comprobarán los parámetros que se detallan a continuación, indicando los valores exigidos en la Norma ASTM D1784 y los métodos de ensayo correspondientes.

Parámetro	Valor exigido	Norma ensayo
Resistencia al impacto	34,7 J/m	ASTM-D256, Método A
Tensión mínima de tracción	48,3 MPa	ASTM-D638 con probetas tipo I
Temperatura de deformación	70	ASTM-D648

Estos ensayos serán realizados en un laboratorio aceptado por S.C.P.S.A.

Las gomas de unión entre tubos deberán cumplir las mismas características que las exigidas para los tubos de hormigón.

PIEZAS DE P.V.C PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO

Cuando así se exija en Planos o Memoria deberán colocarse piezas especiales de P.V.C. en las conducciones de saneamiento.

Estas piezas son codos, derivaciones o abrazaderas de acometidas.

En cualquier caso serán de Poli cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), Presión Nominal PN6 y color gris y salvo disposición en contra serán fundidas en una sola pieza. En caso de utilizarse piezas construidas mediante soldadura deberán ser admitidas y aprobadas por la Dirección de Obra.

Todas las piezas serán de los diámetros exigidos en planos, así como sus ángulos correspondientes, y contarán con las embocaduras y junta de goma necesarias.

Para las piezas abrazaderas de acometidas, éstas deberán contar con la plancha de goma y flejes de apriete que garantice su estanquidad con la tubería principal, o bien con la cola de unión que sustituya al sistema anterior cuando sea por sistema de contacto, en cuyo caso se exigirá exactitud entre el diámetro exterior del tubo a acometer y el interior de la pieza de abrazadera.

EJECUCIÓN

Lecho o asiento de los tubos

Nunca se apoyarán directamente sobre la rasante de zanja, sino sobre las camas que en cada tipo de tubería se definen en los planos de proyecto.

La ejecución del hormigón de limpieza se hará de forma simultánea con la excavación, de modo que la capa del cimiento mantenga sus condiciones portantes. El incumplimiento de este punto que cause deterioros del cimiento de la excavación ocasionará la necesaria sustitución del terreno que no será de abono.

Los tubos sobre lecho de hormigón se colocarán sobre apoyos prefabricados de hormigón que darán la cota y una vez introducidos se procederá al hormigonado continuo de la sección definida en los planos. Cuando el apoyo sea sobre material granular, éste se extenderá previamente con el espesor bajo la generatriz inferior definida en plano; sobre esta capa, y una vez retirado el material en la zona donde vaya a coincidir la campana, se colocará el tubo. Una vez colocado, se verterá en los laterales una segunda capa hasta obtener la altura en riñones exigida en planos para este material granular.

En los lugares que sea conveniente la Dirección de Obra podrá sustituir los hormigones de asiento por material granular seleccionado, no teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto, siendo abonable solamente la obra realmente ejecutada.

Montaje de los tubos

Los colectores deberán quedar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes de proyecto. Antes de la colocación de los tubos el Contratista deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra o de sus representantes que comprobarán que la zanja se halla en buen estado y con la rasante adecuada.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o desagües la excavación. No se colocará más de 100 m de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación.

La longitud máxima de la obra lineal en ejecución no sobrepasará los 300 m, siendo 100 m la máxima distancia abierta de zanja sin colocación del colector.

Será responsabilidad del Contratista el que los tubos hayan sido correctamente introducidos unos en otros y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. Antes de tapar la zanja se efectuarán las pruebas de estanquidad correspondientes, mediante carga de agua o aire, revisándose todas las juntas del tramo. Deberán subsanarse completamente los fallos de estanquidad que puedan detectarse en juntas o en tubos, aunque ello requiera la sustitución de uno o más tubos. Será también cuenta del Contratista la recogida de los vertidos, para lo cual fabricará una arqueta o bien utilizará un pozo de registro existente en el caso de que a juicio de la Dirección de Obra presente condiciones adecuadas. Los orificios que resulten deberán limpiarse y sellarse convenientemente, así mismo este registro quedará en perfectas condiciones de funcionamiento y estanquidad. El Contratista estará a lo dispuesto por la Dirección de Obra con objeto de que el montaje se realice con garantía de calidad y seguridad.

Todas las limitaciones impuestas al montaje de los tubos, así como las propias de los cruces de carreteras, están consideradas en los precios y por lo tanto no le da derecho al Contratista a reclamación alguna por estos conceptos.

MEDICIÓN Y ABONO

Se miden en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro. Su precio incluye la p.p. de colocación de juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de tubería y protección de estos cortes con mortero de resina aprobado por la Dirección de Obra y todas las operaciones precisas para su instalación según detalles de planos.

Igualmente se incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación con su junta de goma.

Asimismo, incluye los gastos propios de las pruebas de estanquidad a presión, con los contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias para la ejecución de las mismas.

El abono de las piezas especiales podrá ser:

- bien por unidades realmente instaladas según especificaciones de proyecto o Dirección de Obra, a los precios señalados para cada una en el Cuadro de Precios 1,

- bien incluido como parte proporcional en el precio por metro lineal de tubería.

El criterio será el aplicado en el Presupuesto de la obra. En cualquier caso incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, su colocación y los medios auxiliares.

IV.5.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

MATERIALES

a) Tubos de hormigón armado, con unión por enchufe con junta elástica

Los tubos de hormigón armado para colectores cumplirán como mínimo las especificaciones de la norma ASTM C76M para el tipo y clase de tubería definidas en proyecto.

Para el cálculo de la carga equivalente a unas determinadas condiciones reales de trabajo se adopta el método americano definido en el "Concrete pipe Hand book", definiéndose la clase de la tubería para soportar la carga que provoque como máximo una fisura de 0,25 mm.

Las tolerancias de dimensiones de los tubos (diámetro, longitud, espesor, etc.) y tolerancias en la situación de las armaduras serán las indicadas en la Norma ASTM C76M y se adoptarán los criterios de aceptación o rechazo en ella establecidos.

Los tubos se deberán unir mediante juntas elásticas que aseguren la estanquidad tanto a la presión exterior que pueda producirse por atascos como a la exterior que originen las aguas freáticas. Deberán permitir igualmente una cierta desviación angular.

El detalle del Proyecto de la junta, tanto en lo que respecta a los extremos de los tubos como a la goma, se considera que es un cometido del fabricante, si bien la Administración exigirá garantías que aseguren el correcto funcionamiento de la tubería.

En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente:

- Que se asegure la estanquidad.

- Que se mantengan las características de estanquidad sin que el peso del tubo produzca deformaciones que la puedan alterar.

- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que estará sometida.

- Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas e industriales, debiendo facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles.

- Los tubos serán de la longitud que estime conveniente el fabricante, si bien se considera conveniente adoptar un valor máximo de tres metros (3 m) y un mínimo de dos metros (2 m).

- Se exigirá una total estanquidad no admitiendo tubos en los que se produzcan goteos. En caso de que el sistema de fabricación pueda dar lugar a porosidades, que impliquen goteos en la zona de la campana y que ello se haya puesto de manifiesto en las pruebas

de estanquidad, la Administración podrá exigir que el interior de la campana y la longitud que se precise sea pintada con una pintura epoxi que se adhiera al hormigón y pueda conseguir la estanquidad. Esta pintura, también podrá ser exigida para mejorar las condiciones de asiento de la goma cuando el sistema de fabricación implique que se produzcan irregularidades en la zona de apoyo de la goma, que den lugar a faltas de estanquidad en el ensayo de presión.

Control de Calidad de Producción en tubos de hormigón armado

Los tubos de hormigón fabricados según las especificaciones mínimas indicadas en apartados anteriores deberán cumplir las condiciones establecidas en la Norma ASTM C76M, para tubos de hormigón armado:

Pruebas de resistencia a cargas ovalizantes

R1A Para tubo de hormigón armado, no se debe producir fisuración o en todo caso la anchura de las fisuras deberá ser menor de cero coma veinticinco milímetros (0'25 mm.) para la carga en el ensayo de tres aristas indicada para cada clase de tubo en la Norma ASTM.

R2A No se debe producir la rotura de la carga indicada para cada clase de tubo en la Norma ASTM. El ensayo se realizará según lo indicado en la Norma ASTM C497-81.

Prueba de presión hidráulica o de Estanquidad (E)

Las pruebas de presión hidráulica tienen por objeto comprobar la estanquidad de los tubos y de las uniones.

Se mantendrá una presión de 1kg/cm² durante un tiempo de 20 minutos, no debiendo producirse goteos ni a través de las juntas ni a través de las paredes del tubo. Se admitirán manchas de humedad siempre que no den lugar a goteos. Este tiempo de 20 minutos puede irse reduciendo en función de los resultados obtenidos, hasta llegar a un mínimo de 3 minutos.

Prueba de absorción

Se realizarán pruebas de absorción de hormigón de las paredes del tubo según el Método A de la Norma C497M-81 siendo el máximo admisible del 6% del peso en seco, en vez del 9% admitido en la Norma ASTM C76M-88.

Las pruebas se realizarán con varias probetas del tubo, que se elegirán de modo que sean representativas de partes del tubo que, por razones de fabricación, puedan ser diferentes y en cualquier caso una del cuerpo y otra de la zona de la campana.

Criterios de aceptación o rechazo.

Serán rechazados todos aquellos tubos en los que puedan apreciarse directamente defectos de:

- Fisuras de anchura igual o superior a 0'25 mm en una longitud superior a 10 cm.
- Dimensiones con desviaciones superiores a las tolerancias admitidas.

- Daños producidos por golpes u otras causas que puedan poner en peligro la estanquidad o reducir la resistencia.

- Defectos que indiquen deficiencias de dosificación o amasado, o vibrado del hormigón.

Con los tubos que no presenten defectos visibles se prepararán lotes para la recepción efectuándose un control estadístico en base a muestras aleatorias en las que se efectuarán los ensayos R1M o R2M, R1A. R2A, E y AA según el caso, descritos en el apartado anterior. El número de tubos a ensayar será:

ENSAYO	NOMENCLATURA	MUESTRA	MÍNIMO
Fisuración controlada	R1A	2 %	1
Rotura Armado	R2A	0,1 %	-
80 % Rotura Masa	R1M	-	-
Rotura Masa	R2M	0,5 %	3
Estanquidad	E	5 %	3
Posición Armaduras	AA	0,2 %	1

Debiendo para recibir el lote, ser satisfactorios todos los ensayos. En caso de que alguno no lo sea se repetirá el ensayo con dos nuevos tubos del mismo lote. Se recibirá el lote si todos estos nuevos ensayos son correctos, de no serlo se rechazará el lote.

Si los resultados de los ensayos de resistencia R1A o R1M y de presión hidráulica P no fuesen satisfactorios, el fabricante podrá proponer a la Dirección de Obra la prueba de todos los tubos aceptándose individualmente aquéllos que alcancen resultados correctos. La Dirección de Obra, a la vista de las circunstancias del caso, decidirá si las pruebas se refieren a los ensayos de resistencia, o de presión o a ambos.

En caso de que en la prueba de presión se produzcan goteos que pueda pensarse se solucionen con una adecuada pintura interior, el fabricante podrá proponer realizarla a su costa y repetir las pruebas de presión que si, en estas condiciones dan resultados favorables, pueden implicar la exigencia de pintar todos los tubos sin que ellos dé lugar a aumento de precio.

De los tubos que se hayan sometido a rotura y de aquéllos que no puedan ser admisibles para su utilización se efectuarán ensayos de absorción A.

Los resultados de la absorción deben ser satisfactorios en todas las muestras.

En caso de que los resultados sean correctos se entenderá que el sistema de fabricación es adecuado y podrá iniciarse la producción de los tubos contratados.

En caso de que algún o algunos tubos no alcancen los resultados exigidos en una o varias de las pruebas S.C.P.S.A. resolverá, a su juicio, si procede repetir el ensayo con otro lote o rescindir la contratación con pérdida de la fianza. Si se repitiesen los ensayos y el resultado fuese desfavorable se desechará ese material.

Los ensayos se realizarán en algún laboratorio especializado elegido por S.C.P.S.A., siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes, pero se deducirán de las certificaciones los gastos ocasionados

por los ensayos de lotes que no hayan sido aceptados, o los producidos por la repetición de muestras ensayadas.

Medios para las pruebas de los tubos y gastos ocasionados

El fabricante deberá tener instalados los medios para la realización de las pruebas y concretamente:

- Prensa para rotura de tubos de ensayo de tres aristas.

- Prensa para prueba de tubos a presión o sistema de llenado de lotes de tubos con un caudal mínimo que asegure el llenado de 50 tubos en un tiempo máximo de una hora.

Los ensayos de absorción serán realizados en algún laboratorio especializado elegido por S.C.P.S.A., siendo a cargo de ésta los gastos correspondientes.

El Contratista avisará a la Dirección de Obra cuando vaya a recibir el primer lote para que sea dado el visto bueno por S.C.P.S.A.

b) Juntas elásticas de unión entre tubos de hormigón

En el proyecto de la junta deberá analizarse especialmente:

- Que se asegure la estanquidad.

- Que se mantengan las características de estanquidad sin que el peso del tubo produzca deformaciones que puedan alterarla.

- Que la goma mantenga sus características en la situación de alternancia aire-agua a que estará sometida.

- Que resista la agresividad de las aguas residuales domésticas o mezcla de domésticas e industriales, debiendo facilitar información sobre los límites de agresividad admisibles.

A estos efectos se exigirán los siguientes resultados mínimos basados en lo indicado en la Norma ASTM C443 y en los criterios establecidos por la región de Lieja y que son los siguientes:

Carga de rotura mínima	85 kg/cm².
Alargamiento mínimo rotura	350%
Dureza Shore A	Entre 40 y 50
Compresión Set máx., en % de la	
Deformación realizada	15%
Envejecimiento acelerado:	
Pérdida máx. de tensión de rotura	15%
Reduc. máx. de alargamiento en rotura..	20%
Absorción máx. de agua en peso	10%
Resistencia al ozono	Sin ataque según método ASTM-D-1149
Resistencia a los hidrocarburos:	
Pérdida máx. de tensión de rotura	15%
Reducción máx. de alarg. en rotura	15%

Control de Calidad de Producción en juntas

* G.G. Prueba de las juntas de goma. Previamente a la fabricación en serie de las gomas se realizarán los ensayos necesarios para tener la seguridad de que la composición de la mezcla y el sistema de fabricación aseguran los resultados exigidos. Las técnicas de ensayo serán:

Carga de alargamiento de rotura	ASTM D 412
Dureza	ASTM D 2240 con excepción de la sec. 5
Compresión Set	ASTM D 395
Envejecimiento acelerado	ASTM D 573 con pruebas de 96 h. a 70ºC
Absorción de agua	ASTM D 471
Resistencia al ozono-Método A .	ASTM D 1171
Resistencia a los Hidrocarburos.	Las probetas para los ensayos de rotura deberán estar sumergidas 72 h. en aceite ASTM III a 20ºC.
Estructura interior.....	Se seccionará longitudinalmente la junta en dos mitades, comprobándose que no existen poros ni rechupes.

* GP. El proyecto de las gomas se comprobará mediante las pruebas de presión de los tubos observando que sean fáciles de introducir y que aseguren y mantengan las condiciones de estanquidad.

* Criterios de aceptación y rechazo de las gomas. Estas se comprobarán en lotes correspondientes a la misma fabricación. La Dirección de Obra efectuará los ensayos pertinentes en Laboratorios especializados sobre un dos por ciento (2%) del número de unidades del lote exigiéndose que todos los ensayos (como mínimo los indicados en la Norma ASTM C443 sean satisfactorios. En caso de que algún resultado no sea correcto se repetirá con dos nuevas unidades, por cada valor defectuoso, aceptándose el lote únicamente si todos los nuevos ensayos son satisfactorios.

La composición de las gomas deberá asegurar que se consigan todos los valores indicados en el apartado correspondiente que tienen el carácter de mínimos.

Las dimensiones serán las propuestas por el fabricante y aceptadas por la Dirección de Obra, estableciéndose para ellas las tolerancias admitidas en la Norma ASTM C443 y en los criterios establecidos para abastecimiento por S.C.P.S.A.

Para la recepción de las gomas la Dirección de Obra decidirá el tamaño de los lotes ensayándose el 1% con un mínimo de 2 muestras, rechazándose el lote si alguna de ellas no alcanza los mínimos exigidos. El lote rechazado quedará a disposición de S.C.P.S.A. hasta la terminación de la recepción del suministro en cuyo momento se devolverá al concursante. Si a juicio de la Dirección de Obra pudiera estimarse que una o las dos juntas seleccionadas para las pruebas no fueran representativas del lote, se repetirá el ensayo rechazándose si en una o en las dos no se alcanzan todos los valores mínimos exigidos.

c) Piezas para sustitución de tubos

Por si resulta necesario sustituir un tubo durante la ejecución de las obras o durante el servicio, se prepararán piezas de sustitución consistentes en:

- Medio tubo de conexión al anterior y terminado en extremo liso.
- Medio tubo de conexión al siguiente y extremo liso.
- Manguito para unión de los dos extremos lisos.

Los medios tubos una vez unidos a los extremos correspondientes a los tubos lindantes, quedarán enfrentados en sus extremos lisos para la conexión del manguito.

El manguito podrá ser de dos mitades, de forma que se consiga la estanquidad al atornillarlos presionando con junta de goma. Estará construido en fundición nodular o acero inoxidable 18/8. También se consideran admisibles manguitos de goma que se aprisionen contra los extremos de los tubos con abrazaderas de acero inoxidable 18/8.

Ejecución

Lecho o asiento de los tubos

Nunca se apoyarán directamente sobre la rasante de zanja, sino sobre las camas que en cada tipo de tubería se definen en los planos de proyecto.

La ejecución del hormigón de limpieza se hará de forma simultánea con la excavación, de modo que la capa del cimiento mantenga sus condiciones portantes. El incumplimiento de este punto que cause deterioros del cimiento de la excavación ocasionará la necesaria sustitución del terreno que no será de abono.

Los tubos sobre lecho de hormigón se colocarán sobre apoyos prefabricados de hormigón que darán la cota y una vez introducidos se procederá al hormigonado continuo de la sección definida en los planos. Cuando el apoyo sea sobre material granular, éste se extenderá previamente con el espesor bajo la generatriz inferior definida en plano; sobre esta capa, y una vez retirado el material en la zona donde vaya a coincidir la campana, se colocará el tubo. Una vez colocado, se verterá en los laterales una segunda capa hasta obtener la altura en riñones exigida en planos para este material granular.

En los lugares que sea conveniente la Dirección de Obra podrá sustituir los hormigones de asiento por material granular seleccionado, no teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto, siendo abonable solamente la obra realmente ejecutada.

Montaje de los tubos

Los colectores deberán quedar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes de proyecto. Antes de la colocación de los tubos el Contratista deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra o de sus representantes que comprobarán que la zanja se halla en buen estado y con la rasante adecuada.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o desagües la excavación. No se colocará más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación.

La longitud máxima de la obra lineal en ejecución no sobrepasará los 300 m., siendo 100 m. la máxima distancia abierta de zanja sin colocación del colector.

Será responsabilidad del Contratista el que los tubos hayan sido correctamente introducidos unos en otros y que, en consecuencia, las juntas resulten estancas. Antes de tapar la zanja se efectuarán las pruebas de estanquidad correspondientes, mediante carga de agua o aire, revisándose todas las juntas del tramo. Deberán subsanarse completamente los fallos de estanquidad que puedan detectarse en juntas o en tubos, aunque ello requiera la sustitución de uno o más tubos. Será también cuenta del Contratista la recogida de los vertidos, para lo cual fabricará una arqueta o bien utilizará un pozo de registro existente en el caso de que a juicio de la Dirección de Obra presente condiciones adecuadas. Los orificios que resulten deberán limpiarse y sellarse convenientemente, así mismo este registro quedará en perfectas condiciones de funcionamiento y estanquidad. El Contratista estará a lo dispuesto por la Dirección de Obra con objeto de que el montaje se realice con garantía de calidad y seguridad.

Todas las limitaciones impuestas al montaje de los tubos, así como las propias de los cruces de carreteras, están consideradas en los precios y por lo tanto no le da derecho al Contratista a reclamación alguna por estos conceptos.

Medición y Abono

Se miden en longitud real instalada, deduciendo los pozos de registro. Su precio incluye la p.p. de colocación de juntas, entronque con los pozos de registro u obras de fábrica, cortes de tubería y protección de estos cortes con mortero de resina aprobado por la Dirección de Obra y todas las operaciones precisas para su instalación según detalles de planos. Igualmente se incluye la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiegos, calce y nivelación y colocación con su junta de goma, así como los gastos propios de las pruebas de estanquidad y todas las modificaciones provisionales necesarias.

IV.5.3. TOLERANCIAS DE NIVELACIÓN EN TUBERÍAS DE HORMIGÓN

En la colocación de las tuberías, el error máximo en la nivelación de un tubo de 2,40 m. de longitud, deberá cumplir las expresiones siguientes:

error de pendiente <= pendiente del tramo / 5

error total máximo <= +/- 10 mm ...(para cualquier pendiente)

error total tolerado: +/- 3 mm ... (para cualquier pendiente)

Por tanto, en cada perfil la cota hidráulica admisible, será la cota teórica absoluta +/- el error. Los errores de altimetría no se irán acumulando, sino que irán corrigiéndose y compensándose tubo a tubo, siendo inadmisible la colocación de tubos en contrapendiente.

La corrección altimétrica cumplirá estas dos condiciones:

1.- Ningún tubo estará en contrapendiente.
2.- La deflexión máxima entre dos tubos será de 0,57º.

Estas dos condiciones pueden expresarse de la siguiente forma:

1.- Eaa-Eab+pL >0
2.- Eaa-Eab-0.01*L <0

siendo:

Eaa: Error respecto a la cota teórica en tubo aguas arriba
Eab: Error respecto a la cota teórica en tubo aguas abajo
p: Pendiente teórica
L: Longitud del tubo

Se comprobará, que la pendiente media entre pozos de registro consecutivos, varía menos de un 10% respecto a la proyectada.

IV.5.4. PRUEBAS DE ESTANQUIDAD EN TUBERÍAS DE SANEAMIENTO CON UNIÓN POR ENCHUFE CON JUNTA ELÁSTICA

EJECUCIÓN

Durante la ejecución y en todo caso, antes del relleno de la zanja, se someterán las obras a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista mecánicos e hidráulicos, con arreglo al programa que redacte la Dirección de Obra y teniendo en cuenta siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones vigentes.

Como norma general se probarán todos los tramos del colector, incluidos los pozos de registro.

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstas, sin abono alguno. A este respecto para tubería hasta D600 se procurará utilizar globos hinchables para el taponado de los tramos a probar. Para mayor diámetro se recurrirá al cierre de los conductos con tabique, de ladrillo o bloque, sellado con yeso.

A efectos hidráulicos las pruebas a que serán sometidas las canalizaciones y pozos de registro de saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias o fecales, deberán ser sometidas a pruebas de estanquidad en zanja.

Para ello es factible hacerlo según dos modalidades: con agua o con aire.

A. PRUEBA DE ESTANQUIDAD CON AGUA

A.1 CONDICIONES GENERALES

La conducción se someterá a una prueba de estanquidad de agua a presión por tramos. Se procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo.

Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro o podrán incluir también el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben

acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanquidad. Es condición indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la prueba.

La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalizar las juntas para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran.

A.2 PROCEDIMIENTO

Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanquidad, según proceda, de una de las dos formas siguientes:

a) **El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba.** El llenado de agua se efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua (h). Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire de la conducción.

b) **El tramo de conducción no incluye pozo de registro.** El llenado de agua se realizará desde el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento de la prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de agua fijada en la prueba (h).

En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón de la conducción. A partir de este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso A, a restituir la altura h de columna de agua y, en el caso B, a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión fijada en la prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de aguas abajo no supere la presión máxima admisible.

A.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Para la aceptación de la prueba se seguirá el siguiente método, que es el correspondiente a la normativa francesa (circular de 16-03-84 del Ministerio del Interior, Agricultura y Medio Ambiente)

Período de impregnación veinticuatro horas.

Presión de prueba 0,4 bar, equivalentes a una altura de columna de agua de 4 m, medida sobre solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba.

En ningún caso la presión máxima será mayor de 1 kg/cm².

La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para mantener el nivel no es superior a:

$V <= D^2$ (m) * L (m) ..... litros

VOLUMEN MÁXIMO ADMISIBLE PARA DAR POR VALIDA
UNA PRUEBA DE ESTANQUIDAD DE CONDUCCIÓN DE SANEAMIENTO

Diámetro (mm)	Litros / 30 min. /cada 10 ml. de conduc.
300	3
400	5
500	8
600	11
800	20
1000	31
1200	45
1400	61
1600	80

La expresión anterior corresponde a un 4 por mil del volumen contenido en el tramo probado.

Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de:

Vp = 0,5 litros/m² pared de pozo.

DIÁMETRO INTERIOR REGISTRO	Litros /30 min./cada ml. de altura de registro
1,00	1,57
1,20	1,88
1,50	2,36
1,80	2,83

Para conducciones de D > 1.200 mm se obturará el tramo de conducción a probar sin incluir los pozos de registro y se realizará la prueba de manera directa sin respetar el período de impregnación. La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos los volúmenes de aportación en litros para mantener la presión inicial, 0,4 bar, son menores que los fijados en la fórmula anterior. En caso contrario podrá efectuarse de nuevo la prueba respetando el período de impregnación de veinticuatro horas y controlando nuevamente la aportación transcurridos treinta minutos.

Todas estas pruebas se entienden sin localización de fugas, que, de aparecer, serán reparadas, independientemente de la tolerancia exigida.

B. PRUEBA DE ESTANQUIDAD CON AIRE

B.1 CONDICIONES GENERALES

La prueba de estanquidad mediante aire a presión se efectúa sobre tramos de conducción sin incluir pozos.

Se puede realizar una vez hechos los orificios de las acometidas, pero garantizando su cierre perfecto para evitar pérdidas de aire por dichos puntos.

Esta prueba se puede aplicar hasta conductos de diámetro 900 mm, no siendo recomendable para diámetros superiores.

B.2 PROCEDIMIENTO

Plan de ejecución según la norma ASTM C-924 M

1. Limpiar el tramo de conducción que se va a probar, especialmente la zona donde van a situarse los balones neumáticos de cierre. Estos balones deberán inflarse a la presión interna marcada por el fabricante.
2. Llenar con aire hasta que la presión interna en la conducción sea 0,27 kg/cm². Dejar estabilizar la presión hasta que descienda a 0,24 kg/cm ²
3. Medir la presión final (kg/cm²) transcurrido el tiempo de ensayo (indicado en la tabla).
4. Se considera válida si el descenso es menor o igual a 0,07 kg/cm ²

VALORES ASTM (tiempo de ensayo en minutos y segundos)					
	DIÁMETRO NOMINAL (mm)				
Longitud tramo a probar (metros)	PVC 250	PVC 315 HA 300	PVC 400 HA 400	PVC 500 HA 500	HA 600
100	**4m 40s**	**5m 44s**	**7m 05s**	**8m 38s**	**10m 48s**

Otras longitudes: interpolar
Diámetros mayores: Consultar a D.O.

MEDICIÓN Y ABONO

Todos los costes de las operaciones de pruebas de estanquidad, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto, se consideran incluidos en el precio de metro lineal de tubería.

IV.5.5. INSPECCIÓN VIDEOGRÁFICA DE LA RED DE SANEAMIENTO

Ejecución

Inmediatamente después de la limpieza de las conducciones para su recepción se realizará inspección videográfica completa de las mismas de acuerdo al artículo 46 de la Ordenanza cuyos requerimientos más reseñables son:

- Identificación del tramo por referencia a los pozos inicial y final.
- Material y diámetro de la tubería.
- Distancia de la ubicación de la cámara respecto al pozo inicial
- Visionado y grabación del colector, juntas y acometidas desde el interior.
- Pendiente longitudinal de la conducción a partir de la detectada por el sistema tractor de la cámara.

Cada tramo de colector vendrá recogido en un único archivo digital con formato de compresión MPEG, definiéndose tramo como la porción de colector entre dos pozos de registro.

Deberá presentarse informe resumen con las incidencias producidas, con copia en soporte digital.

Medición y Abono

Se miden por metros realmente inspeccionados en la obra. El precio unitario incluye todas las operaciones precisas, incluso entrega de un informe escrito con todas las incidencias descritas y localizadas, un reportaje fotográfico de las incidencias y un reportaje videográfico de la inspección.

IV.5.6. REGISTROS PREFABRICADOS

Materiales y Ejecución

Los registros deberán ser prefabricados ajustados a las especificaciones de la Norma UNE-EN 1917 Y UNE-EN 127917, tanto en dimensiones y cuantías como en niveles de calidad, ensayos de recepción, etc.

Estarán constituidos por los siguientes elementos:

-Pieza de fondo que deberá tener previstos los orificios para el paso de la tubería.

-Elementos cilíndricos intermedios.

-Elemento superior de reducción o losa de cubierta.

Las uniones entre estas piezas deberán contar con juntas de goma o de materiales elásticos que aseguren la total ESTANQUIDAD, tanto interior como exterior.

La pieza de fondo deberá tener agujeros para el paso de los tubos cuyo diámetro será función del tipo de junta a adoptar. La superficie que delimite los agujeros deberá ser completamente lisa de modo que pueda garantizarse la estanquidad mediante la presión que, sobre ella, efectúe la goma de la junta.

Las dimensiones de los módulos del pozo se definen en Planos.

Medición y Abono

Se miden por unidad de módulo base y módulos añadidos cilíndricos o cónicos realmente colocados en la obra. El precio unitario incluye todas las operaciones precisas para su puesta en obra, la colocación de los anillos o juntas estancas entre los módulos y la ejecución de las perforaciones y colocación de juntas de estanquidad para el colector y ramales que acometen al pozo registro. Igualmente incluye el transporte de los acopios y su trasiego.

IV.5.7. REGISTROS Y OBRAS DE FABRICA "IN SITU"

Ejecución

Se construirán con los materiales y según dimensiones especificados en los planos para cada uno de ellos, quedando afectado por las prescripciones exigidas para los materiales que los componen.

Si se utilizan, en parte, elementos prefabricados como son conos o módulos de pozo, éstos deberán tener las condiciones exigidas para este tipo de elementos.

Medición y Abono

El criterio de medición y abono de las unidades que intervienen en la ejecución de los pozos de registro y obras de fábrica realizadas “in situ”, será el que se desprende de las mediciones y Presupuestos del Proyecto, especialmente en las unidades correspondientes a hormigones, encofrados y armaduras.

En todos los registros se reforzará el alzado del muro situado sobre las tuberías, con 4 redondos D16 mm (2 inferiores y 2 superiores a 30 cm), con el fin de repartir lateralmente los esfuerzos.

La cubierta tendrá un vuelo de 5 cm y aristas romas con berenjeno de 3 cm., y el acabado superficial será de hormigón visto.

Cuando la altura real del pozo de registro, no difiera en más de 30 cm de la teórica, podrá adoptarse a efectos de valoración, la que figure en el Proyecto.

Las juntas bateaguas de PVC de arranque de muros, deberán cumplir las especificaciones indicadas en el apartado correspondiente de este Pliego.

IV.5.8. ENTRONQUES DE TUBERIAS EN LOS POZOS Y ARQUETAS

MATERIALES

Los eentronques de colectores y acometidas a los pozos y arquetas de registro deberán reunir las condiciones de ESTANQUIDAD y ELASTICIDAD, para cualquiera de las soluciones que se adopten.

A. JUNTAS DE ESTANQUIDAD ENTRE POZO Y TUBOS DE HORMIGÓN

Las uniones del registro con los tubos deberán ser ESTANCAS y ELÁSTICAS, definiéndose los dos modelos siguientes:

- De gran elasticidad, ajustada a la Norma ASTM C923, que deberá permitir desviaciones de al menos 7 grados manteniendo las condiciones de estanquidad. Constará de un elemento cónico que se presionará contra la pared del registro con un aro de aluminio o acero inoxidable AISI 304 con articulaciones que aseguren la posición definitiva y con una abrazadera de acero inoxidable AISI-304 que presione la goma contra el tubo. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Administración, que exigirá justificación de experiencia satisfactoria del modelo propuesto.

- De pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros superiores a 500 mm y de 4 grados en inferiores. Constará de una pieza de goma con la superficie exterior lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de modo suficiente para que consiga estanquidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas

sus características, deberá ser aprobado por la Administración que exigirá justificación de experiencias satisfactorias del modelo propuesta.

La utilización de un tipo u otro será decidida por el Ingeniero Director a la vista de las condiciones de apoyo.

B. JUNTAS DE ESTANQUIDAD ENTRE POZO Y TUBOS DE PVC

Las uniones del registro con los tubos deberán ser estancas y elásticas, definiéndose los dos modelos siguientes:

- Junta elástica labiada: de pequeña elasticidad que admitirán desviaciones del orden de 2 grados en diámetros superiores a 500 mm y de 4 grados en inferiores. Constará de una pieza de goma con la superficie exterior lisa y la interior dentada que será comprimida presionada por el tubo de modo suficiente para que consiga estanquidad total. El modelo concreto a adoptar, con todas sus características, deberá ser aprobado por la Administración que exigirá justificación de experiencias satisfactorias del modelo propuesta.

- Entronque con manguito embutido de P.V.C.: con un bulbo perimetral situado en la zona central que sirve para alojar la junta de estanquidad con el tubo que en él se embute y sirve, simultáneamente, de resalto del pasamuros. El exterior de este manguito debe presentar una superficie claramente rugosa y granular. Su procedencia será de casa acreditada y deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

EJECUCIÓN

Los eentronques de colectores y acometidas a los pozos y arquetas de registro deberán reunir las condiciones de ESTANQUIDAD y ELASTICIDAD, para cualquiera de las soluciones que se adopten:

- Entronque con junta elástica labiada: se colocará la junta elástica labiada en el orificio de la base realizado en fábrica o en una perforación a posteriori realizada mediante máquina de corte al diamante.

- Entronque con manguito de P.V.C.: Este manguito se embutirá en el hormigón.

  Si la obra de fábrica se construye in situ, el manguito se embutirá en el propio hormigonado vigilando especialmente la no formación de coqueras, huecos o poros en la parte inferior del mismo.

  En el caso de utilizarse en pozos prefabricados, se colocará el manguito en el orificio que a tal efecto presenta el pozo o en uno practicado al efecto (mediante perforación con máquina de corte con disco de diamante). Una vez colocado se procederá al relleno mediante mortero expansivo del espacio libre entre el manguito y el contorno del orificio.

Las juntas de los tubos de hormigón armado con las obras de fábrica en que por sus características no sea posible la colocación de juntas elásticas, se realizarán "in situ" rellenando el hueco existente entre el tubo y la obra de fábrica con mortero expansivo de primera calidad y marca acreditada. El

hueco a rellenar con dicho mortero será de tres centímetros (3 cm.) de espesor a todo lo largo y ancho del perímetro de unión.
Deberán contar con la autorización expresa de la Dirección de Obra.

MEDICIÓN Y ABONO

Todas las operaciones necesarias para los entronques de las tuberías a los pozos o arquetas de saneamiento se consideran incluidas en el precio del pozo.

IV.5.9. PRUEBAS ESTANQUIDAD EN POZOS DE REGISTRO

Ejecución

En el caso de colectores de PVC, las pruebas de aire de la tubería no incluyen los pozos de registro.

En estos casos se exigirá la realización de pruebas de estanquidad de, al menos, un 10% de los pozos de registro. Las pruebas se realizarán con agua.

Ejecución de la prueba

Pates instalados: la prueba se realizará con los pates instalados.

Obturación de acometidas: Se procederá, antes de realizar la prueba, a la obturación total de la conducción que atraviese el pozo. Si recibe acometidas secundarias, es condición indispensable el poder realizar la obturación de las acometidas para realizar la prueba.

Llenado de agua: Realizada la obturación del pozo se pasará a realizar la prueba de estanquidad, procediendo al llenado de agua del pozo hasta enrasar con el último modulo (recrecido, losa o cono) prefabricado.

Se dejará transcurrir un tiempo de 30 minutos antes de iniciarse la prueba para permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón del pozo. A partir de este momento se iniciará la prueba procediendo a restituir la altura de columna de agua.

Criterios de aceptación: se considera válida la prueba si el descenso en los siguientes quince minutos no supera 1 cm por pieza prefabricada (Base, Recrecidos, Cono y/o Losa) medidos sobre la superficie de la apertura para la tapa de registro (60 cm de diámetro).

Todas estas pruebas se entienden sin localización de fugas, que, de aparecer, serán reparadas, independientemente de la tolerancia exigida.

MEDICIÓN Y ABONO

Todos los costes de las operaciones de pruebas de estanquidad, salvo que estén específicamente indicadas en el presupuesto del presente Proyecto, se consideran incluidos en el precio del pozo de registro.

IV.5.10. PATES TREPADORES

Materiales

Los pates, con las dimensiones que figuran en los planos, serán los aceptados por S.C.P.S.A., construidos de polipropileno reforzado con varilla de acero y deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 13101.

Los pates de polipropileno, según las especificaciones de norma UNE-EN 13101, resistirán una fuerza de arrancamiento de 5 KN.

Ejecución

La colocación de los pates trepadores se ejecutará introduciéndolos a presión en orificios practicados al efecto. Estos orificios se ejecutarán mediante taladro sobre el hormigón existente y tendrán las dimensiones especificadas por el fabricante o los que dicte en su caso la Dirección de Obra.

El orificio no deberá afectar a la junta de estanquidad entre módulos.

Los pates una vez colocados quedarán perfectamente alineados tanto vertical como horizontalmente dentro del pozo de registro.

La separación entre pates será de 25 cm., colocando el primero de ellos a 50 cm. del acceso al pozo de registro.

La colocación de los pates se hará de tal forma que la presión ejercida para su introducción en los orificios taladrados no cause ningún desperfecto en el propio pate.

Pruebas a someter a los pates colocados

Los pates trepadores serán sometidos a pruebas de tracción y presión vertical una vez colocados en los registros.

La fuerza mínima a la que serán sometidos a tracción será de 5 KN, no permitiéndose arrancamientos ni movimientos de éstos.

La presión vertical mínima a la que se someterán será de 2 KN, no permitiéndose como en el caso anterior ni arrancamientos ni movimientos de los pates trepadores.

Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de medida necesarios para realizar éstos, sin abono alguno ya que su coste está incluido en los precios de colocación.

Medición y abono

Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1, incluyendo dichos precios el almacenaje, su colocación y los medios auxiliares.

IV.5.11. MARCOS Y TAPAS DE REGISTRO

Materiales

Los marcos y tapas de registro serán en todo caso de fundición nodular y de las dimensiones especificadas en los planos. Igualmente deberán contar con los elementos de cierre y maniobra que se especifiquen, y su procedencia deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

Para accesos a registros y arquetas se utilizarán, siempre que no sean suministrados por S.C.P.S.A.:

- Tapas de registro abatibles: normalizadas por S.C.P.S.A., deben cumplir los requisitos siguientes:
  - tapas circulares de paso libre 600 mm
  - características del tipo D400 según la Norma EN124, es decir que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 40 T.
  - diseño que asegure el auto centrado y la estabilidad de la tapa, ya sea un dispositivo de acerrojamiento mediante apéndice elástico solidario a la tapa, sin soldadura ni otro tipo de unión u otro aprobado por SCPSA
  - tapa exterior articulada abatible mediante charnela sin holgura lateral, provista de 2 topes de posicionamiento en la periferia de la tapa a ambos lados de la charnela, con bloqueo de seguridad a 90º.
  - junta de insonorización de elastómero.
  - revestimiento del marco y tapa con pintura bituminosa negra.
  - los marcos deberán tener un mínimo de 4 tacos de anclaje metálicos y tornillos M-12 para facilitar un anclaje a la boca del cono de pozo.

- Tapas de registro hidráulicas: normalizadas por S.C.P.S.A., deben cumplir los requisitos siguientes:
  - tapas cuadradas de paso libre 40x40 o 60x60 cm.
  - características del tipo B125 según la Norma EN124, es decir que estén dimensionadas para soportar una carga de control de 12.5 T.
  - tapa exterior articulada mediante ranura en marco con 2 topes de posicionamiento y extraíble.
  - dispositivo de cierre hidráulico.
  - revestimiento del marco y tapa con barniz epoxi negro.
  - fijación a la arqueta mediante patillas en el marco.
    Únicamente se podrán usar en arquetas de sección cuadrada cuya profundidad de solera no exceda de 1,50 m o en losas de cubierta con bocas de acceso de sección cuadrada.

La tapa deberá ir provista de dos inscripciones:

- una alusiva al propietario del servicio (MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA)
- otra alusiva al servicio que aloja la arqueta o pozo

En el caso de registros para alojamiento de ventosas, la tapa debe ser ventilada.

Ejecución

En pozos de registro situados en campos de cultivo, la tapa del registro debe sobresalir del terreno 30cm y debe realizarse un recibido perimetral de la misma con hormigón HM-20, de modo que se proteja y se evite su aterramiento durante las tareas agrícolas.

En el caso de pozos de registro en zonas pavimentadas, la tapa se debe colocar con el eje bisagra->cierre en el sentido de circulación del tráfico, de modo que una tapa accidentalmente abierta, se cierre al paso del vehículo.

Según la experiencia de SCPSA en el mantenimiento de tapas de pozos de registro, la mayor parte de las incidencias en zonas pavimentadas se refieren a marcos hundidos o mal asentados sobre el pozo, así como a tapas que emiten ruidos al paso de vehículos.

El origen del problema de los ruidos, se encuentra siempre en la falta de un contacto adecuado marco-tapa, que debe cumplir con los s de un contacto continuo, homogéneo y acerrojado, con la junta de insonorización interpuesta.

El origen del problema de los marcos sueltos o hundidos se encuentra en un mal apoyo del marco sobre el pozo, con excentricidades excesivas, recrecidos de hormigón excesivos, de mala calidad o no solidarios al pozo. Este problema puede derivar en alabeos del marco, que modificarán el contacto marco-tapa, produciendo el deterioro de la junta.

De todo lo anterior se deriva una serie de exigencias para la colocación del conjunto marco-tapa:

- El recrecido del pozo de registro, en caso que sea necesario, debe hacerse con hormigón armado según indica la normativa de SCPSA al respecto. Dicho recrecido debe solidarizarse con el pozo mediante un puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes con barras de acero corrugado ø12 B500 S
- Dicho recrecido no podrá exceder de una altura máxima de 20 cm.

- El recortado del pozo de registro, en caso que sea necesario, debe hacerse sin que de él resulte ninguna disminución efectiva de la superficie de apoyo del marco sobre la coronación del pozo de registro.
- Dicho recortado no podrá exceder de una altura máxima de 10 cm.

- El marco debe estar bien asentado sobre el pozo, evitando excentricidades entre ambos.

- El marco se debe anclar al pozo mediante tacos expansivos y tuercas o varillas roscadas M12. El apoyo del marco sobre el pozo debe ser CONTINUO, de modo que se eviten futuras deformaciones del marco ante las solicitaciones del tráfico.

- El **remate de mortero** entre marco y pozo debe hacerse:

  - sin que tapone la vía de desagüe del cajero de la articulación

  - debe dejar espacio bajo el resalte del marco para permitir el acerrojamiento de la tapa

  - asimismo debe dejar libre la junta, permitiendo su cambio sin tener que retirar el remate de mortero.

- Tras los trabajos de pavimentación, debe asegurarse que la articulación y el sistema de cierre quedan totalmente libres y operativos.

Medición y Abono

Marco y tapa forman una única unidad, que se medirá y se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto, entendiéndose incluida la carga y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo, anclaje a pozo o arqueta y nivelación del marco a cota de pavimento, incluso medios auxiliares.

Cuando en el Presupuesto se hace referencia a las dimensiones de la tapa, se está indicando la medida del paso libre, abertura o cota de paso del sistema marco-tapa. Es obligación del contratista la correcta identificación del modelo que figure en Presupuesto, corriendo de su cargo los costes derivados de una mala interpretación de las dimensiones del modelo descrito en el Presupuesto.

IV.6. REDES DE DRENAJE

IV.6.1. TUBERIAS DRENAJE P.V.C.

Materiales

Las tuberías de drenaje de P.V.C. serán de diámetro interior 160 mm, salvo especificación en contra que figure en planos, podrán ser circulares o con asiento en artesa, debiendo tener el fondo sin orificios de un máximo de sector de 90^{o}.

El número de orificios no será inferior a 30 por metro lineal y su dimensión mínima será superior a 3 mm

Las uniones entre tubos se harán con manguitos suministrados por la propia casa fabricante, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

Ejecución

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos.

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización expresa de la Dirección de Obra. Los tubos se tenderán sobre un lecho de material filtrante de diez (10) centímetros de espesor, en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

Las uniones entre tubos se harán con manguitos suministrados por la propia casa fabricante, la cual deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.

El material filtrante cubrirá el tubo hasta una altura mínima de 25 centímetros por encima de la generatriz superior.

Medición y Abono

Se medirán por ml realmente ejecutados y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.

El precio incluye el material (tubería y piezas de conexión), transporte y colocación en zanja, según las condiciones de Proyecto

IV.6.2. RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL DRENANTE

Materiales

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su composición granulométrica:

- Tamaño máximo de árido 76 mm
- El cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasará el 5%
- Coeficiente de uniformidad del filtro será inferior a veinte $\boxed{F_{60}/F_{10} < 20}$
- Condiciones de filtro, que son:

Siendo: Fx tamaño superior al del x%, en peso, del material filtrante
dx tamaño superior al del x%, en peso, del terreno a drenar

$$F_{15}/d_{85} < 5 \qquad F_{15}/d_{15} > 5 \qquad F_{50}/d_{50} < 25$$

El material drenante junto a los tubos deberá cumplir, para tubos perforados:

$$\frac{F_{85}}{Diámetro_orificio} > 1$$

cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG-3 a los materiales filtrantes.

Ejecución

Se proseguirá el relleno con material drenante hasta la cota fijada en el Proyecto o que, en su defecto, indique el Director de las Obras.

Se cuidará especialmente no dañar los tubos ni alterar su posición.

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite la segregación y contaminación del mismo. En especial, se tendrán presentes las siguientes precauciones: evitar una exposición prolongada del material a la intemperie, formar los acopios sobre una superficie que no contamine al material, evitar la mezcla de distintos tipos de materiales.

Los trabajos se realizarán de modo que se evite en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños, o por la circulación, a través del mismo, de agua de lluvia cargada de partículas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutarán en el menor plazo posible y, una vez terminados, se cubrirán, de forma provisional o definitiva, para evitar su contaminación. También se adoptarán las

precauciones necesarias para evitar la erosión o perturbación de los rellenos en ejecución, a causa de las lluvias, así como los encharcamientos superficiales de agua.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminación o perturbación de alguna zona del relleno, se procederá a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas condiciones.

La parte superior de la zanja, cuando no lleve inmediatamente encima cuneta de hormigón ni capa drenante del firme, se rellenará con material impermeable, para impedir la colmatación por arrastres superficiales y la penetración de otras aguas diferentes de aquellas a cuyo drenaje está destinada la zanja.

Las operaciones de relleno de la zanja se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en el artículo 421 del Pliego PG-3.

Medición y Abono

Se medirán por m³ realmente ejecutados según la sección definida en los planos del proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1.

No serán de abono la eliminación y sustitución de las zonas de relleno afectadas por contaminación o perturbación.

El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de Proyecto.

IV.6.3. GEOTEXTIL FILTRANTE

Materiales

Las funciones principales que se asignan a este geotextil serán las de Filtración y Separación.

Filtración: retención de partículas de grano fino al fluir el agua hacia una capa de grano grueso.

Separación: de dos capas de suelo de diferentes propiedades físicas (granulometría, consistencia, densidad,...).

A colocar en drenajes superficiales, fosos de drenaje, envoltura de drenes filtrantes,...

Exigencias mecánicas impuestas al geotextil:

- Resistencia a la perforación y al punzonamiento durante la colocación y posterior vida útil.

- Evitar la migración de finos cumpliendo los criterios de filtro para la apertura eficaz de poro Dw.

Exigencias hidráulicas impuestas al geotextil:

- Retención de finos

- Garantizar un paso de agua sin presión, cumpliendo los criterios de filtro para la permeabilidad, tanto vertical kv como horizontal kh.

Comportamiento a largo plazo:

- Resistencia a la putrefacción y química durante la vida útil
- Evitar la colmatación del filtro de geotextil

Tipo de geotextil indicado:

- Geotextil no-tejido, con filamentos continuos de polipropileno o poliéster virgen, ligados mecánicamente por agujado, exento de material reciclado, con un peso mayor que 100 gr/m2.

Características generales

PROPIEDADES MECANICAS	UNIDAD	METODO ENSAYO	VALOR
Masa	g/m^2	UNE-EN ISO 9864	>100
Espesor (2 KPa)	mm	UNE-EN ISO 9863	<2.0
Resistencia a tracción (rotura)	KN/m	UNE-EN ISO 10319	>5
Alargamiento a rotura	%	UNE-EN ISO 10319	>50
Resistencia al punzonamiento estático	KN	UNE-EN ISO 12236	>1.0
Resistencia a la perforación dinámica	mm	UNE-EN ISO 13433	<35

PERMEABILIDAD	UNIDAD	METODO ENSAYO	VALOR
Apertura eficaz de poros (O_{90})	µm	UNE-EN ISO 12956	$50 \leq O_{90} \leq 200$ (*)
Permeabilidad normal al plano k_v	mm/s	UNE-EN ISO 11058	>75 (**)

(*) comprobar Criterio de retención según tipo de suelo (artículo 422.2.2 del Pliego PG-3)
(**) comprobar Criterio hidráulico según tipo de suelo (artículo 422.2.3 del Pliego PG-3)

DURABILIDAD	UNIDAD	METODO ENSAYO	VALOR
Vida en servicio	años	--	>25
Durabilidad	%	UNE-EN 12226	>80
Resistencia a intemperie	%	UNE-EN 12224	>80
Degradación química	%	UNE-EN 14030	>80
Resistencia a la oxidación	%	UNE-EN ISO 13438	>80

Transporte y almacenamiento

Los geotextiles se suministrarán, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e irán debidamente identificados y etiquetados según EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá marcado, al menos, con:

- Datos del fabricante y/o suministrador
- Nombre del producto
- Tipo del producto
- Identificación del rollo o unidad
- Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos
- Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete)
- Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, según UNE- EN ISO 9864
- Principal(es) tipo(s) de polímero(s) empleado(s)

Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318
El nombre y el tipo del geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio geotextil a intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda ser identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente estampadas la partida de producción y la identificación del rollo o unidad. De cada rollo o unidad habrá de indicarse también la fecha de fabricación.
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos en las capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.).
El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos cortantes y punzantes. No se almacenará ningún rollo o fracción que haya resultado dañado o no esté adecuadamente identificado por resultar una fracción demasiado corta o haberse deteriorado el marcado original.
Para almacenamiento del material de duración mayor de quince (15) días, se respetarán escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protección frente a la acción directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas ancladas o sujetas.
En el momento de la colocación, el Director de las Obras ordenará la eliminación de las capas más exteriores de los rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su instalación, no resulte identificado por su marcado original.
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

Control

Las características técnicas que sean exigibles al geotextil según lo especificado en este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie (UNE-EN ISO 9864), resistencia a tracción y alargamiento bajo carga máxima (UNE-EN ISO 10319), y perforación dinámica por caída de cono (UNE-EN ISO 13433) y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar serán comprobadas según el procedimiento que se describe a continuación.
El Director de las Obras podrá, en todo momento, exigir la comprobación de cualquiera de las características técnicas del producto y aceptar o rechazar, consecuentemente, los lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al valor nominal del producto corregido de la tolerancia, según las características que el Contratista envió para su aprobación por el Director de las Obras.

Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo día de la instalación se exigirá una resistencia a la tracción remanente, después de un ensayo de resistencia a la intemperie (EN-ENV 12224), de al menos el ochenta por ciento (80%) de la nominal, si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos semanas y superior al sesenta por ciento (60%) de la nominal si va a quedar cubierto después de quince (15) días y antes de cuatro (4) meses. En los casos en que de la resistencia a largo plazo no sea importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podrán aceptarse, para los valores antedichos una reducción adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptará ninguna aplicación del geotextil en que este quede al descubierto por más de cuatro (4) meses.
El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de geotextiles con períodos de tiempo entre su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán geotextiles cuyo período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación supere los seis (6) meses, independientemente de las condiciones de almacenamiento.

Ejecución

El soporte deberá ofrecer una superficie continua y regular. Deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes.

La instalación se iniciará en los taludes de abajo hacia arriba y lastrando el material para evitar levantamientos por la acción del viento.

El geotextil se suministra en rollos. La manipulación de los mismos se hará con maquinaria adecuada, evitando el arrastre de los mismos.

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas cosidas, soldadas o grapadas. El tipo de unión será el indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberá realizarse sin dañar el geotextil.

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas.

Medición y abono

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) de superficie recubierta, de acuerdo al precio establecido en el Cuadro de Precios Nº1, quedando incluidos en este precio los solapes necesarios.
El precio por metro cuadrado (m2) incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a la obra, recepción y almacenamiento.
Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que sean necesarias para la correcta instalación del geotextil según determinen el Proyecto y el Director de las Obras.

IV.6.4. CAZ DE HORMIGÓN

Materiales

* Condiciones generales

Los caces prefabricados de hormigón deberán ser de doble capa y se ejecutarán con hormigones de Fck≥25 N/mm² fabricados con áridos procedentes de machaqueo y cemento CEM II/A-M 42.5

* Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los cad de hormigón serán las señaladas en los planos. La longitud mínima de las piezas será de medio metro (0.5 m.).

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm)

* Calidad

Según la Norma UNE-EN 1340, las prestaciones se definen por clases respecto a:

Resistencia climática:
Absorción de agua: deberá ser Clase 2 (≤ 6% en peso)
Resistencia hielo-deshielo: Clase 3

Resistencia a flexión: Clase 3 (resist. característica 6,0 MPa)
Resistencia a desgaste por abrasión: Clase 3 (≤20 mm)

Ejecución

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuyas dimensiones figuran en los planos. El hormigón de apoyo será HM-20.

Las piezas que formen el cad serán iguales y estarán enteras sin presentar roturas de ninguna clase. Se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm relleno por mortero del mismo tipo que el de asiento.

Una vez terminada la colocación y unión entre piezas quedará el cad perfectamente limpio y sin resto ninguno de mortero, y su alineación en planta y alzado deberá ser perfecta, debiendo haberse ejecutado con cordel y piquetas.

Medición y Abono

Se medirán por ml. realmente colocados, e indicados en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1 del Presupuesto.

IV.7. AFIRMADOS Y PAVIMENTOS

IV.7.1. BASES GRANULARES. ZAHORRAS ARTIFICIALES

Materiales

El material procederá del machaqueo de piedra de cantera y su curva granulométrica se ajustará al huso ZA20 o ZA25. Las restantes características se ajustarán a las especificaciones del art. 510 del PG-3 del MOPU.

Ejecución

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación.

Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1 del Pliego PG-3.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas «in situ» en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla.

Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio.

Medición y Abono

La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m^3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones-tipo señaladas en los Planos.

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.

IV.7.2. BORDILLOS DE HORMIGÓN

Materiales

* Condiciones generales

Los bordillos prefabricados de hormigón serán de doble capa y se ejecutarán con hormigones de tipo Fck=25 N/mm² o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento CEM II/A-M 42.5

* Forma y dimensiones

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos.

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos, y su directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados.

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m.).

Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros (10 mm)

* Calidad

Peso específico neto: No será inferior a tres mil trescientos kilogramos por metro cúbico (3.300 kg/m³).

Carga de Rotura (comprensión): Mayor o igual que doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (> 200 kg/cm²).

Según la Norma UNE-EN 1340, las prestaciones se definen por clases respecto a:

- Resistencia climática:
  Absorción de agua: deberá ser Clase 2 (≤ 6% en peso)
  Resistencia hielo-deshielo: Clase 3
- Resistencia a flexión: Clase 3 (resist. característica 6,0 MPa)
- Resistencia a desgaste por abrasión: Clase 3 (≤20 mm)

Ejecución

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuyas dimensiones figuran en los planos, pudiendo según ellos estar acompañadas de rigola lateral. El hormigón de apoyo será HM-20.

Las piezas que formen el bordillo serán iguales y estarán enteras sin presentar roturas de ninguna clase. Se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm relleno por mortero del mismo tipo que el de asiento.

Una vez terminada la colocación y unión entre piezas quedará el bordillo perfectamente limpio y sin resto ninguno de mortero, y su alineación en planta y alzado deberá ser perfecta, debiendo haberse ejecutado con cordel y piquetas.

Medición y Abono

Se medirán por ml. realmente colocados, e indicados en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto.

No habrá precio adicional para las piezas curvas, especiales y de bordillo rebajado.

En este precio se encuentra incluido el bordillo, lecho de asiento, mortero, contra bordillo, rigola, excavación para el asiento, etc., y cuantas operaciones y materiales sean necesarios para la total terminación de esta unidad de obra.

IV.7.3. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO

Materiales

El hormigón a emplear será del tipo HM-20/B/20/I y cumplirá las condiciones que para el agua, los áridos y los aditivos se indican en el art. 550 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes.

Ejecución

La ejecución de los pavimentos de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las operaciones siguientes:

* Preparación del tajo:

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente y se mantendrán húmedos los encofrados.

* Puesta en obra del hormigón

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.) entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorables condiciones de humedad y temperatura.

En ningún caso se colocarán amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. Si se interrumpe la extensión por más de media hora, se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas; si el tiempo de interrupción es mayor al máximo admitido, se dispondrá una junta transversal.

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón mediante bomba, excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo desde las canaletas propias de un camión hormigonera. Deberán evitarse las maniobras que produzcan segregación.

La compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera tal que se obtenga un perfecto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación.

* Juntas

El hormigonado se hará por carriles de ancho constante separados por juntas longitudinales de construcción.

Las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, se realizarán mediante serrado. Este se realizará entre las seis (6) y doce (12) horas posteriores a la colocación del hormigón.

No es conveniente hacer losas muy alargadas. Lo óptimo son losas tendiendo a cuadradas; sin embargo, es habitual hacerlas rectangulares, en cuyo caso la relación entre las longitudes de los lados no debe ser superior a dos: uno (2:1). Las dimensiones recomendables y máximas de las losas de un pavimento de hormigón, en función de su espesor, referidas al lado mayor de la losa serán las siguientes:

Espesor	Distancia recomendable	Distancia máxima
16 cm.	3,75 m.	4,50 m.
18 cm.	4,00 m.	5,00 m.
20 cm.	4,25 m.	5,50 m.

* Acabado del hormigón

Para el acabado del pavimento, tras el talochado y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará, mediante cepillado o barrido, una textura transversal uniforme a definir por la D.O.

* Curado

Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado por lluvia, contra una desecación rápida especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra los enfriamientos bruscos y la congelación.

El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados, mediante productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 285 del PG-3 o por otros sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras humedecidas.

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será impuesta por la Dirección de Obra en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho el Contratista a reclamación alguna por este concepto.

* Control:

Ensayos de resistencia del hormigón.

La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto.

La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas.

El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la sección-tipo de los Planos.

En el caso de pavimentos de hormigón, se comprobará que las losas no presenten fisuras. Si se observa que a causa de un serrado prematuro se producen desconchados en las juntas, deberán ser reparadas con un mortero de resina epoxi.

Medición y Abono

Se medirán por m² realmente ejecutados a los precios del Cuadro de Precios 1.

En este precio se incluyen todas las labores propias de esta unidad de obra completa, incluyendo el vertido con bomba, los productos de curado superficial, la formación de peraltes, encofrados y desencofrados necesarios, el vibrado en espesor con aguja, el extendido con regla vibratoria, el talochado y acabado de superficie con barrido o espigado. Incluye asimismo el p.p. de la formación de juntas de retracción transversales.

IV.7.4. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CON ARIDO CALIZO

La mezcla cumplirá las condiciones que para la misma se indican en el art. 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

El árido utilizado será de naturaleza caliza y procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera. Su granulometría se ajustará al tipo AC16 o AC22.

Esta mezcla no se empleará en capa de rodadura, quedando limitado su uso a las capas intermedia o de base.

La cantidad mínima de betún por Tonelada de mezcla será de cuarenta kilogramos.

El betún utilizado será del tipo B 60/70.

Ejecución

Las condiciones de ejecución se indican en el art. 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Medición y Abono

Se medirán por Tm. o m² realmente ejecutados a los precios del Cuadro de Precios nº1. La sección de abono será la teórica de los planos y mediciones, debiendo el Contratista recabar la autorización expresa de la Dirección de Obra para cualquier exceso debido a saneos localizados no previstos en proyectos.

Cuando el abono se haga por Tm., su medición se hará por vales de pesada sobre camión.

IV.7.5. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE CON ÁRIDO OFÍTICO

La mezcla cumplirá las condiciones que para la misma se indican en el art. 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

El árido utilizado será de naturaleza ofítica y procederá de machaqueo y trituración de piedra de cantera. Su granulometría se ajustará al tipo AC-16 o inferior.

La cantidad mínima de betún por tonelada de mezcla será de cincuenta y cuatro kilogramos.

El betún empleado será del tipo B 60/70.

Ejecución

Las condiciones de ejecución se indican en el art. 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3).

Medición y Abono

Se medirán por Tm. o m² realmente ejecutados a los precios del Cuadro de Precios nº1. La sección de abono será la teórica de los planos y mediciones, debiendo el Contratista recabar la autorización expresa de la Dirección de Obra para cualquier exceso debido a saneos localizados no previstos en proyectos.

Cuando el abono se haga por Tm., su medición se hará por vales de pesada sobre camión.

IV.8. OBRAS DE ALBAÑILERÍA

IV.8.1. MORTEROS

La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo correspondiente.

El mortero de unión deberá ser hidrófugo.

La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la Dirección de Obra:

- Mortero para las fábricas de ladrillo caravista:
  Mortero mixto de cemento blanco 1:1:6

  220 kg de cemento blanco/m³ de mortero.
  0'165 m³ de cal/m³ de mortero.
  0'980 m³ de arena/m³ de mortero.
  0'170 m³ de agua/m³ de mortero.

- Mortero para las fábricas de ladrillo a revestir:
  Mortero de cemento 1:6 M-40

  250 kg de cemento/m³ de mortero.
  0'980 m³ de arena/m³ de mortero.
  0'170 m³ de agua/m³ de mortero.

- Mortero para enfoscado y enlucido:
  Mortero M 450 también llamado M-160 y tipo 1:3

440 kg de cemento CEM II/A-M 42.5 /m³ de mortero.
0'975 m³ de arena/m³ de mortero.
0'260 m³ de agua/m³ de mortero.

IV.9. IMPERMEABILIZACIONES

IV.9.1. SELLADOS CON MASILLAS ELASTICAS

Materiales

Masilla adhesiva mono componente, a base de poliuretano.

Son masillas de elasticidad permanente, buena adherencia y buena resistencia química, adecuadas para el sellado de juntas de dilatación, de preferencia verticales, pero también horizontales cuando las solicitaciones no son excesivas.

El material debe cumplir la Norma UNE 53.622, clase A-1

Datos Técnicos:

- Alargamiento a la rotura: >600%
- Recuperación elástica: > 80%
- Módulo elasticidad: 0,5 N/mm²
- Resistencia a tracción: >1 N/mm²
- Máx. movimiento admisible: 25% de la anchura media de la junta
- Apta para el contacto permanente con agua potable

Ejecución

Los soportes se prepararán de tal manera que en el momento de ejecutar el sellado de las juntas, estén en perfectas condiciones, para lo cual se eliminarán completamente manchas, partículas sueltas o mal adheridas, zonas carbonatadas, óxidos, restos de pinturas, desencofrante, etc.

El soporte que constituye la junta deberá estar totalmente seco

Una vez limpias y secas las superficies interiores de la junta se procederá a la colocación de un fondo de junta de polietileno, cuyo objeto es:

1. Establecer la sección óptima en función del factor de junta, delimitando la profundidad de sellado.
2. Impedir que la masilla adhiera al fondo de la junta.
3. Servir de soporte a la masilla y limitar su consumo.

El diámetro del fondo de junta deberá ser aproximadamente 1,25 veces el ancho de la junta.

La sección a rellenar deberá respetar el factor de junta en función de su anchura

Antes de colocar la masilla se procederá a la imprimación, cuya finalidad principal es mejorar la adherencia del material de sellado a los labios de la junta.

Es imprescindible respetar los tiempos de espera de cada imprimación, antes de colocar la masilla, para evitar la aparición de burbujas en caso de no respetar el mínimo o tener que repetir la operación de imprimación en caso de sobrepasar el máximo.

La aplicación de la masilla se realizará con pistola. Para evitar la oclusión de aire, se deberá desplazar la pistola lentamente y de manera uniforme manteniendo su posición respecto al fondo y paredes de la junta.

El alisado superficial, además de proporcionar estéticamente un buen acabado, tiene por objeto fundamental retacar la masilla por presión de la misma contra las paredes y fondo de la junta, evitando de esta manera la formación de bolsas o burbujas de aire.

Los trabajos de sellado deberán ser realizados por empresas especializadas con personal formado a tal efecto.

Medición y abono

El sellado de las juntas estructurales se medirá por metro lineal, incluyendo siempre la parte proporcional de preparación de la junta, fondos de junta, imprimaciones, accesorios y elementos auxiliares.

IV.9.2. BANDAS DE PVC

Materiales

Los bateaguas de estanquidad en juntas de contracción y/o dilatación, en soleras, cubiertas y muros de estructuras de hormigón, serán de PVC extruido de muy alta calidad, con buena flexibilidad y longevidad, con bulbos para efecto válvula y estrías para efecto de recorrido tortuoso. Conforme a los planos del proyecto, podrán ser de colocación central o externa.

Deben tener las siguientes características:

Forma:	Perfil termoplástico extruido
Color:	Azul
Normativa:	Norma BS 2782
	Directiva Comunitaria 90/128/CE y UNE-EN 1186-1:2002, para materiales plásticos en contacto con agua potable y alimentos
Presión hidrostática:	> 50 m.
Movimiento admisible junta:	> 10 mm
Resistencia a tracción:	14 MPa., mínimo a 25ºC
Alargamiento rotura:	300%, mínimo a 25ºC
Dureza Shore:	Shore A: 80
Uniones:	Electrosoldables. Dispondrá de piezas especiales: Tés, cruces, acopladas mediante mordazas y cuchillas eléctricas de soldadura.
Ajuste de posicionamiento:	Con arandelas embutidas en la junta
Anchura perfiles junta:	250-200 mm (según planos, o Uds. Cuadro de precios)

Bulbos:	4
Óvalo/cuerpo central:	1
Altura bulbos:	22-24 mm para ancho 250 mm 20 mm para ancho 200 mm
Diámetro óvalo central:	Para ancho 250 mm: J.central:16 mm; J.externa: 25 mm Para ancho 200 mm: J.central:12 mm; J. Externa: 22 mm
Peso:	Para ancho250 mm: J.central: 2,25 kg/m.; J.externa: 2,78 kg/m. Para ancho 200 mm: J.central: 1,82 kg/m.; J.externa: 2,00 kg/m.
Tolerancias valores:	+/- 5%

Al inicio de la obra, el Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el modelo y marca de banda a utilizar para que apruebe su suministro.

Ejecución

Los empalmes se realizarán preferiblemente en factoría para lograr una unión perfecta. Cabe la posibilidad, que deberá ser autorizada por la Dirección de Obra de modo expreso, de realizarlas in situ siempre y cuando se ejecute con los medios específicos aconsejados por el fabricante.

En los ángulos y encuentros se deberán utilizar obligatoriamente piezas especiales no admitiéndose la elaboración de estos puntos especiales en obra mediante cortes, soldaduras, etc.

Las bandas deberán llevar, de fábrica, orificios ribeteados de arandelas metálicas para facilitar el paso de los latiguillos de sujeción y atirantamiento. No se admitirá para la sujeción de las bandas horquillas u otros sistemas, debiendo recurrirse siempre al atirantamiento con latiguillos.

El hormigón se deberá compactar de forma adecuada alrededor de los bateaguas, para evitar que queden coqueras o zonas porosas. Se deberá dejar un espacio entre las armaduras y el bateaguas, para permitir una compactación correcta del hormigón

La disposición y colocación de las juntas deberá ser revisada obligatoriamente por la Dirección de Obra previa al hormigonado.

Medición y abono

Se medirán por ml. realmente ejecutados y sus precios del Cuadro de Precios 1 incluyen la parte proporcional de piezas especiales así como los empalmes realizados en factoría o in situ y el sellado de las juntas en los paramentos según planos.

El precio contempla la colocación, latiguillos de amarre, etc.

IV.9.3. REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE DE BASE CEMENTOSA

Materiales

Con el fin de aumentar la durabilidad del hormigón y de las estructuras de hormigón armado, se realizará, de acuerdo a Planos, la impermeabilización de los paramentos exteriores de registros y alzados de muros.

Se utilizarán productos y sistemas para la protección superficial del hormigón, que deberán contar con marcado CE y cumplir la norma UNE-EN 1504.

Los principios a conseguir, de entre los definidos en la norma UNE-EN 1504-9, son:

- Principio 1: Protección contra la penetración: reducción o prevención de la entrada de agentes agresivos
- Principio 2: Control de humedad: Ajuste y mantenimiento del contenido de humedad en el hormigón dentro de un intervalo de valores especificados
- Principio 8: Incremento de la resistividad eléctrica del hormigón

El método de aplicación elegido para satisfacer dichos principios, es el revestimiento, tratamiento que permite obtener una capa protectora continua sobre la superficie de hormigón. El espesor de la misma será de 1,0 a 4,0 mm

El revestimiento será de base cementosa, con un ligante de cemento hidráulico modificado con dispersión de polímero orgánico.

Debe impermeabilizar la masa del hormigón por cierre de la porosidad, obturando la capilaridad y penetrando y bloqueando los poros del hormigón.

Los requisitos generales relativos a los procedimientos de evaluación de la conformidad se definen en la norma UNE-EN 1504-8.

Requisitos de las prestaciones del revestimiento: definidas según UNE-EN 1504-2

- Resistencia a compresión: Clase I (>35 N/mm²)
- Permeabilidad al vapor de agua: Clase I (permeable)
- Permeabilidad al CO2: sD > 50 m
- Absorción capilar y permeabilidad al agua: w < 0,1 kg/m2.h0,5
- Adherencia: >1,0 N/mm²
- Apto para contacto con agua potable según RD 140/2003 (cuando sea necesario)
- Resistente a la presión de agua positiva (>7 bares) y negativa (>3 bares)

Ejecución

El soporte debe estar limpio y húmedo.

La mezcla se aplicará en dos manos, con brocha, rodillo o pistola.

Durante el endurecimiento evitarán calores extremos, sol directo, corrientes de aire, lluvia y hielo. Se realizará un curado durante las primeras 24 horas para evitar la desecación.

Medición y abono

Se medirá por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos en las superficies teóricas señaladas en los planos y se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto.

En este precio se incluyen todas las operaciones propias de la unidad de obra completa, incluso tratamiento de zonas especiales, medios auxiliares, pérdidas,

IV.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE OBRAS

Trata el siguiente capítulo de las técnicas y medios de señalización, balizamiento y, en su caso, defensa de las obras que se ejecutan en vías públicas y que, por constituir un obstáculo, afectan a la libre circulación por ellas de tráfico tanto peatonal como rodado.

La señalización de obras tiene por objeto:

- Informar al usuario de la presencia de obras
- Ordenar el tráfico tanto peatonal como de vehículos de la zona afectada

Normativa de referencia:

- Instrucción 8.3-IC: en obras fijas fuera de poblado
- Ordenanzas municipales: en obras fijas en vías urbanas
- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes

IV.10.1. SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE OBRAS

Materiales

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de señalización incluidos en el Catálogo que se contiene en el anexo 1 de la Instrucción de carreteras 8.3-IC. Este contiene los siguientes grupos de señalización:

- Señales de peligro TP
- Señales de reglamentación y prioridad TR
- Señales de indicación TS
- Señales y dispositivos manuales TM

Las dimensiones de las señales se atendrán a lo dispuesto en la tabla 5 de la Instrucción 8.3-IC. El borde inferior de la misma deberá estar a 1 metro del suelo. El fondo de las señales TP, y total o parcialmente el de todas las señales TS será amarillo.

Cumplirán además las prescripciones del artículo 701 del PG-3 vigente.

El material retrorreflectante será de nivel 2. La marca de identidad visual del mismo debe ser fácilmente visible. Para mantener el nivel de reflectancia, la señalización será conservada en perfecto estado de limpieza.

El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión de las señales de obra será el indicado en la tabla 701.4 del artículo 701 del PG-3 vigente. El contratista deberá poner a disposición de la Dirección de Obra los medios adecuados para la vigilancia de esta característica.

Los elementos de sustentación y anclajes cumplirán las condiciones generales del artículo 701 del PG-3 vigente. El diseño de los mismos se hará considerando las hipótesis de cálculo definidas en la norma UNE 135311.

La cimentación del poste será de hormigón HM-20.

Toda la señalización deberá encontrarse en perfecto estado de conservación.

Ejecución

Se señalizarán y balizarán todos los tramos de carretera existente sobre los que se deba mantener el tráfico y que se vean afectados por las obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo.

Antes de iniciarse la instalación de las señales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución.

Medición y Abono

Se medirán por las unidades (ud) realmente colocadas de cada una, y se abonará al precio que figure en el cuadro de precios del presupuesto, en el que se considera incluido a todos los efectos los elementos de fijación, los postes de sujeción, así como la excavación y hormigonado de la cimentación, por lo que no serán objeto de medición ni abono independiente. Incluye así mismo la retirada posterior de señalización.

IV.10.2. ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO DE OBRAS

Definición

Dispositivos fácilmente perceptibles por el conductor, con objeto de destacar la presencia de los límites de las obras y de las ordenaciones de la circulación a que den lugar.

Materiales

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente los elementos y dispositivos de balizamiento incluidos en el Catálogo que se contiene en el anexo 1 de la Instrucción de carreteras 8.3-IC.

Este contiene los siguientes grupos de balizas:

- Señales de balizamiento reflectantes TB
- Elementos luminosos TL

Cumplirán además las prescripciones del artículo 703 del PG-3 vigente.

El material retrorreflectante será de nivel 2. La marca de identidad visual del mismo debe ser fácilmente visible.

El valor mínimo del coeficiente de retrorreflexión de los elementos de balizamiento será el indicado en la tabla 703.3 del artículo 703 del PG-3 vigente. El contratista deberá poner a disposición de la Dirección de Obra los medios adecuados para la vigilancia de esta característica.

Los elementos de sustentación y anclajes cumplirán las condiciones generales del artículo 703 del PG-3 vigente.

Ejecución

Se señalizarán y balizarán todos los tramos de carretera existente sobre los que se deba mantener el tráfico y que se vean afectados por las obras, así como los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo.

Los recintos vallados en calzadas, cuando deban estar implantados en horario nocturno, llevarán siempre luces propias colocadas a intervalos máximos de 10 m y siempre en los ángulos salientes.

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de balizamiento, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución.

Medición y Abono

Se medirán por las unidades (ud) realmente colocadas de cada una, y se abonará al precio que figure en el cuadro de precios del presupuesto, en el que se considera incluido a todos los efectos los elementos de fijación, los postes de sujeción, así como la excavación y hormigonado de la cimentación, por lo que no serán objeto de medición ni abono independiente. Incluye así mismo la retirada posterior del balizamiento.

IV.10.3. MARCAS VIALES

Materiales

Los materiales cumplirán lo especificado en el Artículo 700 del PG-3 vigente.

Atendiendo a su duración, serán de dos tipos:

- De empleo permanente, serán de color blanco, con un nivel de durabilidad P4 o superior
- De empleo temporal, serán de color amarillo

ambas con carácter retrorreflectante y diseñadas para mantener sus propiedades en condiciones de lluvia o humedad (tipo 2).

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas según UNE-EN-1790, que cumplan lo especificado en el presente artículo. La selección se llevará a cabo mediante la determinación del factor de desgaste (art. 700.3.2 PG-3).

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de micro esferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores, según norma UNE-EN 1423.

Durante el período de garantía, el coeficiente de retrorreflexión, el factor de luminancia y el coeficiente de rozamiento (SRT) deben cumplir los requisitos de valores mínimos especificados en el art. 700.4 del PG-3. Asimismo con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436.

En cualquier caso, cuando en una marca vial temporal el coeficiente de retrorreflexión alcance el valor mínimo de 100 mcd. m^{-2}. lx^{-1}, el repintado se llevará a cabo de forma inmediata. El contratista deberá poner a disposición de la Dirección de Obra los medios adecuados para la vigilancia de esta característica.

Ejecución

Se repintarán las marcas viales de aquellos tramos de carretera en servicio que puedan verse afectados por las obras. Se pintarán los desvíos provisionales que puedan llevarse a cabo atendiendo a la norma 8.2-IC.

El Contratista deberá declarar, según norma UNE 135277, las características técnicas de la maquinaria a emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras.

El Director de las Obras definirá, tras la inspección del pavimento, las operaciones de preparación de la superficie de aplicación, ya sean de reparación propiamente dichas o de aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial.

En cuanto a la compatibilidad con el soporte, se tendrán en cuenta las indicaciones dadas en la Nota Informativa 2/2007 del Ministerio de Fomento.

Serán de aplicación las limitaciones en la ejecución referentes a las condiciones climáticas descritas en el art. 700.6.2 del PG-3.

Se verificará en obra:

- correspondencia de la máquina y equipos de aplicación con los especificados
- velocímetro de precisión superior a 0,1 km
- presencia de equipos de medida (termómetro de ambiente y de superficie, higrómetro, tabla de conversión de punto de rocío)

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución, así como de las marcas recién pintadas, hasta su total secado.

Para la eliminación de las marcas viales queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Deberá utilizarse alguno de los procedimientos de eliminación que figuran en el art. 700.6.4 del PG-3, que en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras.

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones especificados en el proyecto, será de dos años para las de carácter permanente y de tres meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación.

Medición y Abono

Se abonarán por superficie (m2) o por longitud (m) medida por el eje de las marcas, realmente aplicadas sobre el pavimento.

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

La eliminación de las marcas viales, se abonará por superficie (m2) o por longitud (m) medida por el eje de las marcas, realmente eliminadas del pavimento.

IV.10.4. ELEMENTOS DE DEFENSA PARA TRÁFICO RODADO EN OBRAS

Materiales

Salvo justificación en contrario, en obras fijas deberán utilizarse exclusivamente las barreras de seguridad para el tráfico rodado incluidas en el Catálogo que se contiene en el anexo 1 de la Instrucción de carreteras 8.3-IC (grupo de elementos de defensa TD)

Cumplirán además las prescripciones del artículo 704 del PG-3 vigente.

Las barreras, independientemente del material en que estén construidas, deberán tener el nivel de contención que se especifique, definido según la norma UNE-EN 1317.

La selección del nivel de contención de una barrera de seguridad o pretil se efectuará atendiendo a las circunstancias propias de cada tramo (tráfico, trazado, gravedad del accidente a evitar), en base a lo dispuesto en las recomendaciones de la Orden Circular 321/95 del Ministerio de Fomento.

Ejecución

Antes de iniciarse la instalación de los elementos de defensa, el Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución.

Medición y Abono

Se medirán por metros lineales (m) realmente colocados en obra y se abonará al precio que figure en el cuadro de precios del presupuesto, en el que se considera incluido a todos los efectos la retirada posterior de los elementos de defensa.

IV.11. PROTECCIONES COLECTIVAS DE TERCEROS

IV.11.1. PASARELAS Y PLATAFORMAS DE PROTECCIÓN

Definición

Elementos de protección que permiten atravesar zanjas (pasarelas), cubrir huecos como arquetas, cimentaciones, etc. (plataformas) o salvar desniveles (rampas), dando continuidad al pavimento.

Materiales

Deberán ser de materiales metálicos, plásticos o de poliéster reforzado con fibra de vidrio, armados o no, de clase resistente adecuada al tipo de tráfico al que sirvan, según norma UNE-EN 124.

Las plataformas y pasarelas deberán tener los bordes biselados. Las pasarelas presentarán superficies de paso sin escalones para facilitar el paso de sillas de ruedas.

En el caso de plataformas y pasarelas para la protección del tráfico peatonal, deberán presentar una superficie antideslizante, incluso en mojado, y ser manuportantes.

Las plataformas, pasarelas y rampas deberán ser homologadas, y nunca realizadas de manera manual en la propia obra. Queda expresamente prohibida la utilización de tableros de encofrado como plataformas peatonales o elementos de cubrición de huecos.

Ejecución

Las plataformas, pasarelas y rampas deberán colocarse de forma que sean estables y queden ancladas al pavimento. Dicho anclaje debe evitar el desplazamiento de las mismas, bien mediante mecanismos del propio elemento de protección o con medios mecánicos de fijación como tornillos o pernos.

En el caso de pasarelas para tráfico peatonal, las pasarelas presentarán una anchura libre mínima de 80 cm. Además, si la zanja a salvar fuera de más de 1m, dispondrán de doble barandilla extraíble con travesaño central de 100 cm de altura y de rodapiés de al menos 15 cm de altura.

Medición y Abono

Se medirán por la superficie (m2) o las unidades (ud) realmente colocadas de cada una, y se abonarán al precio que figure en el cuadro de precios del presupuesto, en el que se considera incluido a todos los efectos los elementos de fijación y anclaje, la colocación y su retirada posterior.

IV.11.2. VALLAS DE OBRA

Materiales

Deberán ser de materiales plásticos (Polietileno de alta densidad). Con banda horizontal reflexiva de balizamiento y elementos para el anclaje de paneles de advertencia o información.

Con pies giratorios y asimétricos, de perfil reducido en la cara frontal, ampliado en cara posterior. Deberán garantizar la estabilidad de la barrera.

Con diseño que permita la formación de una barrera de protección continua incluso en terrenos irregulares o con desnivel.

Deberán ser de color amarillo, naranja o cualquier otro aceptado por la Dirección de Obra.

Deberán cumplir con la norma BS 7818, sobre los sistemas de retención para peatones.

Ejecución

En zanjas en entorno rural, donde no sea previsible el tránsito de personas o vehículos, las zanjas deberán ser balizadas y señalizadas.

En zanjas realizadas en entornos donde sea previsible el tránsito de personas o vehículos, se deberá separar la zona de trabajo mediante barreras o cerramientos, evitando de esta manera la entrada en el centro de trabajo de personas ajenas a la misma.

En entornos urbanos, dicha barrera de protección será por defecto continua, salvo en tramos que por longitud y escaso tráfico permitan espaciar las vallas con tramos de cinta de balizamiento (máximo 5 m de cinta entre vallas).

La barrera de protección continua tendrá como mínimo 1 m de altura. En aquellos tramos en los que concurran circunstancias que exijan un nivel de protección mayor (densidad de tráfico alta y/o riesgo potencial elevado), la barrera de protección deberá de ser de 2 m de altura, con pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado) de al menos 24 kg y la unión entre los elementos de la barrera se realizará de manera que se impida el desmontaje manual (abrazaderas de cierre).

Entre estas zonas de especial riesgo se deberá considerar la zona de apertura de zanja, la zona de acopios, ubicación de residuos y almacenamiento de sustancias potencialmente tóxicas.

Medición y Abono

Se medirán por la longitud de barrera continua (m) o las unidades (ud) realmente colocadas de cada una, y se abonarán al precio que figure en el cuadro de precios del presupuesto, en el que se considera incluido a todos los efectos los elementos de conexión, pies, fijación de paneles, la colocación y su retirada posterior.

IV.12. OTRAS UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la obra, de los materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el coste de las obras, realizando todos los trabajos adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución.

En la ejecución de fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá a las instrucciones que por escrito reciba de la Dirección de Obra, de acuerdo con los Pliegos o Normas Oficiales que sean aplicables en cada caso.

Los materiales no incluidos en el presente Pliego, deberán contar para su utilización, con la previa aprobación de la Dirección de Obra. Así mismo, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser destinados.

Pamplona, junio 2026

El autor del proyecto	El director del proyecto
Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial	Agustina Rivera Martin Ingeniero Industrial

DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO

INDICE

Desglose de Presupuesto
- Cuadro de precios nº1
- Mediciones Auxiliares
- Mediciones
- Presupuesto
- Resumen de Presupuesto

Presupuesto para Conocimiento de la Administración

DESGLOSE DE PRESUPUESTO

CUADRO DE PRECIOS Nº1

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
1	PAURB	Ud	Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios TRES MIL QUINIENTOS EUROS	3.500,00
2	UABCR.abbb	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1'' mm. (1" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	5,96
3	UABCR.cbbb	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1 ½'' mm. (1 1/2" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	9,49
4	UABCR.fbbb	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 3'' mm. (3" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. DIECINUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	19,27
5	UABCU.aaabc	m	Tubería de fundición nodular de DN 80 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	43,35
6	UABCU.aabbc	m	Tubería de fundición nodular de DN 100 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. CUARENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	49,70
7	UABCU.aadbc	m	Tubería de fundición nodular de DN 150 mm., clase de presión C64, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	66,50
8	UABCU.aafbc	m	Tubería de fundición nodular de DN 250 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. CIENTO DOCE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	112,63
9	UABCU.aagbc	m	Tubería de fundición nodular de DN 300 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	155,20
10	UABDFBba	Ud	Brida Roscada de D.N. 40 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	59,72

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
11	UABDFBbb	Ud	Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	72,48
12	UABDFCaba	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 80 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	166,88
13	UABDFCaca	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS	177,03
14	UABDFCaea	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 150 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	234,43
15	UABDFCaga	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 250 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CUATROCIENTOS SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	406,18
16	UABDFCaha	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 300 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	598,08
17	UABDFCbcb	Ud	Codo de fundición nodular a bridas de DN 100 mm (90º-45º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B , transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	148,13
18	UABDFDbed	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 150/(50-125) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra. CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	181,20
19	UABDFDbgd	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra. CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	420,50
20	UABDFDbgf	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra. CUATROCIENTOS VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	420,50
21	UABDFDbhh	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 300/(150-250) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra. QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	545,62
22	UABDFEac	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO CUARENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS	140,02
23	UABDFEae	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	182,63

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
24	UABDFEag	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	338,48
25	UABDFEah	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	442,40
26	UABDFEcb	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO UN EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	101,46
27	UABDFEcc	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO TRECE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	113,14
28	UABDFEce	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	157,30
29	UABDFEcg	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS SESENTA EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	260,96
30	UABDFEch	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	331,11
31	UABDFMb	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 80 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	169,43
32	UABDFMc	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 100 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	175,36
33	UABDFMe	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 150 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	224,85
34	UABDFMg	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 250 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	462,63
35	UABDFMh	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 300 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. SEISCIENTOS DIEZ EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	610,40
36	UABDFRade	Ud	Carrete de fundición nodular a Bridas, de 100 mm. de diámetro, L=300 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	159,97

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
37	UABDFTaad	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	280,97
38	UABDFTaaf	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 150 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	348,25
39	UABDFTaag1		Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. SEISCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	605,77
40	UABDFTaag2		Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS	842,02
41	UABDFTabh	Ud	Te de fundición nodular de Enchufes a Brida, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, con brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	545,77
42	UABDFTach	Ud	Te de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	662,13
43	UABDFTaci	Ud	Te de fundición nodular a Bridas, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	978,42
44	UABDFTbdh	Ud	Cruceta de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares. NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	997,58
45	UABDPBac	Ud	Enlace mixto brida de Latón , D.N. 60/65 mm con salida para PEBD 2 1/2", para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	156,19
46	UABDPRbcf	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. TREINTA Y SIETE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	37,23
47	UABDVCafba	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, modelo largo, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	325,72

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
48	UABDVCbcba	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	188,87
49	UABDVCbhba	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 250 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	994,22
50	UABDVCbiba	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 300 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. MIL TRESCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	1.390,53
51	UABDVEEef	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares. NOVENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	93,77
52	UABDVTabb	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	637,07
53	UABDVTacb	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. OCHOCIENTOS CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO	804,01
54	UABDVTacb250		Valv. comp. tetones (1") 250 mm PN-16 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	1.598,70
55	UABECUccc	Ud	Adaptador universal para D.N. 80 mm, construida en fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563 y protección de nylon-11, para conexión con tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores de 84-106 mm, mediante junta elastómera EPDM y contrabrida con tornillería protegida con teflón, con homologación, incluso corte de la tubería a conectar, preparación y limpieza del corte resultante, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	116,99
56	UABEUH	Ud	Hidrante bajo rasante, modelo homologado, de doble columna seca, dos bocas de ø 75 mm. con válvulas de compuerta de 2½" en cada una de las bocas y salida de racord Barcelona de 70 mm. de aluminio forjado, con dispositivo antihielo, incluso p.p. de juntas de etileno-propileno, tornillería bicromatada, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. MIL CIENTO DIECISIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	1.117,17
57	UABEUR	Ud	Boca de Riego modelo "BV-05-63-PA", de BELGICAST, D.N. 40 mm, con cuerpo de hierro fundido formando arqueta, eje de acero X20 Cr 13, con el acoplamiento de bronce tipo Pamplona y cadena de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	394,88
58	UABF1.ca	Ud	Llave de paso para acometida de servicios de D 1 1/4", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	219,11

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
59	UABF1.ea	Ud	Llave de paso para acometida de servicios de D 2", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares. DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	273,74
60	UABF2.aaaa	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	427,15
61	UABF2.aaaaSC	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", SIN contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CUATROCIENTOS DOS EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	402,09
62	UABF2.bcba	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de >1", incluso contador antihielo de ø20 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, retirada y puenteado de contador interior existente, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	795,81
63	UABFAbcaa2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m. DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	263,27
64	UABFAbcca2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m. TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	372,62
65	UABFAcaaa2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m. DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	235,50
66	UABFAccaa2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m. DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	264,73
67	UABFAccba2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 10 m. TRESCIENTOS TRECE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	313,33
68	UABFAeaaa2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m. DOSCIENTOS CUARENTA EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	240,79
69	UABFAeaca2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, ejecución de zanja, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15m. TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	328,72

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
70	UABFAecaa2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m. DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON DOS CÉNTIMOS	270,02
71	UABFAecca2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m. TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	379,37
72	UABOA5ddcb1	Ud	Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.80x0.80 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	889,69
73	UABOA6ac	Ud	Arqueta Normalizada de hormigón HM-20/B/19/I, de 60x60 cm x 0.80 m de dimensiones interiores, para alojamiento de hidrante, incluso excavación, relleno de ZA-25, encofrado y desencofrado, marco y tapa abatible de D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares. SEISCIENTOS CUATRO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	604,19
74	UABOR020	Ud	Protección de columna de Boca de Riego, para evitar vibraciones de la misma, mediante Hormigón HM-20, incluso encofrado y colocación. TRECE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	13,99
75	UABORSacba1	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codos de: (11º, 22º y 45º), en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. VEINTISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS	27,02
76	UABORSacca1	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 22º, en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	36,37
77	UABORSbaaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	198,28
78	UABORSbeaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	94,06
79	UABORScaaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	541,45
80	UABORSceaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	353,34
81	UABORSeaaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1.614,17

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
			MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	
82	UABORSeaba	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	182,38
83	UABORSeaca	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	896,72
84	UABORSeeaa1	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	986,30
85	UABORSfaaa	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1.753,98
86	UABORSfeaa1	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	1.179,49
87	UABOW1101	Ud	de abono íntegro para la conexion para la derivación de la red de abastecimiento provisional durante la ejecución de las obras desde la red actual ó definitiva, incluso localización y descubrimiento de la conducción existente en los puntos de conexión, por medios manuales o mecánicos, apuntalamientos necesarios para sujeción de la tubería, entibación y agotamiento de la zanja, rellenos, piecerio necesario para derivación de red provisional y taponamiento de la red actual si fuera necesario, medios manuales y mecánicos requeridos para asegurar el suministro, herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la deconexión final con vuelta a las condiciones iniciales. TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	376,81
88	UALINXa	Ud	Pasamuros para tubería de D menor de 100 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares. CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	52,38
89	UALINXc	Ud	Pasamuros para tubería de D entre 300 y 400 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares. SETENTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	74,89
90	UALISKEea	m	Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 63 de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19. SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	7,46
91	UCCI020	m	Inspección de tuberías de saneamiento, de cualquier diámetro, mediante cámara de video robotizada, antideflagrante, con indicación de material, diámetro y pendiente, visualización individual circunferencial de juntas, incluso entrega de un informe escrito con todas las incidencias descritas y localizadas, reportaje fotográfico de las incidencias y reportaje videográfico de la inspección, según especificaciones Ordenanza M.C.P. TRES EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	3,11

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
92	UCCIPab	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.000 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones. DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	286,97
93	UCCIPbb	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.200 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones. TRESCIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	312,50
94	UCCIPcb	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.500 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones. TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	340,05
95	UESEE.baa	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad. TREINTA Y UN EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	31,64
96	UEXDAafb	m2	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 15 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	5,79
97	UEXDZ030	Ud	Demolición de arqueta de hormigón de pequeñas dimensiones, incluso limpieza, demolición, carga sobre camión, relleno seleccionado y reposición de pavimento. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. DOSCIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	209,29
98	UEXEC.b	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en roca, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. VEINTIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	28,06
99	UEXEC.c	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. DOCE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	12,33
100	UEXEC005	Ud	Cruce de canalización de proyecto con otros servicios afectados, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, adecuación de la entibación, relleno y colocación de la tubería, su desvío, apuntalamiento y estabilización o adecuación a la necesidad de la obra y su reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, gestiones con la compañías, etc., hasta la correcta ejecución de la unidad. CIENTO ONCE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	111,94
101	UEXEC015	Ud	Partida Alzada a justificar en protecciones de tuberías de gas según Normativa de Gas en cruces y paralelismos con los distintos servicios. MIL DOSCIENTOS EUROS	1.200,00
102	UEXEC050	Ud	Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales. CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	176,36

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
103	UEXEE025	m2	Entibación cuajada a una cara de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados. DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,56
104	UEXEE030	m2	Entibación cuajada en zapatas, pozos y frente de hincas, a una cara, con blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados y en cierres frontales, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares. VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	26,89
105	UEXEZ.abbc	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	8,96
106	UEXEZ.bbbc	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. TREINTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	36,93
107	UEXRM.cc	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares. VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	27,67
108	UEXRM.dc	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares. VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS	23,26
109	UEXRZGcac	m3	Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares. VEINTITRES EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	23,49
110	UPAFCZac	m3	Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra. VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	28,58
111	UPAFVXaeadc	m2	Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 22 base 50/70 G (G-20) calizo de 10 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares SESENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	61,05
112	URCTC020	mk	m3.km de transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta. TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	0,33
113	URCTCa	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5) SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,97

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
114	URCTCb	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón en masa, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	21,63
115	URCTCe	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Asfalto 17 03 01) seleccionados SETENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	79,22
116	URCTCf	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) no seleccionados, mezclados con otros no inertes (maderas, papel, plásticos,etc) CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	54,30
117	USACH.ba	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 300 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra. SESENTA Y DOS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS	62,16
118	USACH.bb	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 400 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra. SETENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	75,63
119	USACH.bc	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 500 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra. NOVENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	99,53
120	USACH.bd	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 600 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra. CIENTO VEINTIDOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	122,71
121	USACH.bf	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 800 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, con al menos dos bulones (arteones) para su manipulación, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra. CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	189,99
122	USACP.cac	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 160 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. DIECINUEVE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	19,12

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
123	USACP.dac	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	29,40
124	USACP.eac	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 250 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. TREINTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	35,15
125	USACP.fac	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	52,36
126	USADHLab	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	333,09
127	USADHLab	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	333,09
128	USADHLab1	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 250 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	416,36
129	USADPLbb	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. CIENTO UN EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	101,13
130	USADPLbc	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares. OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	89,22
131	USAFMb	m	Rehabilitación de colector de diámetro 300 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara. DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	298,11
132	USAFMd	m	Rehabilitación de colector de diámetro 500 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara. CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	407,77
133	USAPA2abb	Ud	Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible , con inscripción, clase D400, tipo Rexess de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares. SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS	635,00
134	USAPAA1bb	Ud	Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.		290,19

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
			DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	
135	USAPAA2abd	Ud	Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil cuadrada, de 60x60 cm de paso libre , con inscripción, clase B125, tipo Hidraulica de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares. SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	659,73
136	USAPAPab	Ud	Conexión de tubería de PVC ø200 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	224,15
137	USAPAPac	Ud	Conexión de tubería de PVC ø250 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado. DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	293,22
138	USAPAW61	Ud	Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado. TRESCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	307,50
139	USAPRAaa	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	119,63
140	USAPRAab	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	140,44
141	USAPRAac	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 100 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	186,96
142	USAPRAba	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	156,81
143	USAPRAbb	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	193,84
144	USAPRBac	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. QUINIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	510,58
145	USAPRBbc	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160/200 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. SETECIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	712,92

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
146	USAPRBcc	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1500 mm de diámetro interior y 300 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1.758,98
147	USAPRCa	Ud	Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	167,37
148	USAPRCb	Ud	Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1200/600 mm y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	216,99
149	USAPRHa	m3	Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares. CIENTO CINCUENTA EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	150,33
150	USAPRLaaa	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra. CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	172,79
151	USAPRLbaa	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1200/600 mm., para pozo de registro de 1200 mm. de diámetro interior y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra. CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	196,97
152	USAPRLcac	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1500/1200 mm., para pozo de registro de 1500 mm. de diámetro interior y 300 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra. QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	589,43
153	USAPTDbaa	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo PAMREX de Saint Gobain o SOLO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares. TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	378,77
154	USAPTP100	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares. DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	18,50
155	USAPW050	Ud	Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas fecales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso tapones de entradas de vertidos a pozo con bombeo de los mismos en caso necesario a pozo aguas abajo, colocación, pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares. QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	530,06

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
156	USAPW060	Ud	Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas pluviales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares. QUINIENTOS TREINTA EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	530,06
157	USEB030	Ud	Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos). OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	8,05
158	USEB045	Ud	Panel direccional estrecho (TB-2 ó TB-4) de 165x45 cm., reflectante de nivel H.I., incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada (amortizable en 3 usos). CIENTO DIEZ EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	110,08
159	USEB060	Ud	Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos). SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	65,28
160	USEB100	Ud	Pareja de semáforos portátiles para obra (TL-1), incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 5 usos). NOVECIENTOS VEINTITRES EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	923,37
161	USEB120	Ud	Cascada luminosa TL-8 compuesta por foco principal de xenon flash y 4 focos secundarios de 200 mm diámetro. Incluye balizas de seguridad con bandas reflexivas rojas y blancas TB-7/TB-8, soporte con bases de goma de 28 kg, sistema de control, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 3 usos). OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	833,97
162	USEC0105	Ud	Rótulo informativo de la obra, normalizado, según manual de identidad visual de MCP, sobre una única chapa de acero galvanizado de espesor 1,5 mm, con recubrimiento mínimo de 45 micras, de dimensiones 1950x1400 m, incluso elementos de sustentación con perfiles de acero laminado galvanizado de 80x40, elementos de anclaje, incluso empotramiento en el suelo de los perfiles con excavación de 50x50 cm. con profundidad de 70 cm. y hormigonado para su anclaje, posterior desmontaje y retirada de cimentación, totalmente colocado, herramientas y demás medios auxiliares. SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	729,40
163	USED020	m	Barrera de seguridad rígida (TD-1) portátil, roja y blanca, incluso rellena de agua o arena para evitar su vuelco, incluido colocación y retirada (amortizable en 10 usos). NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	9,31
164	USED034	m	Barrera de contención peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m. de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado negro) de al menos 24 kg de peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocación y desmontaje, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demás medios auxiliares (amortizable en 10 usos). SEIS EUROS	6,00
165	USEV010	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A4, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. DIEZ EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	10,79
166	USEV012	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. DOCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	12,79
167	USEV015	Ud	Cartel informativo combinado de obra, de 1,0x0,70 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado. QUINCE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,79
168	USEV020	Ud	Cartel indicativo de riesgo, tamaño A3, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontaje. (3 usos) CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	101,97
169	USEVaab	Ud	Señal de obra de peligro (TP), triangular, de tamaño normal (lado 90 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). SETENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS	74,22

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
170	USEVbab	Ud	Señal de obra de reglamentación (TR), circular, de tamaño normal (Ø 60 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). SETENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	71,86
171	USEVcab	Ud	Señal de obra de indicación (TS 52-62), rectangular, de tamaño normal (0.5 m²), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos). OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	84,79
172	USEW100	Ud	Partida alzada de abono íntegro según estudio de S y S DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	19.857,63
173	USSCA020	m	Barandilla de protección certificada de 1,10 m. de altura, para aberturas verticales en huecos, de clase A, formada por soportes metálicos, pasamanos y rodapie de 0,20 m, incluso sujeción, colocación y desmontaje, según Norma UNE EN 13374 (amortizable en 5 usos). QUINCE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	15,14
174	USSCC010	Ud	Medidor portátil de gases de cuatro gases con protección ATEX, calibrado, incluye batería pero no cargador (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS UN EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	201,61
175	USSCC030	Ud	Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 3.600 m3/h y presiones superiores a 345 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suminstro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	247,88
176	USSCC035	Ud	Extractor portátil de gases contaminantes, a utilizar en trabajos en espacios confinados (como túneles, minas, excavaciones, interior de grandes tuberías, etc), con caudal de aire superior a 4.900 m3/h y presiones superiores a 600 Pa, incluso conducto flexible de aluminio para conducción al exterior de los gases (hasta 20 m), suministro eléctrico, colocación y retirada (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	265,88
177	USSCC040	Ud	Walkie-talkies para trabajos en espacios confinados, con certificado ATEX, incluida bateria (amortizable en 5 obras). ONCE EUROS	11,00
178	USSCC055	Ud	Cabrestante manual con una reducción mínima de 3: 1, para instalar directamente en el trípode o brazo de rescate. Con palanca de frenado para bloqueo de la cuerda y regulador para un control preciso de la velocidad de descenso. . Con cuerpo y polea de aluminio y cordón de 9 mm. Para carga máxima de 150 kg. Según EN 1496 clase B. TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS	350,00
179	USSCE010	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 8A-34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 3 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. TREINTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	39,89
180	USSCE020	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AENOR. CUARENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	43,89
181	USSCE030	Ud	Extintor de polvo ABC con eficacia 34A-144B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 9 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certicado por AENOR. SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	63,89
182	USSCE110	Ud	Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 13B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas e incendios de equipos eléctricos, de 2 Kg. de agente extintor con soporte y boquilla difusora según norma UNE-23110 totalmente instalado. SESENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	67,96

Nº Orden	Código	Descripción de las unidades de obra		Precio
183	USSCE120	Ud	Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado. CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	135,89
184	USSCE160	Ud	Instalación de puesta a tierra compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas o picas metálicas. MI BT 039. s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	164,06
185	USSCP020	m2	Plataforma peatonal para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclada al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos). DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	10,51
186	USSCP030	m2	Plataforma para tráfico rodado, para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclados al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos). QUINCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,39
187	USSCZ100	Ud	Topes en borde de excavación para vehículos en maniobras de carga y descarga de materiales y en vertido de tierras en vertedero, formado mediante al anclaje al suelo de una pieza de madera de 30x30 cm o de dos tablones de 25x7,5 cm embridados, incluso colocación y retirada. DIECIOCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	18,40
188	USSCZ130	Ud	Escalera manual normalizada, de 5,0 m. de altura, en aluminio, con peldaños antideslizantes, anclaje antivuelco, apoyos de neopreno adaptables a la superficie, sujeción de apoyos, topes laterales. A disposición de la obra, incluye montaje, desmontaje, traslado entre tajos, p.p. de reposición y mantenimiento.(amortizable en 2 obras) DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	276,28
189	USSCZ140	Ud	Rampa de escape, excavada lateralmente en el talud de la zanja principal, con una inclinación no superior a 30º y anchura no inferior a 60 cm, incluso mantenimiento y limpieza adecuados a las características y vigencia de su empleo. SESENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	62,90
190	USSIC015	m	Línea de vida horizontal temporal portátil, homologada, con elemento bloqueador, certificada para cuatro usuarios simultáneos, conforme a la norma EN 795. Con indicador de desgaste, regulable en longitud, tensor, conectores a adaptador giratorio. Incluso colocación y retirada y medios auxiliares. Amortizable en 4 usos QUINCE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS	15,11
191	USSIC020	Ud	Anclaje estructural, de clase A1 según UNE-EN 795, de acero inoxidable AISI 304, fijado a la estructura de forma permanente, certificado para dos personas, incluso tornillería de acero inoxidable, fijación y medios auxiliares, totalmente terminada. SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	65,32
192	USSIC030	Ud	Dispositivo anticaídas retráctil para ascensos y descensos verticales, según UNE EN 360, con tope amortiguador de impactos, cable de acero galvanizado de 9 m de longitud, con mosquetón e indicador de carga que alerta de que ha sido expuesto a una caída y debe dejar de utilizarse. (Amortización en 5 usos) SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	69,23
193	USSIC040	Ud	Absorbedor de energía, con gancho o mosquetón, según UNE-EN 355 TRECE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	13,23
194	USSIC060	Ud	Arnés de seguridad homologado según EN 361, con cinturón acolchado integrado, con punto de sujeción en zona dorsal y otro para ascenso y descenso en la zona abdominal, con hombreras regulables con bucles en los hombros para el rescate, perneras acolchadas regulables, cuerda de dos metros regulable y dos mosquetones en los puntos de enganche. TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS	36,23
195	USSIR020	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante con línea de aire comprimido o con manga de aire fresco de ventilación asistida con capucha, homologado según UNE-EN 14594 (amortizable en 5 obras). CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	154,44
196	USSIR025	Ud	Equipo de protección respiratoria aislante autónoma, de circuito abierto de aire comprimido, con máscara completa, para uso industrial, homologado según UNE-EN 137 (amortizable en 5 obras). DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	252,28
197	USSIR030	Ud	Medias Máscaras filtrantes para la protección contra gases y vapores, según UNE-EN 405, con filtros recambiables según UNE-EN 141, con arnés de sujeción ajustable. Incluído el filtro de gases (amortización de la máscara en 5 obras)	33,43

Nº Orden	Código		Descripción de las unidades de obra	Precio
			TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	
198	USSR010	Ud	Trípode profesional para acceso y rescate en espacios confinados, fabricado en aluminio, apto para hasta 3 personas (2 en anclaje anticaídas y 1 en rescate), cabezal con poleas integradas, tacos de goma pivotantes en patas, con rescatador retráctil y polipasto para izado de carga y materiales hasta 300kg (Certificado EN795 Clase B). Incluso montaje y desmontaje. Amortizado en 4 obras MIL OCHOCIENTOS SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	1.806,14
199	USSR020	Ud	Pescante para el acceso y rescate de personas en espacios confinados o lugares de difícil acceso, como tanques, pozos, arquetas, y estructuras similares. Con base de anclaje en el extremo del pescante anclado a estructura o contrapesado (certificado sg. EN 795 Tipo A), apto para la elevación y descenso carga de hasta 250 kg (certificado sg. Directiva de máquinas 2006/42/CE) o para acceso o rescate de hasta 2 usuarios de forma simultánea (certficación TS 16415:2013) y que permita el giro del poste, con pescante ajustable en altura, con instalación de dispositivos de rescate tipo torno de recuperación y/o anticaídas con recuperador, con certificado ATEX para su uso en atmósferas potencialmente explosivas. Amortizado en 4 obras TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3.880,88
200	USSR030	Ud	Camilla de Rescate de Emergencia, con cesta desmontable, para transporte de pacientes, de aleación de aluminio (amortizable en 5 obras). CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	187,50

En Pamplona, Junio de 2026

LA AUTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Agustina Rivera Martín

LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Agustina Rivera Martín


MEDICIONES AUXILIARES

DESIGNACIÓN GEOMÉTRICA EN ZANJA TIPO

Validez: Zanjas simétricas, sin bermas
Conducción recubierta con "material granular"
Calcularía, TV, desbroce o Pavimento
Unidades SI

E gr1	recubrimiento inferior de material granular
E gr2	recubrimiento superior de material granular
D tubo	Diámetro "de cálculo" de la conducción
B fondo	Ancho en fondo de zanja, pudiendo ser:
	Bf_c/ent Ancho de fondo con entibación
	Bf_s/ent Ancho de fondo con entibación
T tierra	talud en tierras
T roca	talud en roca

Z	Cotas
H	Alturas
D	Distancias
B	Anchuras

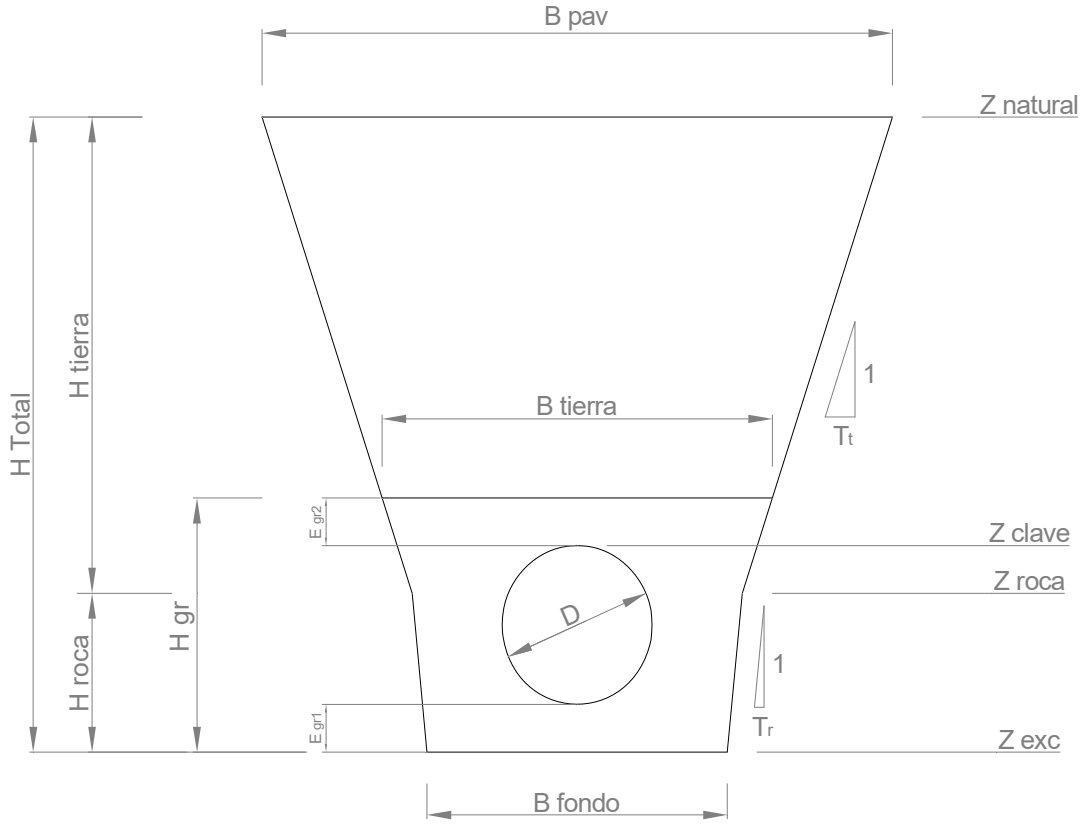

00001190_001 MOVIMIENTO DE TIERRAS - COLECTORES FECALES

FE1											5,00								3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
FE 1.1	0,20	0,00	0,50	1,00	0,33	0,10	0,000	0,00	426,54	424,25	424,75	421,540	424,050	2,490	0,000	2,490		0,325	1,000	2,660	no	0,000	4,557	0,000	0,650	3,907						
FE 1.2	0,20	0,00	0,50	1,00	0,33	0,10	42,740	42,74	426,24	423,83	424,33	421,240	423,630	2,610	0,000	2,610		0,325	1,000	2,740	no	0,000	4,881	0,000	0,650	4,231	0,000	201,677	0,000	27,781	173,896	
FE 1.3	0,20	0,00	0,60	1,20	0,33	0,10	53,790	11,05	426,22	423,72	424,32	421,220	423,520	2,700	0,000	2,700		0,350	1,200	3,000	no	0,000	5,670	0,000	0,770	4,900	0,000	58,293	0,000	7,846	50,447	
FE 1.4	0,20	0,00	0,80	1,40	0,33	0,10	106,930	53,14	425,96	423,30	424,10	420,960	423,100	2,860	0,000	2,860		0,400	1,400	3,307	no	0,000	6,731	0,000	0,960	5,771	0,000	329,482	0,000	45,966	283,516	
FE 1.5	0,20	0,00	0,80	1,40	0,33	0,10	123,660	16,73	425,87	423,27	424,07	420,870	423,070	2,800	0,000	2,800		0,400	1,400	3,267	no	0,000	6,533	0,000	0,960	5,573	0,000	110,952	0,000	16,061	94,891	
FE 1.6	0,20	0,00	0,80	1,40	0,33	0,10	139,690	16,03	425,80	423,20	424,00	420,800	423,000	2,800	0,000	2,800		0,400	1,400	3,267	no	0,000	6,533		0,960	5,573	0,000	104,729	0,000	15,389	89,341	
														2,754						3,040							**0,000 m3**	**805,134 m3**	**0,000 m3**	**113,042 m3**	**692,091 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

FE2											5,00								3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav		B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
FE 2.1	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	426,000	424,50	424,82	421,000	424,400	1,600	0,000	1,600	0,515		0,800	1,867	no	0,000	2,133	0,500		1,633						
FE 2.2	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	6,580	6,58	426,06	424,38	424,70	421,060	424,280	1,780	0,000	1,780	0,515		0,800	1,987	no	0,000	2,480	0,500		1,980	0,000	15,178	3,293	0,000	11,886	
FE 2.3	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	28,320	21,74	426,09	423,99	424,31	421,090	423,890	2,200	0,000	2,200	0,515		0,800	2,267	no	0,000	3,373	0,500		2,873	0,000	63,627	10,879	0,000	52,748	
FE 2.4	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	56,220	27,90	426,07	423,49	423,81	421,070	423,390	2,680	0,000	2,680	0,515		0,800	2,587	no	0,000	4,538	1,015		3,523	0,000	110,365	21,146	0,000	89,219	
FE 1.4	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	66,640	10,42	425,96	423,30	423,62	420,960	423,200	2,760	0,000	2,760	0,515		0,800	2,640	no	0,000	4,747	1,015		3,732	0,000	48,377	10,581	0,000	37,796	
								38,32						2,204						2,269							**0,000 m3**	**237,547 m3**	**45,898 m3**	**0,000 m3**	**191,649 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

FE3											5,00								3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
FE 3.1	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	0,000		425,92	424,54	424,86	420,920	424,440	1,480	0,000	1,480	0,515		0,800	1,787	no	0,000	1,914	0,500		1,414						
FE 3.2	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	25,380	25,38	425,98	424,25	424,57	420,980	424,150	1,830	0,000	1,830	0,515		0,800	2,020	no	0,000	2,580	0,500		2,080	0,000	57,034	12,700	0,000	44,334	
FE 3.3 PVC	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	60,180	34,80	426,08	423,85	424,17	421,080	423,750	2,330	0,000	2,330	0,515		0,800	2,353	no	0,000	3,674	1,015		2,658	0,000	108,818	26,375	0,000	82,443	
FE 3.3 HA	0,20		0,30	0,80	0,33	0,10	60,180	0,00	426,08	423,85	424,15	421,080	423,650	2,430	0,000	2,430	0,500	0,275	0,800	2,420	no	0,000	3,912		0,495	3,417	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
FE 1.3	0,20		0,30	0,80	0,33	0,10	84,200	24,02	426,22	423,72	424,02	421,220	423,520	2,700	0,000	2,700	0,500	0,275	0,800	2,600	no	0,000	4,590		0,495	4,095	0,000	102,113	0,000	11,890	90,223	
								84,20						2,154						2,236							**0,000 m3**	**267,965 m3**	**39,076 m3**	**11,890 m3**	**217,000 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

FE4											5,00								3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
FE 4.1	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	0,000	0,00	425,98	424,48	424,88	420,980	424,280	1,700	0,000	1,700		0,300	1,000	2,133	no	0,000	2,663		0,600	2,063						
FE 4.2	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	14,830	14,83	425,97	424,38	424,78	420,970	424,180	1,790	0,000	1,790		0,300	1,000	2,193	no	0,000	2,858		0,600	2,258	0,000	40,941	0,000	8,898	32,043	
FE 4.3	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	37,240	22,41	426	424,23	424,63	421,000	424,030	1,970	0,000	1,970		0,300	1,000	2,313	no	0,000	3,264		0,600	2,664	0,000	68,593	0,000	13,446	55,147	
FE 4.4	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	54,140	16,90	425,96	424,11	424,51	420,960	423,910	2,050	0,000	2,050		0,300	1,000	2,367	no	0,000	3,451		0,600	2,851	0,000	56,737	0,000	10,140	46,597	
FE 4.5	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	74,070	19,93	425,91	423,97	424,37	420,910	423,770	2,140	0,000	2,140		0,300	1,000	2,427	no	0,000	3,667		0,600	3,067	0,000	70,925	0,000	11,958	58,967	
FE 4.6	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	108,250	34,18	426,03	423,74	424,14	421,030	423,540	2,490	0,000	2,490		0,300	1,000	2,660	no	0,000	4,557		0,600	3,957	0,000	140,535	0,000	20,508	120,027	
FE 4.7	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	124,080	15,83	426,07	423,63	424,03	421,070	423,430	2,640	0,000	2,640		0,300	1,000	2,760	no	0,000	4,963		0,600	4,363	0,000	75,350	0,000	9,498	65,852	
FE 4.8 EXIST	0,20		0,40	1,00	0,33	0,10	125,790	1,71	426,12	423,62	424,02	421,120	423,420	2,700	0,000	2,700		0,300	1,000	2,800	no	0,000	5,130		0,600	4,530	0,000	8,630	0,000	1,026	7,604	
								125,79						2,185						2,457							**0,000 m3**	**461,711 m3**		**75,474 m3**	**386,237 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

FE5											5,00								3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
FE 5.1	0,20		0,30	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	426,11	425,01	425,31	421,110	424,810	1,300	0,000	1,300		0,275	0,800	1,667	no	0,000	1,603		0,495	1,108						
FE 5.2 EXIST	0,20		0,30	0,80	0,33	0,10	25,380	25,38	426,3	424,82	425,12	421,300	424,620	1,680	0,000	1,680		0,275	0,800	1,920	no	0,000	2,285		0,495	1,790	0,000	49,340	0,000	12,563	36,777	
								25,38						1,490						1,793							**0,000 m3**	**49,340 m3**		**12,563 m3**	**36,777 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

00001190_001 MOVIMIENTO DE TIERRAS - COLECTORES PLUVIALES

PL1											7,00									3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja						Datos perfil			Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
PL 1.1	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	425,93	424,85	425,17	418,930	424,750	1,180	0,000	1,180	0,515		0,800	1,587	no	0,000	1,408	0,500	0,000	0,908						
PL 1.2	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	23,130	23,13	425,98	424,62	424,94	418,980	424,520	1,460	0,000	1,460	0,515		0,800	1,773	no	0,000	1,879	0,500	0,000	1,378	0,000	38,010	11,574	0,000	26,436	
PL1.3	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	49,880	26,75	425,98	424,35	424,67	418,980	424,250	1,730	0,000	1,730	0,515		0,800	1,953	no	0,000	2,382	0,500	0,000	1,881	0,000	56,980	13,386	0,000	43,594	
PL 1.4 EXIST	0,10	0,10	0,32	0,80	0,33	0,10	61,090	11,21	425,93	424,24	424,56	418,930	424,140	1,790	0,000	1,790	0,515		0,800	1,993	no	0,000	2,500	0,500	0,000	2,000	0,000	27,362	5,610	0,000	21,752	
								61,09						1,540						1,827							**0,000 m3**	**122,352 m3**	**30,570 m3**	**0,000 m3**	**91,782 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

PL2											7,00									3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja						Datos perfil			Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
PL2.1	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	425,94	424,94	425,24	418,940	424,740	1,200	0,000	1,200		0,275	0,800	1,600	no	0,000	1,440	0,000	0,245	1,195						
PL2.2	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	28,420	28,42	425,93	424,75	425,05	418,930	424,550	1,380	0,000	1,380		0,275	0,800	1,720	no	0,000	1,739	0,000	0,245	1,494	0,000	45,171	0,000	6,969	38,202	
PL2.3	0,20	0,00	0,40	0,80	0,33	0,10	56,290	27,87	426,1	424,57	424,97	419,100	424,370	1,730	0,000	1,730		0,300	0,800	1,953	no	0,000	2,382	0,000	0,270	2,112	0,000	57,418	0,000	7,179	50,239	
PL2.4 EXIST	0,20	0,00	0,40	0,80	0,33	0,10	84,910	28,62	426,26	424,38	424,78	419,260	424,180	2,080	0,000	2,080		0,300	0,800	2,187	no	0,000	3,106	0,000	0,270	2,836	0,000	78,530	0,000	7,727	70,803	
								84,91						1,598						1,865							**0,000 m3**	**181,119 m3**	**0,000 m3**	**21,876 m3**	**159,243 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

PL3											7,00									3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja						Datos perfil			Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
PL 3.1	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	425,94	424,49	424,79	418,940	424,290	1,650	0,000	1,650		0,275	0,800	1,900	no	0,000	2,227	0,000	0,245	1,982						
PL 3.2	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	24,120	24,12	425,98	424,38	424,68	418,980	424,180	1,800	0,000	1,800		0,275	0,800	2,000	no	0,000	2,520	0,000	0,245	2,275	0,000	57,255	0,000	5,914	51,340	
PL 3.3	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	56,430	32,31	425,94	424,24	424,64	418,940	424,040	1,900	0,000	1,900		0,300	1,000	2,267	no	0,000	3,103	0,000	0,330	2,773	0,000	90,845	0,000	9,292	81,552	
PL3.4	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	76,470	20,04	425,91	424,15	424,55	418,910	423,950	1,960	0,000	1,960		0,300	1,000	2,307	no	0,000	3,241	0,000	0,330	2,911	0,000	63,566	0,000	6,613	56,952	
PL3.5	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	113,340	36,87	426,03	423,98	424,38	419,030	423,780	2,250	0,000	2,250		0,300	1,000	2,500	no	0,000	3,937	0,000	0,600	3,337	0,000	132,327	0,000	17,145	115,182	
PL 3.6	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	125,800	12,46	426,23	423,92	424,32	419,230	423,720	2,510	0,000	2,510		0,300	1,000	2,673	no	0,000	4,610	0,000	0,600	4,010	0,000	53,251	0,000	7,476	45,775	
PL 3.7 RESALTO	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	135,810	10,01	426,15	423,88	424,28	419,150	423,680	2,470	0,000	2,470		0,300	1,000	2,647	no	0,000	4,504	0,000	0,600	3,904	0,000	45,614	0,000	6,006	39,608	
PL3.8 EXISTENTE	0,20	0,00	0,40	1,00	0,33	0,10	136,990	1,18	426,18	420,33	420,73	419,180	420,130	6,050	0,000	6,050		0,300	1,000	5,033	si	0,000	12,100	0,000	0,600	11,500	0,000	9,796	0,000	0,708	9,088	7,139
								136,99						2,574						2,666							**0,000 m3**	**452,654 m3**	**0,000 m3**	**53,155 m3**	**399,499 m3**	**7,139 m2**
																											0,000%	100,000%				

PL4											7,00									3,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja						Datos perfil			Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
PL 4.1	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	0,000	0,00	426,1	425,37	425,67	419,100	425,170	0,930	0,000	0,930		0,275	0,800	1,420	no	0,000	1,032	0,000	0,245	0,787						
PL 4.2	0,20	0,00	0,30	0,80	0,33	0,10	19,740	19,74	426,25	425,24	425,54	419,250	425,040	1,210	0,000	1,210		0,275	0,800	1,607	no	0,000	1,456	0,000	0,245	1,211	0,000	24,560	0,000	4,840	19,719	
								19,74						1,070						1,513							**0,000 m3**	**24,560 m3**	**0,000 m3**	**4,840 m3**	**19,719 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

A

AB-1											7,00								2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB1.1	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	426,26	425,04	425,19	419,260	424,890	1,370	0,000	1,370	0,450		0,600	1,513	no	0,000	1,448	0,338	0,000	1,110						
AB1.2	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	426,11	424,31	424,46	419,110	424,160	1,950	0,000	1,950	0,450		0,600	1,900	no	0,000	2,437	0,338	0,000	2,100	0,000	19,426	3,375	0,000	16,051	
AB1.3	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	426,01	424,24	424,39	419,010	424,090	1,920	0,000	1,920	0,450		0,600	1,880	no	0,000	2,381	0,338	0,000	2,043	0,000	24,091	3,375	0,000	20,716	
AB1.4	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	30,000	10,00	425,97	424,4	424,55	418,970	424,250	1,720	0,000	1,720	0,450		0,600	1,747	no	0,000	2,018	0,338	0,000	1,681	0,000	21,995	3,375	0,000	18,620	
AB1.5	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	40,000	10,00	425,98	424,55	424,70	418,980	424,400	1,580	0,000	1,580	0,450		0,600	1,653	no	0,000	1,780	0,338	0,000	1,443	0,000	18,991	3,375	0,000	15,616	
AB1.6	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	50,000	10,00	425,97	424,71	424,86	418,970	424,560	1,410	0,000	1,410	0,450		0,600	1,540	no	0,000	1,509	0,338	0,000	1,171	0,000	16,444	3,375	0,000	13,069	
AB1.7	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	60,000	10,00	425,83	424,71	424,86	418,830	424,560	1,270	0,000	1,270	0,450		0,600	1,447	no	0,000	1,300	0,338	0,000	0,962	0,000	14,042	3,375	0,000	10,667	
AB1.8	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	70,000	10,00	425,78	424,7	424,85	418,780	424,550	1,230	0,000	1,230	0,450		0,600	1,420	no	0,000	1,242	0,338	0,000	0,905	0,000	12,710	3,375	0,000	9,335	
AB1.9	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	80,000	10,00	425,77	424,69	424,84	418,770	424,540	1,230	0,000	1,230	0,450		0,600	1,420	no	0,000	1,242	0,338	0,000	0,905	0,000	12,423	3,375	0,000	9,048	
AB1.10	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	87,870	7,87	425,78	424,53	424,68	418,780	424,380	1,400	0,000	1,400	0,450		0,600	1,533	no	0,000	1,493	0,338	0,000	1,156	0,000	10,765	2,656	0,000	8,109	
								87,87						1,508													**0,000 m3**	**150,886 m3**	**29,656 m3**	**0,000 m3**	**121,230 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

AB-2											7,00								2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB2.1	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	425,87	424,77	424,92	418,870	424,620	1,250	0,000	1,250	0,450		0,600	1,433	no	0,000	1,271	0,338	0,000	0,933						
AB2.2	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	425,77	424,72	424,82	418,770	424,570	1,200	0,000	1,200	0,400		0,600	1,400	no	0,000	1,200	0,293	0,000	0,907	0,000	12,354	3,154	0,000	9,200	
AB2.3	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	425,95	424,67	424,77	418,950	424,520	1,430	0,000	1,430	0,400		0,600	1,553	no	0,000	1,540	0,293	0,000	1,246	0,000	13,698	2,933	0,000	10,765	
AB2.4	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	30,000	10,00	425,92	424,61	424,71	418,920	424,460	1,460	0,000	1,460	0,400		0,600	1,573	no	0,000	1,587	0,293	0,000	1,293	0,000	15,631	2,933	0,000	12,697	
AB2.5	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	40,000	10,00	426,06	424,56	424,66	419,060	424,410	1,650	0,000	1,650	0,400		0,600	1,700	no	0,000	1,897	0,293	0,000	1,604	0,000	17,420	2,933	0,000	14,487	
AB2.6	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	50,000	10,00	426,08	424,51	424,61	419,080	424,360	1,720	0,000	1,720	0,400		0,600	1,747	no	0,000	2,018	0,293	0,000	1,725	0,000	19,578	2,933	0,000	16,645	
AB2.7	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	60,000	10,00	426,09	424,46	424,56	419,090	424,310	1,780	0,000	1,780	0,400		0,600	1,787	no	0,000	2,124	0,293	0,000	1,831	0,000	20,711	2,933	0,000	17,778	
AB2.8	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	70,000	10,00	426,11	424,4	424,50	419,110	424,250	1,860	0,000	1,860	0,400		0,600	1,840	no	0,000	2,269	0,293	0,000	1,976	0,000	21,967	2,933	0,000	19,033	
AB2.9	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	80,000	10,00	425,82	424,5	424,60	418,820	424,350	1,470	0,000	1,470	0,400		0,600	1,580	no	0,000	1,602	0,293	0,000	1,309	0,000	19,357	2,933	0,000	16,424	
AB2.10	0,15	0,15	0,10	0,60	0,33	0,10	83,950	3,95	425,92	424,67	424,77	418,920	424,520	1,400	0,000	1,400	0,400		0,600	1,533	no	0,000	1,493	0,293	0,000	1,200	0,000	6,114	1,159	0,000	4,955	
								83,95						1,522													**0,000 m3**	**146,831 m3**	**24,846 m3**	**0,000 m3**	**121,985 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

AB-3											7,00								2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)									Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos		Entibaciones
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB3.1	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	426,17	424,57	424,82	419,170	424,420	1,750	0,000	1,750	0,550		0,600	1,767	no	0,000	2,071	0,431	0,000	1,640						
AB3.2	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	426,22	424,48	424,73	419,220	424,330	1,890	0,000	1,890	0,550		0,600	1,860	no	0,000	2,325	0,431	0,000	1,894	0,000	21,978	4,308	0,000	17,669	
AB3.3	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	426,22	424,38	424,63	419,220	424,230	1,990	0,000	1,990	0,550		0,600	1,927	no	0,000	2,514	0,431	0,000	2,083	0,000	24,194	4,308	0,000	19,885	
AB3.4	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	30,000	10,00	426,15	424,29	424,54	419,150	424,140	2,010	0,000	2,010	0,550		0,600	1,940	no	0,000	2,553	0,431	0,000	2,122	0,000	25,334	4,308	0,000	21,025	
AB3.5	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	40,000	10,00	426,1	424,2	424,45	419,100	424,050	2,050	0,000	2,050	0,550		0,600	1,967	no	0,000	2,631	0,431	0,000	2,200	0,000	25,918	4,308	0,000	21,609	
AB3.6	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	50,000	10,00	426,06	424,1	424,35	419,060	423,950	2,110	0,000	2,110	0,550		0,600	2,007	no	0,000	2,750	0,431	0,000	2,319	0,000	26,904	4,308	0,000	22,596	
AB3.7	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	60,000	10,00	425,89	424,01	424,26	418,890	423,860	2,030	0,000	2,030	0,550		0,600	1,953	no	0,000	2,592	0,431	0,000	2,161	0,000	26,708	4,308	0,000	22,400	
AB3.8	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	70,000	10,00	426,03	423,87	424,12	419,030	423,720	2,310	0,000	2,310	0,550		0,600	2,140	no	0,000	3,165	0,431	0,000	2,734	0,000	28,782	4,308	0,000	24,473	
AB3.9	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	80,000	10,00	425,9	424,61	424,86	418,900	424,460	1,440	0,000	1,440	0,550		0,600	1,560	no	0,000	1,555	0,431	0,000	1,124	0,000	23,599	4,308	0,000	19,291	
AB3.10	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	90,000	10,00	426,08	424,65	424,90	419,080	424,500	1,580	0,000	1,580	0,550		0,600	1,653	no	0,000	1,780	0,431	0,000	1,349	0,000	16,677	4,308	0,000	12,368	
AB3.11	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	100,000	10,00	426,11	424,69	424,94	419,110	424,540	1,570	0,000	1,570	0,550		0,600	1,647	no	0,000	1,764	0,431	0,000	1,333	0,000	17,719	4,308	0,000	13,410	
AB3.12	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	110,000	10,00	426,12	424,73	424,98	419,120	424,580	1,540	0,000	1,540	0,550		0,600	1,627	no	0,000	1,715	0,431	0,000	1,284	0,000	17,391	4,308	0,000	13,082	
AB3.13	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	120,000	10,00	426,17	424,77	425,02	419,170	424,620	1,550	0,000	1,550	0,550		0,600	1,633	no	0,000	1,731	0,431	0,000	1,300	0,000	17,227	4,308	0,000	12,918	
AB3.14	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	130,000	10,00	426,22	424,82	425,07	419,220	424,670	1,550	0,000	1,550	0,550		0,600	1,633	no	0,000	1,731	0,431	0,000	1,300	0,000	17,308	4,308	0,000	13,000	
AB3.15	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	140,000	10,00	426,29	424,86	425,11	419,290	424,710	1,580	0,000	1,580	0,550		0,600	1,653	no	0,000	1,780	0,431	0,000	1,349	0,000	17,555	4,308	0,000	13,247	
AB3.16	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	150,000	10,00	426,31	424,9	425,15	419,310	424,750	1,560	0,000	1,560	0,550		0,600	1,640	no	0,000	1,747	0,431	0,000	1,316	0,000	17,637	4,308	0,000	13,328	
AB3.17	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	160,000	10,00	426,22	424,94	425,19	419,220	424,790	1,430	0,000	1,430	0,550		0,600	1,553	no	0,000	1,540	0,431	0,000	1,109	0,000	16,434	4,308	0,000	12,126	
AB3.18	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	170,000	10,00	426,24	424,98	425,23	419,240	424,830	1,410	0,000	1,410	0,550		0,600	1,540	no	0,000	1,509	0,431	0,000	1,078	0,000	15,242	4,308	0,000	10,933	
AB3.19	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	171,810	1,81	426,26	424,99	425,24	419,260	424,840	1,420	0,000	1,420	0,550		0,600	1,547	no	0,000	1,524	0,431	0,000	1,093	0,000	2,745	0,780	0,000	1,965	
								171,81						1,725													**0,000 m3**	**359,350 m3**	**74,021 m3**	**0,000 m3**	**285,329 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

A

AB-4											7,00									2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					Entibaciones
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos	
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB4.1	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	426,23	425,23	425,38	419,230	425,080	1,150	0,000	1,150	0,450		0,600	1,367	no	0,000	1,131	0,338	0,000	0,793						
AB4.2	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	426,14	425,19	425,34	419,140	425,040	1,100	0,000	1,100	0,450		0,600	1,333	no	0,000	1,063	0,338	0,000	0,726	0,000	10,971	3,375	0,000	7,596	
AB4.3	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	426,03	425,14	425,29	419,030	424,990	1,040	0,000	1,040	0,450		0,600	1,293	no	0,000	0,985	0,338	0,000	0,647	0,000	10,239	3,375	0,000	6,864	
AB4.4	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	30,000	10,00	426,07	425,08	425,23	419,070	424,930	1,140	0,000	1,140	0,450		0,600	1,360	no	0,000	1,117	0,338	0,000	0,780	0,000	10,509	3,375	0,000	7,134	
AB4.5	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	40,000	10,00	426,04	425	425,15	419,040	424,850	1,190	0,000	1,190	0,450		0,600	1,393	no	0,000	1,186	0,338	0,000	0,849	0,000	11,516	3,375	0,000	8,141	
AB4.6	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	50,000	10,00	426,04	424,92	425,07	419,040	424,770	1,270	0,000	1,270	0,450		0,600	1,447	no	0,000	1,300	0,338	0,000	0,962	0,000	12,428	3,375	0,000	9,053	
AB4.7	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	60,000	10,00	426,06	424,84	424,99	419,060	424,690	1,370	0,000	1,370	0,450		0,600	1,513	no	0,000	1,448	0,338	0,000	1,110	0,000	13,736	3,375	0,000	10,361	
AB4.8	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	70,000	10,00	426,03	424,76	424,91	419,030	424,610	1,420	0,000	1,420	0,450		0,600	1,547	no	0,000	1,524	0,338	0,000	1,187	0,000	14,859	3,375	0,000	11,484	
AB4.9	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	80,000	10,00	425,9	424,68	424,83	418,900	424,530	1,370	0,000	1,370	0,450		0,600	1,513	no	0,000	1,448	0,338	0,000	1,110	0,000	14,859	3,375	0,000	11,484	
AB4.10	0,15	0,15	0,15	0,60	0,33	0,10	87,560	7,56	425,86	424,62	424,77	418,860	424,470	1,390	0,000	1,390	0,450		0,600	1,527	no	0,000	1,478	0,338	0,000	1,141	0,000	11,059	2,552	0,000	8,508	
								87,56						1,244													**0,000 m3**	**110,176 m3**	**29,552 m3**	**0,000 m3**	**80,625 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

AB-5											7,00									2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					Entibaciones
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos	
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB5.1	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	426,77	425,22	425,52	419,770	425,070	1,700	0,000	1,700	0,600		0,600	1,733	no	0,000	1,983	0,480	0,000	1,503						
AB5.2	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	426,66	425,1	425,40	419,660	424,950	1,710	0,000	1,710	0,600		0,600	1,740	no	0,000	2,001	0,480	0,000	1,521	0,000	19,920	4,800	0,000	15,120	
AB5.3	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	426,61	424,98	425,28	419,610	424,830	1,780	0,000	1,780	0,600		0,600	1,787	no	0,000	2,124	0,480	0,000	1,644	0,000	20,624	4,800	0,000	15,824	
AB5.4	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	30,000	10,00	426,51	424,86	425,16	419,510	424,710	1,800	0,000	1,800	0,600		0,600	1,800	no	0,000	2,160	0,480	0,000	1,680	0,000	21,421	4,800	0,000	16,621	
AB5.5	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	40,000	10,00	426,43	424,74	425,04	419,430	424,590	1,840	0,000	1,840	0,600		0,600	1,827	no	0,000	2,233	0,480	0,000	1,753	0,000	21,963	4,800	0,000	17,163	
AB5.6	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	50,000	10,00	426,32	424,62	424,92	419,320	424,470	1,850	0,000	1,850	0,600		0,600	1,833	no	0,000	2,251	0,480	0,000	1,771	0,000	22,417	4,800	0,000	17,617	
AB5.7	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	60,000	10,00	426,25	424,5	424,80	419,250	424,350	1,900	0,000	1,900	0,600		0,600	1,867	no	0,000	2,343	0,480	0,000	1,863	0,000	22,971	4,800	0,000	18,171	
AB5.8	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	70,000	10,00	426,26	424,94	425,24	419,260	424,790	1,470	0,000	1,470	0,600		0,600	1,580	no	0,000	1,602	0,480	0,000	1,122	0,000	19,728	4,800	0,000	14,928	
AB5.9	0,15	0,15	0,30	0,60	0,33	0,10	70,940	0,94	426,26	425,03	425,33	419,260	424,880	1,380	0,000	1,380	0,600		0,600	1,520	no	0,000	1,463	0,480	0,000	0,983	0,000	1,441	0,451	0,000	0,989	
								70,94						1,714													**0,000 m3**	**150,484 m3**	**34,051 m3**	**0,000 m3**	**116,433 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

AB-6											7,00									2,0m	Áreas (m2)					Volúmenes (m3)					Entibaciones
	Geometria Zanja							Datos perfil		Datos rasante			Datos calculados (m)								Excavavaciones			Rellenos		Excavavaciones			Rellenos	
E.S.	E gr1	E gr2	D tubo	B fondo	T tierra	T roca	D Origen	D Parcial	Z natural	Z RH	Z Clave	Z roca	Z exc	H Total	H roca	H tierra	H grav	H horm 120º	B tierra	B pav	Entibar	A Exc Roca	A Exc Tierra	A Gr	A HM	Resto	Roca	Tierra	Gr	HM	Resto	A Entib
AB6.1	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	0,000	0,00	426,33	425,08	425,33	419,330	424,930	1,400	0,000	1,400	0,550		0,600	1,533	no	0,000	1,493	0,431	0,000	1,062						
AB6.2	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	10,000	10,00	426,37	425,16	425,41	419,370	425,010	1,360	0,000	1,360	0,550		0,600	1,507	no	0,000	1,433	0,431	0,000	1,002	0,000	14,629	4,308	0,000	10,321	
AB6.3	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	20,000	10,00	426,23	425,23	425,48	419,230	425,080	1,150	0,000	1,150	0,550		0,600	1,367	no	0,000	1,131	0,431	0,000	0,700	0,000	12,817	4,308	0,000	8,508	
AB6.4	0,15	0,15	0,25	0,60	0,33	0,10	24,600	4,60	426,26	425,03	425,28	419,260	424,880	1,380	0,000	1,380	0,550		0,600	1,520	no	0,000	1,463	0,431	0,000	1,032	0,000	5,965	1,982	0,000	3,984	
								24,60						1,322													**0,000 m3**	**33,412 m3**	**10,599 m3**	**0,000 m3**	**22,813 m3**	**0,000 m2**
																											0,000%	100,000%				

00001190_001 REGISTROS DE FECALES

DN (mm)	250	315	400	500
HRh_base (m)	0,63	0,68	0,73	0,9

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
Rehacer salida	FE 1.1	U	FE1	500 mm														
1200	FE 1.2	U	FE1	500 mm	426,24	423,83	2,41	0,9	1	0	1	0	1	0	1	6	0,22	21,39303936
1200	FE 1.3	U	FE1	600 mm	426,22	423,72	2,50	0,9	1	0	1	0	1	1	1	7	0,06	22,116864
1500	FE 1.4	U	FE1	800 mm	425,96	423,3	2,66	0,9	1	0	1	0	1	1	1	7	0,22	27,9975465
1500	FE 1.5	U	FE1	800 mm	425,87	423,27	2,60	0,9	1	0	1	0	1	1	1	7	0,16	27,4202775
Rehacer entrada	FE 1.6	U	FE1	800 mm														
							2,54		4	0	4	0	4	3	4	27		
								TOTAL	4	0	4	0	4	3	4	27		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	FE 2.1	U	FE2	315 mm	426	424,5	1,50	0,68	1	0	1	0	0	0	1	3	0,03	12,37
1000	FE 2.2	U	FE2	315 mm	426,06	424,38	1,68	0,68	1	0	1	0	0	0	1	3	0,21	13,64
1000	FE 2.3	U	FE2	315 mm	426,09	423,99	2,10	0,68	1	0	1	0	1	0	1	5	0,13	16,61
1000	FE 2.4	U	FE2	315 mm	426,07	423,49	2,58	0,68	1	0	1	1	0	0	1	7	0,11	20,00
							1,96		4	0	4	1	1	0	4	18		
								TOTAL	4	0	4	1	1	0	4	18		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	FE 3.1	U	FE3	315 mm	425,92	424,54	1,38	0,68	1	1	0	0	0	1	1	2	0,03	11,52
1000	FE 3.2	U	FE3	315 mm	425,98	424,25	1,73	0,68	1	0	1	0	0	1	1	3	0,01	14,00
1000	FE 3.3 HA	U	FE3	300 mm	426,08	423,85	2,23	0,63	1	0	1	0	1	1	1	5	0,06	17,53
							1,78		3	1	2	0	1	3	3	10		
								TOTAL	3	1	2	0	1	3	3	10		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	FE 4.1	U	FE4	400 mm	425,98	424,48	1,50	0,73	1	0	1	0	0	0	1	3	-0,02	12,37
1000	FE 4.2	U	FE4	400 mm	425,97	424,38	1,59	0,73	1	0	1	0	0	0	1	3	0,07	13,01
1000	FE 4.3	U	FE4	400 mm	426	424,23	1,77	0,73	1	0	1	0	0	1	1	4	0,00	14,28
1000	FE 4.4	U	FE4	400 mm	425,96	424,11	1,85	0,73	1	0	1	0	0	1	1	4	0,08	14,84
1000	FE 4.5	U	FE4	400 mm	425,91	423,97	1,94	0,73	1	0	1	0	0	1	1	4	0,17	15,48
1000	FE 4.6	U	FE4	400 mm	426,03	423,74	2,29	0,73	1	0	1	0	1	1	1	6	0,02	17,95
1000	FE 4.7	U	FE4	400 mm	426,07	423,63	2,44	0,73	1	0	1	0	1	1	1	6	0,17	19,01
							1,91		7	0	7	0	2	5	7	30		
								TOTAL	7	0	7	0	2	5	7	30		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	FE 5.1	U	FE3	300 mm	426,11	425,01	1,10	0,63	1	1	0	0	0	0	1	1	0,05	9,54
Rehacer entrada	FE 5.2 EXIST	U	FE3	300 mm														
							1,10		1	1	0	0	0	0	1	1		
								TOTAL	1	1	0	0	0	0	1	1		

321,09

00001190_001 REGISTROS DE PLUVIALES

DN (mm)	250	315	400	500
HRh_base (m)	0,63	0,68	0,73	0,9

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	PL 1.1	U	PL1	315 mm	425,93	424,85	1,08	0,68	1	1	0	0	0	0	1	1	-0,02	9,40
1000	PL 1.2	U	PL1	315 mm	425,98	424,62	1,36	0,68	1	1	0	0	0	1	1	2	0,01	11,38
1000	PL1.3	U	PL1	315 mm	425,98	424,35	1,63	0,68	1	0	1	0	0	0	1	3	0,16	13,29
Existente	**PL 1.4 EXIST**	U	PL1	315 mm														
							1,36		3	2	1	0	0	1	3	6		
								TOTAL	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**1**	**3**	**6**		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	PL2.1	U	PL2	300 mm	425,94	424,94	1,00	0,63	1	1	0	0	0	0	1	1	-0,05	8,84
1000	PL2.2	U	PL2	300 mm	425,93	424,75	1,18	0,63	1	1	0	0	0	0	1	1	0,13	10,11
1000	PL2.3	U	PL2	400 mm	426,1	424,57	1,53	0,73	1	0	1	0	0	0	1	3	0,01	12,58
Existente	**PL2.4 EXIST**	U	PL2	400 mm														
							1,24		3	2	1	0	0	0	3	5		
								TOTAL	**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**3**	**5**		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
1000	PL 3.1	U	PL3	300 mm	425,94	424,49	1,45	0,63	1	0	1	0	0	0	1	2	0,03	12,02
1000	PL 3.2	U	PL3	300 mm	425,98	424,38	1,60	0,63	1	0	1	0	0	0	1	3	0,18	13,08
1000	PL 3.3	U	PL3	400 mm	425,94	424,24	1,70	0,73	1	0	1	0	0	0	1	3	0,18	13,78
1000	PL3.4	U	PL3	400 mm	425,91	424,15	1,76	0,73	1	0	1	0	0	1	1	4	-0,01	14,21
1000	PL3.5	U	PL3	400 mm	426,03	423,98	2,05	0,73	1	0	1	0	1	0	1	5	0,03	16,26
1000	PL 3.6	U	PL3	400 mm	426,23	423,92	2,31	0,73	1	0	1	0	1	1	1	6	0,04	18,10
1200	PL 3.7 RESALTO	U	PL3	600 mm	426,15	423,88	2,27	0,9	1	0	1	0	1	0	1	6	0,08	20,27
Existente	**PL3.8 EXISTENTE**	U	PL3															
							1,88		7	0	7	0	3	2	7	29		
								TOTAL	**7**	**0**	**7**	**0**	**3**	**2**	**7**	**29**		

diam pozo	REG.	U/C	colector	diámetro	Z natural	Z RH	H rh (a tapa)	HRh_base	B	L30	C	R100	R50	R25	TAPA	PATES	Recrecer (m)	Excavación
Arqueta 90x90	PL 4.1	U	PL4	300 mm	426,1	425,37	0,73	0,63										
1000	PL 4.2	U	PL4	300 mm	426,25	425,24	1,01	0,63	1	1	0	0	0	0	1	1	-0,04	8,91
							0,87		1	1	0	0	0	0	1	1		
								TOTAL	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**		

182,21

Medición Auxiliar Acometidas de fecales

Nombre	Colector	Prof.Media colector	Prof. Media Arranque	DN	Esp. Firme dem.	Gr. Protec	Talud	B.Zanja	Longitud	H. Hidráulica media	Ancho Firme	Excavación	Gravillín	Hg (pav)	Resto		Entibación
AF1.1	FE1	2,75	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,23 m	1,83 m	2,53 m	18,12 m3	1,83 m3	0,00 m3	16,29 m3	no	0,000
AF1.2	FE1	2,75	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,47 m	1,83 m	2,53 m	18,64 m3	1,88 m3	0,00 m3	16,77 m3	no	0,000
AF1.3*	FE1	2,75	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	7,46 m	1,83 m	2,53 m	16,42 m3	1,82 m3	0,00 m3	14,61 m3	no	0,000
AF1.4	FE1	2,75	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,36 m	1,83 m	2,53 m	7,40 m3	0,75 m3	0,00 m3	6,65 m3	no	0,000
AF1.5	FE1	2,75	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	7,30 m	1,83 m	2,53 m	16,07 m3	1,62 m3	0,00 m3	14,45 m3	no	0,000
AF2.1*	FE2	2,20	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,23 m	1,55 m	2,35 m	16,02 m3	2,25 m3	0,00 m3	13,77 m3	no	0,000
AF2.2	FE2	2,20	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,54 m	1,55 m	2,35 m	11,35 m3	1,45 m3	0,00 m3	9,90 m3	no	0,000
AF2.3*	FE2	2,20	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,84 m	1,55 m	2,35 m	11,87 m3	1,66 m3	0,00 m3	10,21 m3	no	0,000
AF2.4	FE2	2,20	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,33 m	1,55 m	2,35 m	10,99 m3	1,40 m3	0,00 m3	9,58 m3	no	0,000
AF2.5	FE2	2,20	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	7,03 m	1,55 m	2,35 m	12,20 m3	1,56 m3	0,00 m3	10,64 m3	no	0,000
AF2.6*	FE2	2,20	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	11,09 m	1,55 m	2,35 m	19,25 m3	2,70 m3	0,00 m3	16,55 m3	no	0,000
AF2.7	FE2	2,20	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	14,96 m	1,55 m	2,35 m	25,97 m3	3,32 m3	0,00 m3	22,65 m3	no	0,000
AF2.8*	FE2	2,20	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,12 m	1,55 m	2,35 m	14,09 m3	1,98 m3	0,00 m3	12,12 m3	no	0,000
AF3.1	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	12,45 m	1,53 m	2,33 m	21,11 m3	2,76 m3	0,00 m3	18,35 m3	no	0,000
AF3.2	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,78 m	1,53 m	2,33 m	18,28 m3	2,39 m3	0,00 m3	15,89 m3	no	0,000
AF3.3	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,04 m	1,53 m	2,33 m	17,03 m3	2,23 m3	0,00 m3	14,80 m3	no	0,000
AF3.4	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,36 m	1,53 m	2,33 m	7,39 m3	0,97 m3	0,00 m3	6,43 m3	no	0,000
AF3.5	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,17 m	1,53 m	2,33 m	17,25 m3	2,26 m3	0,00 m3	14,99 m3	no	0,000
AF3.6	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,65 m	1,53 m	2,33 m	11,28 m3	1,48 m3	0,00 m3	9,80 m3	no	0,000
AF3.7	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,38 m	1,53 m	2,33 m	7,43 m3	0,97 m3	0,00 m3	6,46 m3	no	0,000
AF3.8	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,19 m	1,53 m	2,33 m	17,28 m3	2,26 m3	0,00 m3	15,02 m3	no	0,000
AF3.9	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,86 m	1,53 m	2,33 m	8,24 m3	1,08 m3	0,00 m3	7,16 m3	no	0,000
AF3.10	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,48 m	1,53 m	2,33 m	17,77 m3	2,33 m3	0,00 m3	15,45 m3	no	0,000
AF3.11	FE3	2,15	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,57 m	1,53 m	2,33 m	11,14 m3	1,46 m3	0,00 m3	9,68 m3	no	0,000
AF4.1*	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	7,63 m	1,54 m	2,34 m	13,13 m3	1,86 m3	0,00 m3	11,27 m3	no	0,000
AF4.2*	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	11,58 m	1,54 m	2,34 m	19,92 m3	2,82 m3	0,00 m3	17,10 m3	no	0,000
AF4.3*	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,55 m	1,54 m	2,34 m	6,11 m3	0,86 m3	0,00 m3	5,24 m3	no	0,000
AF4.4*	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,25 m	1,54 m	2,34 m	14,19 m3	2,01 m3	0,00 m3	12,19 m3	no	0,000
AF4.5*	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,65 m	1,54 m	2,34 m	11,44 m3	1,62 m3	0,00 m3	9,82 m3	no	0,000
AF4.6	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,06 m	1,54 m	2,34 m	13,87 m3	1,79 m3	0,00 m3	12,08 m3	no	0,000
AF4.7	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,88 m	1,54 m	2,34 m	6,68 m3	0,86 m3	0,00 m3	5,81 m3	no	0,000
AF4.8	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	7,99 m	1,54 m	2,34 m	13,75 m3	1,77 m3	0,00 m3	11,97 m3	no	0,000
AF4.9	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,60 m	1,54 m	2,34 m	18,24 m3	2,35 m3	0,00 m3	15,89 m3	no	0,000
AF4.10	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,73 m	1,54 m	2,34 m	11,58 m3	1,49 m3	0,00 m3	10,09 m3	no	0,000
AF4.11	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	11,10 m	1,54 m	2,34 m	19,10 m3	2,46 m3	0,00 m3	16,63 m3	no	0,000
AF4.12	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,32 m	1,54 m	2,34 m	5,71 m3	0,74 m3	0,00 m3	4,98 m3	no	0,000
AF4.13***	FE4	2,18	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,32 m	1,54 m	2,34 m	5,71 m3	0,81 m3	0,00 m3	4,90 m3	no	0,000
AF4.14	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,51 m	1,54 m	2,34 m	6,04 m3	0,78 m3	0,00 m3	5,26 m3	no	0,000
AF4.15	FE4	2,18	0,90	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,87 m	1,54 m	2,34 m	8,38 m3	1,08 m3	0,00 m3	7,30 m3	no	0,000
AF5.1*	FE5	1,49	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,26 m	1,20 m	2,11 m	11,17 m3	2,25 m3	0,00 m3	8,92 m3	no	0,000
AF5.2*	FE5	1,49	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,31 m	1,20 m	2,11 m	11,23 m3	2,27 m3	0,00 m3	8,97 m3	no	0,000
AF5.3***	FE5	1,49	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,60 m	1,20 m	2,11 m	10,38 m3	2,09 m3	0,00 m3	8,28 m3	no	0,000
AF5.4***	FE5	1,49	0,90	DN 250 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	8,76 m	1,20 m	2,11 m	10,57 m3	2,13 m3	0,00 m3	8,44 m3	no	0,000
									332,86 m		**Totales**	**569,79 m3**	**76,44 m3**	**0,00 m3**	**493,35 m3**		**0,00 m2**

Medición Auxiliar Acometidas de pluviales

Nombre	Colector	Prof.Media colector	Prof. Media Arranque	DN	Esp. Firme dem.	Gr. Protec	Talud	B.Zanja	Longitud	H. Hidráulica media	Ancho Firme	Excavación	Exc. Tierra	Exc. Roca	Gravillín	Hg (pav)	Resto
Sumideros																	
	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	19,0 m	1,15 m	2,07 m	21,55 m3			4,21 m3	0,00 m3	17,34 m3
	PL2	1,60	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	12,0 m	1,17 m	2,09 m	14,07 m3			2,66 m3	0,00 m3	11,41 m3
	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	21,0 m	1,66 m	2,41 m	40,01 m3			4,65 m3	0,00 m3	35,36 m3
	PL4	1,07	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,0 m	0,91 m	1,92 m	7,57 m3			1,99 m3	0,00 m3	5,58 m3
BAJANTES									61,0 m								
AP1.1	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	2,2 m	1,15 m	2,07 m	2,51 m3			0,49 m3	0,00 m3	2,02 m3
AP1.2	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	17,5 m	1,15 m	2,07 m	19,79 m3			3,86 m3	0,00 m3	15,93 m3
AP1.3	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,9 m	1,15 m	2,07 m	11,24 m3			2,19 m3	0,00 m3	9,04 m3
AP1.4	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	2,5 m	1,15 m	2,07 m	2,88 m3			0,56 m3	0,00 m3	2,32 m3
AP1.5	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,4 m	1,15 m	2,07 m	10,69 m3			2,09 m3	0,00 m3	8,61 m3
AP1.6	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,4 m	1,15 m	2,07 m	3,84 m3			0,75 m3	0,00 m3	3,09 m3
AP1.7	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,6 m	1,15 m	2,07 m	10,84 m3			2,12 m3	0,00 m3	8,72 m3
AP1.8	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	3,3 m	1,15 m	2,07 m	3,73 m3			0,73 m3	0,00 m3	3,00 m3
AP1.9	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,6 m	1,15 m	2,07 m	10,84 m3			2,12 m3	0,00 m3	8,72 m3
AP1.10	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,6 m	1,15 m	2,07 m	7,46 m3			1,46 m3	0,00 m3	6,01 m3
AP1.11	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,8 m	1,15 m	2,07 m	12,24 m3			2,39 m3	0,00 m3	9,85 m3
AP1.12	PL1	1,54	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	13,3 m	1,15 m	2,07 m	15,04 m3			2,94 m3	0,00 m3	12,10 m3
AP3.10	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,8 m	1,66 m	2,41 m	9,09 m3			1,06 m3	0,00 m3	8,03 m3
AP3.11	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,4 m	1,66 m	2,41 m	19,80 m3			2,30 m3	0,00 m3	17,50 m3
AP3.12	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	9,4 m	1,66 m	2,41 m	17,91 m3			2,08 m3	0,00 m3	15,83 m3
AP3.13	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,2 m	1,66 m	2,41 m	8,02 m3			0,93 m3	0,00 m3	7,09 m3
AP3.14	PL3	2,57	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	4,8 m	1,66 m	2,41 m	9,16 m3			1,06 m3	0,00 m3	8,10 m3
AP4.1	PL4	1,07	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,5 m	0,91 m	1,92 m	5,48 m3			1,44 m3	0,00 m3	4,04 m3
AP4.2	PL4	1,07	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,0 m	0,91 m	1,92 m	8,41 m3			2,21 m3	0,00 m3	6,20 m3
AP4.3	PL4	1,07	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	6,6 m	0,91 m	1,92 m	5,53 m3			1,45 m3	0,00 m3	4,08 m3
AP4.4	PL4	1,07	0,75	DN 200 mm	0 cm	10 cm	0,33	50 cm	10,5 m	0,91 m	1,92 m	8,84 m3			2,32 m3	0,00 m3	6,51 m3
									287,12 m		**Totales**	**286,53 m3**	**0,00 m3**	**0,00 m3**	**50,06 m3**	**0,00 m3**	**236,47 m3**

Medición Auxiliar Acometidas de Abastecimiento

Nombre	Conducción	Prof.Media conducción	Prof.Media Arranque	H. Hidráu. media	DN (mm)	Esp. Firme	Gr.Protec	Talud	B.Zanja	Longitud	Ancho Hg	Ancho Aglom.	Hg (sub) (m3)	Excav. bajo Firme (m3)	Excav. Total (m3)	Gravillín (m3)	Resto (m3)
C.1	AB1	1,508	0,75	1,13 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	9,54 m	1,62 m	2,02 m	0,00	9,49	9,49	1,13	8,35
C.2	AB1	1,508	0,75	1,13 m	80	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	5,93 m	1,62 m	2,02 m	0,00	5,90	5,90	0,79	5,11
C.3	AB1	1,508	0,75	1,13 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	4,76 m	1,62 m	2,02 m	0,00	4,73	4,73	0,57	4,17
C.4	AB1	1,508	0,75	1,13 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	4,72 m	1,62 m	2,02 m	0,00	4,69	4,69	0,56	4,13
HIDRANTE	AB1	1,508	0,75	1,13 m	100	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	5,36 m	1,62 m	2,02 m	0,00	5,33	5,33	0,76	4,57
BOCA DE RIEGO	AB1	1,508	0,75	1,13 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	2,00 m	1,62 m	2,02 m	0,00	1,99	1,99	0,24	1,75
C.5	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,10 m	1,62 m	2,02 m	0,00	1,10	1,10	0,13	0,97
C.6	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,15 m	1,62 m	2,02 m	0,00	1,15	1,15	0,14	1,02
C.7	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,17 m	1,62 m	2,02 m	0,00	1,17	1,17	0,14	1,03
C.8	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	2,10 m	1,62 m	2,02 m	0,00	2,11	2,11	0,25	1,86
C.9	AB2	1,522	0,75	1,14 m	80	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	5,31 m	1,62 m	2,02 m	0,00	5,33	5,33	0,71	4,62
BOCA DE RIEGO	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	8,46 m	1,62 m	2,02 m	0,00	8,49	8,49	1,01	7,48
C.10	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	9,82 m	1,62 m	2,02 m	0,00	9,85	9,85	1,17	8,68
C.11	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	11,55 m	1,62 m	2,02 m	0,00	11,59	11,59	1,37	10,21
C.12	AB2	1,522	0,75	1,14 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,21 m	1,62 m	2,02 m	0,00	13,25	13,25	1,57	11,68
C.13	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,54 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,31	15,31	1,61	13,70
C.14	AB3	1,725	0,75	1,24 m	80	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,47 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,23	15,23	1,79	13,44
C.15	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,45 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,21	15,21	1,60	13,61
C.16	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,45 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,21	15,21	1,60	13,61
C.17	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,36 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,10	15,10	1,59	13,52
N.1	AB3	1,725	0,75	1,24 m	32	0 cm	10 cm	0,333	41 cm	13,34 m	1,70 m	2,10 m	0,00	15,26	15,26	1,50	13,76
C.18	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	13,27 m	1,69 m	2,09 m	0,00	15,00	15,00	1,58	13,43
C.19	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	15,26 m	1,69 m	2,09 m	0,00	17,25	17,25	1,81	15,44
C.20	AB3	1,725	0,75	1,24 m	63	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	12,41 m	1,69 m	2,09 m	0,00	14,03	14,03	1,55	12,48
HIDRANTE	AB3	1,725	0,75	1,24 m	100	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	14,18 m	1,69 m	2,09 m	0,00	16,03	16,03	2,02	14,02
BOCA DE RIEGO	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	3,46 m	1,69 m	2,09 m	0,00	3,91	3,91	0,41	3,50
C.21	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	2,41 m	1,69 m	2,09 m	0,00	2,72	2,72	0,29	2,44
N.2	AB3	1,725	0,75	1,24 m	32	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,99 m	1,69 m	2,09 m	0,00	2,25	2,25	0,22	2,03
C.22	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	2,05 m	1,69 m	2,09 m	0,00	2,32	2,32	0,24	2,07
C.32	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,13 m	1,69 m	2,09 m	0,00	1,28	1,28	0,13	1,14
C.33	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,13 m	1,69 m	2,09 m	0,00	1,28	1,28	0,13	1,14
C.34	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,13 m	1,69 m	2,09 m	0,00	1,28	1,28	0,13	1,14
C.35	AB3	1,725	0,75	1,24 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	4,59 m	1,69 m	2,09 m	0,00	5,19	5,19	0,55	4,64
C.23	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	10,02 m	1,53 m	1,93 m	0,00	8,41	8,41	1,19	7,22
C.24	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	10,12 m	1,53 m	1,93 m	0,00	8,50	8,50	1,20	7,29
C.25	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	10,34 m	1,53 m	1,93 m	0,00	8,68	8,68	1,23	7,45
C.26	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	10,60 m	1,53 m	1,93 m	0,00	8,90	8,90	1,26	7,64
C.27	AB4	1,244	0,75	1,00 m	32	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,08 m	1,53 m	1,93 m	0,00	0,91	0,91	0,12	0,79
C.28	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,17 m	1,53 m	1,93 m	0,00	0,98	0,98	0,14	0,84
C.29	AB4	1,244	0,75	1,00 m	32	0 cm	10 cm	0,333	40 cm	1,19 m	1,53 m	1,93 m	0,00	1,00	1,00	0,13	0,87
N.3	AB4	1,244	0,75	1,00 m	32	0 cm	10 cm	0,333	41 cm	1,23 m	1,54 m	1,94 m	0,00	1,05	1,05	0,14	0,91
C.30	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	42 cm	1,27 m	1,55 m	1,95 m	0,00	1,09	1,09	0,16	0,94
C.31	AB4	1,244	0,75	1,00 m	80	0 cm	10 cm	0,333	43 cm	1,54 m	1,56 m	1,96 m	0,00	1,34	1,34	0,22	1,13
BOCA DE RIEGO	AB4	1,244	0,75	1,00 m	50	0 cm	10 cm	0,333	44 cm	1,00 m	1,57 m	1,97 m	0,00	0,88	0,88	0,13	0,75
C.36	AB5	1,380	0,75	1,07 m	80	0 cm	10 cm	0,333	45 cm	2,43 m	1,63 m	2,03 m	0,00	2,37	2,37	0,36	2,01
C.37	AB6	1,322	0,75	1,04 m	32	0 cm	10 cm	0,333	46 cm	11,64 m	1,62 m	2,02 m	0,00	11,09	11,09	1,44	9,65
				1,14 m						303,43 m	Totales		0,00	315,23	315,23	36,99	278,24

0,00 m2

ABASTECIMIENTO

Dimensiones de arquetas en nudos de abastecimiento (m)


E.S.	DEFINICIÓN GEOMÉTRICA														OTROS DATOS DE INTERÉS					MEDICIONES								
	P. Perfil	DN	TIPO	U / C	EP	WL	LL	ELI	ELS	EM	HL	BT	RT	RTUB	Tapa	HA	Recub.	Prof. RH	TALUD	EXCAV.	GRAV.	T. UNO	HL150	HA 25	ENCOFRADO	ACERO B500 S	JUNTA WS	PATES
Nudo 1	-	300	G	U	0,20	1,37	2,00	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,24	424,44	1	1,60 m	1,50 m	1,80 m	1/3	28,51 m3	5,47 m3	12,77 m3	0,56 m3	5,05 m3	33,09 m2	248,17 kg	7,54 m	3
Nudo 2.1	-	150	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,07	424,12	1	1,75 m	1,80 m	1,95 m	1/3	19,26 m3	4,45 m3	10,39 m3	0,26 m3	2,70 m3	20,39 m2	123,91 kg	4,40 m	4
Nudo 2.2		250	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,20	424,97	1	1,03 m	0,98 m	1,23 m	1/3	11,27 m3	2,42 m3	5,65 m3	0,26 m3	2,06 m3	14,05 m2	95,51 kg	4,40 m	0
Nudo 3	-	250	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,33	425,08	1	1,05 m	1,00 m	1,25 m	1/3	11,47 m3	2,47 m3	5,76 m3	0,26 m3	2,08 m3	14,23 m2	96,30 kg	4,40 m	2
Nudo 4		150	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	425,78	424,53	1	1,05 m	1,10 m	1,25 m	1/3	11,47 m3	2,47 m3	5,76 m3	0,26 m3	2,08 m3	14,23 m2	96,30 kg	4,40 m	0
Nudo 5		100	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,06	424,37	1	1,49 m	1,59 m	1,69 m	1/3	16,11 m3	3,64 m3	8,49 m3	0,26 m3	2,47 m3	18,10 m2	113,65 kg	4,40 m	3
Nudo 6		150	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	425,81	424,71	1	0,90 m	0,95 m	1,10 m	1/3	10,07 m3	2,13 m3	4,96 m3	0,26 m3	1,95 m3	12,91 m2	90,38 kg	4,40 m	0
Nudo 7		150	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	425,87	424,63	1	1,04 m	1,09 m	1,24 m	1/3	11,37 m3	2,45 m3	5,71 m3	0,26 m3	2,07 m3	14,14 m2	95,90 kg	4,40 m	2
Nudo 8	-	150	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,23	425,23	1	0,80 m	0,85 m	1,00 m	1/3	9,19 m3	1,91 m3	4,47 m3	0,26 m3	1,86 m3	12,03 m2	86,44 kg	4,40 m	0
Nudo 9	-	250	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	425,89	423,89	1	1,80 m	1,75 m	2,00 m	1/3	19,90 m3	4,62 m3	10,78 m3	0,26 m3	2,74 m3	20,83 m2	125,88 kg	4,40 m	4
Nudo 10	-	250	G	U	0,20	0,90	0,90	0,20	0,25	0,20	0,10	0,25	426,17	424,56	1	1,41 m	1,36 m	1,61 m	1/3	15,20 m3	3,41 m3	7,95 m3	0,26 m3	2,40 m3	17,40 m2	110,50 kg	4,40 m	3

Mallas electrosoldada	Ø	#	kg/m²
Losa Inferior (Parrilla inferior	10	15x15	7,47
Losa Inferior (Parrilla superio	10	15x15	7,47
Muros	10	15x15	7,47
Losa Superior (Parrilla inferio	12	15x15	10,76
Losa Superior (Parrilla super	10	15x15	7,47


Datos Variables		
Vuelo LS Arqueta en campo	A	0,20 m
Sobrealto LS Arqueta en campo	B	0,50 m
Sobreancho fondo de excavación	C	0,30 m
Ancho cámara desagüe Arqueta "D"	D	0,50 m
Talud (H/V) - H<4m		0,33
Talud (H/V) - H>=4m		0,50
Recubrimiento acero		0,05 m
Δ Acero en solapes y despuntes		10 %
Altura "Ha" arqueta "V" (ventosa)		1,00 m

ARQUETAS TIPO "G" (GENERAL) CON LOSA SUPERIOR BAJO PAVIMENTO. UBICACIÓN URBANA

Los aceros de armaduras de estas secciones, son solo una representación esquemática, el armado queda definido en la sección tipo correspondiente.

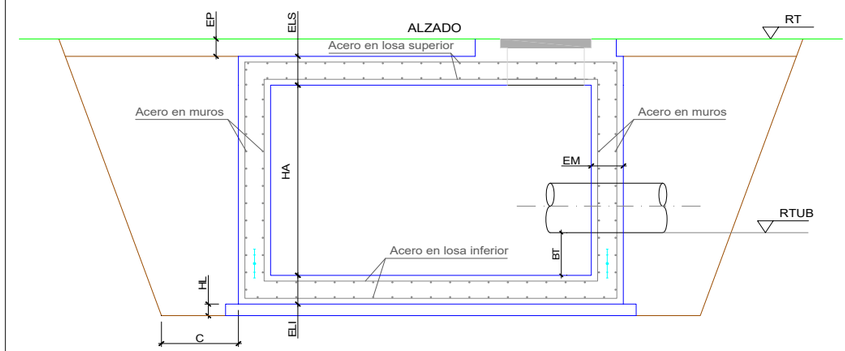

PLANTA

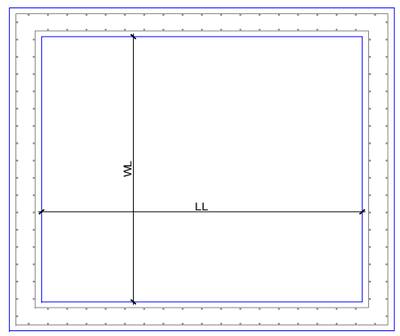

COD.	DESCRIPCIÓN
A	Vuelo de la losa superior en (campo)
B	Sobrealto de la losa superior (campo)
C	Sobreancho fondo de excavación
LL	Largura útil interior
WL	Anchura útil interior
HA	Altura útil interior
ELI	Espesor de la Losa Inferior
ELS	Espesor de la Losa Superior
EM	Espesor de muros
BT	Altura libre Bajo Tubo
RT	Rasante de Terreno Natural
RTUB	Rasante de Tubería (Cota de excavación)

Mediciones para Gestión de Resíduos de Construcción y Demolición

ABASTECIMIENTO		
Excav. en zanja		
	Conducción	951,14 m3
	Acometidas	315,23 m3
		1266,37 m3
Excav. en nudos		**163,81 m3**
Demoliciones en general		
Hormigón en masa		4,20 m3
Demolición de arquetas		3,87 m3
		8,07 m3
Hormigón armado		6,05 m3
		6,05 m3
	Total demolición hormigones	**14,12 m3**
Demoliciones pavimentos en áreas que NO pav. El Ayto. de Ansoain		
Calle Canteras		
Demolición Pav. (MBC)		6,78 m2
Demolición Pav. Hormigón (Aceras)		0,00 m2
		6,78 m2
FECALES		
Excav. en zanja		
	Colectores y acometidas	2391,48 m3
		2391,48 m3
Excav. en registros		
	Pozos	321,09 m3
	Arquetas 60x60	162,80 m3
	Arquetas 40x40	3,84 m3
		487,73 m3
Demoliciones en general		
Hormigón en masa		
Demolición de arquetas		45,50 m3
		45,50 m3
Demoliciones pavimentos en áreas que NO pav. El Ayto. de Ansoain		
Calle Navarra		
Demolición Pav. MBC		17,46 m2
		17,46 m2
PLUVIALES		
Excav. en zanja		
	Colectores y acometidas	1067,22 m3
		1067,22 m3
Excav. en registros		
	Pozos	182,21 m3
	Arquetas 60x60	81,40 m3
	Arquetas 40x40	2,88 m3
		266,49 m3
Demoliciones en general		
Hormigón en masa		
Demolición de arquetas		22,26 m3
		22,26 m3
Demoliciones pavimentos en áreas que NO pav. El Ayto. de Ansoain		
Demolición Pav. MBC		0,00 m2
		0,00 m2

MEDICIONES

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
	00001190 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN, CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA						
1	**RED DE ABASTECIMIENTO**						
1.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES**						
1.1.1	m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 15 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Calle Canteras	1	3,390	2,000		6,780	
	Conexiones	2	4,000	2,000		16,000	
	Total partida						22,780
1.1.2	Ud Demolición de arqueta de hormigón de pequeñas dimensiones, incluso limpieza, demolición, carga sobre camión, relleno seleccionado y reposición de pavimento. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Nudo 3	1				1,000	
	Nudo 6	1				1,000	
	Nudo 8	1				1,000	
	Nudo 10	1				1,000	
	Total partida						4,000
1.1.3	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Según mediciones auxiliares						
	AB1	0,9	150,886			135,797	
	AB2	0,9	146,831			132,148	
	AB3	0,9	359,350			323,415	
	AB4	0,9	110,176			99,158	
	AB5	0,9	150,484			135,436	
	AB6	0,9	33,412			30,071	
	CONEXIONES	5	6,000	1,500	1,500	67,500	
	Total partida						923,525
1.1.4	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Según mediciones auxiliares						
	AB1	0,1	150,886			15,089	
	AB2	0,1	146,831			14,683	
	AB3	0,1	359,350			35,935	
	AB4	0,1	110,176			11,018	
	AB5	0,1	150,484			15,048	
	AB6	0,1	33,412			3,341	
	Total partida						95,114
1.1.6	m3 Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	AB1	1	29,656			29,656	
	AB2	1	24,846			24,846	
	AB3	1	74,021			74,021	
	AB4	1	29,552			29,552	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:						158,075
	AB5	1	34,051			34,051	
	AB6	1	10,599			10,599	
	CONEXIONES	5	6,000	0,500	0,500	7,500	
	Total partida						210,225
1.1.7	m3 Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	AB1	1	121,230			121,230	
	AB2	1	121,985			121,985	
	AB3	1	285,329			285,329	
	AB4	1	80,625			80,625	
	AB5	1	116,433			116,433	
	AB6	1	22,813			22,813	
	CONEXIONES	5	6,000	1,500	1,500	67,500	
	Total partida						815,915
1.1.8	Ud Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios						
	Total partida						1,000
1.1.9	m3 Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.						
	Calle Canteras	1	4,390	3,000	0,250	3,293	
	Conexiones	2	5,000	3,000	0,250	7,500	
	Total partida						10,793
1.1.10	m2 Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 22 base 50/70 G (G-20) calizo de 10 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares						
	Calle Canteras	1	4,390	3,000		13,170	
	Conexiones	2	5,000	3,000		30,000	
	Total partida						43,170
1.1.11	m2 Mallazo electrosoldado B 500 S formado por redondos ø10 mm. en cuadrícula de 15x15 cms., en posesión de sello de calidad, incluso p.p. de despuntes, desperdicios, solapes, esperas, separadores, totalmente colocado.						
	En protección de tuberías someras	5	15,000	2,000		150,000	
	Total partida						150,000
1.1.12	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.						
	En protección de tuberías someras	5	15,000	2,000	0,250	37,500	
	Total partida						37,500
1.2	**TUBERIAS Y PIEZAS**						
1.2.1	m Tubería de fundición nodular de DN 100 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.						
	AB2	1	78,000			78,000	
	Conexiones	1	6,000			6,000	
	Total partida						84,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.2.2	m Tubería de fundición nodular de DN 150 mm., clase de presión C64, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	AB1	1	90,000	90,000	
	AB2	1	12,000	12,000	
	AB4	1	90,000	90,000	
	Conexiones	1	12,000	12,000	
	Total partida				204,000
1.2.3	m Tubería de fundición nodular de DN 250 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	AB3	1	174,000	174,000	
	AB6	1	30,000	30,000	
	Conexiones	1	12,000	12,000	
	Total partida				216,000
1.2.4	m Tubería de fundición nodular de DN 300 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	AB5	1	72,000	72,000	
	Conexiones	1	12,000	12,000	
	Total partida				84,000
1.2.5	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CODOS HORIZONTALES				
	AB2	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.2.6	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 150 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CODOS HORIZONTALES				
	AB1	4		4,000	
	AB2	2		2,000	
	AB4	2		2,000	
	CONEXIONES	1		1,000	
	Total partida				9,000
1.2.7	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 250 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CODOS VERTICALES				
	AB3	2		2,000	
	CODOS HORIZONTALES				
	AB3	8		8,000	
	AB6	3		3,000	
	CONEXIONES	1		1,000	
	Total partida				14,000
1.2.8	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 300 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	AB5	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.2.9	Ud Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 80 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CONEXION EXISTENTE	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.2.10	Ud Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 100 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CONEXION AB1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.2.11	Ud Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 150 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CONEXION AB2	1		1,000	
	CONEXION AB4	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.2.12	Ud Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 250 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CONEXION AB6	1		1,000	
	CONEXION AB3	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.2.13	Ud Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 300 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	CONEXION 1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.2.14	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AB3	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.2.15	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AB3	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.2.16	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AB2	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.2.17	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AB1	4		4,000	
	AB2	2		2,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:				6,000
	AB4	2		2,000	
	CONEXIONES	1		1,000	
	Total partida				9,000
1.2.18	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	CONEXION AB6	1		1,000	
	CONEXION AB3	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.2.19	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AB5	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3	**OBRAS DE FABRICA**				
1.3.1	**NUDO 1**				
1.3.1.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	28,510	28,510	
	Total partida				28,510
1.3.1.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,470	5,470	
	Total partida				5,470
1.3.1.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	según medición auxiliar	1	12,770	12,770	
	Total partida				12,770
1.3.1.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,560	0,560	
	Total partida				0,560
1.3.1.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,050	5,050	
	Total partida				5,050

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.1.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	33,090	33,090	
	Total partida				33,090
1.3.1.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	248,170	248,170	
	Total partida				248,170
1.3.1.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	7,540	7,540	
	Total partida				7,540
1.3.1.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.1.12	Ud Trampillón para registro y maniobra de válvula de acometida, cuerpo en HDPE, con tapa de fundición gris EN-GJL-200 (GG-20) y revestimento epoxídico, con tornillo de acero inoxidable A2 e inscripción en personalizada en nylon 6. Totalmente instalada en pavimentos o losas de arqueta, incluso colocación, hormigón de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.1.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 1	3		3,000	
	Total partida				3,000
1.3.1.14	Ud Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.1.15	Ud Pasamuros para tubería de D entre 300 y 400 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 1	2		2,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.1.16	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.1.17	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.1.18	Ud Te de fundición nodular a Bridas, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.1.19	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.1.20	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 300 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.1.21	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.1.22	Ud Adaptador universal para D.N. 80 mm, construida en fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563 y protección de nylon-11, para conexión con tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores de 84-106 mm, mediante junta elastómera EPDM y contrabrida con tornillería protegida con teflón, con homologación, incluso corte de la tubería a conectar, preparación y limpieza del corte resultante, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.2	**NUDO 2**				
1.3.2.1	Ud Empalme Brida-Enchufe (BE) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.2.2	Ud Empalme Brida-Enchufe (BE) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
1.3.2.3	Ud Empalme Brida-Enchufe (BE) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.						
	Total partida						1,000
1.3.2.4	Ud Cruceta de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.						
	Total partida						1,000
1.3.2.5	Ud Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 300/(150-250) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.						
	Total partida						1,000
1.3.2.6	Ud Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.						
	Total partida						1,000
1.3.2.7	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.						
	contrarresto cruceta DN250mm	1	0,500	0,500	0,800	0,200	
	contrarresto reducciones DN 300/(150-250)mm	1	0,300	0,300	0,500	0,045	
	contrarresto reducciones DN 250/(100-200)mm	1	0,250	0,250	0,500	0,031	
	Total partida						0,276
1.3.2.8	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.						
	contrarresto cruceta DN250mm	120	0,500	0,500	0,800	24,000	
	Total partida						24,000
1.3.2.9	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.						
	contrarresto cruceta DN250mm	4	0,500		0,800	1,600	
	contrarresto reducciones DN 300/(150-250)mm	4	0,300		0,500	0,600	
	contrarresto reducciones DN 250/(100-200)mm	4	0,250		0,500	0,500	
	Total partida						2,700
1.3.3	**NUDO 2.1**						
1.3.3.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Según medición auxiliar	1	19,260			19,260	
	Total partida						19,260

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.3.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,450	4,450	
	Total partida				4,450
1.3.3.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	10,390	10,390	
	Total partida				10,390
1.3.3.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.3.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,700	2,700	
	Total partida				2,700
1.3.3.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	20,390	20,390	
	Total partida				20,390
1.3.3.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	123,910	123,910	
	Total partida				123,910
1.3.3.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.3.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 2.1	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.3.12	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 2.1	4		4,000	
	Total partida				4,000
1.3.3.14	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 2.1	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.3.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 2.1	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.3.16	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.3.17	Ud Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.3.18	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.3.19	Ud Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.4	**NUDO 2.2**				
1.3.4.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	11,270	11,270	
	Total partida				11,270
1.3.4.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,420	2,420	
	Total partida				2,420
1.3.4.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,650	5,650	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				5,650
1.3.4.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.4.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,060	2,060	
	Total partida				2,060
1.3.4.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	14,050	14,050	
	Total partida				14,050
1.3.4.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	95,510	95,510	
	Total partida				95,510
1.3.4.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.4.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 2.2	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.4.12	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 2.2	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.4.13	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 2.2	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.4.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 2.2	1		1,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				1,000
1.3.4.16	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.4.17	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 250 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.5	**NUDO 3**				
1.3.5.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	11,470	11,470	
	Total partida				11,470
1.3.5.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,470	2,470	
	Total partida				2,470
1.3.5.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,760	5,760	
	Total partida				5,760
1.3.5.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.5.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,080	2,080	
	Total partida				2,080
1.3.5.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	14,230	14,230	
	Total partida				14,230

N.º Orden		DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.5.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
		Según medición auxiliar	1	96,300	96,300	
		Total partida				96,300
1.3.5.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
		Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
		Total partida				4,400
1.3.5.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
		Nudo 3	1		1,000	
		Total partida				1,000
1.3.5.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
		Nudo 3	2		2,000	
		Total partida				2,000
1.3.5.13	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
		Nudo 3	2		2,000	
		Total partida				2,000
1.3.5.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
		Nudo 3	1		1,000	
		Total partida				1,000
1.3.5.16		Valv. comp. tetones (1") 250 mm PN-16				
		Total partida				1,000
1.3.5.17	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				2,000
1.3.5.18	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				2,000
1.3.5.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.6	**NUDO 4**				
1.3.6.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	11,470	11,470	
	Total partida				11,470
1.3.6.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,470	2,470	
	Total partida				2,470
1.3.6.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,760	5,760	
	Total partida				5,760
1.3.6.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.6.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,080	2,080	
	Total partida				2,080
1.3.6.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	14,230	14,230	
	Total partida				14,230
1.3.6.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	96,300	96,300	
	Total partida				96,300
1.3.6.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.6.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 4	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.6.12	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 4	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.6.13	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 4	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.6.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 4	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.6.16	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.6.17	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.6.18	Ud Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.6.19	Ud Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.7	**NUDO 5**				
1.3.7.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	16,110	16,110	
	Total partida				16,110

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.7.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	3,640	3,640	
	Total partida				3,640
1.3.7.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	8,490	8,490	
	Total partida				8,490
1.3.7.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.7.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,470	2,470	
	Total partida				2,470
1.3.7.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	18,100	18,100	
	Total partida				18,100
1.3.7.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	113,650	113,650	
	Total partida				113,650
1.3.7.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.7.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 5	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.7.12	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 5	3		3,000	
	Total partida				3,000
1.3.7.13	Ud Pasamuros para tubería de D menor de 100 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 5	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.7.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 5	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.7.16	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.7.17	Ud Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.7.18	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.7.19	Ud Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.8	**NUDO 6**				
1.3.8.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	10,070	10,070	
	Total partida				10,070
1.3.8.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,130	2,130	
	Total partida				2,130

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.8.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,960	4,960	
	Total partida				4,960
1.3.8.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.8.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	1,950	1,950	
	Total partida				1,950
1.3.8.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	12,910	12,910	
	Total partida				12,910
1.3.8.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	90,380	90,380	
	Total partida				90,380
1.3.8.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.8.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 6	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.8.12	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 6	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.8.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 6	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.8.14	Ud Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 6	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.8.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 6	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.8.16	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.8.17	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.8.18	Ud Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 150/(50-125) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.				
	Total partida				1,000
1.3.8.19	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.8.20	Ud Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.9	**NUDO 7**				
1.3.9.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	11,370	11,370	
	Total partida				11,370
1.3.9.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,450	2,450	
	Total partida				2,450

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.9.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	5,710	5,710	
	Total partida				5,710
1.3.9.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.9.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,070	2,070	
	Total partida				2,070
1.3.9.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	14,140	14,140	
	Total partida				14,140
1.3.9.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	95,900	95,900	
	Total partida				95,900
1.3.9.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.9.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 7	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.9.12	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 7	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.9.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 7	2		2,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.9.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 7	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.9.16	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, modelo largo, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.9.17	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.10	**NUDO 8**				
1.3.10.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	9,190	9,190	
	Total partida				9,190
1.3.10.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	1,910	1,910	
	Total partida				1,910
1.3.10.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,470	4,470	
	Total partida				4,470
1.3.10.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.10.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	1,860	1,860	
	Total partida				1,860
1.3.10.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	12,030	12,030	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				12,030
1.3.10.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	86,440	86,440	
	Total partida				86,440
1.3.10.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.10.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 8	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.10.12	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 8	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.10.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 8	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.10.14	Ud Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 8	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.10.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 8	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.10.16	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.11	**NUDO 9**				
1.3.11.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	19,900	19,900	
	Total partida				19,900
1.3.11.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,620	4,620	
	Total partida				4,620
1.3.11.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	10,780	10,780	
	Total partida				10,780
1.3.11.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.11.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,740	2,740	
	Total partida				2,740
1.3.11.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	20,830	20,830	
	Total partida				20,830
1.3.11.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	125,880	125,880	
	Total partida				125,880
1.3.11.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.11.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 9	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.11.12	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 9	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.3.11.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 9	4		4,000	
	Total partida				4,000
1.3.11.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 9	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.11.16	Valv. comp. tetones (1") 250 mm PN-16				
	Total partida				1,000
1.3.11.17	Ud Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.11.18	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.3.11.19	Ud Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.12	**NUDO 10**				
1.3.12.1	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	1	15,200	15,200	
	Total partida				15,200
1.3.12.2	m3 Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	3,410	3,410	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				3,410
1.3.12.3	m3 Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	7,950	7,950	
	Total partida				7,950
1.3.12.5	m3 Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	0,260	0,260	
	Total partida				0,260
1.3.12.6	m3 Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	2,400	2,400	
	Total partida				2,400
1.3.12.7	m2 Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	Según medición auxiliar	1	17,400	17,400	
	Total partida				17,400
1.3.12.9	kg Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	110,500	110,500	
	Total partida				110,500
1.3.12.10	m Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	4,400	4,400	
	Total partida				4,400
1.3.12.11	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 10	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.12.12	Ud Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento				
	Nudo 10	2		2,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.3.12.13	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 10	3		3,000	
	Total partida				3,000
1.3.12.14	Ud Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Nudo 10	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.12.15	Ud Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.				
	Nudo 10	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.3.12.16	Ud Te de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.12.17	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				4,000
1.3.12.18	Ud Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.				
	Total partida				1,000
1.3.12.19	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 250 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.12.20	Ud Empalme Brida-Enchufe (BE) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.3.12.21	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.4	**ACOMETIDAS**				
1.4.1	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.				
	C.5	1		1,000	
	C.6	1		1,000	
	C.7	1		1,000	
	C.8	1		1,000	
	SIN LOCALIZAR	2		2,000	
	Total partida				6,000
1.4.2	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m.				
	C.10	1		1,000	
	C.11	1		1,000	
	C.12	1		1,000	
	Total partida				3,000
1.4.3	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.				
	C.27	1		1,000	
	C.29	1		1,000	
	N.3	1		1,000	
	Total partida				3,000
1.4.4	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.				
	C.3	1		1,000	
	C.4	1		1,000	
	C.28	1		1,000	
	C.30	1		1,000	
	SIN LOCALIZAR	2		2,000	
	Total partida				6,000
1.4.5	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 10 m.				
	C1	1		1,000	
	C.23	1		1,000	
	C.24	1		1,000	
	C.25	1		1,000	
	C.26	1		1,000	
	Total partida				5,000
1.4.6	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.				
	N.2	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.7	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, ejecución de zanja, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15m.				
	N.1	1		1,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:				1,000
	C.37	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.4.8	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.				
	C.21	1		1,000	
	C.22	1		1,000	
	C.32	1		1,000	
	C.33	1		1,000	
	C.34	1		1,000	
	C.35	1		1,000	
	Total partida				6,000
1.4.9	Ud Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m.				
	C.13	1		1,000	
	C.15	1		1,000	
	C.16	1		1,000	
	C.17	1		1,000	
	C.18	1		1,000	
	C.19	1		1,000	
	SIN LOCALIZAR	2		2,000	
	Total partida				8,000
1.4.19	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	0,9	315,230	283,707	
	Total partida				283,707
1.4.20	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según medición auxiliar	0,1	315,230	31,523	
	Total partida				31,523
1.4.22	m3 Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	36,990	36,990	
	Total partida				36,990
1.4.23	m3 Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.				
	Según medición auxiliar	1	278,240	278,240	
	Total partida				278,240

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.4.24	Ud Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.9	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.25	Ud Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 150 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.26	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.14	1		1,000	
	C.20	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.4.27	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.36	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.28	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.9	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.29	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.30	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.14	1		1,000	
	C.20	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.4.31	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.36	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.4.32	m Tubería de fundición nodular de DN 80 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	C.2	1	5,930	5,930	
	C.9	1	5,310	5,310	
	C.14	1	13,470	13,470	
	C.36	1	2,430	2,430	
	Total partida				27,140
1.4.34	Ud Llave de paso para acometida de servicios de D 1 1/4", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.				
	AB6				
	C.37	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.4.35	Ud Llave de paso para acometida de servicios de D 2", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.				
	AB1				
	C.1	1		1,000	
	C.3	1		1,000	
	C.4	1		1,000	
	AB2				
	C.5	1		1,000	
	C.6	1		1,000	
	C.7	1		1,000	
	C.8	1		1,000	
	C.10	1		1,000	
	C.11	1		1,000	
	C.12	1		1,000	
	AB3				
	C.13	1		1,000	
	C.17	1		1,000	
	C.19	1		1,000	
	C.21	1		1,000	
	C.22	1		1,000	
	C.32	1		1,000	
	C.33	1		1,000	
	C.34	1		1,000	
	C.35	1		1,000	
	AB4				
	C.28	1		1,000	
	C.30	1		1,000	
	C.23	1		1,000	
	C.24	1		1,000	
	C.25	1		1,000	
	C.26	1		1,000	
	SIN LOCALIZAR	4		4,000	
	Total partida				29,000
1.4.36	Ud Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C27	1		1,000	
	C29	1		1,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.4.37	Ud Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de >1", incluso contador antihielo de ø20 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, retirada y puenteado de contador interior existente, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C15	1		1,000	
	C16	1		1,000	
	C18	1		1,000	
	Total partida				3,000
1.4.38	Ud Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", SIN contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	N1	1		1,000	
	N2	1		1,000	
	N3	1		1,000	
	Total partida				3,000
1.4.40	Ud Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.80x0.80 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	C.9	1		1,000	
	C.14	1		1,000	
	C.36	1		1,000	
	Total partida				4,000
1.4.42	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	C.9	1		1,000	
	C.14	1		1,000	
	C.36	1		1,000	
	Total partida				4,000
1.4.43	Ud Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.2	2		2,000	
	C.9	2		2,000	
	C.14	2		2,000	
	C.36	2		2,000	
	Total partida				8,000
1.4.44	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 80 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	C.2	2		2,000	
	C.9	2		2,000	
	C.14	2		2,000	
	C.36	2		2,000	
	Total partida				8,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.4.45	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codos de: (11º, 22º y 45º), en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	C.9	1		1,000	
	C.14	1		1,000	
	C.36	1		1,000	
	Total partida				4,000
1.4.46	Ud Contrarresto de hormigón armado en Codo 22º, en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	C.9	1		1,000	
	C.14	1		1,000	
	C.36	1		1,000	
	Total partida				4,000
1.4.47	Ud Adaptador universal para D.N. 80 mm, construida en fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563 y protección de nylon-11, para conexión con tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores de 84-106 mm, mediante junta elastómera EPDM y contrabrida con tornillería protegida con teflón, con homologación, incluso corte de la tubería a conectar, preparación y limpieza del corte resultante, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	C.2	1		1,000	
	C.9	1		1,000	
	C.14	1		1,000	
	C.36	1		1,000	
	Total partida				4,000
1.5	**HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO**				
1.5.1	Ud Arqueta Normalizada de hormigón HM-20/B/19/I, de 60x60 cm x 0.80 m de dimensiones interiores, para alojamiento de hidrante, incluso excavación, relleno de ZA-25, encofrado y desencofrado, marco y tapa abatible de D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
1.5.2	Ud Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	AB2				
	BOCA DE RIEGO	1		1,000	
	Total partida				1,000
1.5.3	Ud Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 150 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	AB1				
	HIDRANTE	1		1,000	
	BOCA DE RIEGO	1		1,000	
	AB4				
	BOCA DE RIEGO	1		1,000	
	Total partida				3,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.5.4	Ud Te de fundición nodular de Enchufes a Brida, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, con brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	AB3				
	HIDRANTE	1		1,000	
	BOCA DE RIEGO	1		1,000	
	Total partida				2,000
1.5.5	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				1,000
1.5.6	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				3,000
1.5.7	Ud Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	HIDRANTES	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.5.8	Ud Empalme Brida-Enchufe (BE) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	HIDRANTES	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.5.9	Ud Carrete de fundición nodular a Bridas, de 100 mm. de diámetro, L=300 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	HIDRANTES	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.5.10	Ud Codo de fundición nodular a bridas de DN 100 mm (90º-45º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B , transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	HIDRANTES	2		2,000	
	Total partida				2,000
1.5.11	Ud Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
	HIDRANTES	2		2,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden		DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.5.12	m	Tubería de fundición nodular de DN 100 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
		HIDRANTES	2	6,000	12,000	
		Total partida				12,000
1.5.13	Ud	Hidrante bajo rasante, modelo homologado, de doble columna seca, dos bocas de ø 75 mm. con válvulas de compuerta de 2½" en cada una de las bocas y salida de racord Barcelona de 70 mm. de aluminio forjado, con dispositivo antihielo, incluso p.p. de juntas de etileno-propileno, tornillería bicromatada, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
		Total partida				2,000
1.5.14	Ud	Boca de Riego modelo "BV-05-63-PA", de BELGICAST, D.N. 40 mm, con cuerpo de hierro fundido formando arqueta, eje de acero X20 Cr 13, con el acoplamiento de bronce tipo Pamplona y cadena de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares				
		Total partida				4,000
1.5.15	Ud	Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				4,000
1.5.16	m	Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 63 de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.				
		BOCAS DE RIEGO	4	6,000	24,000	
		Total partida				24,000
1.5.17	m	Tubería de diámetro ext. 63 mm. (int. 2"), de polietileno de Alta Densidad PE-100, para 16 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE-EN 12201, en posesión de la Marca de producto certificado, incluso transporte a pie de obra, p.p. de piezas especiales, colocación en zanja, prueba de presión y desinfección con cloro, herramientas y medios auxiliares.				
		BOCAS DE RIEGO	4	6,000	24,000	
		Total partida				24,000
1.5.18	Ud	Brida Roscada de D.N. 40 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				4,000
1.5.19	Ud	Enlace mixto brida de Latón , D.N. 60/65 mm con salida para PEBD 2 1/2", para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.				
		Total partida				4,000
1.5.20	Ud	Protección de columna de Boca de Riego, para evitar vibraciones de la misma, mediante Hormigón HM-20, incluso encofrado y colocación.				
		Total partida				4,000
1.6		**RED PROVISIONAL**				
1.6.1	Ud	Localización y preparación para la conexión de acometidas de agua a viviendas y locales existentes, mediante la realización de catas, incluyendo excavación mecánica o manual, con demolición de pavimentos y/o contrarrestos, materiales para posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.				
		Acometidas existentes	34		34,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:				34,000
	Sin localizar	6		6,000	
	Total partida				40,000
1.6.2	m Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 3" mm. (3" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.					
	Calle Canteras	1	149,610	149,610	
		1	3,270	3,270	
		1	4,020	4,020	
		1	34,330	34,330	
		1	5,410	5,410	
	Travesía Canteras	1	143,820	143,820	
	Calle Arturo Campion	1	113,170	113,170	
		1	106,760	106,760	
		1	65,960	65,960	
		1	16,340	16,340	
	Calle Navarra	1	49,440	49,440	
		1	85,720	85,720	
	Total partida				777,850
1.6.3	m Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1 ½'' mm. (1 1/2" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.					
	C.5	1	4,000	4,000	
	C.6	1	4,000	4,000	
	C.7	1	4,000	4,000	
	C.8	1	4,000	4,000	
	C.10	1	4,000	4,000	
	C.11	1	4,000	4,000	
	C.12	1	4,000	4,000	
	C.3	1	4,000	4,000	
	C.4	1	4,000	4,000	
	C.28	1	4,000	4,000	
	C.30	1	4,000	4,000	
	C1	1	4,000	4,000	
	C.23	1	4,000	4,000	
	C.24	1	4,000	4,000	
	C.25	1	4,000	4,000	
	C.26	1	4,000	4,000	
	C.21	1	4,000	4,000	
	C.22	1	4,000	4,000	
	C.32	1	4,000	4,000	
	C.33	1	4,000	4,000	
	C.34	1	4,000	4,000	
	C.35	1	4,000	4,000	
	C.13	1	4,000	4,000	
	C.15	1	4,000	4,000	
	C.16	1	4,000	4,000	
	C.17	1	4,000	4,000	
	C.18	1	4,000	4,000	
	C.19	1	4,000	4,000	
	SIN LOCALIZAR	6	4,000	24,000	
	P				136,000
	Total partida				136,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
1.6.4	m Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1" mm. (1" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.				
	C.27	1	4,000	4,000	
	C.29	1	4,000	4,000	
	N.3	1	4,000	4,000	
	N.2	1	4,000	4,000	
	N.1	1	4,000	4,000	
	C.37	1	4,000	4,000	
	P				24,000
	Total partida				24,000
1.6.5	Ud de abono íntegro para la conexion para la derivación de la red de abastecimiento provisional durante la ejecución de las obras desde la red actual ó definitiva, incluso localización y descubrimiento de la conducción existente en los puntos de conexión, por medios manuales o mecánicos, apuntalamientos necesarios para sujeción de la tubería, entibación y agotamiento de la zanja, rellenos, piecerio necesario para derivación de red provisional y taponamiento de la red actual si fuera necesario, medios manuales y mecánicos requeridos para asegurar el suministro, herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la deconexión final con vuelta a las condiciones iniciales.				
	Hidrante C/. Ezcaba	1		1,000	
	NUdo C/. Lapurbide	1		1,000	
	Nudo C/. Canteras	1		1,000	
	Hidrante C/. Arturo Campión	1		1,000	
	P				4,000
	Total partida				4,000
1.7	**VARIOS**				
1.7.1	Ud Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.				
	AB1	2		2,000	
	AB2	2		2,000	
	AB3	2		2,000	
	AB4	2		2,000	
	AB5	2		2,000	
	P				10,000
	Total partida				10,000
1.7.2	Ud Partida Alzada a justificar en protecciones de tuberías de gas según Normativa de Gas en cruces y paralelismos con los distintos servicios.				
	Total partida				5,000
1.7.3	Ud Cruce de canalización de proyecto con otros servicios afectados, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, adecuación de la entibación, relleno y colocación de la tubería, su desvío, apuntalamiento y estabilización o adecuación a la necesidad de la obra y su reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, gestiones con la compañías, etc., hasta la correcta ejecución de la unidad.				
	AB1				
	ONO	1		1,000	
	AB3				
	GAS	3		3,000	
	BAJA TENSION	1		1,000	
	TELEFONICA	2		2,000	
	AB4				
	MEDIA TENSION	1		1,000	
	BAJA TENSION	1		1,000	
	AB6				
	GAS	1		1,000	
	ONO	1		1,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:	.....					11,000
	PREVISION ALUMBRADO 3						
P							11,000
		28				28,000	
	Total partida	.....					39,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
2	**RED DE FECALES**						
2.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**						
2.1.1	m2 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 15 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Calle Navarra	1	8,730	2,000		17,460	
	Conexiones	2	4,000	2,000		16,000	
	Total partida						33,460
2.1.3	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Según mediciones auxiliares						
	F1	0,7	805,134			563,594	
	F2	0,7	237,547			166,283	
	F3	0,7	267,965			187,576	
	F4	0,7	461,711			323,198	
	F5	0,7	49,340			34,538	
	ACOMETIDAS	0,7	569,790			398,853	
	SOBREEXCAVACIONES	8	5,000	2,000	2,000	160,000	
	Total partida						1.834,042
2.1.4	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	Según mediciones auxiliares						
	F1	0,3	841,187			252,356	
	F2	0,3	244,175			73,253	
	F3	0,3	285,808			85,742	
	F4	0,3	503,856			151,157	
	F5	0,3	49,340			14,802	
	ACOMETIDAS	0,3	450,550			135,165	
	SOBREEXCAVACIONES	4	5,000	2,000	2,000	80,000	
	Total partida						792,475
2.1.6	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en tierras, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	POZOS FECALES						
	Según medicion auxiliar	0,7	321,090			224,763	
	P						224,763
	Total partida						224,763
2.1.7	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en roca, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.						
	POZOS FECALES						
	Según medicion auxiliar	0,3	321,090			96,327	
	Total partida						96,327

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
2.1.10	m3 Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	F2	1	45,898			45,898	
	F3	1	39,076			39,076	
	ACOMETIDAS	1	76,440			76,440	
	P						161,414
	POZOS FECALES						
	F2	4	2,000	2,000	0,500	8,000	
	F3	3	2,000	2,000	0,500	6,000	
	a deducir registros						
	F2	-3,142	4,000	0,384	0,500	-2,413	
	F3	-3,142	3,000	0,384	0,500	-1,810	
	P						9,777
	·S·						
	Total partida						171,191
2.1.11	m3 Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.						
	CAMAS DE HORMIGON (Incluye nivelación de la base)						
	FE1	1	113,042			113,042	
	FE3	1	11,890			11,890	
	FE4	1	75,474			75,474	
	FE5	1	12,563			12,563	
	SOBREEXCVACIONES	5	5,000	2,000	0,500	25,000	
	Total partida						237,969
2.1.13	m3 Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	F1	1	692,061			692,061	
	F2	1	191,649			191,649	
	F3	1	217,000			217,000	
	F4	1	386,237			386,237	
	F5	1	36,777			36,777	
	ACOMETIDAS	1	493,950			493,950	
	Total partida						2.017,674
2.1.14	Ud Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios						
	Total partida						1,000
2.1.15	m3 Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.						
	Calle Navarra	1	8,730	2,000	0,200	3,492	
	Conexiones	2	4,000	2,000	0,200	3,200	
	Total partida						6,692
2.1.16	m2 Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 22 base 50/70 G (G-20) calizo de 10 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares						
	Calle Canteras	1	4,390	3,000		13,170	
	Conexiones	2	5,000	3,000		30,000	
	Total partida						43,170

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.2	**TUBERIAS**				
2.2.1	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 300 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	FE3	1	24,010	24,010	
	FE5	1	25,620	25,620	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				54,430
2.2.2	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 400 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	FE4	1	14,830	14,830	
		1	22,400	22,400	
		1	16,910	16,910	
		1	19,930	19,930	
		1	34,180	34,180	
		1	15,830	15,830	
		1	1,710	1,710	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				130,590
2.2.3	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 500 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	FE1	1	42,740	42,740	
		1	11,060	11,060	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				58,600
2.2.4	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 600 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	FE1	153,14		153,140	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				157,940
2.2.5	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 800 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, con al menos dos bulones (arteones) para su manipulación, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	FE1	1	16,720	16,720	
		1	16,030	16,030	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				37,550

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.2.6	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AF1.1	1	8,230	8,230	
	AF1.2	1	8,470	8,470	
	AF1.4	1	3,360	3,360	
	AF1.5	1	7,300	7,300	
	AF2.2	1	6,540	6,540	
	AF2.4	1	6,330	6,330	
	AF2.5	1	7,030	7,030	
	AF2.7	1	14,960	14,960	
	AF3.1	1	12,450	12,450	
	AF3.2	1	10,780	10,780	
	AF3.3	1	10,040	10,040	
	AF3.4	1	4,360	4,360	
	AF3.5	1	10,170	10,170	
	AF3.6	1	6,650	6,650	
	AF3.7	1	4,380	4,380	
	AF3.8	1	10,190	10,190	
	AF3.9	1	4,860	4,860	
	AF3.10	1	10,480	10,480	
	AF3.11	1	6,570	6,570	
	AF4.6	1	8,060	8,060	
	AF4.7	1	3,880	3,880	
	AF4.8	1	7,990	7,990	
	AF4.9	1	10,600	10,600	
	AF4.10	1	6,730	6,730	
	AF4.11	1	11,100	11,100	
	AF4.12	1	3,320	3,320	
	AF4.14	1	3,510	3,510	
	AF4.15	1	4,870	4,870	
	No localizadas	5	4,000	20,000	
	Total partida				233,210
2.2.7	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 250 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AF1.3	1	7,460	7,460	
	AF2.1	1	9,230	9,230	
	AF2.3	1	6,840	6,840	
	AF2.6	1	11,090	11,090	
	AF2.8	1	8,120	8,120	
	AF4.1	1	7,630	7,630	
	AF4.2	1	11,580	11,580	
	AF4.3	1	3,550	3,550	
	AF4.4	1	8,250	8,250	
	AF4.5	1	6,650	6,650	
	AF4.13	1	3,320	3,320	
	AF5.1	1	9,260	9,260	
	AF5.2	1	9,310	9,310	
	AF5.3	1	8,600	8,600	
	AF5.4	1	8,760	8,760	
	No localizadas	3	4,000	12,000	
	Total partida				131,650
2.2.8	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE2	1	6,580	6,580	
		1	21,750	21,750	
		1	27,910	27,910	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:				56,240
		1	10,410	10,410	
	FE3	1	25,380	25,380	
		1	34,810	34,810	
	Total partida				126,840
2.2.9	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	AF1.1	1		1,000	
	AF3.11	1		1,000	
	AF4.12	1		1,000	
	AF4.13	1		1,000	
	AF4.14	1		1,000	
	AF5.3	1		1,000	
	AF5.4	1		1,000	
	No localizadas	1		1,000	
	Total partida				8,000
2.2.10	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	No localizadas	4		4,000	
	Total partida				4,000
2.2.11	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	AF3.3	1		1,000	
	AF3.4	1		1,000	
	AF3.7	1		1,000	
	AF3.8	1		1,000	
	Total partida				4,000
2.2.12	m Rehabilitación de colector de diámetro 300 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara.				
	FE5	1	25,620	25,620	
	Total partida				25,620
2.3	**OBRAS DE FABRICA**				
2.3.1	Ud Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 2.1	1		1,000	
	FE 2.2	1		1,000	
	FE 2.3	1		1,000	
	FE 2.4	1		1,000	
	FE 3.1	1		1,000	
	FE 3.2	1		1,000	
	FE 3.3 HA	1		1,000	
	FE 4.1	1		1,000	
	FE 4.2	1		1,000	
	FE 4.3	1		1,000	
	FE 4.4	1		1,000	
	FE 4.5	1		1,000	
	FE 4.6	1		1,000	
	FE 4.7	1		1,000	
	FE 5.1	1		1,000	
	FE A MODIFICAR	2		2,000	
	Total partida				17,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.3.2	Ud Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160/200 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE1.2	1		1,000	
	FE1.3	1		1,000	
	Total partida				2,000
2.3.3	Ud Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1500 mm de diámetro interior y 300 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE1.4	1		1,000	
	FE1.5	1		1,000	
	Total partida				2,000
2.3.4	Ud Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1500/1200 mm., para pozo de registro de 1500 mm. de diámetro interior y 300 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.				
	FE1.4	1		1,000	
	FE1.5	1		1,000	
	Total partida				2,000
2.3.5	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 3.1	1		1,000	
	FE 3.2	1		1,000	
	FE 3.3 HA	1		1,000	
	FE 4.3	1		1,000	
	FE 4.4	1		1,000	
	FE 4.5	1		1,000	
	FE 4.6	1		1,000	
	FE 4.7	1		1,000	
	FECALES A REFORZAR	2		2,000	
	Total partida				10,000
2.3.6	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 2.3	1		1,000	
	FE 3.3	1		1,000	
	FE 4.6	1		1,000	
	FE 4.7	1		1,000	
	Total partida				4,000
2.3.7	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 100 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 2.4	1		1,000	
	Total partida				1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.3.8	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE1.3	1		1,000	
	Total partida				1,000
2.3.9	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE1.4	1		1,000	
	FE1.5	1		1,000	
	FE1.2	1		1,000	
	FE1.3	1		1,000	
	Total partida				4,000
2.3.10	Ud Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 2.1	1		1,000	
	FE 2.2	1		1,000	
	FE 2.3	1		1,000	
	FE 2.4	1		1,000	
	FE 3.2	1		1,000	
	FE 3.3 HA	1		1,000	
	FE 4.1	1		1,000	
	FE 4.2	1		1,000	
	FE 4.3	1		1,000	
	FE 4.4	1		1,000	
	FE 4.5	1		1,000	
	FE 4.6	1		1,000	
	FE 4.7	1		1,000	
	FECALES A REFORZAR	2		2,000	
	Total partida				15,000
2.3.11	Ud Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1200/600 mm y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE1.2	1		1,000	
	FE1.3	1		1,000	
	Total partida				2,000
2.3.12	Ud Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1200/600 mm., para pozo de registro de 1200 mm. de diámetro interior y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.				
	FE1.4	1		1,000	
	FE1.5	1		1,000	
	Total partida				2,000
2.3.13	Ud Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.				
	FE 3.1	1		1,000	
	FE 5.1	1		1,000	
	Total partida				2,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.3.14	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 1.2	1		1,000	
	FE 1.3	1		1,000	
	FE 1.4	1		1,000	
	FE 1.5	1		1,000	
	FE 2.1	1		1,000	
	FE 2.2	1		1,000	
	FE 2.3	1		1,000	
	FE 2.4	1		1,000	
	FE 3.1	1		1,000	
	FE 3.2	1		1,000	
	FE 3.3 HA	1		1,000	
	FE 4.1	1		1,000	
	FE 4.2	1		1,000	
	FE 4.3	1		1,000	
	FE 4.4	1		1,000	
	FE 4.5	1		1,000	
	FE 4.6	1		1,000	
	FE 4.7	1		1,000	
	FE 5.1	1		1,000	
	Total partida				19,000
2.3.15	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo PAMREX de Saint Gobain o SOLO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	POZOS A REFORZAR	2		2,000	
	Total partida				2,000
2.3.16	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	FE 1.2	6		6,000	
	FE 1.3	7		7,000	
	FE 1.4	7		7,000	
	FE 1.5	7		7,000	
	FE 2.1	3		3,000	
	FE 2.2	3		3,000	
	FE 2.3	5		5,000	
	FE 2.4	7		7,000	
	FE 3.1	2		2,000	
	FE 3.2	3		3,000	
	FE 3.3 HA	5		5,000	
	FE 4.1	3		3,000	
	FE 4.2	3		3,000	
	FE 4.3	4		4,000	
	FE 4.4	4		4,000	
	FE 4.5	4		4,000	
	FE 4.6	6		6,000	
	FE 4.7	6		6,000	
	FE 5.1	1		1,000	
	Total partida				86,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.3.17	Ud Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.				
	NO LOCALIZADAS	4		4,000	
	Total partida				4,000
2.3.18	Ud Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil cuadrada, de 60x60 cm de paso libre , con inscripción, clase B125, tipo Hidraulica de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.				
	AF1.1	1		1,000	
	AF1.2	1		1,000	
	AF1.3	1		1,000	
	AF1.4	1		1,000	
	AF1.5	1		1,000	
	AF2.1	1		1,000	
	AF2.2	1		1,000	
	AF2.3	1		1,000	
	AF2.4	1		1,000	
	AF2.5	1		1,000	
	AF2.6	1		1,000	
	AF2.7	1		1,000	
	AF2.8	1		1,000	
	AF3.1	1		1,000	
	AF3.2	1		1,000	
	AF3.3	1		1,000	
	AF3.4	1		1,000	
	AF3.5	1		1,000	
	AF3.6	1		1,000	
	AF3.7	1		1,000	
	AF3.8	1		1,000	
	AF3.9	1		1,000	
	AF3.10	1		1,000	
	AF3.11	1		1,000	
	AF4.1	1		1,000	
	AF4.2	1		1,000	
	AF4.3	1		1,000	
	AF4.4	1		1,000	
	AF4.5	1		1,000	
	AF4.6	1		1,000	
	AF4.7	1		1,000	
	AF4.8	1		1,000	
	AF4.9	1		1,000	
	AF4.10	1		1,000	
	AF4.11	1		1,000	
	AF4.12	1		1,000	
	AF4.13	1		1,000	
	AF4.14	1		1,000	
	AF4.15	1		1,000	
	AF5.1	1		1,000	
	AF5.2	1		1,000	
	AF5.3	1		1,000	
	AF5.4	1		1,000	
	NO LOCALIZADAS	4		4,000	
	Total partida				47,000
2.3.19	Ud Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.				
		25		25,000	
	Total partida				25,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
2.3.20	Ud Conexión de tubería de PVC ø200 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.				
		20		20,000	
	Total partida				20,000
2.3.21	Ud Conexión de tubería de PVC ø250 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.				
		12		12,000	
	Total partida				12,000
2.3.22	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 250 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
		3		3,000	
	Total partida				3,000
2.3.23	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
		4		4,000	
	Total partida				4,000
2.3.24	Ud Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas fecales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso tapones de entradas de vertidos a pozo con bombeo de los mismos en caso necesario a pozo aguas abajo, colocación, pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.				
	FE 1.1	1		1,000	
	FE 1.6	1		1,000	
	FE 4.8 EXIST	1		1,000	
	FE 5.2 EXIST	1		1,000	
	Total partida				4,000
2.4	**VARIOS**				
2.4.1	Ud Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.				
	FE 1				
	Gas Natural	2		2,000	
	Telefónica	4		4,000	
	ONO	2		2,000	
	Media Tensión	1		1,000	
	FE 2				
	Gas natural	4		4,000	
	FE 3				
	Baja tensión	1		1,000	
	Gas natural	2		2,000	
	Telefónica	2		2,000	
	FE 4				
	Alumbrado	2		2,000	
	Gas Natural	1		1,000	
	Baja tensión	1		1,000	
	Media tensión	2		2,000	
	FE 5				
	Gas natural	1		1,000	
	Media Tensión	1		1,000	
	Telefónica	1		1,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:						27,000
	P						27,000
	Total partida						27,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
3	**RED DE PLUVIALES**				
3.1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
3.1.2	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según mediciones auxiliares				
	Colectores				
	PL 1	0,8	122,352	97,882	
	PL 2	0,8	181,119	144,895	
	PL 3	0,8	452,654	362,123	
	PL 4	0,8	24,560	19,648	
	Acometidas (bajantes mas sumideros)	0,8	286,530	229,224	
	Sobreexcavaciones	0,8	90,000	72,000	
	Total partida				925,772
3.1.3	m3 Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	Según mediciones auxiliares				
	Colectores				
	PL 1	0,2	122,352	24,470	
	PL 2	0,2	181,119	36,224	
	PL 3	0,2	452,654	90,531	
	PL 4	0,2	24,560	4,912	
	Acometidas	0,2	286,530	57,306	
	Sobreexcavaciones	0,2	90,000	18,000	
	Total partida				231,443
3.1.4	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en tierras, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	POZOS PLUVIALES				
	Según medicion auxiliar	0,8	182,210	145,768	
	P				145,768
	Total partida				145,768
3.1.5	m3 Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en roca, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.				
	POZOS PLUVIALES				
	Según medicion auxiliar	0,2	182,210	36,442	
	P				36,442
	Total partida				36,442

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
3.1.9	m2 Entibación cuajada a una cara de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados.						
	Según mediciones auxiliares						
	Colectores						
	PL 3	2	7,139			14,278	
	P						14,278
	Total partida						14,278
3.1.10	m2 Entibación cuajada en zapatas, pozos y frente de hincas, a una cara, con blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados y en cierres frontales, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	Colectores						
	PL 3	2		2,000	6,000	24,000	
	P						24,000
	Total partida						24,000
3.1.11	m3 Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	Colectores						
	PL 1	1	30,570			30,570	
	Acometidas (sumideros mas bajantes)	1	50,060			50,060	
	P						80,630
	POZOS PLUVIALES						
	PL1	4	2,000	2,000	0,500	8,000	
	a deducir registros						
	PL1	-3,142	4,000	0,384	0,500	-2,413	
	P						5,587
	·S·						
	Total partida						86,217
3.1.13	m3 Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.						
	CAMAS DE HORMIGON (Incluye nivelación de la base)						
	Según mediciones auxiliares						
	Colectores						
	PL 2	1	21,876			21,876	
	PL 3	1	53,155			53,155	
	PL 4	1	4,840			4,840	
	Sobreexcavaciones	1	9,000			9,000	
	Total partida						88,871
3.1.14	m3 Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.						
	Según mediciones auxiliares						
	Colectores						
	PL 1	1	91,782			91,782	
	PL 2	1	159,243			159,243	
	PL 3	1	399,499			399,499	
	PL 4	1	19,719			19,719	
	Acometidas (sumideros mas bajantes)	1	236,470			236,470	
	Sobreexcavaciones	1	90,000			90,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				996,713
3.1.15	Ud Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios				
	Total partida				1,000
3.2	**TUBERIAS**				
3.2.1	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 300 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	PL 2	1	56,290	56,290	
	PL 3	1	56,430	56,430	
	PL 4	1	30,390	30,390	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				147,910
3.2.2	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 400 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	PL 2	1	28,620	28,620	
	PL 3	1	20,030	20,030	
		1	36,870	36,870	
		1	12,460	12,460	
		1	10,010	10,010	
	Conexiones	2	2,400	4,800	
	Total partida				112,790
3.2.3	m Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 600 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.				
	PL 3	1	2,400	2,400	
	Total partida				2,400
3.2.4	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 160 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	No localizadas	10	3,000	30,000	
	Total partida				30,000
3.2.5	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Sumideros				
	a PL1	1	19,000	19,000	
	a PL2	1	12,000	12,000	
	a PL3	1	21,000	21,000	
	a PL4	1	9,000	9,000	
	P				61,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:				61,000
	BAJANTES				
	AP1.1	1	2,200	2,200	
	AP1.2	1	17,500	17,500	
	AP1.3	1	9,900	9,900	
	AP1.4	1	2,500	2,500	
	AP1.5	1	9,400	9,400	
	AP1.6	1	3,400	3,400	
	AP1.7	1	9,600	9,600	
	AP1.8	1	3,300	3,300	
	AP1.9	1	9,600	9,600	
	AP1.10	1	6,600	6,600	
	AP1.11	1	10,800	10,800	
	AP1.12	1	13,300	13,300	
	AP3.10	1	4,800	4,800	
	AP3.11	1	10,400	10,400	
	AP3.12	1	9,400	9,400	
	AP3.13	1	4,200	4,200	
	AP3.14	1	4,800	4,800	
	AP4.1	1	6,500	6,500	
	AP4.2	1	10,000	10,000	
	AP4.3	1	6,600	6,600	
	AP4.4	1	10,500	10,500	
	No localizadas	10	3,000	30,000	
	P				195,300
	Total partida				256,300
3.2.6	m Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 1	1	61,090	61,090	
	conexiones	2	4,000	8,000	
	Total partida				69,090
3.2.7	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	Sumideros				
	a PL2	2		2,000	
	a PL3	7		7,000	
	a PL4	2		2,000	
	P				11,000
	Bajantes				
	AP3.12	1		1,000	
	AP3.13	1		1,000	
	AP4.3	1		1,000	
	AP4.4	1		1,000	
	No localizadas	2		2,000	
	P				6,000
	Total partida				17,000
3.2.8	Ud Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.				
		8		8,000	
	Total partida				8,000
3.2.9	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	No localizadas	4		4,000	
	Total partida				4,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
3.2.10	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	a PL1	1		1,000	
	AP1.5	1		1,000	
	AP1.6	1		1,000	
	AP1.8	1		1,000	
	AP1.9	1		1,000	
	P				5,000
	Total partida				5,000
3.2.11	m Rehabilitación de colector de diámetro 500 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara.				
	PL 5	1	17,590	17,590	
	Conexiones	2	2,000	4,000	
	Total partida				21,590
3.3	**OBRAS DE FABRICA**				
3.3.1	Ud Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible , con inscripción, clase D400, tipo Rexess de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.				
	POZO PL4.1	1		1,000	
	Total partida				1,000
3.3.3	Ud Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 1.1	1		1,000	
	PL 1.2	1		1,000	
	PL1.3	1		1,000	
	PL2.1	1		1,000	
	PL2.2	1		1,000	
	PL2.3	1		1,000	
	PL 3.1	1		1,000	
	PL 3.2	1		1,000	
	PL 3.3	1		1,000	
	PL3.4	1		1,000	
	PL3.5	1		1,000	
	PL 3.6	1		1,000	
	PL 3.7 RESALTO	1		1,000	
	PL 4.1	1		1,000	
	PL 4.2	1		1,000	
	Otros pozos	1		1,000	
	Total partida				16,000
3.3.4	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 1.2	1		1,000	
	PL3.4	1		1,000	
	PL 3.6	1		1,000	
	Otros pozos	1		1,000	
	Total partida				4,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
3.3.5	Ud Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 3.5	1		1,000	
	PL 3.6	1		1,000	
	Total partida				2,000
3.3.6	Ud Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL1.3	1		1,000	
	PL2.3	1		1,000	
	PL 3.1	1		1,000	
	PL 3.2	1		1,000	
	PL 3.3	1		1,000	
	PL3.4	1		1,000	
	PL3.5	1		1,000	
	PL 3.6	1		1,000	
	PL 3.7 RESALTO	1		1,000	
	Otros pozos	1		1,000	
	Total partida				10,000
3.3.7	Ud Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.				
	PL 1.1	1		1,000	
	PL 1.2	1		1,000	
	PL2.1	1		1,000	
	PL2.2	1		1,000	
	PL 4.1	1		1,000	
	PL 4.2	1		1,000	
	Otros pozos	1		1,000	
	Total partida				7,000
3.3.8	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 1.1	1		1,000	
	PL 1.2	1		1,000	
	PL1.3	1		1,000	
	PL2.1	1		1,000	
	PL2.2	1		1,000	
	PL2.3	1		1,000	
	PL 3.1	1		1,000	
	PL 3.2	1		1,000	
	PL 3.3	1		1,000	
	PL3.4	1		1,000	
	PL3.5	1		1,000	
	PL 3.6	1		1,000	
	PL 3.7 RESALTO	1		1,000	
	PL 4.1	1		1,000	
	PL 4.2	1		1,000	
	Otros pozos	1		1,000	
	Total partida				16,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
3.3.9	Ud Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo PAMREX de Saint Gobain o SOLO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.				
	POZOS A REFORZAR	2		2,000	
	Total partida				2,000
3.3.10	Ud Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	PL 1.1	1		1,000	
	PL 1.2	2		2,000	
	PL1.3	3		3,000	
	PL2.1	1		1,000	
	PL2.2	1		1,000	
	PL2.3	3		3,000	
	PL 3.1	2		2,000	
	PL 3.2	3		3,000	
	PL 3.3	3		3,000	
	PL3.4	4		4,000	
	PL3.5	5		5,000	
	PL 3.6	6		6,000	
	PL 3.7 RESALTO	6		6,000	
	PL 4.1	1		1,000	
	PL 4.2	1		1,000	
	Otros pozos	4		4,000	
	Total partida				46,000
3.3.11	Ud Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.				
	NO LOCALIZADAS	4		4,000	
	Total partida				4,000
3.3.12	Ud Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil cuadrada, de 60x60 cm de paso libre , con inscripción, clase B125, tipo Hidraulica de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.				
	BAJANTES				
	AP1.1	1		1,000	
	AP1.2	1		1,000	
	AP1.3	1		1,000	
	AP1.4	1		1,000	
	AP1.5	1		1,000	
	AP1.6	1		1,000	
	AP1.7	1		1,000	
	AP1.8	1		1,000	
	AP1.9	1		1,000	
	AP1.10	1		1,000	
	AP1.11	1		1,000	
	AP1.12	1		1,000	
	AP3.10	1		1,000	
	AP3.11	1		1,000	
	AP3.12	1		1,000	
	AP3.13	1		1,000	
	AP3.14	1		1,000	
	AP4.1	1		1,000	
	AP4.2	1		1,000	
	AP4.3	1		1,000	
	AP4.4	1		1,000	
	No localizadas	2		2,000	

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
	Total partida				23,000
3.3.13	Ud Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.				
		20		20,000	
	Total partida				20,000
3.3.14	Ud Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.				
	SUMIDEROS				
	conexión a tubo				
	PL2	1		1,000	
	PL3	1		1,000	
	PL4	1		1,000	
P					3,000
	Bajantes	11		11,000	
	Sin localizar	4		4,000	
P					15,000
	·S·				
	Total partida				18,000
3.3.15	Ud Conexión de tubería de PVC ø200 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.				
	SUMIDEROS				
	conexión a pozo				
	PL1	2		2,000	
	PL2	1		1,000	
	PL3	2		2,000	
	PL4	1		1,000	
P					6,000
	Bajantes	3		3,000	
	Sin localizar	2		2,000	
P					5,000
	·S·				
	Total partida				11,000
3.3.16	Ud Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas pluviales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.				
	PL 2.4	1		1,000	
	PL 1.4	1		1,000	
	PL3.8	1		1,000	
	PL4.3	1		1,000	
	Total partida				4,000
3.4	**VARIOS**				
3.4.1	Ud Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.				
	PL 1				
	Gas natural	1		1,000	
	PL 2				
	Gas natural	3		3,000	
	Telefónica	2		2,000	
	Abastecimiento exist	1		1,000	
	PL 3				

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
	Suma y sigue:						7,000
	Alumbrado	2				2,000	
	Gas Natural	3				3,000	
	Media tensión	2				2,000	
	Baja tensión	1				1,000	
	Total partida						15,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
4	**CONTROL DE CALIDAD**				
4.1	Ud Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.500 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.				
	Pruebas sin pavimento terminado	1		1,000	
	Pruebas con pavimento terminado	1		1,000	
	Total partida				2,000
4.2	Ud Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.200 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.				
	Pruebas con pavimento terminado	1		1,000	
	Pruebas sin pavimento terminado	1		1,000	
	Total partida				2,000
4.3	Ud Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.000 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.				
	Pruebas con pavimento terminado	10		10,000	
	Pruebas sin pavimento terminado	10		10,000	
	Total partida				20,000
4.4	m Inspección de tuberías de saneamiento, de cualquier diámetro, mediante cámara de video robotizada, antideflagrante, con indicación de material, diámetro y pendiente, visualización individual circunferencial de juntas, incluso entrega de un informe escrito con todas las incidencias descritas y localizadas, reportaje fotográfico de las incidencias y reportaje videográfico de la inspección, según especificaciones Ordenanza M.C.P.				
	PLUVIALES				
	Inspección inicial	1	400,000	400,000	
	Inspeccion final	1	350,000	350,000	
	FECALES				
	Inspección inicial	1	460,000	460,000	
	Inspeccion final	1	460,000	460,000	
	Total partida				1.670,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES				
			DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
5	**SEGURIDAD Y SALUD**						
5.1	Ud Partida alzada de abono íntegro según estudio de S y S						
	Total partida						1,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
6	**SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO**				
6.1	Ud Rótulo informativo de la obra, normalizado, según manual de identidad visual de MCP, sobre una única chapa de acero galvanizado de espesor 1,5 mm, con recubrimiento mínimo de 45 micras, de dimensiones 1950x1400 m, incluso elementos de sustentación con perfiles de acero laminado galvanizado de 80x40, elementos de anclaje, incluso empotramiento en el suelo de los perfiles con excavación de 50x50 cm. con profundidad de 70 cm. y hormigonado para su anclaje, posterior desmontaje y retirada de cimentación, totalmente colocado, herramientas y demás medios auxiliares.				
	Total partida				2,000
6.2	Ud Señal de obra de peligro (TP), triangular, de tamaño normal (lado 90 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).				
	Total partida				9,000
6.3	Ud Señal de obra de reglamentación (TR), circular, de tamaño normal (Ø 60 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).				
	Total partida				12,000
6.4	Ud Señal de obra de indicación (TS 52-62), rectangular, de tamaño normal (0.5 m²), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).				
	Total partida				4,000
6.5	Ud Panel direccional estrecho (TB-2 ó TB-4) de 165x45 cm., reflectante de nivel H.I., incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada (amortizable en 3 usos).				
	Total partida				12,000
6.6	Ud Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos).				
	Total partida				30,000
6.7	Ud Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos).				
	Total partida				12,000
6.8	Ud Pareja de semáforos portátiles para obra (TL-1), incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 5 usos).				
	Total partida				1,000
6.9	Ud Cascada luminosa TL-8 compuesta por foco principal de xenon flash y 4 focos secundarios de 200 mm diámetro. Incluye balizas de seguridad con bandas reflexivas rojas y blancas TB-7/TB-8, soporte con bases de goma de 28 kg, sistema de control, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 3 usos).				
	Total partida				3,000
6.10	m Barrera de seguridad rígida (TD-1) portátil, roja y blanca, incluso rellena de agua o arena para evitar su vuelco, incluido colocación y retirada (amortizable en 10 usos).				
	Total partida				20,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES		
			DIMENSIONES	Subtotales	TOTALES
6.11	m Barrera de contención peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m. de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado negro) de al menos 24 kg de peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocación y desmontaje, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demás medios auxiliares (amortizable en 10 usos).				
	Total partida				100,000
6.12	m2 Plataforma peatonal para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclada al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos).				
	Total partida				10,000
6.13	m2 Plataforma para tráfico rodado, para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclados al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos).				
	Total partida				5,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
7	**GESTION DE RESIDUOS**						
7.1	mk m3.km de transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.						
	C Residuos	uds	m3	km			
	ABASTECIMIENTO						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	951,140	23,000		21.876,220	
	Acometidas	1	315,230	23,000		7.250,290	
	Exca nudos	1	163,810	23,000		3.767,630	
	demoliciones hormigón	1,1	14,120	23,000		357,236	
	Demoliciones asfalto	1,1	6,780	23,000	0,150	25,730	
	FECALES						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	2.391,480	23,000		55.004,040	
	Exca pozos y arquetas	1	487,730	23,000		11.217,790	
	demoliciones hormigón	1,1	45,500	23,000		1.151,150	
	Demoliciones asfalto	1,1	17,460	23,000	0,150	66,261	
	PLUVIALES						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	1.067,220	23,000		24.546,060	
	Exca pozos y arquetas	1	266,490	23,000		6.129,270	
	demoliciones hormigón	1,1	22,260	23,000		563,178	

	OTROS RESIDUOS	1,1	5,000	23,000		126,500	
	Total partida						132.081,355
7.2	m3 Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5)						
	ABASTECIMIENTO						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	951,140			951,140	
	Acometidas	1	315,230			315,230	
	Exca nudos	1	163,810			163,810	
	FECALES						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	2.391,480			2.391,480	
	Exca pozos y arquetas	1	487,730			487,730	
	PLUVIALES						
	Tierras y piedras						
	Conducción	1	1.067,220			1.067,220	
	Exca pozos y arquetas	1	266,490			266,490	
	P						5.643,100
	Total partida						5.643,100
7.3	m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón en masa, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados						
	ABASTECIMIENTO						
	demoliciones hormigón	1,1	14,120			15,532	
	FECALES						
	demoliciones hormigón	1,1	45,500			50,050	
	PLUVIALES						
	demoliciones hormigón	1,1	22,260			24,486	
	P						90,068
	Total partida						90,068
7.4	m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Asfalto 17 03 01) seleccionados						
	ABASTECIMIENTO						
	Demoliciones asfalto	1,1	6,780		0,150	1,119	
	FECALES						
	Demoliciones asfalto	1,1	17,460		0,150	2,881	
	P						4,000
	Total partida						4,000

N.º Orden	DESCRIPCION DE LAS UNIDADES DE OBRA	Nº de Unidades	UNIDADES DIMENSIONES			Subtotales	TOTALES
7.5	m3 Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) no seleccionados, mezclados con otros no inertes (maderas, papel, plásticos,etc)						
	OTROS RESIDUOS	1,1	5,000			5,500	
	Total partida						5,500

PRESUPUESTO

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
		00001190 RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO EN ANSOAIN, CALLES NAVARRA, ARTURO CAMPION, CANTERAS Y PLAZA EUSKAL HERRIA			
1		**RED DE ABASTECIMIENTO**			
1.1		**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES**			
1.1.1	m2	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 15 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	22,780	5,79	131,90
1.1.2	Ud	Demolición de arqueta de hormigón de pequeñas dimensiones, incluso limpieza, demolición, carga sobre camión, relleno seleccionado y reposición de pavimento. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	4,000	209,29	837,16
1.1.3	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	923,525	8,96	8.274,78
1.1.4	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	95,114	36,93	3.512,56
1.1.6	m3	Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	210,225	23,49	4.938,19
1.1.7	m3	Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	815,915	18,25	14.890,45
1.1.8	Ud	Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios	1,000	3.500,00	3.500,00
1.1.9	m3	Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.	10,793	28,58	308,46
1.1.10	m2	Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 22 base 50/70 G (G-20) calizo de 10 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares	43,170	61,05	2.635,53
1.1.11	m2	Mallazo electrosoldado B 500 S formado por redondos ø10 mm. en cuadrícula de 15x15 cms., en posesión de sello de calidad, incluso p.p. de despuntes, desperdicios, solapes, esperas, separadores, totalmente colocado.	150,000	15,03	2.254,50

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.1.12	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	37,500	157,17	5.893,88
		Total Capítulo 1.1	.....	.....	**47.177,41**
1.2		**TUBERIAS Y PIEZAS**			
1.2.1	m	Tubería de fundición nodular de DN 100 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	84,000	49,70	4.174,80
1.2.2	m	Tubería de fundición nodular de DN 150 mm., clase de presión C64, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	204,000	66,50	13.566,00
1.2.3	m	Tubería de fundición nodular de DN 250 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	216,000	112,63	24.328,08
1.2.4	m	Tubería de fundición nodular de DN 300 mm., clase de presión C50, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	84,000	155,20	13.036,80
1.2.5	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	177,03	354,06
1.2.6	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 150 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	9,000	234,43	2.109,87
1.2.7	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 250 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	14,000	406,18	5.686,52
1.2.8	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 300 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	598,08	598,08
1.2.9	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 80 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	169,43	169,43
1.2.10	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 100 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	175,36	175,36

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.2.11	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 150 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	224,85	449,70
1.2.12	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 250 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	462,63	925,26
1.2.13	Ud	Manguito de fundición nodular a enchufes de DN 300 mm de diámetro principal, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	610,40	610,40
1.2.14	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	182,38	182,38
1.2.15	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	896,72	896,72
1.2.16	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	198,28	396,56
1.2.17	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	9,000	541,45	4.873,05
1.2.18	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	1.614,17	3.228,34
1.2.19	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	1.753,98	1.753,98
		Total Capítulo 1.2	**.....**		**77.515,39**
1.3		**OBRAS DE FABRICA**			

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.1		**NUDO 1**			
1.3.1.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	28,510	12,33	351,53
1.3.1.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	5,470	27,67	151,35
1.3.1.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	12,770	23,26	297,03
1.3.1.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,560	145,55	81,51
1.3.1.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	5,050	157,17	793,71
1.3.1.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	33,090	31,64	1.046,97
1.3.1.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	248,170	1,46	362,33
1.3.1.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	7,540	15,83	119,36
1.3.1.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.1.12	Ud	Trampillón para registro y maniobra de válvula de acometida, cuerpo en HDPE, con tapa de fundición gris EN-GJL-200 (GG-20) y revestimento epoxídico, con tornillo de acero inoxidable A2 e inscripción en personalizada en nylon 6. Totalmente instalada en pavimentos o losas de arqueta, incluso colocación, hormigón de protección, herramientas y medios auxiliares.	1,000	42,00	42,00

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.1.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	18,50	55,50
1.3.1.14	Ud	Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	128,64	128,64
1.3.1.15	Ud	Pasamuros para tubería de D entre 300 y 400 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.	2,000	74,89	149,78
1.3.1.16	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.1.17	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	331,11	662,22
1.3.1.18	Ud	Te de fundición nodular a Bridas, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	978,42	978,42
1.3.1.19	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	188,87	188,87
1.3.1.20	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 300 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	1.390,53	1.390,53
1.3.1.21	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	101,46	101,46
1.3.1.22	Ud	Adaptador universal para D.N. 80 mm, construida en fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563 y protección de nylon-11, para conexión con tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores de 84-106 mm, mediante junta elastómera EPDM y contrabrida con tornillería protegida con teflón, con homologación, incluso corte de la tubería a conectar, preparación y limpieza del corte resultante, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	116,99	116,99
		Total Capítulo 1.3.1	**.....**		**7.327,29**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.2		**NUDO 2**			
1.3.2.1	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	182,63	182,63
1.3.2.2	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	338,48	676,96
1.3.2.3	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 300 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	442,40	442,40
1.3.2.4	Ud	Cruceta de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 ISO 2531 montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	997,58	997,58
1.3.2.5	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 300/(150-250) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.	1,000	545,62	545,62
1.3.2.6	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.	1,000	420,50	420,50
1.3.2.7	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	0,276	157,17	43,38
1.3.2.8	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	24,000	1,46	35,04
1.3.2.9	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	2,700	31,64	85,43
		Total Capítulo 1.3.2	.....	.....	**3.429,54**
1.3.3		**NUDO 2.1**			
1.3.3.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	19,260	12,33	237,48

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.3.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,450	27,67	123,13
1.3.3.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	10,390	23,26	241,67
1.3.3.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.3.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,700	157,17	424,36
1.3.3.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	20,390	31,64	645,14
1.3.3.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	123,910	1,46	180,91
1.3.3.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.3.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.3.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	18,50	74,00
1.3.3.14	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.3.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.3.16	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	157,30	314,60

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.3.17	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	93,77	187,54
1.3.3.18	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	804,01	804,01
1.3.3.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	37,23	74,46
		Total Capítulo 1.3.3	.....	.....	**3.851,16**
1.3.4		**NUDO 2.2**			
1.3.4.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	11,270	12,33	138,96
1.3.4.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,420	27,67	66,96
1.3.4.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	5,650	23,26	131,42
1.3.4.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.4.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,060	157,17	323,77
1.3.4.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	14,050	31,64	444,54
1.3.4.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	95,510	1,46	139,44

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.4.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.4.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.4.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	18,50	18,50
1.3.4.13	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.4.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.4.16	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	260,96	521,92
1.3.4.17	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 250 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	994,22	994,22
		Total Capítulo 1.3.4	.....		**3.323,59**
1.3.5		**NUDO 3**			
1.3.5.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	11,470	12,33	141,43
1.3.5.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,470	27,67	68,34
1.3.5.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	5,760	23,26	133,98
1.3.5.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.5.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,080	157,17	326,91
1.3.5.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	14,230	31,64	450,24
1.3.5.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	96,300	1,46	140,60
1.3.5.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.5.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.5.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	18,50	37,00
1.3.5.13	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.5.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.5.16		Valv. comp. tetones (1") 250 mm PN-16	1,000	1.598,70	1.598,70
1.3.5.17	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	93,77	187,54
1.3.5.18	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	260,96	521,92
1.3.5.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	37,23	74,46
		Total Capítulo 1.3.5	.....	.....	**4.224,98**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.6		**NUDO 4**			
1.3.6.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	11,470	12,33	141,43
1.3.6.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,470	27,67	68,34
1.3.6.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	5,760	23,26	133,98
1.3.6.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.6.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,080	157,17	326,91
1.3.6.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	14,230	31,64	450,24
1.3.6.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	96,300	1,46	140,60
1.3.6.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.6.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.6.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	18,50	18,50
1.3.6.13	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.6.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.6.16	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	804,01	804,01
1.3.6.17	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	157,30	314,60
1.3.6.18	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	93,77	187,54
1.3.6.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	37,23	74,46
		Total Capítulo 1.3.6	.....		**3.204,47**
1.3.7		**NUDO 5**			
1.3.7.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	16,110	12,33	198,64
1.3.7.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	3,640	27,67	100,72
1.3.7.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	8,490	23,26	197,48
1.3.7.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.7.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,470	157,17	388,21
1.3.7.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	18,100	31,64	572,68

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.7.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	113,650	1,46	165,93
1.3.7.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.7.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.7.12	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	18,50	55,50
1.3.7.13	Ud	Pasamuros para tubería de D menor de 100 mm en entronques con obras de fábrica de hormigón, a base de manta de fibra de vidrio envolviendo a la tubería y formación de junta perimetral en ambos lados mediante roza de 1 cm en una profundidad mínima de 2 cm, con imprimación previa de bordes y sellado con caucho sintético thikol, sikaflex,madelastik o similar y limpieza de bordes, incluso p.p. de encofrado, aros de goma, impermeabilizante de la manta, acero en armaduras de paso, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.	2,000	52,38	104,76
1.3.7.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.7.16	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	637,07	637,07
1.3.7.17	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	93,77	93,77
1.3.7.18	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	113,14	226,28
1.3.7.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	37,23	74,46
		Total Capítulo 1.3.7	**.....**	**.....**	**3.232,08**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.8		**NUDO 6**			
1.3.8.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	10,070	12,33	124,16
1.3.8.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,130	27,67	58,94
1.3.8.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,960	23,26	115,37
1.3.8.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.8.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	1,950	157,17	306,48
1.3.8.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	12,910	31,64	408,47
1.3.8.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	90,380	1,46	131,95
1.3.8.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.8.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.8.12	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.8.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	18,50	18,50

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.8.14	Ud	Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	128,64	128,64
1.3.8.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.8.16	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	113,14	113,14
1.3.8.17	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	157,30	157,30
1.3.8.18	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 150/(50-125) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.	1,000	181,20	181,20
1.3.8.19	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con tetones (by-pass de 1 ½"), con homologación, de D.N. 100 mm, PN-16, tipo "BV-05-47", modelo largo F5 de BELGICAST, S.A., con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	637,07	637,07
1.3.8.20	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2''), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	37,23	37,23
		Total Capítulo 1.3.8	.....		**2.962,31**
1.3.9		**NUDO 7**			
1.3.9.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	11,370	12,33	140,19
1.3.9.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,450	27,67	67,79
1.3.9.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	5,710	23,26	132,81
1.3.9.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.9.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,070	157,17	325,34
1.3.9.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	14,140	31,64	447,39
1.3.9.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	95,900	1,46	140,01
1.3.9.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.9.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.9.12	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.9.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	18,50	37,00
1.3.9.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.9.16	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 150 mm, PN-16, modelo largo, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	325,72	325,72
1.3.9.17	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	157,30	314,60
		Total Capítulo 1.3.9	.....	.....	**2.474,71**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.10		**NUDO 8**			
1.3.10.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	9,190	12,33	113,31
1.3.10.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	1,910	27,67	52,85
1.3.10.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,470	23,26	103,97
1.3.10.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.10.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	1,860	157,17	292,34
1.3.10.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	12,030	31,64	380,63
1.3.10.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	86,440	1,46	126,20
1.3.10.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.10.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.10.12	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.10.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	18,50	18,50

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.10.14	Ud	Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	128,64	128,64
1.3.10.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.10.16	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 150 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	157,30	157,30
		Total Capítulo 1.3.10	.....		**1.917,60**
1.3.11		**NUDO 9**			
1.3.11.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	19,900	12,33	245,37
1.3.11.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,620	27,67	127,84
1.3.11.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	10,780	23,26	250,74
1.3.11.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84
1.3.11.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,740	157,17	430,65
1.3.11.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	20,830	31,64	659,06
1.3.11.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	125,880	1,46	183,78
1.3.11.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.11.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.11.12	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.11.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	18,50	74,00
1.3.11.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.11.16		Valv. comp. tetones (1") 250 mm PN-16	1,000	1.598,70	1.598,70
1.3.11.17	Ud	Válvula de esfera de 2", construida en latón estampado con mordaza de latón, con manilla de acero, mariposa o cuadradillo, con salidas roscadas, para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	93,77	93,77
1.3.11.18	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	260,96	521,92
1.3.11.19	Ud	Enlace mixto, con rosca hembra, de Latón ADZ/DZR con casquillo acetálico, de DN exterior 63 mm (interior aprox. 2"), para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	37,23	37,23
		Total Capítulo 1.3.11	.....		**4.766,92**
1.3.12		**NUDO 10**			
1.3.12.1	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en cq. terreno, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	15,200	12,33	187,42
1.3.12.2	m3	Relleno seleccionado con grava, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, humectación, agotamiento y compactación en capas horizontales no superiores a 30 cm, hasta alcanzar el 95% del Proctor Modificado, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	3,410	27,67	94,35
1.3.12.3	m3	Relleno seleccionado con todo-uno de árido reciclado tipo ARH, en trasdós de muros de obras de fábrica, incluso carga y transporte, extendido en capas, agotamiento y compactación, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	7,950	23,26	184,92
1.3.12.5	m3	Hormigón de limpieza HL-150, con árido de tamaño máximo 20 mm. y consistencia seca-plástica, en presoleras, incluso fabricación, transporte, vertido, colocación y puesta en obra manual, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	0,260	145,55	37,84

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.12.6	m3	Hormigón armado HA-25/B/20/XC1-XC2 (IIa) en soleras, alzados y losas de obras de fabrica, incluso fabricación, transporte, vertido manual, colocación y puesta en obra, consolidación vibratoria por medios mecánicos, curado posterior durante al menos 4 días, p.p. de encofrado de juntas de construcción/retracción y de dilatación, herramientas y medios auxiliares.	2,400	157,17	377,21
1.3.12.7	m2	Encofrado recto oculto, en paramentos de hormigón de < 3 m. de altura media, realizado con tableros fenólicos de 27 mm de grueso, sobre soporte-armazón de madera, incluso durmientes, acodalamientos, pies derechos, elementos mecanizados de sujeción y anclaje, rascado y limpieza del hormigón acabado, desencofrado, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	17,400	31,64	550,54
1.3.12.9	kg	Acero para armar de resistencia característica 500 N/mm2, en cualquiera de los diámetros normalizados, en posesión del sello de calidad, preparado en taller u obra, montado y atado, incluye la parte proporcional de desperdicios, tolerancias legales, cortes, despuntes, arriostramientos, refuerzos auxiliares, separadores rígidos en cuadrícula de 50x50 cm., setas de protección, herramientas y medios auxiliares.	110,500	1,46	161,33
1.3.12.10	m	Junta de estanquidad para la utilización en juntas de estructuras de hormigón (de dilatación, retracción o construcción), con bateaguas de PVC de colocación central o externa, tipo Supercast SL de Fosroc o similar de iguales características técnicas, de 25 cm de anchura, apta para su uso en contacto con agua potable. Incluso p.p. de piezas especiales, amarres, soldaduras y sujeciones. Totalmente terminada, herramientas y demás medios auxiliares.	4,400	15,83	69,65
1.3.12.11	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	246,40	246,40
1.3.12.12	Ud	Imperm. unión tub. D150-250mm-paramento	2,000	63,64	127,28
1.3.12.13	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	18,50	55,50
1.3.12.14	Ud	Contrarresto de hormigón HA-25 armado con acero B-500 S, en interior de obras de fábrica, contra solera o alzados, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos comprendiendo la ejecución de esperas en el alzado y solera o bien el anclaje mediante taladro y aplicación de resinas epoxi, incluso encofrado y desencofrado, apuntalamiento , totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	128,64	128,64
1.3.12.15	Ud	Desague de arqueta de abastecimiento, formado con tuberia de PE D90 mm. (Longitud = 2 m.), totalmente instalada, herramientas y medios auxiliares.	1,000	62,69	62,69
1.3.12.16	Ud	Te de fundición nodular a Bridas, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	662,13	662,13
1.3.12.17	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 250 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	4,000	260,96	1.043,84
1.3.12.18	Ud	Reducción Brida-Brida en fundición nodular D.N. 250/(100-200) mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra.	1,000	420,50	420,50

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.3.12.19	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 250 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	994,22	994,22
1.3.12.20	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	140,02	140,02
1.3.12.21	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	986,30	986,30
		Total Capítulo 1.3.12	.....	.....	**6.530,78**
		Total Capítulo 1.3	.....	.....	**47.245,43**
1.4		**ACOMETIDAS**			
1.4.1	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.	6,000	263,27	1.579,62
1.4.2	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø100 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m.	3,000	372,62	1.117,86
1.4.3	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.	3,000	235,50	706,50
1.4.4	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.	6,000	264,73	1.588,38
1.4.5	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø150 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 10 m.	5,000	313,33	1.566,65
1.4.6	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.	1,000	240,79	240,79
1.4.7	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, ejecución de zanja, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15m.	2,000	328,72	657,44

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.4.8	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 6 m.	6,000	270,02	1.620,12
1.4.9	Ud	Acometida domiciliaria, realizada con tubería de polietileno PEAD de Ø1 1/2", derivada de la red general de Ø250 mm. Incluye: suministro y colocación de collarín con enlace giratorio en derivación, colocación de la tubería y tapón final. Incluso coquilla flexible de espuma elastomérica de 9 mm. de espesor. Longitud de acometida hasta 15 m.	8,000	379,37	3.034,96
1.4.19	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	283,707	8,96	2.542,01
1.4.20	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	31,523	36,93	1.164,14
1.4.22	m3	Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	36,990	23,49	868,90
1.4.23	m3	Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	278,240	18,25	5.077,88
1.4.24	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	280,97	280,97
1.4.25	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 150 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	348,25	348,25
1.4.26		Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	605,77	1.211,54
1.4.27		Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 300 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	842,02	842,02
1.4.28	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	94,06	94,06

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.4.29	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	353,34	353,34
1.4.30	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	986,30	1.972,60
1.4.31	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 300 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	1.179,49	1.179,49
1.4.32	m	Tubería de fundición nodular de DN 80 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	27,140	43,35	1.176,52
1.4.34	Ud	Llave de paso para acometida de servicios de D 1 1/4", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.	1,000	219,11	219,11
1.4.35	Ud	Llave de paso para acometida de servicios de D 2", con contador interior, compuesta por valvula de esfera de bronce o latón estampado, accesorios roscados de bronce y arqueta de charnela de 125 mm. instalada sobre tubería de PVC del mismo diámetro, incluso colocación, hormigón de protección, conexión a acometida, herramientas y medios auxiliares.	29,000	273,74	7.938,46
1.4.36	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", incluso contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	427,15	854,30
1.4.37	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de >1", incluso contador antihielo de ø20 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, retirada y puenteado de contador interior existente, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	795,81	2.387,43
1.4.38	Ud	Caja de contador, modelo homologado, para acometida domiciliaria de abastecimiento de 1", SIN contador antihielo de ø13 mm, valvulería, piezas especiales y pequeño piecerio de acuerdo a la Normativa, recibido en base y con zuncho perimetral de hormigón HNE-15 de 20 cm, encofrado, protección de entradas a la caja con limitadores-centradores giratorios sobre su eje y cierre de poliestireno expandido, localización y preparación para conexión con tubería actual, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	402,09	1.206,27
1.4.40	Ud	Arqueta Normalizada de hormigón HA-25/B/19/IIa, de 0.80x0.80 m de dimensiones interiores y 1.15 m de altura media interior, incluso excavación, relleno de Todo-uno (T máx. 60 mm), hormigón, encofrado y desencofrado, armaduras, marco y tapa de fundición nodular clase D400 ø600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares.	4,000	889,69	3.558,76

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.4.42	Ud	Válvula de compuerta de cierre elástico, con homologación, de D.N. 80 mm, PN-16, modelo corto, conforme a EN 1074, tipo BV-05-47 de BELGICAST o EURO 20 de SAINT GOBAIN o serie 6/30 de AVK, con cuerpo de fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563, con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	188,87	755,48
1.4.43	Ud	Empalme BE Corto (Quick GS sin acerrojar) de 80 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	8,000	101,46	811,68
1.4.44	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 80 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	8,000	166,88	1.335,04
1.4.45	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codos de: (11º, 22º y 45º), en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia arriba (cóncavo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	27,02	108,08
1.4.46	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Codo 22º, en tuberías de ø 80 mm, en colocación vertical hacia abajo (convexo), para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	36,37	145,48
1.4.47	Ud	Adaptador universal para D.N. 80 mm, construida en fundición dúctil ENGJS-500-7 según norma UNE EN 1563 y protección de nylon-11, para conexión con tuberías de distintos materiales y diámetros exteriores de 84-106 mm, mediante junta elastómera EPDM y contrabrida con tornillería protegida con teflón, con homologación, incluso corte de la tubería a conectar, preparación y limpieza del corte resultante, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocada, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	116,99	467,96
		Total Capítulo 1.4	.....		**49.012,09**
1.5		**HIDRANTES Y BOCAS DE RIEGO**			
1.5.1	Ud	Arqueta Normalizada de hormigón HM-20/B/19/I, de 60x60 cm x 0.80 m de dimensiones interiores, para alojamiento de hidrante, incluso excavación, relleno de ZA-25, encofrado y desencofrado, marco y tapa abatible de D 600 mm. colocado con sus 4 anclajes, herramientas y medios auxiliares.	2,000	604,19	1.208,38
1.5.2	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 100 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	1,000	280,97	280,97
1.5.3	Ud	Te de fundición nodular con tres Enchufes, de 150 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	3,000	348,25	1.044,75
1.5.4	Ud	Te de fundición nodular de Enchufes a Brida, de 250 mm de diámetro principal con salida a cualquier diámetro normalizado, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas exprés equipadas, con brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, anclaje, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	545,77	1.091,54

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.5.5	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 100 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	94,06	94,06
1.5.6	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 150 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	3,000	353,34	1.060,02
1.5.7	Ud	Contrarresto de hormigón armado en Te 90º, en tuberías de ø 250 mm, en colocación horizontal, para una presión de prueba de 12 Kg/cm2, de acuerdo a las formas y detalles definidos en planos, incluso suministro y colocación de hormigón HA-25, acero B500 S, encofrado y desencofrado, apuntalamiento, sobreexcavación en todo tipo de terreno, incluso roca, relleno, totalmente terminado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	986,30	1.972,60
1.5.8	Ud	Empalme Brida-Enchufe (BE) de 100 mm., de fundición nodular, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso junta exprés equipada, brida PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montada con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	140,02	280,04
1.5.9	Ud	Carrete de fundición nodular a Bridas, de 100 mm. de diámetro, L=300 mm, con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	159,97	319,94
1.5.10	Ud	Codo de fundición nodular a bridas de DN 100 mm (90º-45º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso con bridas PN-16 UNE EN 1092-2 (ISO 2531) montadas con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B , transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	148,13	296,26
1.5.11	Ud	Codo de fundición nodular a enchufe de DN 100 mm (90º,45º,22º,11º), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso juntas expres equipadas, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	2,000	177,03	354,06
1.5.12	m	Tubería de fundición nodular de DN 100 mm., clase de presión C100, con junta automática flexible standard, revestida interiormente con mortero, con revestimiento exterior reforzado (capa de Zn/Aluminio 85%/15% (400gr/m2) + pintura acrílica espesor >70 µm), fabricada de acuerdo con la Norma UNE-EN 545, incluso transporte a pie de obra, cinta de señalización, colocación en zanja, pruebas, desinfección con Cloro, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	12,000	49,70	596,40
1.5.13	Ud	Hidrante bajo rasante, modelo homologado, de doble columna seca, dos bocas de ø 75 mm. con válvulas de compuerta de 2½" en cada una de las bocas y salida de racord Barcelona de 70 mm. de aluminio forjado, con dispositivo antihielo, incluso p.p. de juntas de etileno-propileno, tornillería bicromatada, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	1.117,17	2.234,34
1.5.14	Ud	Boca de Riego modelo "BV-05-63-PA", de BELGICAST, D.N. 40 mm, con cuerpo de hierro fundido formando arqueta, eje de acero X20 Cr 13, con el acoplamiento de bronce tipo Pamplona y cadena de acero inoxidable, incluso transporte a pie de obra, totalmente colocado, pruebas y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares	4,000	394,88	1.579,52
1.5.15	Ud	Brida Roscada de D.N. 60 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	4,000	72,48	289,92

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.5.16	m	Aislamiento térmico para tuberías realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 63 de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.	24,000	7,46	179,04
1.5.17	m	Tubería de diámetro ext. 63 mm. (int. 2"), de polietileno de Alta Densidad PE-100, para 16 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE-EN 12201, en posesión de la Marca de producto certificado, incluso transporte a pie de obra, p.p. de piezas especiales, colocación en zanja, prueba de presión y desinfección con cloro, herramientas y medios auxiliares.	24,000	10,20	244,80
1.5.18	Ud	Brida Roscada de D.N. 40 mm, en fundición nodular, con salida a cualquier diámetro, para PN-16, UNE EN 1092-2 (ISO 2531), con revestimiento exterior e interior con cincado y capa de acabado con pintura epoxi, incluso montaje con junta de PVC o elástica de EPDM y tornillería Geomet 500B, transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	4,000	59,72	238,88
1.5.19	Ud	Enlace mixto brida de Latón , D.N. 60/65 mm con salida para PEBD 2 1/2", para 16 Atmósferas de presión de trabajo, incluso transporte a pie de obra, colocación en zanja, pruebas, herramientas y medios auxiliares.	4,000	156,19	624,76
1.5.20	Ud	Protección de columna de Boca de Riego, para evitar vibraciones de la misma, mediante Hormigón HM-20, incluso encofrado y colocación.	4,000	13,99	55,96
		Total Capítulo 1.5	.....		**14.046,24**
1.6		**RED PROVISIONAL**			
1.6.1	Ud	Localización y preparación para la conexión de acometidas de agua a viviendas y locales existentes, mediante la realización de catas, incluyendo excavación mecánica o manual, con demolición de pavimentos y/o contrarrestos, materiales para posteriores rellenos, mano de obra, herramientas y medios auxiliares, totalmente terminado.	40,000	118,88	4.755,20
1.6.2	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 3'' mm. (3" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	777,850	19,27	14.989,17
1.6.3	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1 ½'' mm. (1 1/2" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	136,000	9,49	1.290,64
1.6.4	m	Tubería de polietileno de baja densidad, de diámetro ext. 1'' mm. (1" int.) , en instalación vista-aérea, tendida por un lado de la calle, fijada a la altura suficiente que permita el paso de vehiculos y maquinaria de obra, para 10 atmósferas de presión de trabajo, fabricada según normas UNE 53131 y 53142, en posesión de la Marca de calidad del MOPU, incluso transporte a pie de obra, p.p de piezas especiales,, p.p. de coquilla elastomérica e=9 mm, montaje, sistemas de fijación, desmontaje y traslado a otro sector, pruebas y desinfección con cloro, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares y de seguridad.	24,000	5,96	143,04

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
1.6.5	Ud	de abono íntegro para la conexion para la derivación de la red de abastecimiento provisional durante la ejecución de las obras desde la red actual ó definitiva, incluso localización y descubrimiento de la conducción existente en los puntos de conexión, por medios manuales o mecánicos, apuntalamientos necesarios para sujeción de la tubería, entibación y agotamiento de la zanja, rellenos, piecerio necesario para derivación de red provisional y taponamiento de la red actual si fuera necesario, medios manuales y mecánicos requeridos para asegurar el suministro, herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la deconexión final con vuelta a las condiciones iniciales.	4,000	376,81	1.507,24
		Total Capítulo 1.6	.....		**22.685,29**
1.7		**VARIOS**			
1.7.1	Ud	Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.	10,000	176,36	1.763,60
1.7.2	Ud	Partida Alzada a justificar en protecciones de tuberías de gas según Normativa de Gas en cruces y paralelismos con los distintos servicios.	5,000	1.200,00	6.000,00
1.7.3	Ud	Cruce de canalización de proyecto con otros servicios afectados, incluyendo todos los trabajos necesarios para su localización, la pérdida de rendimiento de excavación, adecuación de la entibación, relleno y colocación de la tubería, su desvío, apuntalamiento y estabilización o adecuación a la necesidad de la obra y su reposición final, incluyendo todos los materiales necesarios, piezas especiales, gestiones con la compañías, etc., hasta la correcta ejecución de la unidad.	39,000	111,94	4.365,66
		Total Capítulo 1.7	.....		**12.129,26**
		Total Capítulo 1	.....		**269.811,11**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2		**RED DE FECALES**			
2.1		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
2.1.1	m2	Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico existente en espacio confinado ocupado por zanja, de anchura media 1-2 m, de espesor medio 15 cm, incluso corte de bordes mediante disco radial, carga sobre camión, herramientas y demás medios auxiliares. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	33,460	5,79	193,73
2.1.3	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	1.834,042	8,96	16.433,02
2.1.4	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	792,475	36,93	29.266,10
2.1.6	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en tierras, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	224,763	8,72	1.959,93
2.1.7	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en roca, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	96,327	28,06	2.702,94
2.1.10	m3	Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	171,191	23,49	4.021,28
2.1.11	m3	Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.	237,969	150,33	35.773,88
2.1.13	m3	Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	2.017,674	18,25	36.822,55
2.1.14	Ud	Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios	1,000	3.500,00	3.500,00
2.1.15	m3	Base con material granular, zahorra con huso granulométrico huso ZA-20 ó ZA-32, con árido calizo procedente de machaqueo, incluso carga, transporte, extendido, humectación, compactación vibratoria en capas no superiores a 30 cm. de espesor, hasta obtener el 100% del Proctor Modificado, formación de pendientes transversales, refino de coronación y reperfilado de taludes, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares de obra.	6,692	28,58	191,26

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2.1.16	m2	Firme con mezcla bituminosa en caliente, con M.B.C. AC 22 base 50/70 G (G-20) calizo de 10 cms en capa intermedia y M.B.C. AC 16 surf 50/70 S (S-12) ofítica de 5 cms en capa de rodadura, según Norma 6.1.IC de la Instrucción de Carreteras vigente, incluso riegos asfálticos, extendido, compactación, herramientas y demás medios auxiliares	43,170	61,05	2.635,53
		Total Capítulo 2.1	.....	.....	**133.500,22**
2.2		**TUBERIAS**			
2.2.1	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 300 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	54,430	62,16	3.383,37
2.2.2	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 400 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	130,590	75,63	9.876,52
2.2.3	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 500 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	58,600	99,53	5.832,46
2.2.4	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 600 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	157,940	122,71	19.380,82
2.2.5	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 800 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, con al menos dos bulones (arteones) para su manipulación, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	37,550	189,99	7.134,12
2.2.6	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	233,210	29,40	6.856,37
2.2.7	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 250 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	131,650	35,15	4.627,50

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2.2.8	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	126,840	52,36	6.641,34
2.2.9	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	8,000	333,09	2.664,72
2.2.10	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	101,13	404,52
2.2.11	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	89,22	356,88
2.2.12	m	Rehabilitación de colector de diámetro 300 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara.	25,620	298,11	7.637,58
		Total Capítulo 2.2	.....	.....	**74.796,20**
2.3		**OBRAS DE FABRICA**			
2.3.1	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	17,000	510,58	8.679,86
2.3.2	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160/200 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	712,92	1.425,84
2.3.3	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1500 mm de diámetro interior y 300 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	1.758,98	3.517,96
2.3.4	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1500/1200 mm., para pozo de registro de 1500 mm. de diámetro interior y 300 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.	2,000	589,43	1.178,86
2.3.5	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	10,000	119,63	1.196,30

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2.3.6	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	140,44	561,76
2.3.7	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 100 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	186,96	186,96
2.3.8	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	156,81	156,81
2.3.9	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1200 mm de diámetro interior y 160 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	193,84	775,36
2.3.10	Ud	Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	15,000	167,37	2.510,55
2.3.11	Ud	Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1200/600 mm y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	216,99	433,98
2.3.12	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1200/600 mm., para pozo de registro de 1200 mm. de diámetro interior y 160 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.	2,000	196,97	393,94
2.3.13	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.	2,000	172,79	345,58
2.3.14	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	19,000	246,40	4.681,60

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2.3.15	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo PAMREX de Saint Gobain o SOLO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	378,77	757,54
2.3.16	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	86,000	18,50	1.591,00
2.3.17	Ud	Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	290,19	1.160,76
2.3.18	Ud	Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil cuadrada, de 60x60 cm de paso libre , con inscripción, clase B125, tipo Hidraulica de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.	47,000	659,73	31.007,31
2.3.19	Ud	Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.	25,000	307,50	7.687,50
2.3.20	Ud	Conexión de tubería de PVC ø200 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	20,000	224,15	4.483,00
2.3.21	Ud	Conexión de tubería de PVC ø250 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	12,000	293,22	3.518,64
2.3.22	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 250 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	3,000	416,36	1.249,08
2.3.23	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	333,09	1.332,36
2.3.24	Ud	Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas fecales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso tapones de entradas de vertidos a pozo con bombeo de los mismos en caso necesario a pozo aguas abajo, colocación, pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	530,06	2.120,24
		Total Capítulo 2.3	.....		**80.952,79**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
2.4		**VARIOS**			
2.4.1	Ud	Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.	27,000	176,36	4.761,72
		Total Capítulo 2.4			**4.761,72**
		Total Capítulo 2			**294.010,93**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
3		**RED DE PLUVIALES**			
3.1		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**			
3.1.2	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en tierras a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	925,772	8,96	8.294,92
3.1.3	m3	Excavación en zanjas, arquetas y pozos de registro en roca a cualquier profundidad, por medios mecánicos, con carga a camión de los productos de la excavación, en zona urbana densa (con I>10.000 hab/km²), incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, p.p. de corte y rotura de pavimento, demoliciones de obras de fábrica, agotamientos, entibaciones puntuales necesarias por motivos de seguridad, cruces con otros servicios realizados tanto manualmente como con medios mecánicos, refino a mano, herramientas y medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	231,443	36,93	8.547,19
3.1.4	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en tierras, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	145,768	8,72	1.271,10
3.1.5	m3	Excavación para emplazamiento de cimentaciones o pequeñas obras de fábrica en roca, reperfilado y compactación de la superficie excavada hasta el 100% del Proctor Modificado, refino, entibación, agotamiento, acopio seleccionado de la tierra vegetal existente y de los productos de la excavación para su posterior reutilización o transporte a acopio intermedio, incluso herramientas y demás medios auxiliares. Incluye la carga a camión y descarga de los residuos en vertedero. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido.	36,442	28,06	1.022,56
3.1.9	m2	Entibación cuajada a una cara de blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados.	14,278	19,56	279,28
3.1.10	m2	Entibación cuajada en zapatas, pozos y frente de hincas, a una cara, con blindaje metálico y arriostramientos telescópicos, con posibilidad de movimiento de traslación del marco de arriostramiento, apta para empujes laterales en zanjas verticales hasta 6.0 m. de profundidad y p.p. de utilización de tablestacas especiales en el cruce de infraestructuras o servicios afectados y en cierres frontales, a emplear por indicación de la Dirección de obra previa aprobación del modelo a utilizar, incluso incrementos de costes de excavaciones y rellenos, p.p. de grúa para su manejo y retirada, soportes, elementos metálicos extensibles, colocación y posterior recuperación, herramientas y medios auxiliares.	24,000	26,89	645,36
3.1.11	m3	Relleno con material granular, tamaño 5-12 mm, en zanjas, en cama y protección de tuberías, incluso carga y transporte, extendido en zanja, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	86,217	23,49	2.025,24
3.1.13	m3	Hormigón HNE-15 en asientos, recalces, protección de tuberías, cunas, contrarrestos, incluso fabricación, transporte, colocación y puesta en obra, consolidación por vibración, curado, p.p. de juntas de construcción, herramientas y demás medios auxiliares.	88,871	150,33	13.359,98

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
3.1.14	m3	Relleno con todo-uno de Árido reciclado ARH, de tamaño máximo 60 mm, en zanjas y pozos, incluso carga y transporte, extendido en zanja en tongadas horizontales de 30 cm. de espesor máximo, humectación, compactación vibratoria por medios mecánicos, refino de coronación y taludes, herramientas y medios auxiliares.	996,713	18,25	18.190,01
3.1.15	Ud	Partida alzada a justificar para pequeños trabajos de urbanización y varios	1,000	3.500,00	3.500,00
		Total Capítulo 3.1	.....	.....	**57.135,64**
3.2		**TUBERIAS**			
3.2.1	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 300 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	147,910	62,16	9.194,09
3.2.2	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 400 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	112,790	75,63	8.530,31
3.2.3	m	Tubería de hormigón armado, fabricado por compresión radial, con cemento SR, Ø int. 600 mm, conforme a EN 1916 y su complemento UNE 127916, clase IV según clasificación tipo A (ASTM C-76M), espesor B, con campana, fresado de macho con acanaladura y junta de goma tipo delta alojada en la misma, según Norma UNE EN 681-1, colocada en zanja, comprendiendo descarga, carga y transporte a lugar de empleo o acopio, incluso p.p. de cortes, pruebas de estanquidad y tacos de nivelación y limpieza. Totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y medios auxiliares de obra.	2,400	122,71	294,50
3.2.4	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 160 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	30,000	19,12	573,60
3.2.5	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 200 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	256,300	29,40	7.535,22
3.2.6	m	Tubería de PVC color gris (RAL 7037), según norma UNE EN ISO 1452-1, para saneamiento, de 315 mm de diámetro exterior, para presión interior PN 6, montada con embocadura estanca mediante junta homogénea de caucho EPDM, tipo Delta bilabiada, según norma UNE-EN 681-1, en posesión del sello y la marca de calidad, incluso acopios, p.p. de corte y tratamiento del corte, pp. de piezas especiales, pruebas y limpieza, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	69,090	52,36	3.617,55
3.2.7	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	17,000	333,09	5.662,53

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
3.2.8	Ud	Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.	8,000	307,50	2.460,00
3.2.9	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 160 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	101,13	404,52
3.2.10	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de PVC de DN 315 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	5,000	89,22	446,10
3.2.11	m	Rehabilitación de colector de diámetro 500 mm, mediante encamisado por entubado continuo de fibra de vidrio impregnada con resinas de poliéster y curado en obra, completamente autoportante, de acuerdo a la norma UNE-EN 13566. Incluso desplazamiento de equipos y personal especializado, by-pass de los efluentes e inspección final con cámara.	21,590	407,77	8.803,75
		Total Capítulo 3.2	.....		**47.522,17**
3.3		**OBRAS DE FABRICA**			
3.3.1	Ud	Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible , con inscripción, clase D400, tipo Rexess de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.	1,000	635,00	635,00
3.3.3	Ud	Módulo base de Hormigón Armado prefabricado, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de hormigón HL-150 para regularización y nivelación de apoyo con 10 cm de espesor, colocación sin lubricante de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión de tuberías con registro, cuna de hormigón HNE-20/B/20/I (cemento SR), encofrado interior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	16,000	510,58	8.169,28
3.3.4	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 25 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	119,63	478,52
3.3.5	Ud	Módulo cilíndrico de Hormigón Armado prefabricado, de 50 cm de altura, en pozo de registro, de 1000 mm de diámetro interior y 120 mm de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) entre recrecidos, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	140,44	280,88
3.3.6	Ud	Módulo cónico de Hormigón Armado prefabricado, de 65 cm de altura, en pozo de registro, de diámetro interior 1000/600 mm y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, pruebas, totalmente colocado y puesto en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	10,000	167,37	1.673,70
3.3.7	Ud	Losa de reducción de Hormigón Armado prefabricado de 30 cm. de altura y diámetros interiores 1000/600 mm., para pozo de registro de 1000 mm. de diámetro interior y 120 mm. de espesor, incluso acopios, p.p. de junta elástica homogénea de caucho vulcanizado (según EN 681-1) en unión con módulo inferior, puesta a cota en la parte superior mediante recrecido con anillo de Hormigón Armado, encofrado circular, puente de unión entre hormigones con resinas epoxi y anclajes ø12 B500 S, pruebas, totalmente colocada y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares de obra.	7,000	172,79	1.209,53

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
3.3.8	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo REXESS de Saint Gobain o TWINO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	16,000	246,40	3.942,40
3.3.9	Ud	Marco y tapa de fundición dúctil ø 600 mm, abatible, con inscripción, clase D400, Modelo PAMREX de Saint Gobain o SOLO de EJ, con marco redondo, para carga de rotura 40 Tn., según Norma UNE-EN 124, incluso puesta a cota de la parte superior de arqueta o pozo mediante recortado o recrecido con hormigón armado in situ, encofrado, sellado de la junta recortada o puente de unión entre hormigones con resinas Epoxi y anclajes ø12 B500 S, nivelación del marco con 4 tornillos M-12 con doble tuerca anclados mediante tacos mecánicos expansivos, incluso recibido perimetral con hormigón HM-25, armadura circular ø12 B500 S, encofrado metálico, pruebas, totalmente colocado y puesta en servicio, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	378,77	757,54
3.3.10	Ud	Pate trepador homologado, de polipropileno con varilla de acero ø 12mm, con tope de anclaje curvo en pozos de registro y plano en arquetas, colocado mediante ejecución de taladro no pasante y sellado con resinas epoxi, totalmente terminado, herramientas y demás medios auxiliares.	46,000	18,50	851,00
3.3.11	Ud	Arqueta de registro de hormigón de dimensiones interiores en planta 40x40 cm y 0.70 m de altura máxima, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,10 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil de paso libre 40x40, clase C 250 para 12,5 Tn, tipo "Hidraúlica" de Saint Gobain, incluyendo manguito pasamuros de PVC en entrada y salida de la arqueta de conexión, herramientas y demás medios auxiliares.	4,000	290,19	1.160,76
3.3.12	Ud	Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores en planta 60x60 cm y 0.95 m de altura interior media, espesor de solera 0,15 m y alzados de 0,15 m, encofrado y desencofrado exterior e interior, excavación y relleno perimetral, formación de media caña, colocación de marco y tapa de fundición dúctil cuadrada, de 60x60 cm de paso libre , con inscripción, clase B125, tipo Hidraulica de Saint Gobain, herramientas y demás medios auxiliares.	23,000	659,73	15.173,79
3.3.13	Ud	Conexión entre tuberías de saneamiento de distinto material, realizado in situ, mediante un mazizado de hormigón de la junta entre el colector existente y un tubo corto (L<1,0 m). Incluye los trabajos necesarios para el corte y preparación de las tuberías, embocado y bloqueo de las mismas, encofrados y vertido de hormigón HA-25, regularización de superficie hidraúlica con mortero. Totalmente terminado.	20,000	307,50	6.150,00
3.3.14	Ud	Accesorio de PVC inyectado, para conexión directa de acometida DN 200 mm a colector de hormigón de DN 300-600 mm, incluso taladro de colector con corona perforadora, colocación de injerto con junta elástica, transporte a pie de obra, pruebas, totalmente colocado, herramientas y medios auxiliares.	18,000	333,09	5.995,62
3.3.15	Ud	Conexión de tubería de PVC ø200 a pozo de registro, en acometidas no previstas en planos, incluso taladro en pozo de registro por medios mecánicos, suministro y colocacion de manguito pasamuros arenado con junta de estanquidad, recibido con mortero sin retracción a base de resinas epoxi, herramientas y medios auxiliares. Totalmente terminado.	11,000	224,15	2.465,65
3.3.16	Ud	Reforma de pozo de registro existente en colector de aguas pluviales, consistente en la sustitución del marco y tapa por unos nuevos de fundición dúctil ø600 mm, abatible, con inscripción, clase D400 Rexess, para carga de rotura 40 Tn., según Norma EN 124, limpieza y preparación de la base para la ejecución o reforma de la media caña, incluso pruebas, totalmente terminado, herramientas y medios auxiliares.	4,000	530,06	2.120,24
		Total Capítulo 3.3	.....	.....	**51.063,91**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
3.4		**VARIOS**			
3.4.1	Ud	Apertura de calicata en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos y apoyo manual, de cualquier profundidad, hasta localización de redes existentes, servicios afectados ó roca dura no meteorizada. Incluso relleno de la zanja con restitución de la capa superior (tierra vegetal o pavimento) a sus condiciones iniciales.	15,000	176,36	2.645,40
		Total Capítulo 3.4			**2.645,40**
		Total Capítulo 3			**158.367,12**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
4		**CONTROL DE CALIDAD**			
4.1	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.500 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.	2,000	340,05	680,10
4.2	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.200 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.	2,000	312,50	625,00
4.3	Ud	Prueba de estanquidad en pozo de registro de saneamiento diámetro interior 1.000 mm, de cualquier altura, a realizar mediante llenado con agua y previa obturación de la conducción y acometidas. Unicamente serán de abono las pruebas que resulten satisfactorias según especificaciones del pliego de condiciones.	20,000	286,97	5.739,40
4.4	m	Inspección de tuberías de saneamiento, de cualquier diámetro, mediante cámara de video robotizada, antideflagrante, con indicación de material, diámetro y pendiente, visualización individual circunferencial de juntas, incluso entrega de un informe escrito con todas las incidencias descritas y localizadas, reportaje fotográfico de las incidencias y reportaje videográfico de la inspección, según especificaciones Ordenanza M.C.P.	1.670,000	3,11	5.193,70
		Total Capítulo 4	**.....**	**.....**	**12.238,20**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
5		**SEGURIDAD Y SALUD**			
5.1	Ud	Partida alzada de abono íntegro según estudio de S y S	1,000	19.857,63	19.857,63
		Total Capítulo 5			**19.857,63**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
6		**SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO**			
6.1	Ud	Rótulo informativo de la obra, normalizado, según manual de identidad visual de MCP, sobre una única chapa de acero galvanizado de espesor 1,5 mm, con recubrimiento mínimo de 45 micras, de dimensiones 1950x1400 m, incluso elementos de sustentación con perfiles de acero laminado galvanizado de 80x40, elementos de anclaje, incluso empotramiento en el suelo de los perfiles con excavación de 50x50 cm. con profundidad de 70 cm. y hormigonado para su anclaje, posterior desmontaje y retirada de cimentación, totalmente colocado, herramientas y demás medios auxiliares.	2,000	729,40	1.458,80
6.2	Ud	Señal de obra de peligro (TP), triangular, de tamaño normal (lado 90 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).	9,000	74,22	667,98
6.3	Ud	Señal de obra de reglamentación (TR), circular, de tamaño normal (Ø 60 mm), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).	12,000	71,86	862,32
6.4	Ud	Señal de obra de indicación (TS 52-62), rectangular, de tamaño normal (0.5 m²), reflexiva de clase RA2 y troquelada, normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,5 m. de altura. Incluso anclajes para señales de código según norma UNE 135312, colocación, vigilancia, mantenimiento y desmontaje (amortizable en 4 usos).	4,000	84,79	339,16
6.5	Ud	Panel direccional estrecho (TB-2 ó TB-4) de 165x45 cm., reflectante de nivel H.I., incluso soportes metálicos y sujeción al suelo, colocación y retirada (amortizable en 3 usos).	12,000	110,08	1.320,96
6.6	Ud	Cono de tráfico reglamentario, de 50 cm. de altura (TB-6), en PVC, reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos).	30,000	8,05	241,50
6.7	Ud	Baliza de borde reglamentaria (TB-8/9), reflectante, incluso colocación y retirada (amortizable en 3 usos).	12,000	65,28	783,36
6.8	Ud	Pareja de semáforos portátiles para obra (TL-1), incluso soporte, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 5 usos).	1,000	923,37	923,37
6.9	Ud	Cascada luminosa TL-8 compuesta por foco principal de xenon flash y 4 focos secundarios de 200 mm diámetro. Incluye balizas de seguridad con bandas reflexivas rojas y blancas TB-7/TB-8, soporte con bases de goma de 28 kg, sistema de control, colocación, mantenimiento de alimentación, reposición y retirada (amortizable en 3 usos).	3,000	833,97	2.501,91
6.10	m	Barrera de seguridad rígida (TD-1) portátil, roja y blanca, incluso rellena de agua o arena para evitar su vuelco, incluido colocación y retirada (amortizable en 10 usos).	20,000	9,31	186,20
6.11	m	Barrera de contención peatonal formada por vallas de 3,5 m de longitud por 2 m. de alto, formada por malla electrosoldada y postes de acero galvanizado, sobre pies de materiales plásticos (termoplástico reciclado negro) de al menos 24 kg de peso, para cerramiento de la zona de obras, normalizada, incluso colocación y desmontaje, elementos de unión y soportes, preparación del terreno, cimentaciones y anclajes necesarios, totalmente colocada, herramientas y demás medios auxiliares (amortizable en 10 usos).	100,000	6,00	600,00
6.12	m2	Plataforma peatonal para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclada al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos).	10,000	10,51	105,10
6.13	m2	Plataforma para tráfico rodado, para cubrición de huecos, con bordes biselados, superficie antideslizante, manuportante, homologada, de clase resistente adecuada según UNE EN 124 y anclados al pavimento. Incluye colocación y retirada de la misma (amortizable en 20 usos).	5,000	15,39	76,95

N.º Orden	Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
	Total Capítulo 6	.....	.....	**10.067,61**

N.º Orden		Descripción de las unidades de obra	Medición	Precio	Importe
7		**GESTION DE RESIDUOS**			
7.1	mk	m3.km de transporte de tierras, piedras, áridos, escombros o cualquier otro residuo de la construcción o demolición sobre camión, volumen medido sobre perfil, y distancia mínima por carretera medida en sentido de ida, incluso vuelta.	132.081,355	0,33	43.586,85
7.2	m3	Tasa en concepto de vertido de tierras y rocas sin contaminar (Código LER 17.05.04) en vertedero perteneciente a gestor autorizado en operaciones de eliminación (D5)	5.643,100	6,97	39.332,41
7.3	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón en masa, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) seleccionados	90,068	21,63	1.948,17
7.4	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Asfalto 17 03 01) seleccionados	4,000	79,22	316,88
7.5	m3	Tasa en concepto de gestión en planta de tratamiento, perteneciente a gestor autorizado en operaciones de valorización R5, de residuos no peligrosos de construcción o demolición pétreos (Códigos LER 17.01: Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos) no seleccionados, mezclados con otros no inertes (maderas, papel, plásticos,etc)	5,500	54,30	298,65
		Total Capítulo 7			**85.482,96**
		Total Presupuesto			**849.835,56**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE CAPÍTULOS

Nº Orden	Descripción de los capítulos	Importe
1	RED DE ABASTECIMIENTO	269.811,110
2	RED DE FECALES	294.010,930
3	RED DE PLUVIALES	158.367,120
4	CONTROL DE CALIDAD	12.238,200
5	SEGURIDAD Y SALUD	19.857,630
6	SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO	10.067,610
7	GESTION DE RESIDUOS	85.482,960

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**849.835,56 €**
10 % Gastos Generales	84.983,56 €
6 % Beneficio Industrial	50.990,13 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	**985.809,25 €**
21 % I.V.A.	207.019,94 €
TOTAL PRESUPUESTO	**1.192.829,19 €**

Asciende el presupuesto proyectado a la expresada cantidad de:
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS

En Pamplona, Junio de 2026

LA AUTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Agustina Rivera Martín

LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Agustina Rivera Martín
